


Identif.	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	ZBERNÝ DVOR TVRDOŠOVCE	434 dni	Št 1.9.22	Ut 30.4.24
2	SO-01 Prevádzková budova	60 dni	Št 1.9.22	Str 23.11.22
3	SO-01 Prevádzková budova - stavebná časť	12 týždne	Št 1.9.22	Str 23.11.22
4	Míľnik č.1 - ukončenie základov	0 dni	Str 14.9.22	Str 14.9.22
5	Míľnik č.1 - ukončenie hrubej stavby	0 dni	Str 19.10.22	Str 19.10.22
6	SO-01 Prevádzková budova - bleskozvod a uzemňenie	3 týždne	Št 1.9.22	Str 21.9.22
7	SO-01 Prevádzková budova - NN privody pre SO-01	3 týždne	Št 22.9.22	Str 12.10.22
8	SO-02 Prístrešok pre kontajnery	40 dni	Št 16.2.23	Str 12.4.23
9	SO-02 Prístrešok pre kontajnery - stavebná časť	8 týždne	Št 16.2.23	Str 12.4.23
10	Míľnik č.1 - ukončenie základov	0 dni	Str 1.3.23	Str 1.3.23
11	Míľnik č.1 - ukončenie hrubej stavby	0 dni	Str 15.3.23	Str 15.3.23
12	SO-02 Prístrešok pre kontajnery - Bleskozvod a uzemnenie	2 týždne	Št 16.2.23	Str 1.3.23
13	SO-02 Prístrešok pre kontajnery - silnopráúdové a svetelné rozvody	2 týždne	Št 16.3.23	Str 29.3.23
14	SO-03 Garáž	60 dni	Št 24.11.22	Str 15.2.23
15	SO-03 Garáž - stavebná časť	12 týždne	Št 24.11.22	Str 15.2.23
16	Míľnik č.1 - ukončenie základov	0 dni	Str 21.12.22	Str 21.12.22
17	Míľnik č.1 - ukončenie hrubej stavby	0 dni	Str 18.1.23	Str 18.1.23
18	SO-03 Garáž - Bleskozvod a uzemnenie	3 týždne	Št 24.11.22	Str 14.12.22
19	SO-03 Garáž - silnopráúdové a svetelné rozvody	3 týždne	Št 19.1.23	Str 8.2.23
20	SO-04 Silážny žľab	12 týždne	Št 26.10.23	Str 17.1.24
21	SO-05 Váha	60 dni	Št 31.8.23	Str 22.11.23
22	SO-05 Váha - stavebná časť + technológia	8 týždne	Št 31.8.23	Str 25.10.23
23	SO-05 Váha - Silnopráúdové rozvody	4 týždne	Št 26.10.23	Str 22.11.23
24	SO-06 Spevnené plochy	14 týždne	Str 24.1.24	Ut 30.4.24
25	SO-07 Hangár	100 dni	Št 13.4.23	Str 30.8.23
26	SO-07 Hangár - stavebná časť	20 týždne	Št 13.4.23	Str 30.8.23
27	Míľnik č.1 - ukončenie základov	0 dni	Str 17.5.23	Str 17.5.23
28	Míľnik č.1 - ukončenie hrubej stavby	0 dni	Str 12.7.23	Str 12.7.23
29	SO-07 Hangár - bleskozvod a uzemnenie	3 týždne	Št 13.4.23	Str 3.5.23
30	SO-07 Hangár - silnopráúdové a svetelné rozvody	3 týždne	Št 13.7.23	Str 2.8.23
31	SO-08 Prípojka vody a areálové rozvody vody	8 týždne	Št 12.10.23	Str 6.12.23
32	SO-09 Areálová splašková kanalizácia a žumpa	8 týždne	Št 7.12.23	Str 31.1.24
33	SO-10 Dažďová kanalizácia	8 týždne	Št 1.2.24	Str 27.3.24
34	SO-11 Požiarna nádrž	6 týždne	Št 31.8.23	Str 11.10.23
35	SO-12 Areálové NN rozvody	80 dni	Št 12.10.23	Str 31.1.24
36	SO-12.1 NN prípojka	8 týždne	Št 12.10.23	Str 6.12.23
37	SO-12.2 Areálové NN rozvody	8 týždne	Št 7.12.23	Str 31.1.24
38	SO-13 Bezpečnostný kamerový systém	8 týždne	Št 1.2.24	Str 27.3.24
39	SO-14 Areálové osvetlenie	12 týždne	Št 7.12.23	Str 28.2.24
40	SO-15 Sadové úpravy	13 týždne	Št 18.1.24	Str 17.4.24
41	SO-16 Oplotenie	13 týždne	Št 18.1.24	Str 17.4.24

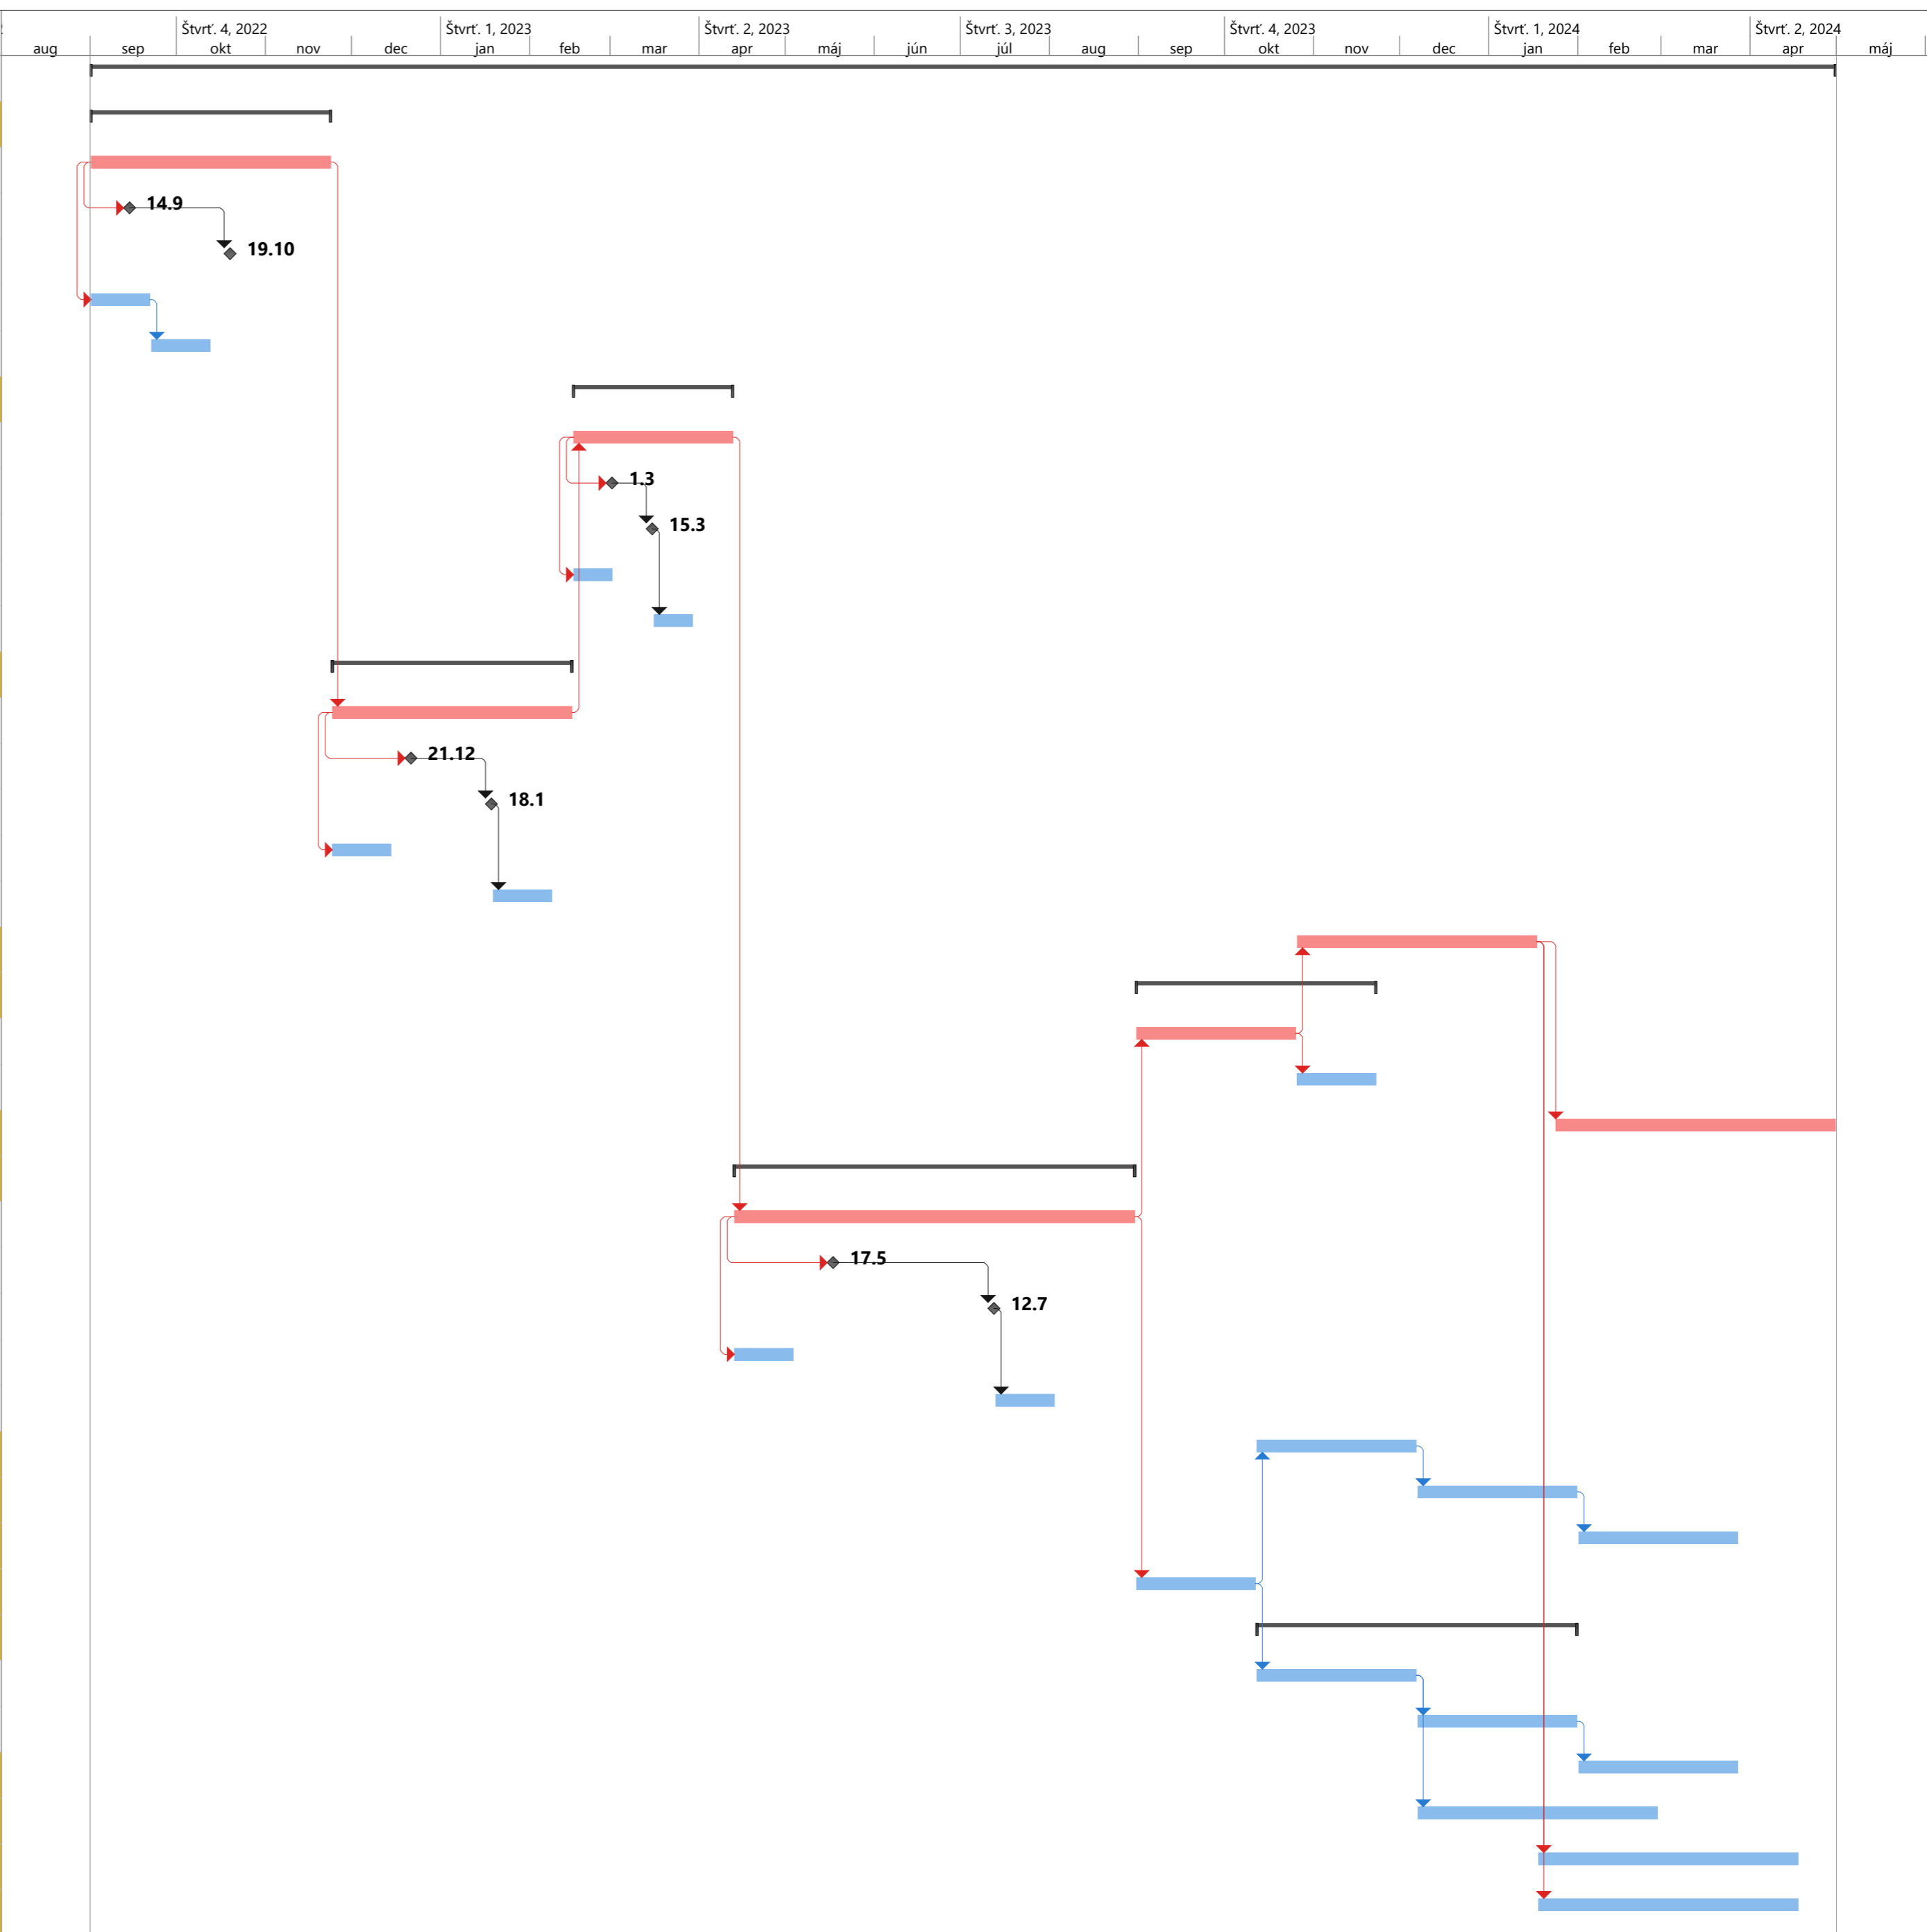

AVA-stav, s.r.o.	Úloha		Súhrn		Neaktívny medzník		Iba trvanie		Iba začiatok		Externý medzník		Kritické rozdelenie	
	Rozdeliť		Súhrn projektu		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Iba dokončiť		Termín		Priebeh	
	Medzník		Neaktívna úloha		Manuálna úloha		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Kritické		Manuálny priebeh	

HARMONOGRAM
