



ID	Název úkolu	Doba trváni	Zahájení	Dokončení	S	N	25.XI.13	P	U	S	C	P	S	N	P	U	2.XII.13	S	C
1	Národný onkologický ústav	52 dny	25.11.13	15.1.14															
2	Búracie práce	21 dny	25.11.13	15.12.13															
3	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dverí do 2 m ²	1 den	25.11.13	25.11.13															
4	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ²	2 dny	25.11.13	26.11.13															
5	Demontáž podhládov, kazety	2 dny	27.11.13	28.11.13															
6	Demontáž podhládov, perfor.	2 dny	27.11.13	28.11.13															
7	Demontáž podhládov, roštov Al.	2 dny	29.11.13	30.11.13															
8	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m ²	3 dny	1.12.13	3.12.13															
9	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m ²	3 dny	1.12.13	3.12.13															
10	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m ²	1 den	1.12.13	1.12.13															
11	Vybúr. otvorov do 4 m ² v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	2 dny	2.12.13	3.12.13															
12	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápencom, do 100 %	3 dny	4.12.13	6.12.13															
13	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m ²	1 den	7.12.13	7.12.13															
14	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou	2 dny	8.12.13	9.12.13															
15	Búranie dlažieb z xylitolu luteho nad 1 m ²	3 dny	10.12.13	12.12.13															
16	Búranie dlažieb xylitol. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m ²	2 dny	13.12.13	14.12.13															
17	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 2 m ²	1 den	15.12.13	15.12.13															
18	Stavebné práce	32 dny	15.12.13	15.1.14															
19	Montáž exteriér. dverí	1 den	16.12.13	16.12.13															
20	Zamurovanie otvoru do 1 m ² v priečkach alebo stenách POROTHERM P+D hr. 175 m	1 den	16.12.13	16.12.13															
21	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	4 dny	17.12.13	20.12.13															
22	Podlahy lute hr. 5 mm Nivelit R	3 dny	21.12.13	23.12.13															
23	PRICKY SADROKART W112 2X12 GKB 150	3 dny	24.12.13	26.12.13															
24	Izolácia proti vlhkosti mŕtva voda, AQUAFIN 2K	1 den	24.12.13	24.12.13															
25	Milník - Ukončenie hrubých prác	0 dny	26.12.13	26.12.13															
26	Hrubé rozvody TZB	11 dny	15.12.13	25.12.13															
27	Elektro	5 dny	15.12.13	19.12.13															
28	ZTI - Vnútorná kanalizácia, Voda, Sanita	3 dny	20.12.13	22.12.13															
29	Vzduchotechnika	3 dny	23.12.13	25.12.13															
30	Povrchové úpravy	3 dny	27.12.13	29.12.13															
31	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	3 dny	27.12.13	29.12.13															
32	Omietka vnút. stropov izolačná	2 dny	27.12.13	28.12.13															
33	Podlahy keramické, povlakové	5 dny	30.12.13	3.1.14															
34	Montáž dlažby	1 den	30.12.13	30.12.13															
35	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	4 dny	31.12.13	3.1.14															
36	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov	4 dny	31.12.13	3.1.14															
37	Keramické obklady	1 den	4.1.14	4.1.14															
38	Montáž obkladov	1 den	4.1.14	4.1.14															
39	Konštrukcie stolárske	3 dny	5.1.14	7.1.14															
40	Montáž drev. stien konopl. zácl. s dvoma kridl.	1 den	5.1.14	5.1.14															
41	Montáž drev. stien konopl. zácl. s jedným kridl.	1 den	5.1.14	5.1.14															

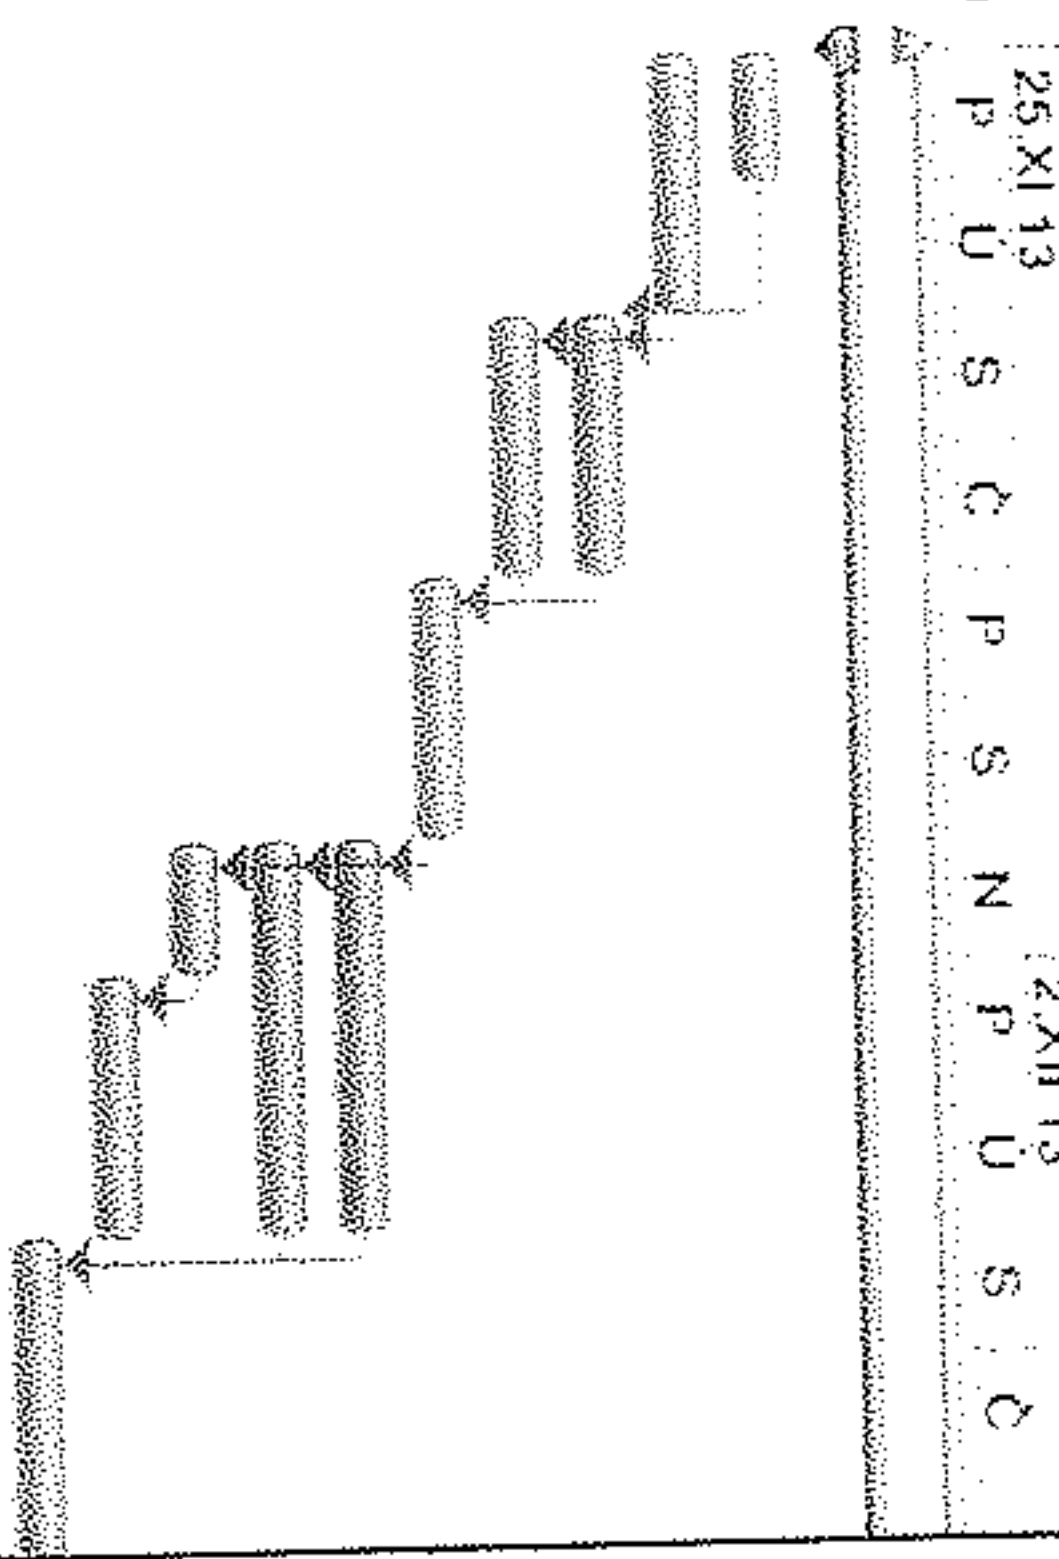

ID	Nazev úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	S	N	P	U	S	C	P	S	N	P	U	S	C
42	Osadenie dvereých zárubní alebo rámov ocelových do 2,5 m ²	1 den	6.1.14	6.1.14													
43	Montáž dverí kompl. okvát. do zárub	1 den	7.1.14	7.1.14													
44	Montáž okien,sten	1 den	7.1.14	7.1.14													
45	Konštrukcie - drevosťavby	3 dny	7.1.14	9.1.14													
46	PODHLADY SÁDROKART D113 GKBI 12,5	1 den	7.1.14	7.1.14													
47	Kazetový podhlad	3 dny	7.1.14	9.1.14													
48	Dokončovacie práce - maľby	5 dny	10.1.14	14.1.14													
49	MALBA 2XPRIMAL 1FAIR M500	5 dny	10.1.14	14.1.14													
50	Kompletáž TZB	1 den	15.1.14	15.1.14													
51	Elektro	1 den	15.1.14	15.1.14													
52	ZTI -Vnútorná kanalizácia,Voda,Sanita	1 den	15.1.14	15.1.14													
53	Vzduchoelektrika	1 den	15.1.14	15.1.14													

P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č		
9.XII.13					16.XII.13					23.XII.13					30.XII.13					6.I.14					13.I.14				

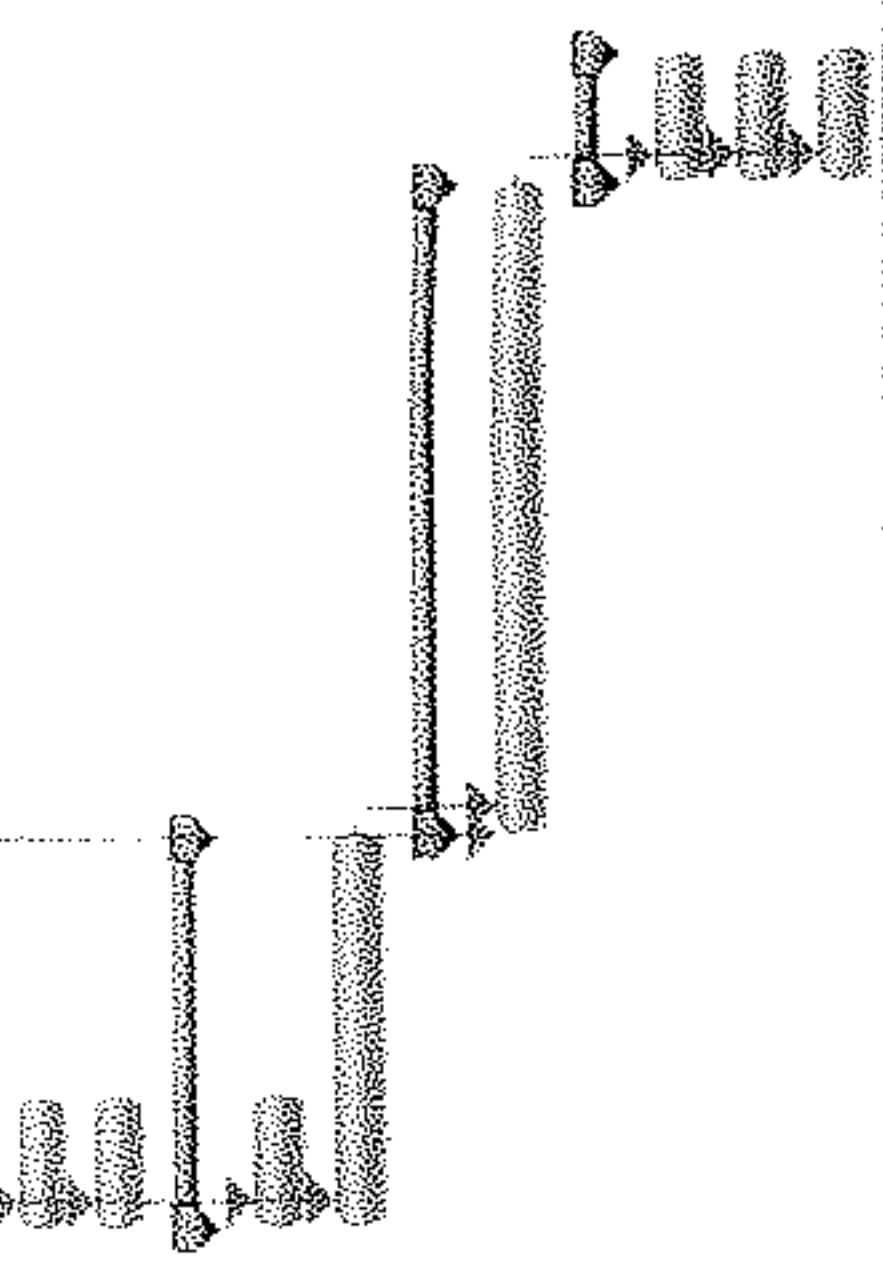

MOTOPI
 10.000 10.000 10.000 10.000
 10.000 10.000 10.000 10.000
 10.000 10.000 10.000 10.000
 10.000 10.000 10.000 10.000

Finančný harmonogram - NOÚ Obnova a údržba odd.chemoterapie					
ID	Názov stavby, objektu, časti	2 013		2 014	Spolu
		11	12	1	
1	NOÚ Obnova a údržba odd. chemoterapie	23 272,09	89 152,98	70 505,24	182 930,31
4	Búracie práce	23 272,09	32 891,63		23 272,09
5	Stavebné práce		5 436,29		32 891,63
6	Hrubé rozvody Elektro		1 943,80		5 436,29
7	Hrubé rozvody ZTI		629,40		1 943,80
8	Hrubé rozvody Vzduchotechnika		2 010,80	3 763,00	629,40
9	Povrchové úpravy		5 470,00	23 280,02	5 773,80
10	Podlahy keramické, povlakové		2 593,25		28 750,02
11	Keramické obklady		3 300,00	11 571,32	2 593,25
12	Konštrukcie stolárske		34 877,81		14 871,32
13	Konštrukcie - drevostavby			3 954,36	34 877,81
14	Dokončovacie práce - maľby			27 936,54	3 954,36
15	Kompletáž Elektro, ZTI, Vzduchotechnika				27 936,54
	Celkom v EUR bez DPH	23 272,09	89 152,98	70 505,24	182 930,31

182 930,31
 70 505,24
 23 272,09
 32 891,63
 5 436,29
 1 943,80
 629,40
 5 773,80
 28 750,02
 2 593,25
 14 871,32
 34 877,81
 3 954,36
 27 936,54
 182 930,31
