


Diagnostické preventívne a výskumné centrum VUSCH

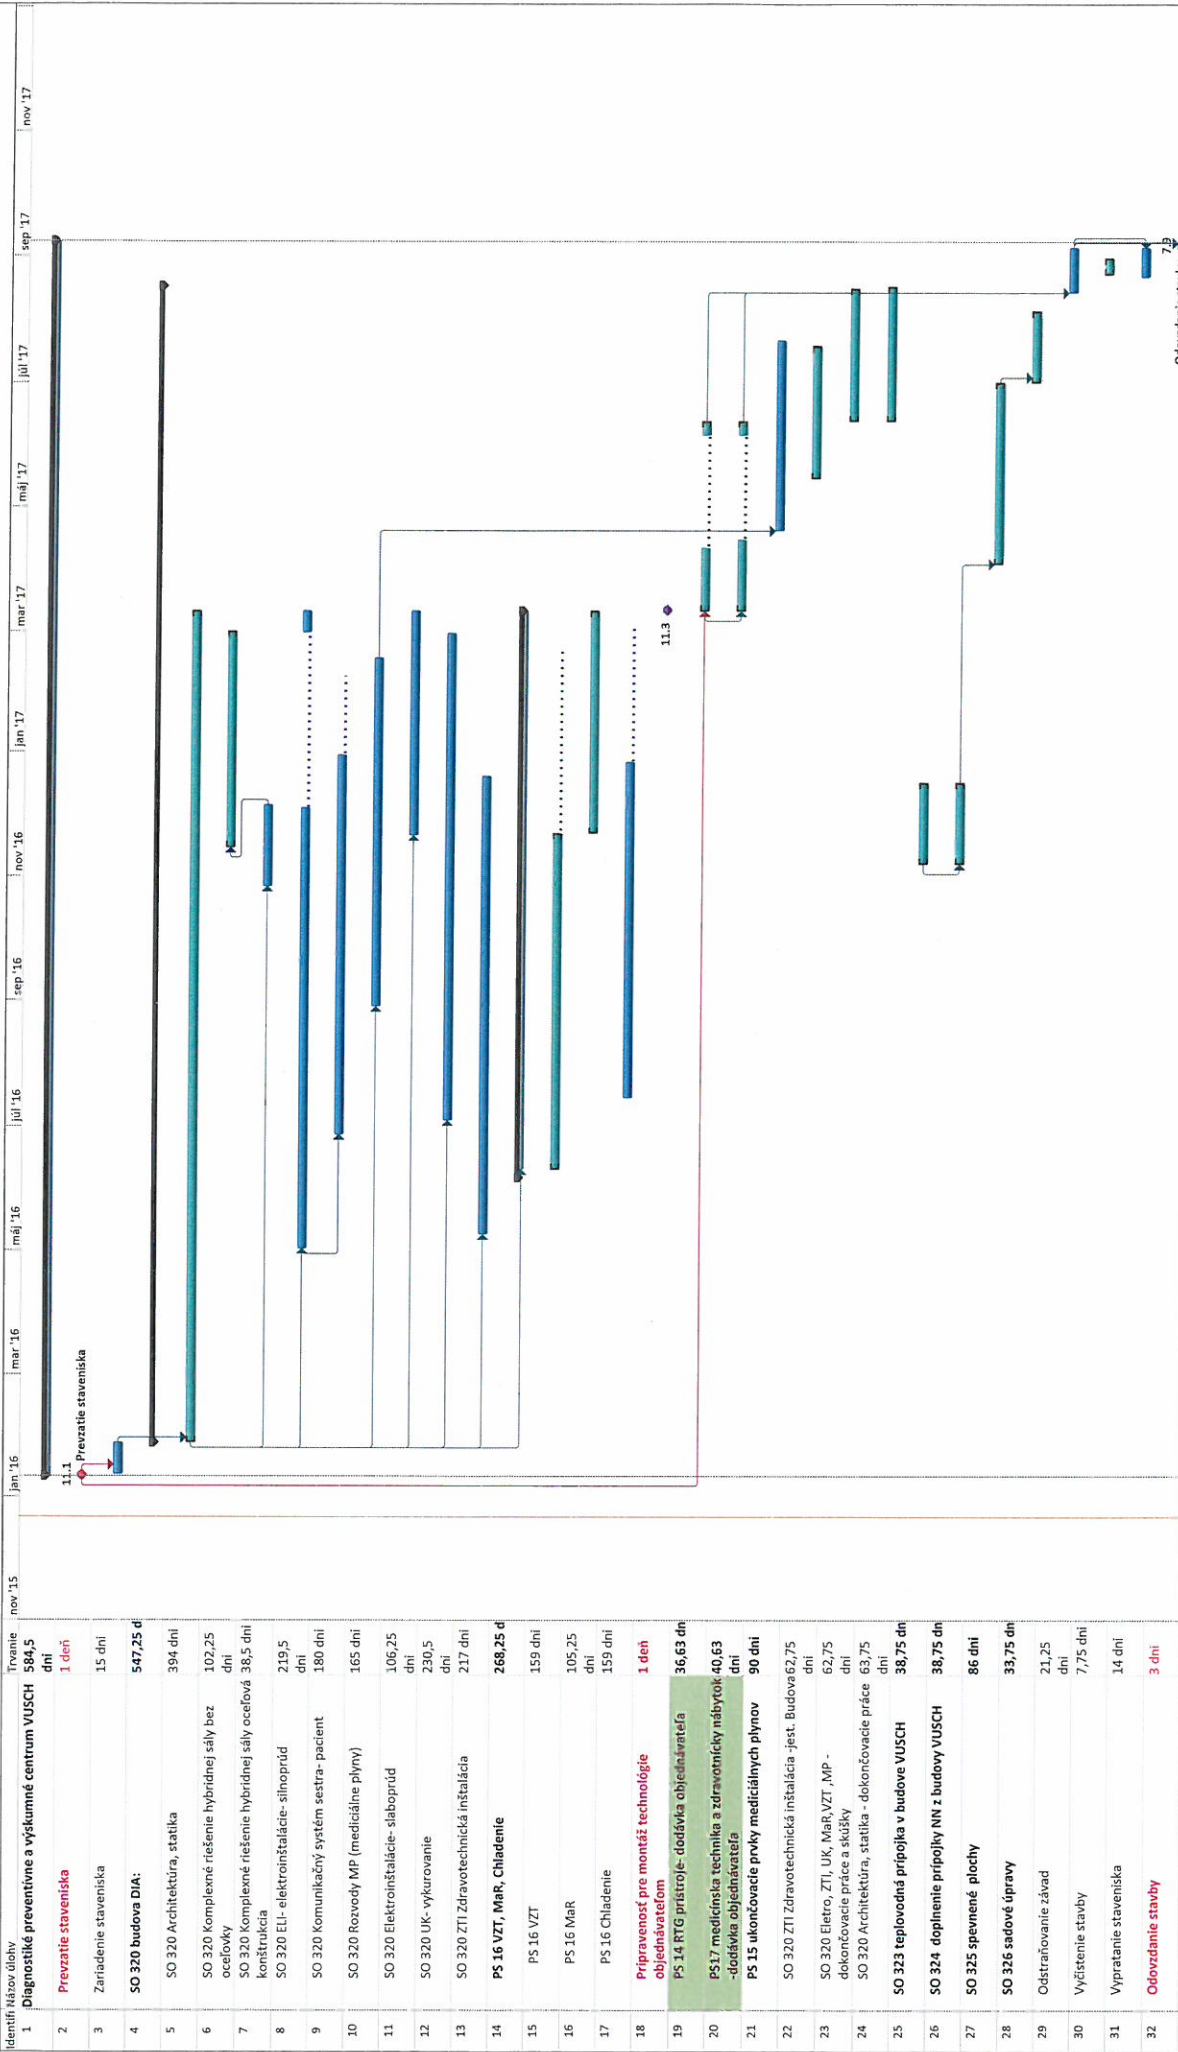

Identif	Názov úlohy	Trvanie dni	nov '15	jan '16	mar '16	máj '16	júl '16	sep '16	nov '16	jan '17	mar '17	máj '17	júl '17	sep '17	nov '17
1	Diagnostické preventívne a výskumné centrum VUSCH	584,5 dni													
2	Prevratie staveniska	1 deň													
3	Zariadenie staveniska	15 dni													
4	SO 320 budova DIA:	547,25 d													
5	SO 320 Architektúra, statika	394 dni													
6	SO 320 Komplexné riešenie hybridnej sály bez ocelovky	102,25 dni													
7	SO 320 Komplexné riešenie hybridnej sály oceľová konštrukcia	38,5 dni													
8	SO 320 Eli. elektroinštalácie- silnoprád	219,5 dni													
9	SO 320 Komunikačný systém sestra- pacient	180 dni													
10	SO 320 Rozvody MP (medicálne plyn)	165 dni													
11	SO 320 Elektroinštalácie- slaboprád	106,25 dni													
12	SO 320 UK- vykurovanie	230,5 dni													
13	SO 320 ZTI Zdravotechnická inštalácia	217 dni													
14	PS 16 VZT, MaR, Chladenie	268,25 d													
15	PS 16 VZT	159 dni													
16	PS 16 MaR	105,25 dni													
17	PS 16 Chladenie	159 dni													
18	Prípravnosť pre montáž technológie objednávateľom	1 deň													
19	PS 14 RTG prístroje- dodávka objednávateľá	36,63 dni													
20	PS 17 medicínska technika a zdravotnícky nábytok -dodávka objednávateľá	40,63 dni													
21	PS 15 ukončovanie prvky medicínskych plynov	90 dni													
22	SO 320 ZTI Zdravotechnická inštalácia- jest. Budova	62,75 dni													
23	SO 320 Eletro, ZTI, UK, MaR, VZT, MP - dokončovanie práce a skúšky	62,75 dni													
24	SO 320 Architektúra, statika - dokončovanie práce	63,75 dni													
25	SO 323 teplotná prípojka v budove VUSCH	38,75 dni													
26	SO 324 doplnenie prípojky NN z budovy VUSCH	38,75 dn													
27	SO 325 spevnené plochy	86 dni													
28	SO 326 sadové úpravy	33,75 dni													
29	Odstraňovanie závad	21,25 dni													
30	Vyčistenie stavby	7,75 dni													
31	Vypratávanie staveniska	14 dni													
32	Odozdvádanie stavby	3 dni													

Úloha Súhrn Externý medzník Neaktívny súhrn Iba dokončiť Iba trvanie Iba začiatok Príbeh
 Rozdeľ Súhrn projektu Neaktívna úloha Manuálny súhrn Termin Termin Termin
 Medzník Externé úlohy Neaktívny medzník Neaktívna úloha Manuálna úloha Iba trvanie Iba začiatok Príbeh

OBDIENÁVATEĽ VYHLASUJE, ŽE SA S HARMONOGRAMOM V CELOM ROZSAHU PODROBNE OBOZNÁMIL, JEHO OBSAHU POROZUMEL, SÚHLASÍ S NÍM, PRIČOM BERIE NA VEDOMIE, ŽE MÔŽE BYŤ ZMENENÝ AJ V ZÁVISLOSTI OD PRÍL.Č.4 K ZŔD, PRIČOM UVEDENÉ POTVRDŽUJE PODPISOM
