


Identifik	Režir	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	aug	sep	Štvrť. 4, 2022	Štvrť. 1, 2023	Štvrť. 2, 2023	Štvrť. 3, 2023	Štvrť. 4, 2023
	úlohy						okt	jan	apr	júl	okt
0	→	<b>HMG Bardejov - K4</b>	<b>262 dni?</b>	<b>Ut 20.9.22</b>							
1	→	<b>K4</b>	<b>262 dni?</b>	<b>Ut 20.9.22</b>							
2	→	Prevzatie staveniska	0 dni	Ut 20.9.22							
3	→	Príprava, dodávka a montáž OST vrátane MaR, ELI, OPTI, vnútorných rozvodov TUV + UK + voda	141 dni	Ut 20.9.22							
4	→	Vytýčenie inžinierskych sietí a trasy potrubia	5 dni	Str 1.3.23							
5	→	Výkopové práce a príprava lôžka	60 dni	Str 8.3.23							
6	→	Potrubné predizolované rozvody - dodávka + montáž	65 dni	Str 3.5.23							
7	→	Tlakové skúšky a dokončovacie práce predizolovaného potrubia	15 dni	Str 26.7.23							
8	→	Skúšky, revízie, uvádzanie do prevádzk	33 dni	Str 2.8.23							
9	→	Montáž prepojov ELI a MaR	22 dni	Str 2.8.23							
10	→	Zásyp potrubia a zhotovenie lôžka pre ELI a MaR	22 dni	Str 2.8.23							
11	→	Úprava komunikácií a spevnených plôc	31 dni	Str 9.8.23							
12	→	Odobzanie stavby	0 dni	Str 20.9.23							
13	→?	Pracovná doba v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna bude prebiehať od 7:00 do 18:00 hod. Počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja sú práce na stavenisku									

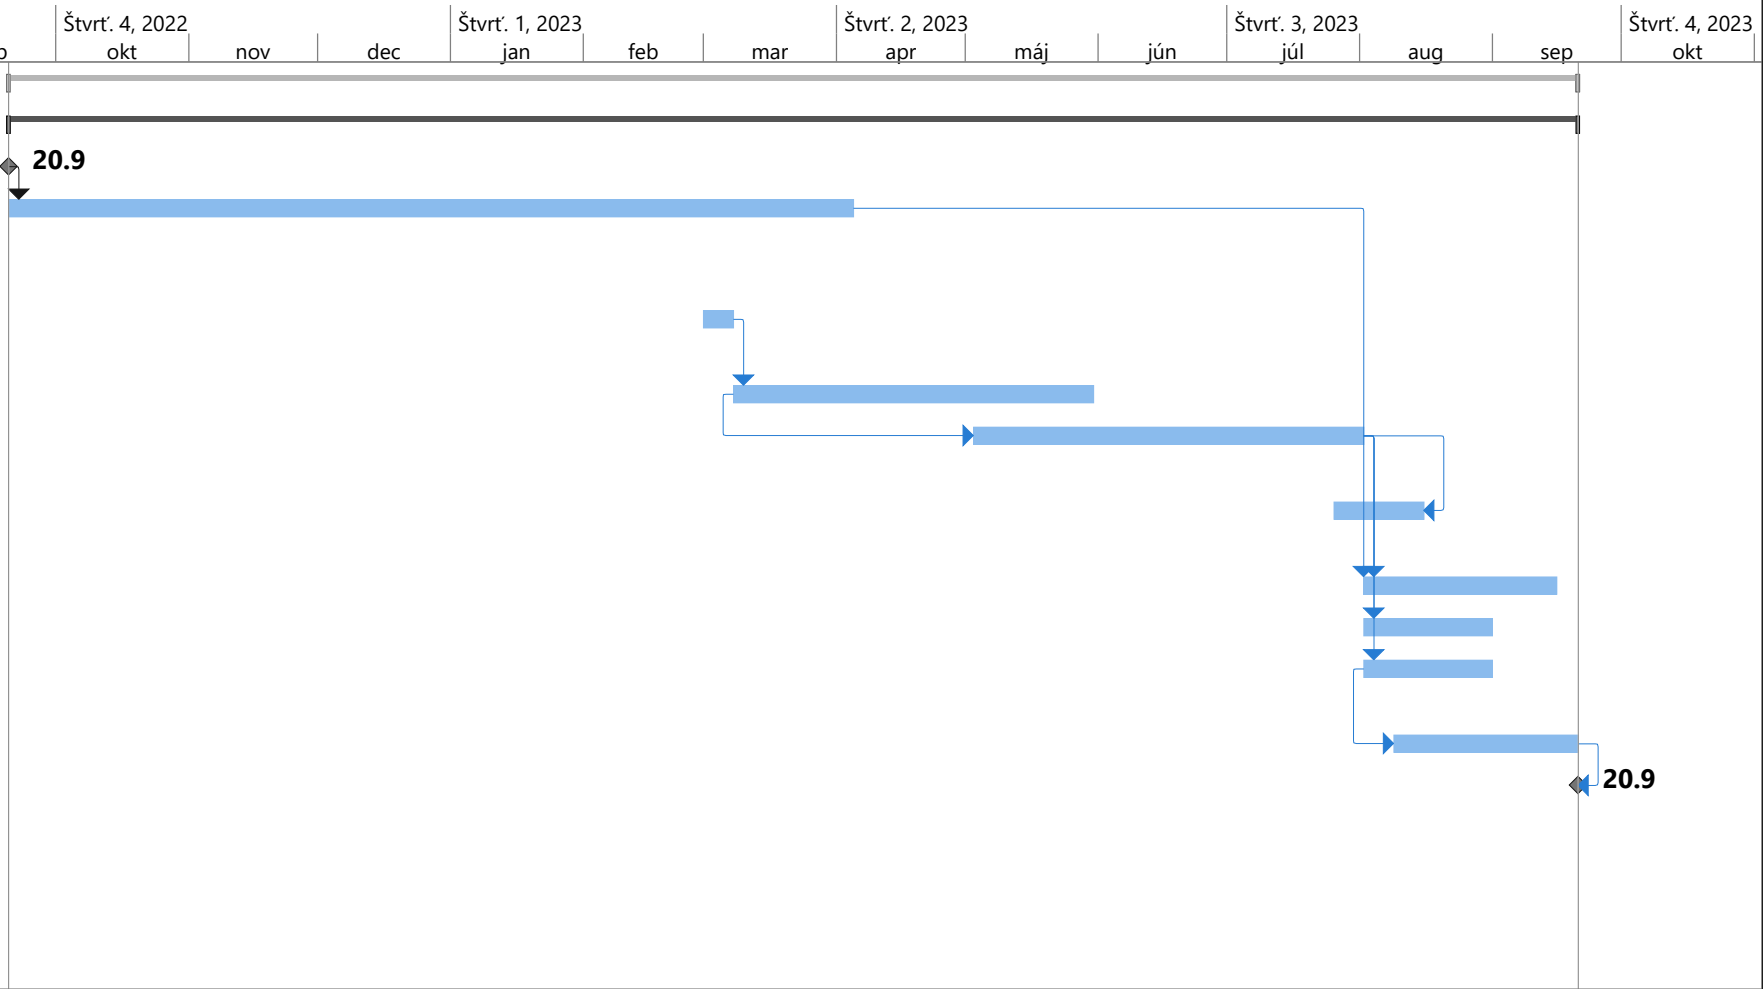

Projekt: HMG Bardejov - K4 Dátum: Ut 26.7.22	Úloha		Súhrn projektu		Manuálna úloha		Iba začiatok		Termín	
	Rozdeliť		Neaktívna úloha		Iba trvanie		Iba dokončiť		Priebeh	
	Medzník		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		Manuálny priebeh	
	Súhrn		Neaktívny súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník			
