

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. září		1. leden		11.
						1.10.	19.11.	7.1.	25.2.	
1		DFN BB HMG ETAP VÝSTAVBY	819 dny	1.7. 19	31.10. 21					
2		1. etapa -VZT kanál, práčovňa, výťah priebežne	106 dny	1.7. 19	14.10. 19					
3		DNF príprava	7 dny	1.7. 19	7.7. 19					
4		Špecifikácie dodávok s dlhou dodacou lehotou pre 1.et.	7 dny	1.7. 19	7.7. 19					
5		Objednávky I.etapy : VZT „Salda,, riadenie MaR - DR3, Limity dodávok. MaR.Rozvádzače, výplne. PO.	60 dny	1.7. 19	29.8. 19					
6		Objednávky TG potrubnej pošty, špec. Požiadaviek na stav.úpravy, trasy	10 dny	1.7. 19	10.7. 19					
7		Vyznačiť TZB a ELI, ktorá musí zostať funkčná	2 dny	6.7. 19	8.7. 19					
8		Nástupná plocha pre hasičskú techniku zrealizovaná	14 dny	1.7. 19	14.7. 19					
9		Búracie práce -2PP, ZS del. Steny, demont TZB, sondáž	30 dny	7.7. 19	6.8. 19					
10		Odkopávky + búr.práce západ, preložka DK z výť. Šachty východ	30 dny	7.7. 19	6.8. 19					
11		ZS opatrenia - uzávery -2PP, -1PP - príprava stavby	8 dny	7.7. 19	15.7. 19					
12		Búracie práce: -1PP, M -1-30, M-1-32, M-1-45	14 dny	14.7. 19	28.7. 19					
13		Demontáže VZT TG a potrubí na -2PP, DD príprava na nový stav. Demont. ÚK, ELI	14 dny	14.7. 19	28.7. 19					
14		Výroba : VZT potr. Okná, OKD, stav. Úpravy, preložky	40 dny	9.8. 19	18.9. 19					
15		Hydroizolácie, opravy - 2PP, základy VZT kanála	12 dny	3.8. 19	15.8. 19					
16		Limita pre funkčnosť vežového žerivu	1 den	11.8. 19	12.8. 19					

Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. září		1. leden		11.
						1.10.	19.11.	7.1.	25.2.	
17		ŽB kanál západ - VZT, ZD VŠ1-východ, příprava svetlíky -1PP	31 dny	14.8. 19	14.9. 19					
18		ŽB konštrukcie výtahovej šachty -2PP - 1PP	40 dny	8.9. 19	18.10. 19					
19		Nová dispozícia, hr.podlahy, vonkajšie výplne -2PP,-1PP	17 dny	5.8. 19	22.8. 19					
20		HM PSV - rozvody VZT, ZTI, ELI /SLP/, ÚK - nové rozvody TÚV -2PP. Trasy potr.pošty, SP staníc	25 dny	17.9. 19	12.10. 19					
21		Úpravy povrchov, podlahy, pohľady - /rastre, úpravy v stropoch/ -2PP-1PP / doteplenie /	30 dny	26.9. 19	26.10. 19					
22		SP TG VZT, pracovní, stavebne dokončený priestor	1 den	29.8. 19	29.8. 19					
23		Montáž VŽ, príprava NOV	7 dny	17.9. 19	24.9. 19					
24		Nový stav, kompletáž VZT, rozvádzače, maľby, nátery, ELI, MaR, EPS, M -2.58 v predstihu SP pre TG VZT, Eli	27 dny	27.8. 19	22.9. 19					
25		TG potrubnej pošty, stanice, signalizácia	12 dny	17.9. 19	28.9. 19					
26		Dokončovacie práce - prevádzkové a funkčné skúšky, epox. Nátery, kompletáže svetlo, EPS, EZS,PER dokladová časť ku spusteniu prevádzky	13 dny	17.9. 19	29.9. 19					
27		uvadenie do prevádzky	18 dny	27.9. 19	14.10. 19					
28		2. etapa – kostná sála 4.NP, prepojovacia chodba	153 dny	5.8. 19	4.1. 20					
29		DFN príprava	14 dny	5.8. 19	18.8. 19					
30		Špecifikácie dodávok s dlhou dodacou lehotou pre 2.et.	4 dny	12.8. 19	15.8. 19					

Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. září		1. leden		11.
						1.10.	19.11.	7.1.	25.2.	
31		Objednat VZT - zar.10 „Salda,, riadenie MaR - DR4 + úpravy DT1, + Limity dodávok. MaR. Rozvádzače, Príprava pre zameranie a DD OKD	56 dny	5.8. 19	29.9. 19					
32		Str. VZT 5.NP - zar.12.101, K CHÚC -1PP	56 dny	5.8. 19	29.9. 19					
33		Dočasné ZS opatrenia, prístupy, logistika	3 dny	19.8. 19	21.8. 19					
34		Zdemontovať podhľady, vykonať audit PD a rozv. V podhľadoch. Určiť poradie a pozíciu VZT. Doplňiť PD rozvodu med.plynov	9 dny	22.8. 19	30.8. 19					
35		Búracie práce 4.NP, príprava strojovne VZT 5.NP - ÚK rozvody, ZTI rozvody,prekládky	19 dny	19.8. 19	6.9. 19					
36		Demontáže VZT 4.NP, posúdenie úprav na jestvujúcej VZT, DD príprava	4 dny	27.8. 19	30.8. 19					
37		Dielenská príprava OK, objednávky výplní, výroba OK, výroba VZT, objednávky MaR, Eli	27 dny	7.9. 19	3.10. 19					
38		Príprava OK prep. Lávk, priečky, hr. Podlahy - nové	20 dny	4.10. 19	23.10. 19					
39		Osadenie OK plošín rozš. Chodieb + OK1 podl. 4.NP	4 dny	20.10. 19	23.10. 19					
40		HSV a PSV HM, rozvody TZB, ZTI,ÚK, OK chodba, plošina OS, SLP, EPS,...potrubná pošta 4.NP	27 dny	17.9. 19	13.10. 19					
41		Kompletáže, HSV, PSV, výplne, maľby, nátery, podlahy	31 dny	13.10. 19	12.11. 19					
42		Montáž VZT - zar.10, DR4, TZB a Eli pripojenie	13 dny	4.10. 19	16.10. 19					
43		Postupná realizácia SP pre vstavok operačnej sály	36 dny	4.10. 19	8.11. 19					

Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. září		1. leden		11.
						1.10.	19.11.	7.1.	25.2.	
44		Kompletáže ELI, MaR, EPS, PER...ZP ZTI, PO	11 dny	12.11. 19	22.11. 19					
45		Pripojenie OS na média, čisté práce, kompletáž OS	21 dny	8.11. 19	28.11. 19					
46		Zhotoviteľ - Skúšky, oživenie, filtrácia, dezinfekcia, finalizácia interiérov	14 dny	24.11. 19	7.12. 19					
47		uvadenie do prevádzky / postupne, dokladová časť odovzdaná k 30.5.19 /	28 dny	8.12. 19	4.1. 20					
48		3. etapa – zateplenie fasády átria	72 dny	30.9. 19	10.12. 19					
49		Realizácia ZS vstupu do átria	4 dny	30.9. 19	3.10. 19					
50		Lešenia átria z úrovne pôv. Srechy nad -1PP / KT -0,47 /	6 dny	3.10. 19	8.10. 19					
51		Dokončenie lešení v mieste OK prepojujúcich lávok	3 dny	24.10. 19	26.10. 19					
52		Súbeh prác 2. etapy a 3.etapy na fasádach prepojujúcich lávok	48 dny	24.10. 19	10.12. 19					
53		Zameranie a výroba výplní, DD, zabezpečenie dod. KZS	30 dny	30.9. 19	29.10. 19					
54		Montáž KZS, výmena okien / zhora-dolu po 1.NP /KT ca+6,0 m/, parapety, vzt fasádna / aj pre 6.etapu /	55 dny	8.10. 19	1.12. 19					
55		Fasády a výplne „OK,, lávok 3+4.NP - detaily pre ich osadenie / súbeh s etapou II limita /	31 dny	13.10. 19	12.11. 19					
56		Zameranie OK pre výrobnú dok. 4.etapy /DD 4.etapy/	5 dny	30.10. 19	3.11. 19					
57		Demontáž lešenia átria, ZS opatrenia - zatekanie do -1PP	7 dny	2.12. 19	8.12. 19					
58		4. etapa – nosná konštrukcia vstavku s prestrešením	105 dny	9.12. 19	22.3. 20					

Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. září		1. leden		11.
						1.10.	19.11.	7.1.	25.2.	
59		DFN příprava - objednávky VZT / MaR .../ pre etapu 5	14 dny	9.12. 19	22.12. 19					
60		Kostná sála 4.NP uvedená do prevádzky	1 den	5.1. 20	5.1. 20					
61		ZS opatrenia - uzávery 0.NP	7 dny	9.12. 19	15.12. 19					
62		Výtahová šachta realizovaná po úroveň 1.NP	10 dny	6.1. 20	15.1. 20					
63		Výroba „OK„PLO1 / 0.NP / dokončená	1 den	9.12. 19	9.12. 19					
64		Stavebné úpravy před osadením PLO1 + OK OS1	15 dny	9.12. 19	23.12. 19					
65		Montáž PLO1 + OS1 /OK, bez Trapéz. Prekrytia /	15 dny	24.12. 19	7.1. 20					
66		Stavebné úpravy před osadením kotev. OK a zvislá OK PLO + 3,4m - 1.NP	6 dny	8.1. 20	13.1. 20					
67		Stavebné úpravy pre „OK,, a strechu v úr. 2.NP /+6,65m/	5 dny	14.1. 20	18.1. 20					
68		OK na KT +6,65m, úpravy svetlíkov v plášti str. S31, detaily	10 dny	19.1. 20	28.1. 20					
69		Dokončené zvyšné zateplenie od strechy vstavku po okná 1.NP / väzba na et.3 /	1 den	26.1. 20	26.1. 20					
70		Strešné súvrsvia vstavku OK: S31, S32, det. So zateplením stien, klampiarske detaily, odvodnenie striech	25 dny	29.1. 20	22.2. 20					
71		Postupné búranie pôvod. Str. plášťa átria, presuny hmôt, postupné doplnenie trapézových plechov na PLO1	29 dny	23.2. 20	22.3. 20					
72		Doriešené väzby na SP a osadenie VZT19 / mont. Otvor / zo striech nad vstavkom.	1 den	28.1. 20	28.1. 20					
73		5. etapa – práce v 0.NP, okno, realizácia urgent	133 dny	2.3. 20	12.7. 20					

Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. září		1. leden		11.
						1.10.	19.11.	7.1.	25.2.	
74		DFN příprava	28 dny	2.3. 20	29.3. 20					
75		Strešné vrstvy pôvodného átria dobúrané. Je SP pre hr. Podlahy na KT 0,00m + ZS uzávery 5.et.	1 den	29.3. 20	29.3. 20					
76		Špecifikácia a objednávky zar. S dlhou dod. Lehotou VZT 14 a VZT 19	5 dny	2.3. 20	6.3. 20					
77		Demontáže podláh, podhládov, priečok 0.NP, stavebné úpravy	20 dny	29.3. 20	17.4. 20					
78		Demontáže rozvodov VZT, presuny, úpravy na VZT. Súbežne dem. ÚK, ELI, ZTI	26 dny	12.4. 20	7.5. 20					
79		HSV urgent 0.114, nová dispozícia 0 NP realizovaná.	21 dny	27.4. 20	17.5. 20					
80		HM PSV - rozvody VZT, ZTI, ELI /SLP/, ÚK - nové rozvody TÚV . Trasy potr.pošty, SP staníc	26 dny	7.5. 20	1.6. 20					
81		Zariadenia VZT 14 a 19 včít. MaR /DR5/ sú osadené	1 den	30.4. 20	30.4. 20					
82		Pripojenie jed. VZT / Eli, MaR, ZTI, ...ÚK /	10 dny	1.5. 20	10.5. 20					
83		SP urgentu 0.114 + zázemia urg. pre operačné osvetlenie, VZT, TZB,ÚK. Namonované VZT 14 a 19 s MaR DR5	1 den	17.5. 20	17.5. 20					
84		Kompletážne práce + vybavenie urgent 0.114	30 dny	17.5. 20	15.6. 20					
85		Úpravy povrchov, podlahy, pohľady - /rastre, úpravy v stropoch/. Výplne	25 dny	26.5. 20	19.6. 20					
86		Kompletáže ELI, MaR, EPS, PER...ZP ZTI, PO : 0.NP	25 dny	5.6. 20	29.6. 20					
87		Limita pre demontáž vežového žerivu	1 den	2.6. 20	2.6. 20					

Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. září		1. leden		11.
						1.10.	19.11.	7.1.	25.2.	
88		Funkčné skúšky VZT, oživenie EPS, MaR, dokončený nový výťah, dokladová časť k prevádzke	15 dny	5.6. 20	19.6. 20					
89		Realizovať časť prác et.6 na rozhraní strechy átria a steny 1.NP - os „F,, a rozhranie 1.88 str. VZT /dokončenie striech /	15 dny	5.6. 20	19.6. 20					
90		uvadenie do prevádzky - 5. etapa	28 dny	15.6. 20	12.7. 20					
91		6. etapa – nem. lekárň 1.np, zvyšok fasády 2.pn	70 dny	29.6. 20	6.9. 20					
92		DFN príprava	7 dny	13.7. 20	19.7. 20					
93		Okná / steny/ a fasády 1.NP sú dokonč. V et.3 /4/ „átrium,, 100%	1 den	29.6. 20	29.6. 20					
94		VZT 19 strojovňa - vstavok z 1.NP funguje pre 5.etapu a je oddelený ZS pričkou	1 den	5.7. 20	5.7. 20					
95		VZT 6 strojovňa -2PP / bez MaR/ dodaná, namontovaná, spustená vetr. A klim. Lekárne /	11 dny	30.7. 20	9.8. 20					
96		Demontáže a búracie práce 1.NP - , Lekárň + zázemie	10 dny	14.7. 20	23.7. 20					
97		Finálne detaily striech a fasád k úrovni 2.NP - dokončenie prác na strechách átrii 0.121,0.122	15 dny	14.7. 20	28.7. 20					
98		HSV - lekárň, str. VZT - podlahy, steny, stav. Úpravy	15 dny	19.7. 20	2.8. 20					
99		PSV rozvody /VZT, ÚK, ZTI, ELI /	10 dny	29.7. 20	7.8. 20					
100		Dokončovacie práce, podlahy, podhľady, kompl. ZP, ÚK	10 dny	8.8. 20	17.8. 20					
101		Kompletáž, ELI, EPS, MaR, PP, VZT / zar.19 + MaR /. Skúšky a dokladová časť k prevádzke.	30 dny	20.7. 20	18.8. 20					

Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. září		1. leden		11.
						1.10.	19.11.	7.1.	25.2.	
102		uvadenie do prevádzky	28 dny	10.8. 20	6.9. 20					
103		7. etapa – 2.np a 3.np na 3 etapy	371 dny	19.8. 20	15.9. 21					
104		7.1	117 dny	19.8. 20	13.12. 20					
105		DFN príprava	12 dny	19.8. 20	30.8. 20					
106		Príprava - demont. Stroj. VZT -1PP / m - 1.30 /, stav. Úpravy.	10 dny	30.8. 20	8.9. 20					
107		Demontážne práce VZT 2.NP, výr. príprava pre nové rozvody / súběžne demont. ÚK, ZTI, Eli.../	10 dny	6.9. 20	15.9. 20					
108		búracie práce 7.1. začať podhľadmi v trasách VZT	30 dny	1.9. 20	30.9. 20					
109		Dodávky vonkajších výplní pre et.7.1 na stavbe	1 den	17.9. 20	17.9. 20					
110		Nová dispozícia, hr.podlahy, vonkajšie výplne et. 7.1	21 dny	20.9. 20	10.10. 20					
111		HM rozvody PSV / VZT, ELI, ZTI, ÚK, PP/ stav. Úpravy,, vyspravenie. Pripojenie VZT OS 2.90	20 dny	26.9. 20	15.10. 20					
112		HSV - podlahy1, rastre podhľadov, úpravy povrchov stien, SDK rastre	28 dny	22.9. 20	19.10. 20					
113		PSV- podlahy2, podhľady, parapety, zárubne, dvere , SDK	20 dny	13.10. 20	1.11. 20					
114		Kompletáže PSV, Eli, EPS, maľby, FS VZT a MaR k operačke 2.90	15 dny	2.11. 20	16.11. 20					
115		uvadenie do prevádzky et. 7.1. hotový HMG	28 dny	16.11. 20	13.12. 20					
116		7.2	120 dny	14.12. 20	12.4. 21					


Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. září		1. leden		11.
						1.10.	19.11.	7.1.	25.2.	
117		DFN příprava	14 dny	14.12. 20	27.12. 20					
118		búracie práce v dohodnutých priestoroch, detto 7.1	21 dny	29.12. 20	18.1. 21					
119		HSV v dohodnutých priestoroch, detto 7.1	28 dny	19.1. 21	15.2. 21					
120		PSV v dohodnutých priestoroch, detto 7.1	42 dny	9.2. 21	22.3. 21					
121		uvadenie do prevádzky	28 dny	16.3. 21	12.4. 21					
122		7.3	134 dny	13.4. 21	15.9. 21					
123		DFN príprava	14 dny	13.4. 21	26.4. 21					
124		búracie práce v dohodnutých priestoroch, detto 7.1	20 dny	29.4. 21	18.5. 21					
125		HSV v dohodnutých priestoroch, detto 7.1	28 dny	19.5. 21	15.6. 21					
126		PSV v dohodnutých priestoroch, detto 7.1	35 dny	16.6. 21	28.7. 21					
127		uvadenie do prevádzky	28 dny	9.8. 21	15.9. 21					
128		8. etapa	142 dny	13.4. 21	27.9. 21					
129		Montáž fasádneho lešenia Z1	21 dny	13.4. 21	3.5. 21					
130		Konštrukčné skladby podláh balkónov, klamp. Konštrukcie	130 dny	13.4. 21	9.9. 21					
131		zateplenie fasády postupné	130 dny	20.4. 21	20.9. 21					
132		Demontáž fasádneho lešenia, presun do Z2...Z3...Z4	100 dny	25.5. 21	27.9. 21					
133		9. etapa	54 dny	17.8. 21	29.10. 21					
134		vonkajšie terénne úprava, nástupná plocha pre HaZZ	54 dny	17.8. 21	29.10. 21					


Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

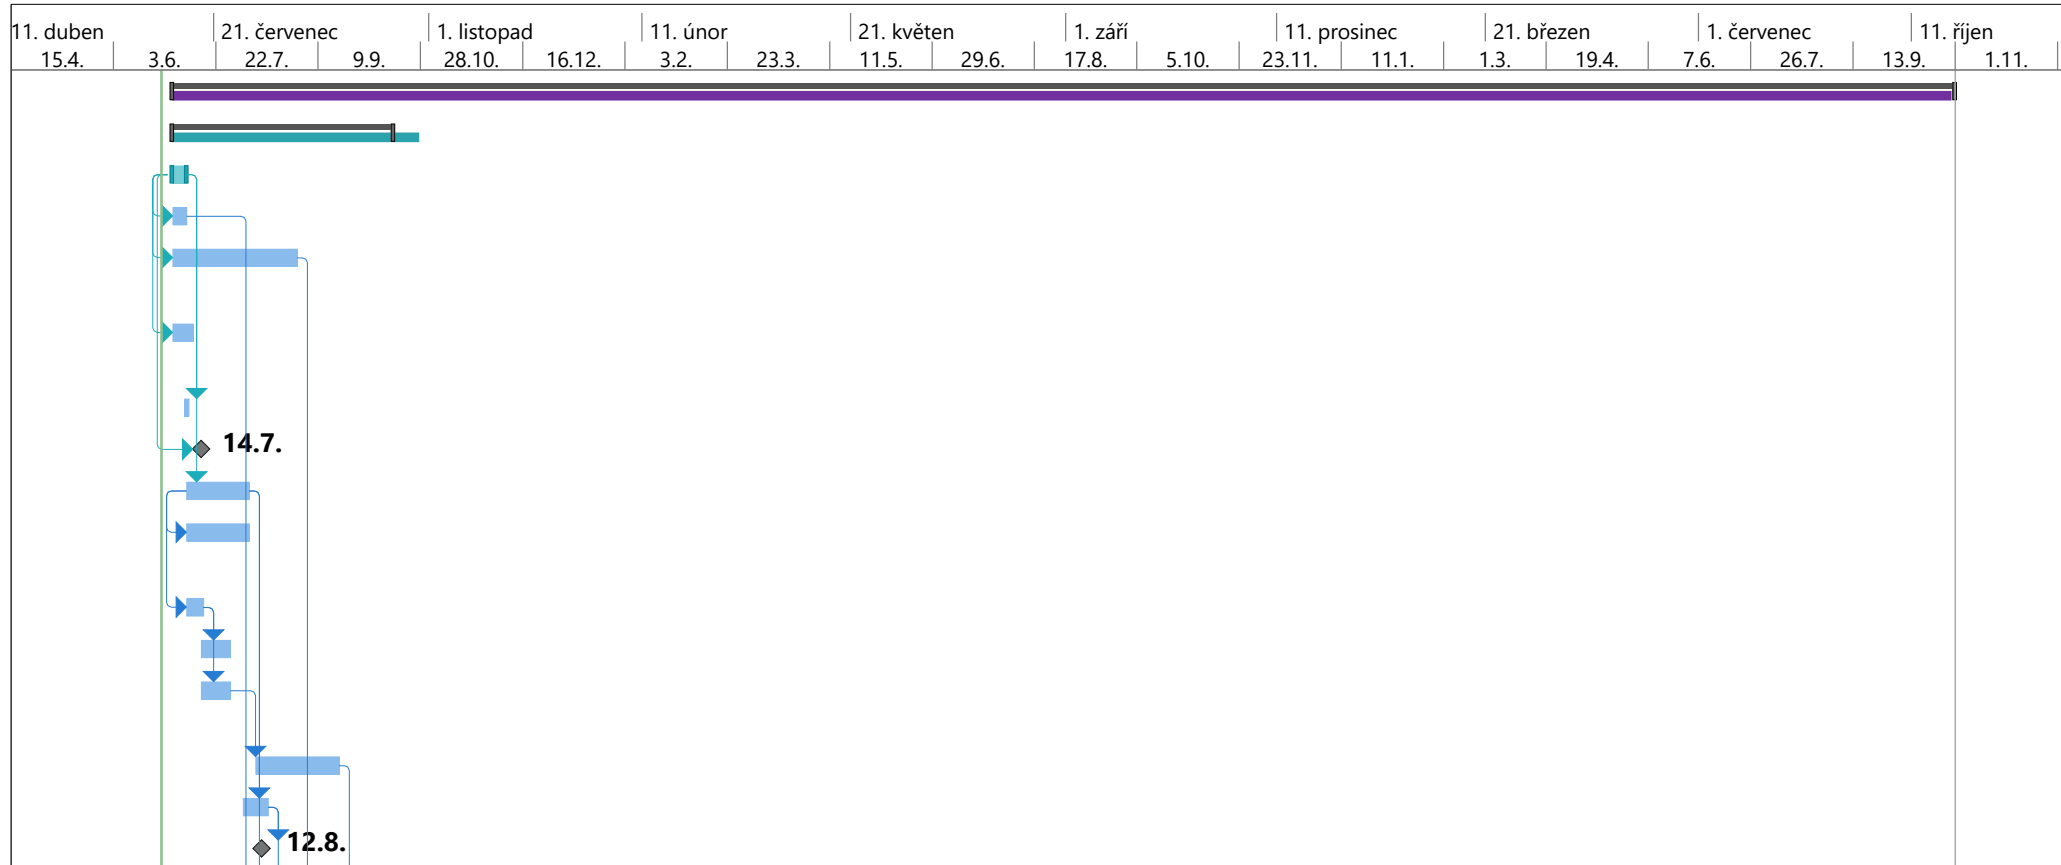


Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

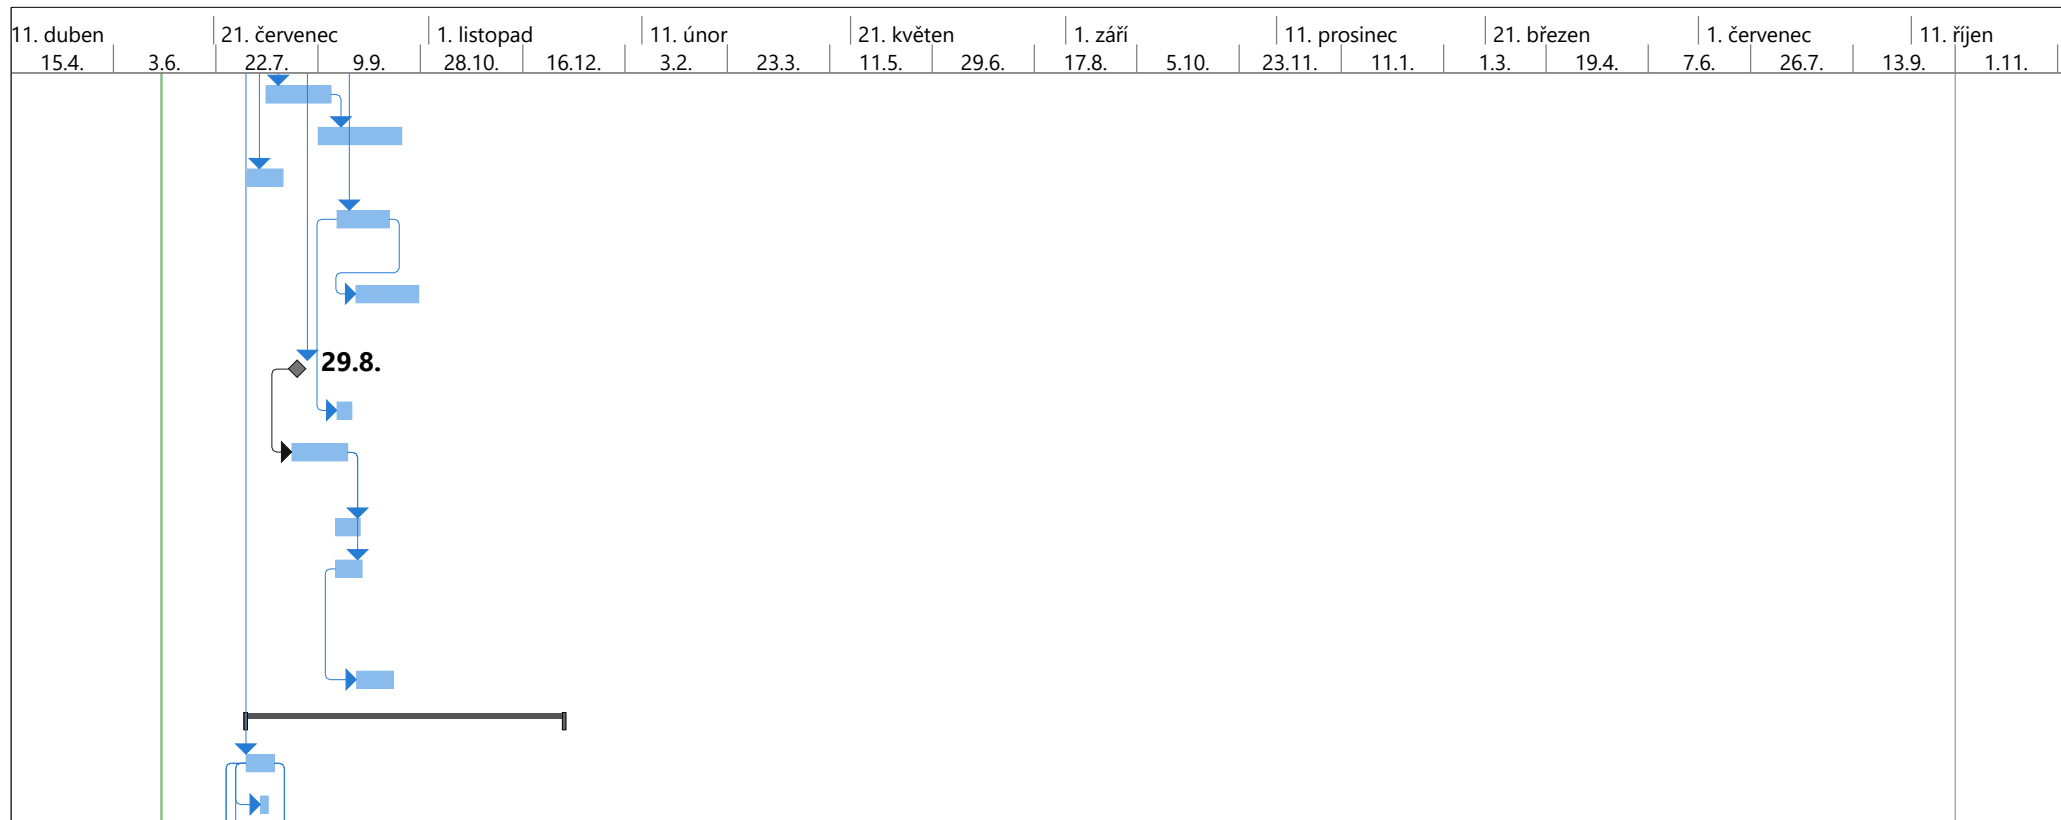


Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

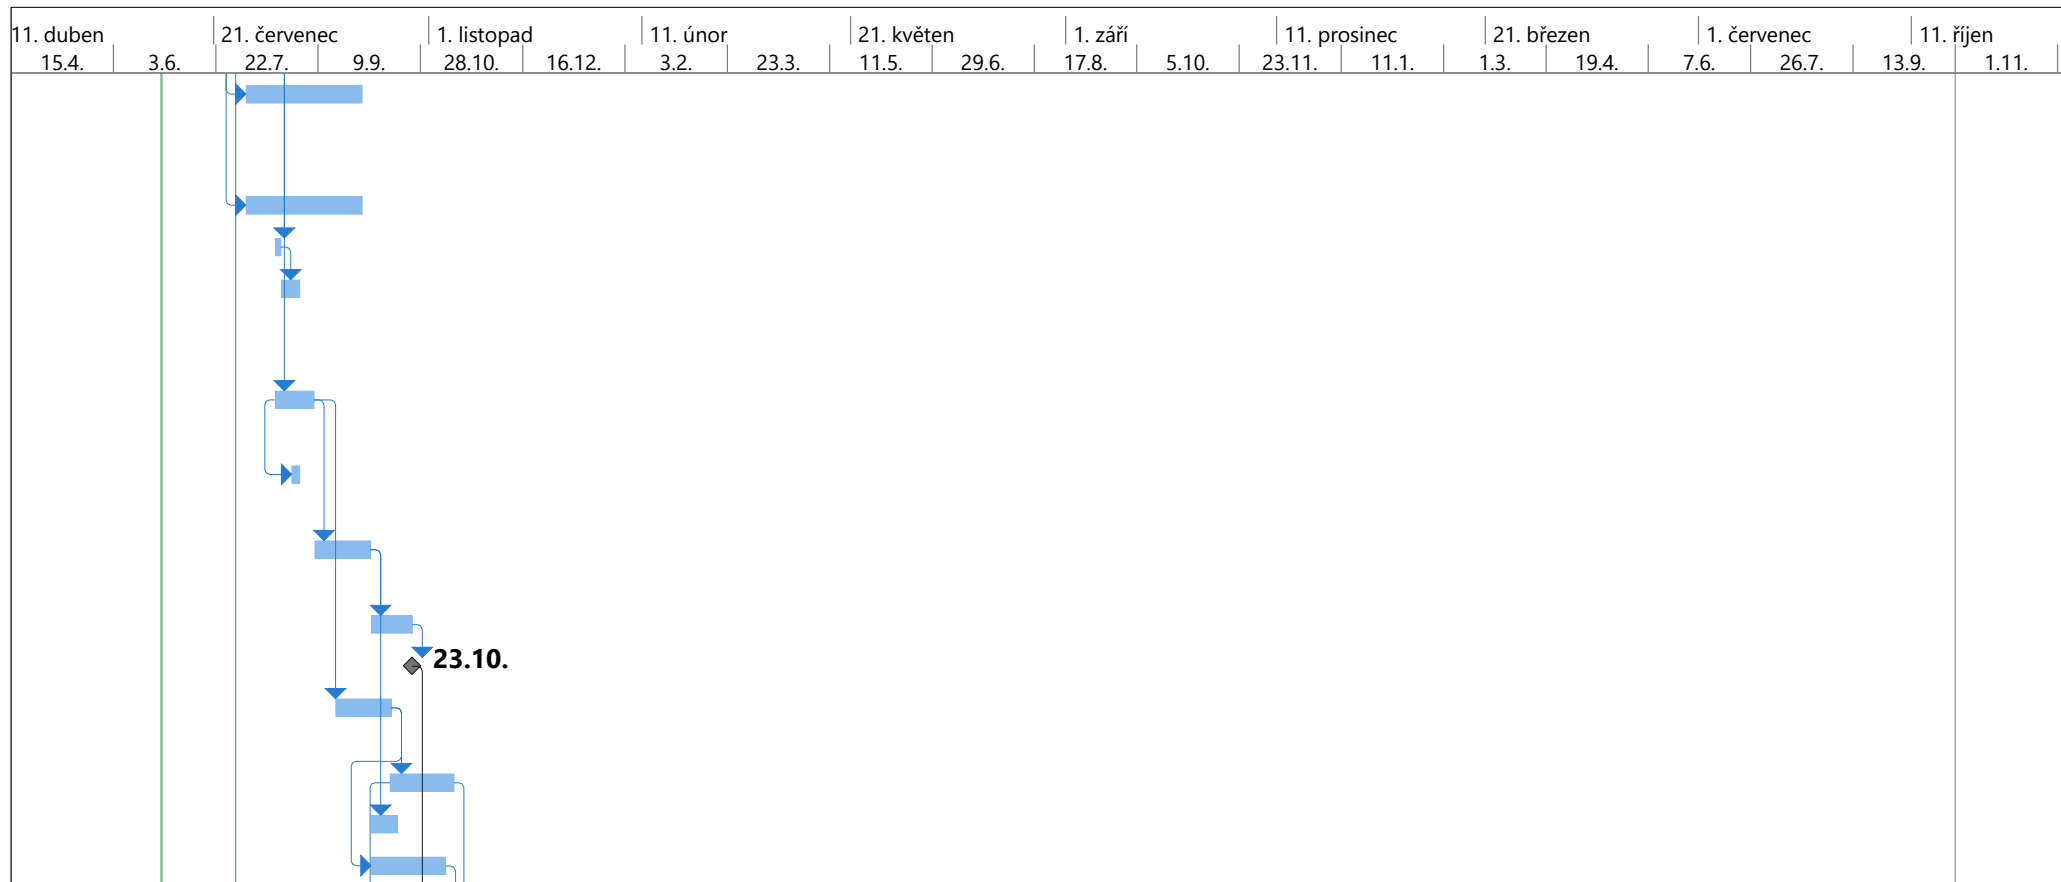


Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

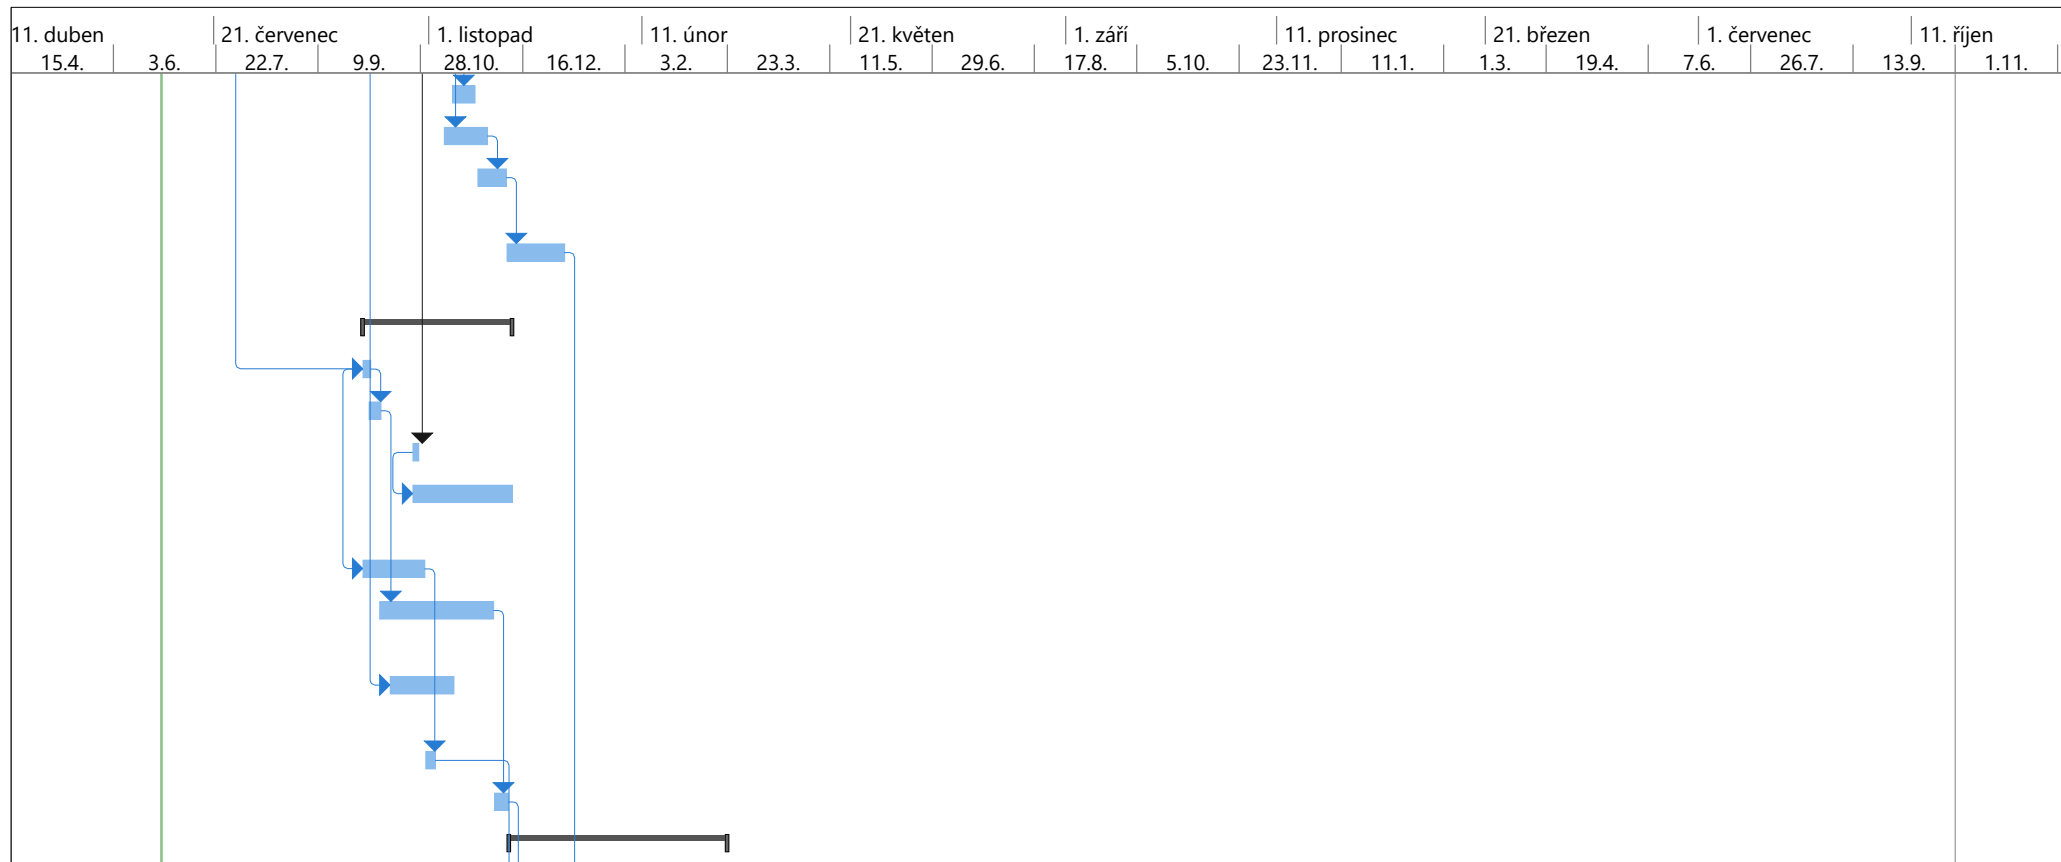


Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19


Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

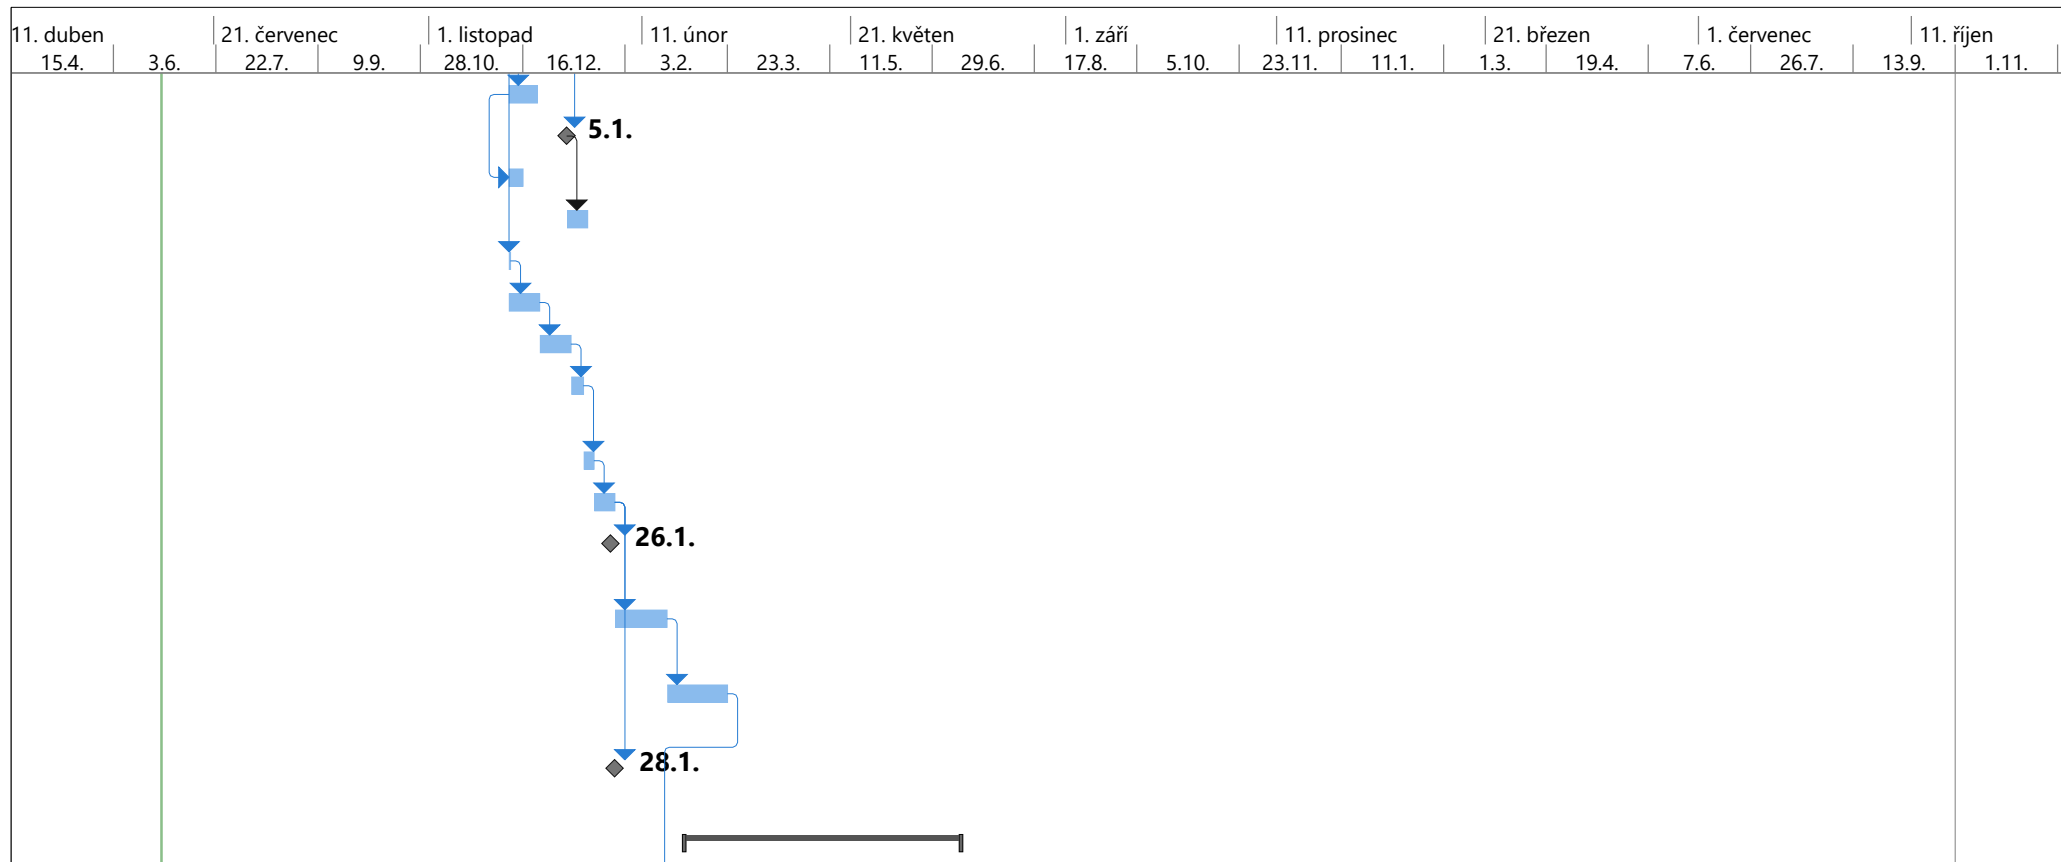


Projekt: DFN BB HMG final 14.1
Datum: 26.6. 19

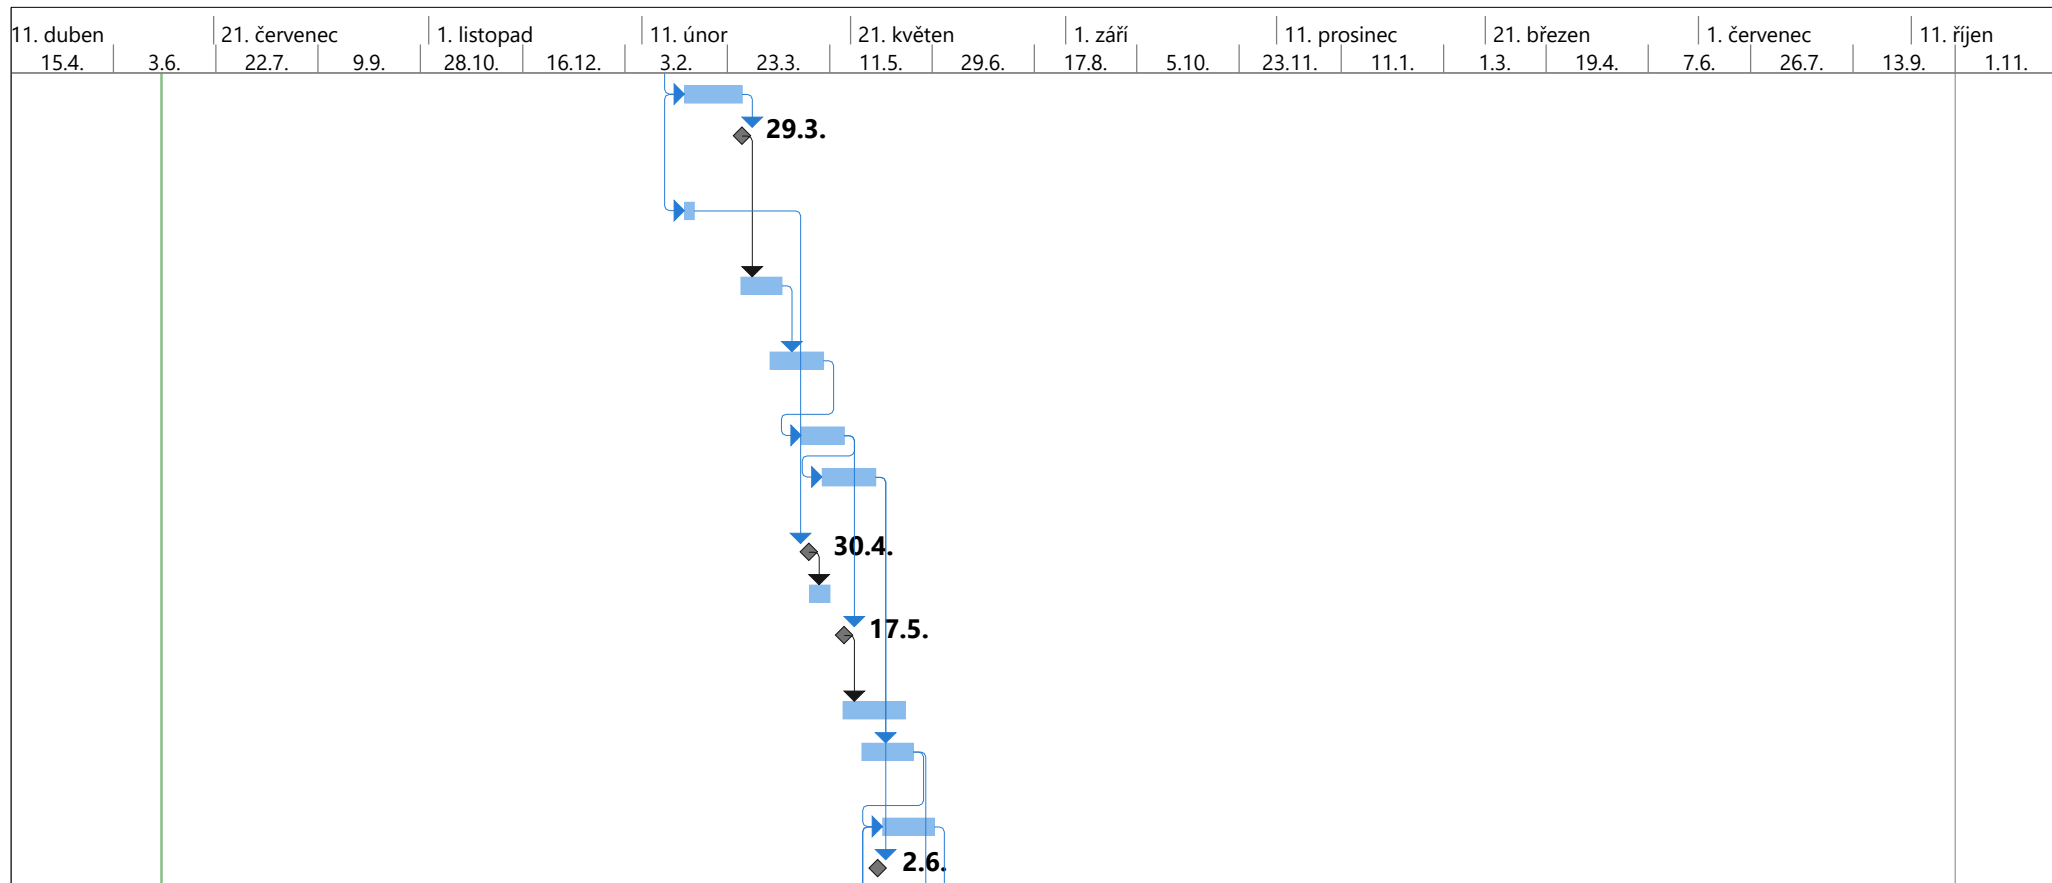

Projekt: DFN BB HMG final 14.1 Datum: 26.6. 19	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

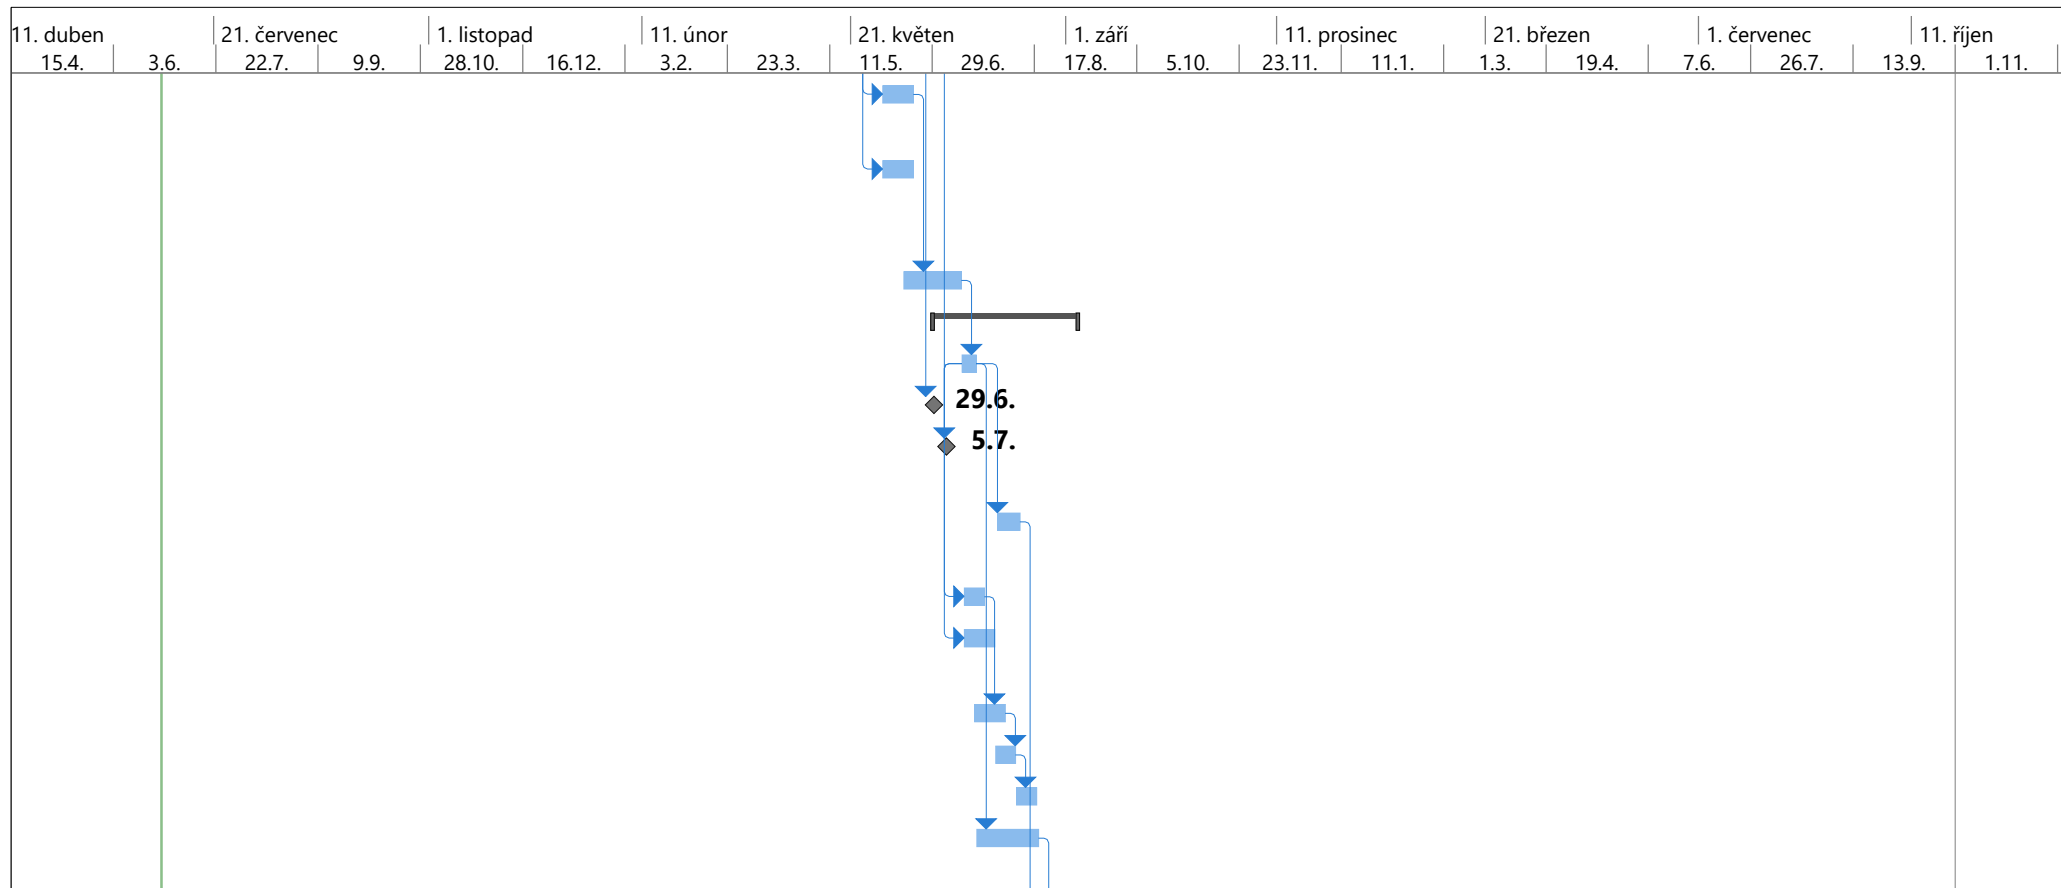


Projekt: DFN BB HMG final 14.1 Datum: 26.6. 19	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

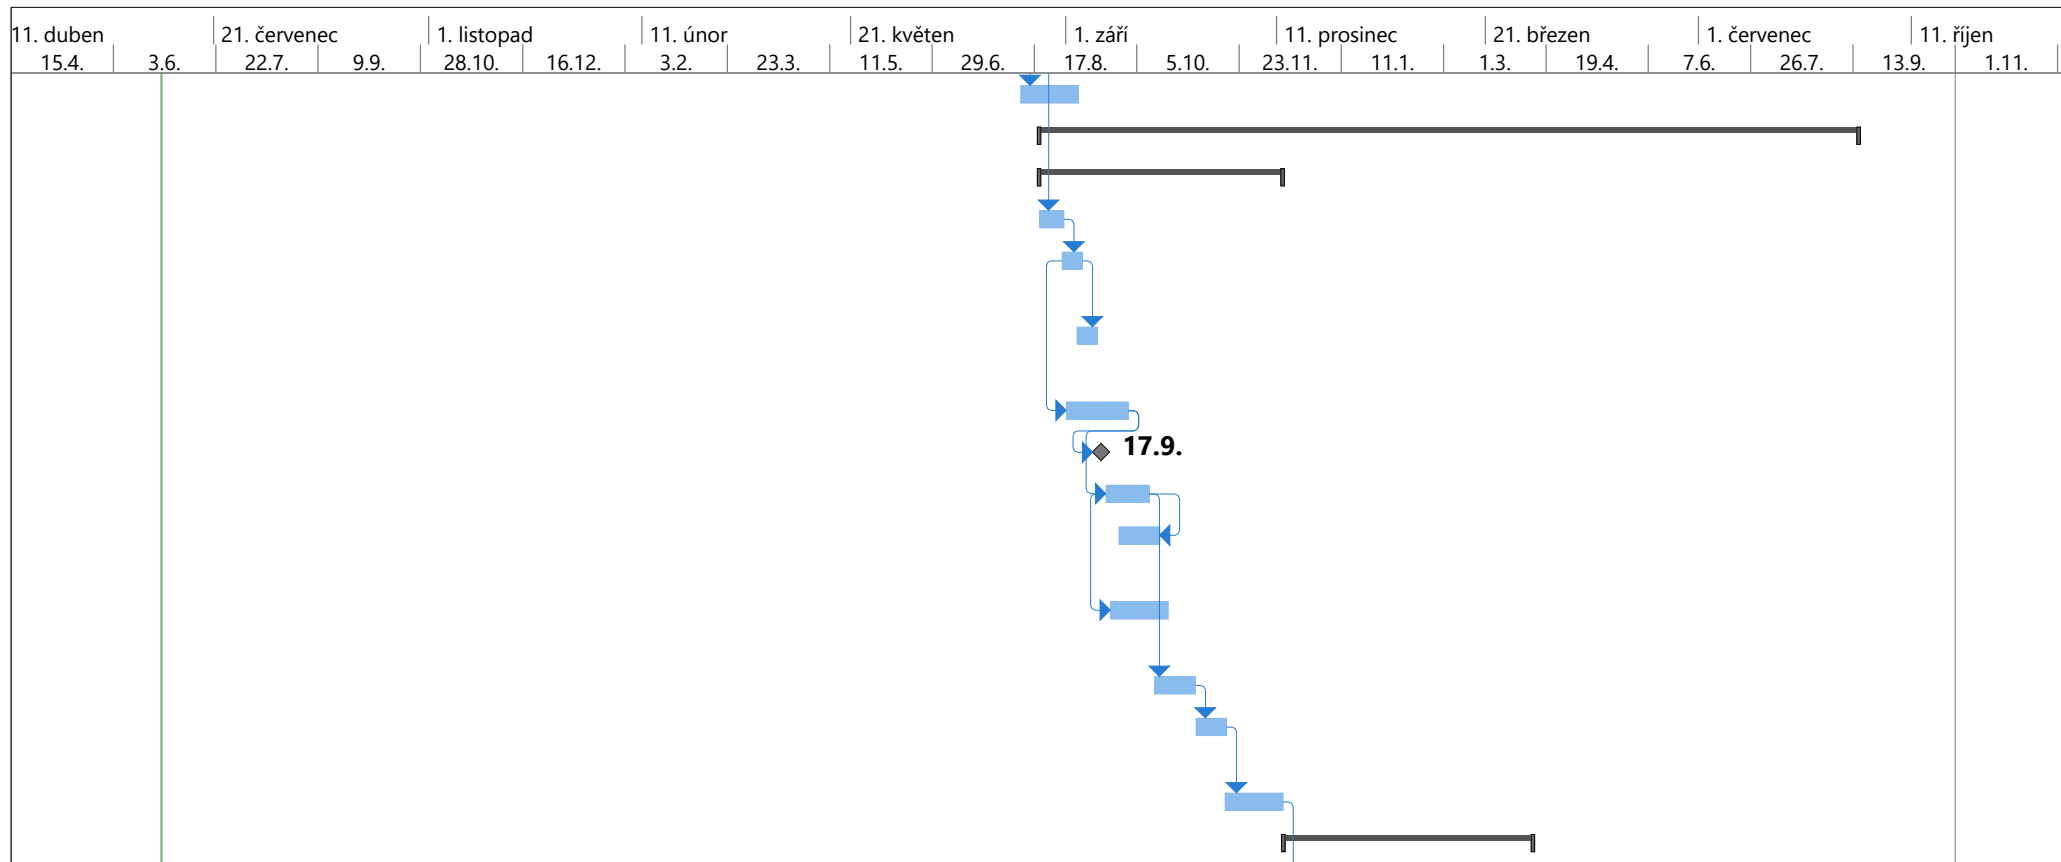

Projekt: DFN BB HMG final 14.1
 Datum: 26.6. 19

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

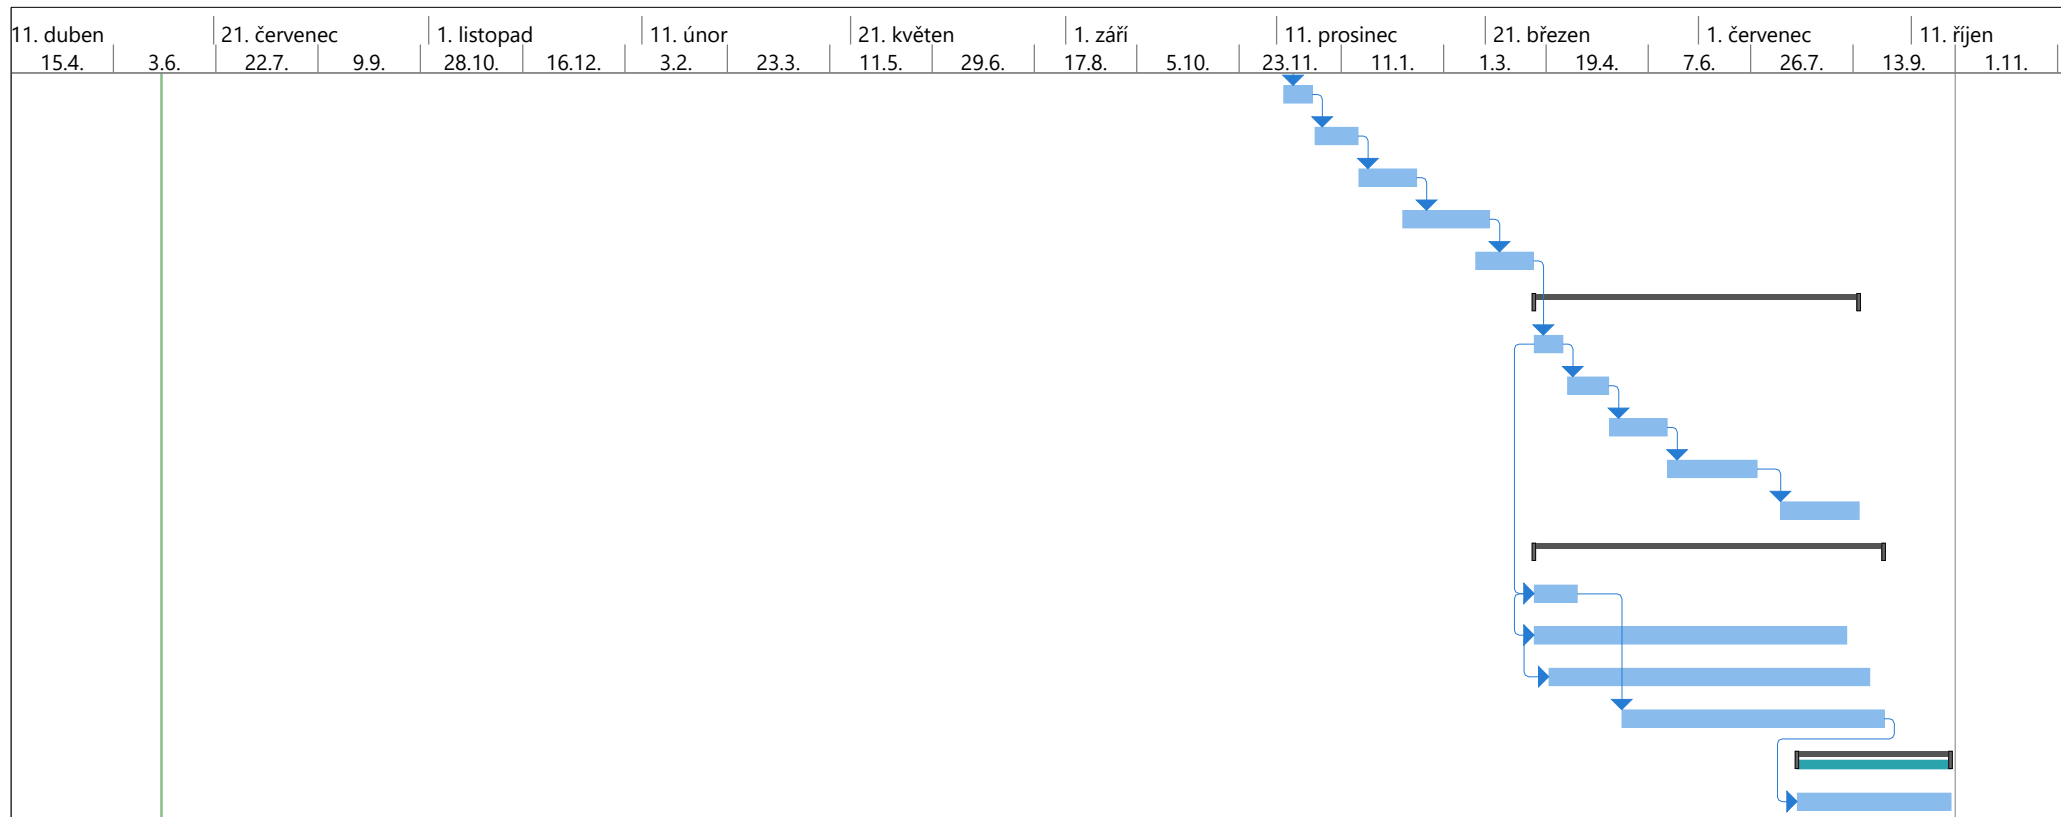

Projekt: DFN BB HMG final 14.1 Datum: 26.6. 19	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			
