

PRACOVNÍCI - 8
POČASÍ +33°C / 14°C
PRAC. DOBA - 7-18

1.4.2023
805040

//

- STROJOVÁ OMÍTKA HRUBÁ / ŠETVÁ MP
- MONTÁŽ SKLOTEXILNÉ SÍTKY NA FASÁDE
- UPRÁVNIČ STAVEBNÍSKA

1 /

PRACOVNÍCI - 8 + 3 elektr. + 2 SDK
PRAC. DOBA - 7-18
POČASÍ +29°C / 15°C

3.4.2023
pondelok
//

- MONTÁŽ SDK, KONSTRUKCIE + POSLA
- MONTÁŽ ELEKTR. POLUVODNÍK + NÁPOJENIE ISTICE
- MONTÁŽ DODÁVKA ELEKTR. KABELÁŽ PRE
- KLIMATIZÁCIU A REKUPERAČIU
- POSLEDNÁ VRSTVA LEPIDLA A FASÁDY / MČIŠKA /
- JEJINA VNÚTORNÁ OMÍTKA OTIEŤ

1 /

Ľudovít KOLHÁR

SKS

Ev. č. 11231
Výb. Slovenská komora stavebníkov

PRACOVNÍČI - 8
 PRAC. DOBA - 4-18
 POČASÍ + 29°C / 18°C

4.4.2023
 úterý
 //

- BRUSLEVIS PODLAHY 1NP. / PŘÍPRAVA PŘE NIVEL
- PLEVLNĚNÍ PŘED NIVEL
- MONTÁŽ SAMONIVELIZAČNÍ 1NP.
- JEMNÁ STROJOVÁ OČIŠŤKA STĚN 1NP. / 2NP.
- UPRÁVNĚNÍ STAVENISKA
- POUKAZ STAV. MATERIÁLŮ
- MONTÁŽ SDE, POSKY + 1 VRSOVA GIPS + SLOOTEX

PRACOVNÍČI - 8 + 2 UZT + 2 ELEKTŘ. + 1 VODAR
 PRAC. DOBA - 4-18
 POČASÍ + 24°C / 16°C

5.4.2023
 středa

- MONTÁŽ KONSTRUKCE SDE NA 1NP.
- TMELĚNÍ SDE 2NP.
- SÍŤKOVÁNÍ STĚN 2NP. / 2.32 - 2.36. /
- MONTÁŽ SDE KONSTR. + TMELĚNÍ MÍSTNOSTI
 / 1.46 - 1.49 / PŘÍPRAVA ORDINACE /
- MONTÁŽ UZT POTRUBÍ 1NP / 2NP CHODBA
- UPRÁVNĚNÍ STAVENISKA
- MONTÁŽ ZASUVKŮ A VYPÍNAČŮ 2NP.
- MONTÁŽ ŽLABŮ PO STŘECHU

KOTI



Ev. č. 1123

PRACOVNÍCI - 8 + 2 UZT + 3 ELEKT.
PRAC. DOBA - 7-18
POČASÍ +26°C / 15°C

6. 7. 2023

Stavba

//

- MONTÁŽ UZT POTRUBÍ
- POLOŽENIE UZT + KLIMATIZAČNÉ JEDNOTY NA STRECHU.
- SIEŤKOVANIE STIEŤU ZIUP. / 2.32-2.36 /
- PŘEPOJENIE EGZISTUJÚCI INTERNET KABELSKÝ OTVOR ZIUP. D2
- MONTÁŽ SDK, KONSTRUKCIE ZIUP.
- TMIELENIE SDK NA ZIUP. - 2 URSŤA
- ZAMUROVANIE GYBERITOU V WC ZIUP. / ZIUP.
- BETONÁŽ STABOVÝ BETON V SPRACHA. ZIUP. / ZIUP.

PRACOVNÍCI - 8
PRAC. DOBA - 4-18
POČASÍ +30°C / 14°C

7. 7. 2023

Práca

//

- VYBURANIE OTVORU PRE UZT ZIUP. / 1.44 /
- OCISTENIE OKIEŤ ZIUP. - PRÍPRAVA NA MALBU
- MONTÁŽ SDK DOSKY + TMIELENIE ZIUP.
- TMIELENIE ROKOFINAL ZIUP.
- MALBA - I VÝSPRAVY OKIEŤ U PETSKEJ AMBULANCIE
- SIEŤKOVANIE STIEŤU MIESTNOSTI ZIUP. / 2.36 a 2.38 /
- FARBEBNÝ OPTICKÝ FASADY BOLO VYBRATÉ
- ŽELEZA - N-184-S
- TMAVA - N-182-S
- COČKÁ - N-182-1
- VYBURANIE OTVORU ZIUP. - D2

Ing. stavebný dozor

Vydala Ex. č. 11231

PRACOVNI - 5
PRAC. DOBA - 7.18
POČASIE +33°C / 14°C

8. 7. 2023
Sobota

- FEBRUÁR A ZABÝTOUOVANIE PRIESTUPOU 1. NP. / 2. NP.
- UVEDA VRT.
- OČISTENIE KÁRBUKUS ENP.

PRACOVNI - 8
PRAC. DOBA - 7.18
POČASIE +31°C / 15°C

10. 7. 2023
Pondelok

- MONTAŽ OBEKADOV
- HRUBA A JEMNÁ OMLSTKA STIEW ENP / 1. NP.
- MALBA STIEW 2. NP.
- OPRAVA - (VYROVNANIE FASADY)
- MONTAŽ SDK, KONSTRUKCIE + THERMOVIE POSIČKY.

KOLLEKTIV

INS. Stavba


1231

Konka

PRACOVNIK - 8
PRAC. DOBA - 7-18.
POČASIE +32°C/18°C

11. 7. 2023
utorok
//


- MONTÁŽ SDK. POSKY + THERCENIE 1NP.
- MALOVANIE STIEV A STROPŮV 2NP.
- MONTÁŽ OBLADŮV 2NP.



PRACOVNIK - 8 + 2 UST.
PRAC. DOBA - 7-18
POČASIE +34°C/20°C

12. 7. 2023
streda
//

- MONTÁŽ SDK. KONSTR. NA CHODBACH 1NP./2NP.
- MONTÁŽ UST. POKRYVIE
- MALBA STIEV A STROPŮV
- OPRÁVA OKOLO OKIEV

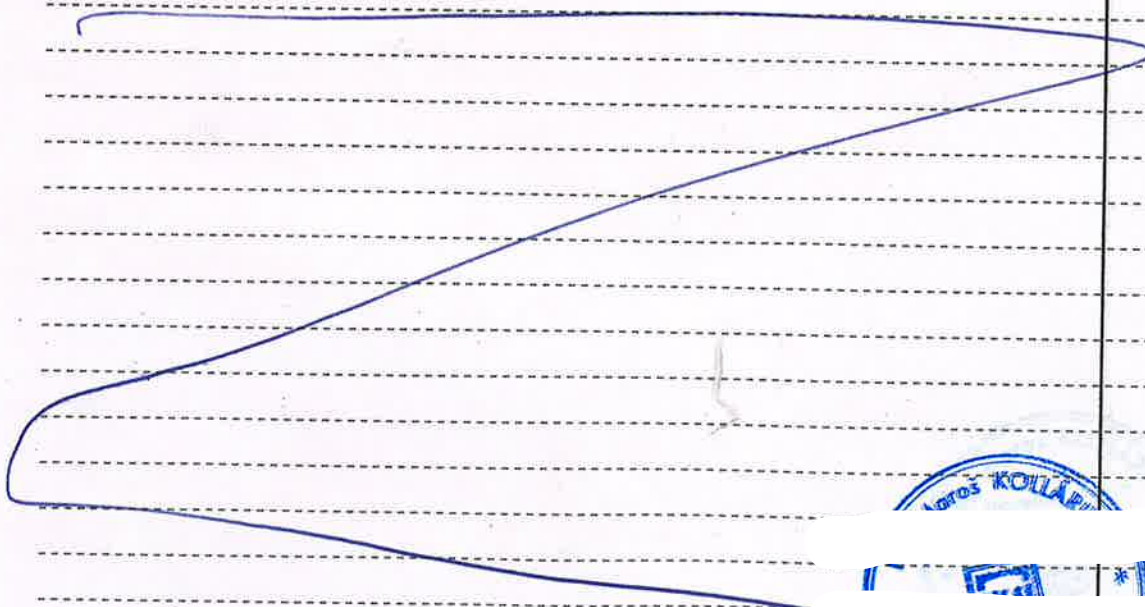

LOTOŠ KOLLÁR

11/23

Kollár


PRACOVNÍČ - 4
PRAC. DOBA - 4 18
POČASÍ +32°C/18°C

13. 7. 2023

Streda

11

- MALBA RTNĚV A STROPŮ.
- MONTÁŽ SDK KAMĚTOV. NA CHODBÁCH.




PRACOVNÍČ - 4 + 3 elektr. na 1 vodor.
PRAC. DOBA - 4 18
POČASÍ +31°C/15°C

14. 7. 2023

Piatok

11

- MONTÁŽ SDK KAMĚTOV. + dřevo NA CHODBÁCH.
 - MONTÁŽ SUŠTIDISK ZNP. - 3KOK C
- BOLO PRESUMPTA VOPROJEDNÉ A KANALIZAČNÉ
POTRUBIE KDE JE MASÁŽNÉ KROSLA Ø 60 CM.
A POTRUBIE KDE JE NOVÉ UMÝVADLO.

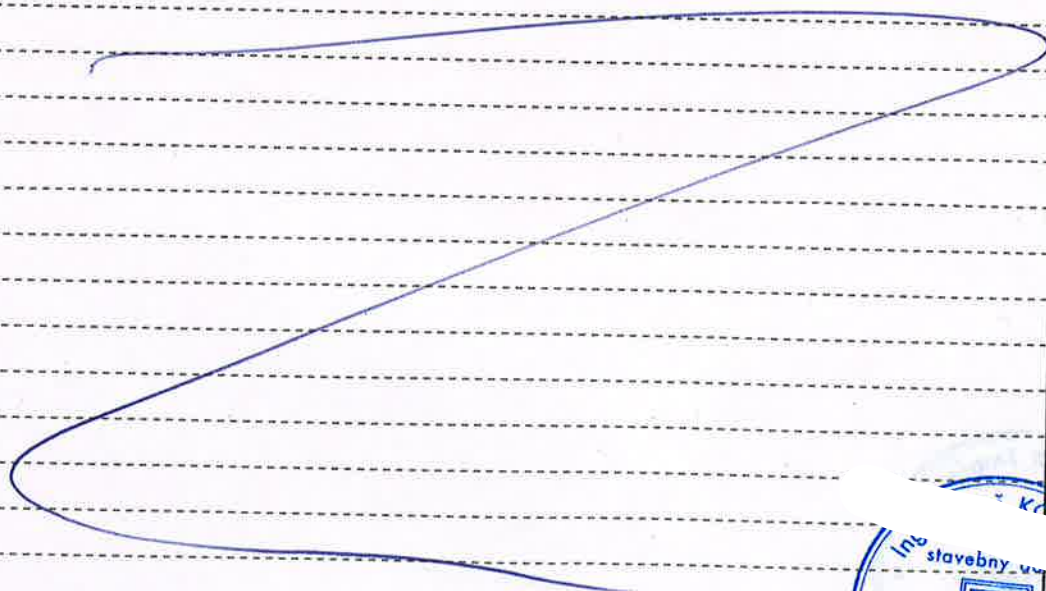


Pracovníci - 6 + 2 elektr. + 1 vodár.
 Prac. doba - 7.08
 Počasie +29°C/14°C

17. 7. 2023

pondelok

- MONTÁŽ OBLIČADOU
- MONTÁŽ SÚVISIČIEK A NÝTINACOU
- OPRAVA FASÁD




Pracovníci - 6 + 2 elektr. + 1 vodár.
 Prac. doba - 7.18
 Počasie +28°C/14°C

18. 7. 2023

utorok

- MONTÁŽ SÚVISIČIEK, KAPUJKY + NÝTINACOU
- MONTÁŽ KAPUJOK FPP PRIE MOJÍ OKRUCH KAPUJOK -
- CENIEK + 2 X EPOLO
- DEMONTÁŽ - BULACOU PRACU INP. U PORTORA
- PRERABKA POTRUBIE NSE U PORTORA INP.
- MONTÁŽ OBLIČADOU 2ND
- OPRAVA FASÁD
- NÝTISTENIE STAKENISKA.

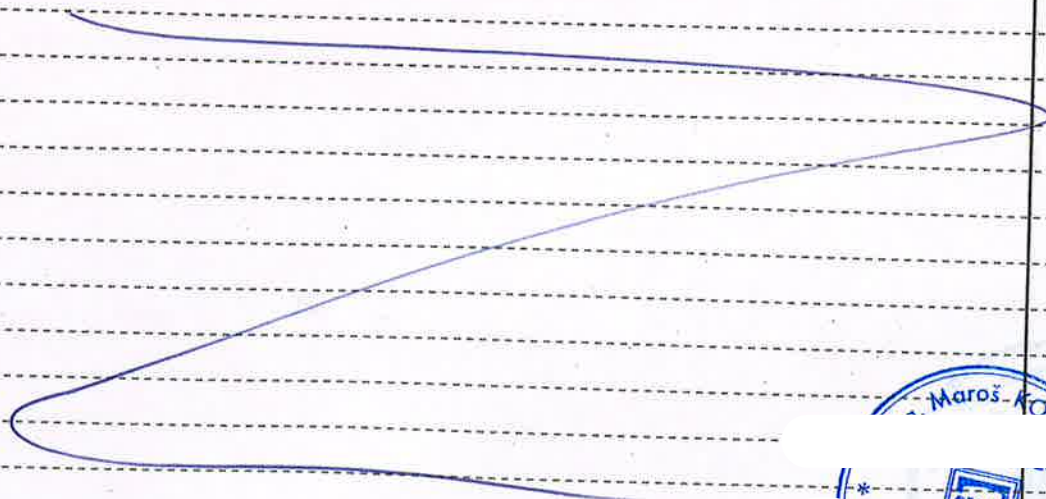

Maroš Ko.

**

Ev. č. 1123

Kucera

PRACOVNÍČ - 3 + 3 + 125 / 2 125 LTR / 2 VODAR

PRAC. DOBA - 4 - 18

POČASÍ 13 °C / 14 °C

19. 7. 2023

streda

- MONTÁŽ KLIMATIZAČNÉ UNIT jednotky
- MONTÁŽ SUŠTIDIEL + UPLYNACOV + RASUOVY
- MONTÁŽ KANALIZAČNÉ POTRUBIE INP. + ELAB.
- MONTÁŽ PLETBY 2 VP.
- MONTÁŽ RADIÁTOROV INP.
- MALBA KASTLÍKOV.

PRACOVNÍČ - 4 + 2 VODAR

PRAC. DOBA - 4 - 18

POČASÍ 12 °C / 15 °C

20. 7. 2023

streda

- MONTÁŽ ODKLADY A PLETBY - SPAROVANIE
- PRERODISNIE VODOVODNÉ POTRUBIE PRE HYDROVANT.

- OPRAVA FASADY
- UPRATANIE STAVENISKÁ
- MALBA STICU
- MONTÁŽ RADIÁTOROV.

PRACOVNÍČ - 4 + 3 V2C.

PRAC. DOBA - 4 - 18

POČASÍ 13 °C / 14 °C

21. 7. 2023

piatok

- MONTÁŽ REKTOU NA KASTLÍKY
- MONTÁŽ ODKLADOU U DOKTORA (HYDROKOLACIA)
- MALBA STICU INP. / 2 VP. - oprava
- MALBA ZAKRUBIE

Maroš KOLLÁRIK

EKSI

Ev. č. 11

Pracovník - 6 + 30 min

Prac. doba - 4 - 18

Počasie +22°C / 12°C

29. 7. 2023

pondelok

Hy

- MONTÁŽ OBEKLADOV A PLOTBY

- MONTÁŽ PUKA PLOTBY 3x

- MONTÁŽ SDK, kamoltrácie nad posraní

- DEMNIA ZMLA-KA STIEU ZNE - HYDROIZBY

Pracovník - 6

Prac. doba - 7 - 18

Počasie +24°C / 16°C

25. 7. 2023

utorok

Hy

- MONTÁŽ OBEKLADOV A PLOTBY

- MALBA PARNBUS / OPRAVA MALBY STIEU /

- OPRAVA FASADY

Pracovník - 6

Pracovník doba - 4 - 18

Počasie +25°C / 15°C

26. 7. 2023

streda

Hy

- OPRAVA FASADY

- MONTÁŽ OBEKLADOV A PLOTBY

- OPRAVA FASADY - DOLATENIE FINISCH

- PRIPRAVA NA PVC



Denné záznamy stavby:

List č.:

1438687

Dátum

PRACOVNÍK - J
PRAC. DOBA - 7-18
POČASÍ 130°C / 14°C

27.7.2023
Stredok.
11

- MONTÁŽ OBEKTOV A DLAŽBY
- PENETRÁCIA POD PVC
- PRÍPRAVA PRED OBEKTY / izolácia /
- PENETRÁCIA FASADY
- OPRÁVA MALBY + KARMÁNIE

11

PRACOVNÍK - G + 3 vodárni + 3 elektr.
PRAC. DOBA - 7-18
POČASÍ 128°C / 16°C

28.7.2023
Piatok,
11

- MONTÁŽ OBEKTOV A DLAŽBY + SPÁROVANIE
- MONTÁŽ RADIÁTOROV + UMYVADIA + TOALETY
- MONTÁŽ ZÁSMIEK + UPRÁVACOU + RACK SKRIN
- MONTÁŽ PVC ZMP 11 MP - PRÍPRAVA
- MONTÁŽ FASADNEJ OCHRANY HR 2MM

11

KAROS KOLLÁRIK



Nováky Komárno

Denné záznamy stavby:

List č.:

1438688

Dátum

PRACOVNÍ - 8.

PRAC. POŘAD - 7 - 12

POČASÍ +30°C

29. 4. 2023

Soňa

"

MONTÁŽ TĚSADYŠŮ Ouklety
- OPRAVA MALBY
- MONTÁŽ PUC. + soňa

8/



[Handwritten signature]

PRACOVNÍČ - 8
 POČASIE +30°C / 16°C
 PRAC. DOBA - 4 - 18

31. 4. 2023
 pondelok
 11

- MONTÁŽ FASÁDIKOVÝCH MIEK
- DEMONTÁŽ KEŠOVIE
- PRÍJEM OPRAVNÉ PRÁCE
- MONTÁŽ PVC. + SOKEI

11

PRACOVNÍČ - 8 + 2 VODARI
 PRAC. DOBA - 4 - 18
 POČASIE +24 / 15°C

1.
 1. 8. 2023
 utorok
 11

- MONTÁŽ OBRUBNÍKOV
- POVLZ A VYPRÁVIE STROJNEJ AKO FIDOUY
- VEMNIE DO KONČOUACIE PRÁCE
- UPRAVDNIE STAVBY
- KONTROLA VODOVODU A KANALIZAČNÉ PRÁCE
- A 107 TĚSNOSTI

1

