

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 10.3.-25.4.2023

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
sídlo: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník

IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Svidník
sídlo: Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

IČO: 331023
DIČ: 2020784821

Stavba: Vybudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici - II. etapa
Miesto: Svidník

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				549,60
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie		do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	549,60		549,60
3. DPH	0,00	20.00 %	109,92	109,92
4. Celkom	0,00		659,52	659,52
5. Zádržné			0,00	
6. Pozastávka			0,00	
7. K úhrade (4-5-6)			659,52	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Súpis vykonaných prác

Kód: 07-DODATOK
Stavba: Vybudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici vo Svidníku

JKSO:
Miesto: Svidník

KS:
Dátum: 24.4.2023

Objednávateľ:
Mesto Svidník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 36451576
IČ DPH: SK2020002160

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milan Ščerba

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			549,60
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	549,60	109,92
Cena s DPH v EUR			659,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

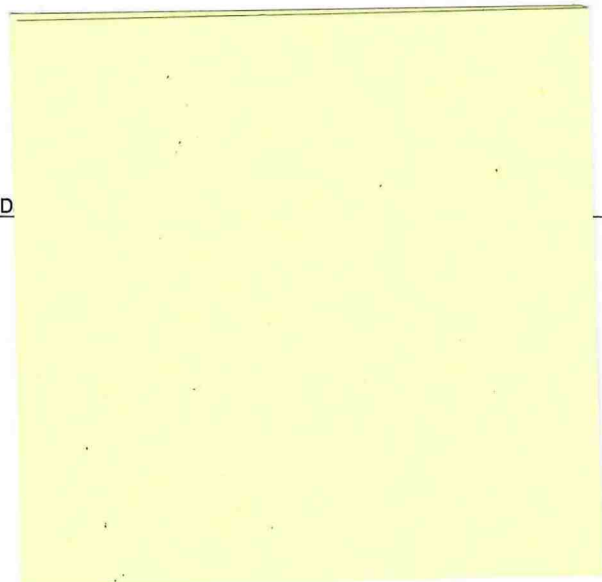

Súpis vykonaných prác

Kód: 07-DODATOK

Stavba: Vybudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici vo Svidníku

Miesto: Svidník

Dátum: 24.04.2023

Objednávateľ: Mesto Svidník

Projektant:

Zhotoviteľ: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

549,60 659,52

02 II. etapa

549,60 659,52

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Vybudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici vo Svidníku

Objekt:

02 - II. etapa

JKSO:

Miesto: Svidník

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milan Ščerba

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36451576

IČ DPH:

SK2020002160

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

549,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	549,60	20,00%	109,92

Cena s DPH

v EUR

659,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Súpis vykonaných prác

Stavba:

Vybudovanie infraštruktúry na Festivalovej ulici vo Svidníku

Objekt:

02 - II. etapa

Miesto:

Svidník

Dátum:

24.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Projektant:

Spracovateľ: Milan Ščerba

Zhotoviteľ:

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

549,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				549,60
D	1		Zemné práce				66,48
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,500	1,09	1,64
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	7,72	23,16
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,900	1,17	1,05
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,500	4,62	20,79
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	31,500	0,47	14,81
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,500	0,67	5,03
D	5		Komunikácie				290,11
7	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,500	7,52	56,40
8	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-4 mm	m3	0,300	44,80	13,44
9	K	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,500	15,12	113,40
VV			5*1,5		7,500		
10	M	592460007800	Dlažba betónová 60 mm	m2	7,650	13,97	106,87
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				177,36
11	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	6,80	68,00
VV			5*2		10,000		
12	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	10,000	2,24	22,40
13	K	918101121	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	0,900	96,62	86,96
D	99		Presun hmôt HSV				15,65
14	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	2,930	5,34	15,65
