

Názov stavby :	TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO ZVOLEN		
Miesto stavby :	Neresnícká cesta 3396, Zvolen	Dátum	9.8.2023
Predmet :	Pokyn na uskutočnenie Zmeny SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO Preložka napájacieho vedenia budovy SPO	Číslo	Z-041

Objednávateľ : **Železničná spoločnosť Slovensko a.s.**
Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zastúpený : Ing. Marián Hlaváč – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miroslav Popjak – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Dozor Objednávateľa : **Skupina dodávateľov SD-THÚ-EDO**
Sídlo : Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Zastúpený : Ing. Peter Obyšovský

Zmluva o dielo (ZoD) č.objednávateľa: 4600005830/VS/2021 **č.zhotoviteľa:** 2021/OA/01/001 zo dňa 16.9.2021

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO ZVOLEN

Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ) bola spracovaná v r. 2014 a nezohľadňovala celkom aktuálny stav. Zhotoviteľ zistil, že káble elektrického vedenia, ktoré napájajú budovu SPO ZSSK sú uložené v nedostatočnej hĺbke a ich trasa nie je v súlade s podmienkami ŽSR. Správca ŽSR sekcie EE nariadil prekládku káblov a nutnosť tieto káble ochrániť podľa predpisu ŽSR TS 4.

Na základe žiadosti Dozoru Objednávateľa, Zhotoviteľ, listom č. 310/0908/2023/THU zo dňa 9.8.2023, predložil Dozoru Objednávateľa v súlade s čl. 9.1.4.1 a 9.1.4.4 ZoD návrh na uskutočnenie Zmeny č. 041. Realizáciou predmetného má dôjsť k navýšeniu Zmluvnej ceny o 14 433,91 EUR. Zmena má mať vplyv na Lehotu realizácie v dĺžke 10 dní. Dopad na Lehotu realizácie Zhotoviteľ riadne neodôvodnil a Dozor Objednávateľa mu ho nepriznáva.

Dozor Objednávateľa vydáva **Pokyn na uskutočnenie Zmeny v zmysle čl. 9.1.5.1** v nasledovnom znení:

Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z – 041:

SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO

Zhotoviteľ realizuje nasledovné zmeny:

- realizovať preložku napájacieho vedenia budovy SPO, vyhovujúcu výškovo, smerovo a kvalitou prevedenia platným STN a predpisom ŽSR.
- ako v Ponuke (v inom SO) a množstvom podľa skutočne vykonaných prác.
- **Zmenou Z – 042 dôjde k zvýšeniu Zmluvnej ceny v sume 14 433,91 EUR**

- **vplyv na Lehotu realizácie: bez vplyvu**
- Cenu za realizáciu Zmeny Zhotoviteľ môže fakturovať podľa postupu dohodnutého v ZoD. Takto vystavenú faktúru Objednávateľ zaplatí v súlade s postupom a v lehotách dohodnutých v ZoD
- hoci tento písomný Pokyn na uskutočnenie Zmeny predstavuje v zmysle ZoD prijatie návrhu uskutočnenia Zmeny, čím prichádza k zmene ZoD v rozsahu Návrhu uskutočnenia Zmeny, uvedená zmena bude ešte predmetom kontroly na Riadiacom orgáne. Po jej schválení musí byť formálne upravená dodatkom k ZoD. Tým však nie je dotknutá záväznosť Pokynu na uskutočnenie Zmeny a zmena ZoD v rozsahu Návrhu uskutočnenia Zmeny.

Objednávateľ súhlasí s predkladaným Pokynom na uskutočnenie Zmeny č. Z- 041
v zmysle čl. 9.26 Zmluvy na poskytnutie služby stavebného dozoru

Ing. Marián Hlaváč
Technický dozor objednávateľa
(ZSSK-THU s.r.o.)

S pozdravom

Ing. Peter Obyšovský
Vedúci stavebný dozor SD-THÚ-EUDO

Prílohy:

1- Návrh Zmeny č. 041 – list Zhotoviteľa č. 310/0908/2023/THU zo dňa 9.8.2023

Na vedomie:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Pre: Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Dozor objednávateľa
Skupina dodávateľov SD-THÚ-EUDO
Zastúpená spoločnosťou EUTECH a. s.
EUTECH a. s.
Moldavská cesta 10/B
040 11 Košice
Do rúk
Ing. Peter Obyšovský
Na vedomie
Ing. Andrej Janšo, PhD.
Ing. Marián Hlaváč

Vaša značka:
212/THU/23-Pa

Naša značka:
310/0908/2023/THU

Vybavuje:
Ing. Miroslav Popjak
Tel: +421

Miesto a dátum:
Zvolen 09.08.2023

Projekt: "Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre Stredisko ZVOLEN"
Zmluva o Dielo: č. Objednávateľa 4600005830/VS/2021

č. Zhotoviteľa 2021/OA/01/001

z dňa 16.09.2021

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. Z-041
SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO
Preložka napájacieho vedenia budovy SPO

Vážený obchodný partner,

dňa 16.09.2021 bola uzavretá medzi našou spoločnosťou STRABAG s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 317 282, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B ako zhotoviteľom (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) a spoločnosťou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 914 939, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3497/B ako objednávateľom (ďalej len „**Objednávateľ**“) Zmluva o dielo č. Objednávateľa: 4600005830/VS/2021, č. Zhotoviteľa: 2021/OA/01/001, v znení prípadných dodatkov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo (ďalej len „**Dielo**“). Zmluva o dielo bola zverejnené v Centrálnom registri zmlúv dňa 23.09.2021 a účinnosť nadobudla dňa 24.09.2021.

Dozor Objednávateľa doručil Zhotoviteľovi listom č. 212/THU/23-Pa, zo dňa 09.08.2023
Žiadosť na predloženie návrhu na Zmenu č. Z-041.

Zhotoviteľ na základe čl. 9.1.4 ZoD predkladá Návrh uskutočnenia Zmeny č. Z-041.

SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO

Predmetom Zmeny je preložka jestvujúcich napájacích káblov od Transformovne ŽSR k budove ZSSK SPO, ktoré križujú stavenisko v žkm 0,300.

a.) Popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia:

Pôvodný stav podľa projektovej dokumentácie (DVZ):

Projektová dokumentácia stupňa DVZ pojednávala o preložkách káblov len ideovo. Technická správa popisuje: „V prípade, že existujúce káble križujú novonavrhované koľaje, kde hĺbka kábla nezodpovedá platnej STN a predpisom ŽSR, sa káble musia ručne odkopať, potom rozrezať a naspojovať novým káblom. Tým sa kábel predĺži a môže sa zakopať hlbšie.“

V miestach križovania existujúcich funkčných káblov so starými koľajami, ktoré budú nahradené novými koľajami, sa predpokladá, že existujúce káble sú uložené v zmysle platných STN a predpisov ŽSR.

V prípade, že existujúce káble križujú novonavrhované koľaje, kde hĺbka kábla nezodpovedá platnej STN a predpisom ŽSR, sa káble musia ručne odkopať, potom rozrezať a naspojovať novým káblom. Tým sa kábel predĺži a môže sa zakopať hlbšie.

Káble budú uložené :

- vo voľnom teréne v pieskovom lôžku v ryhe 35x80cm
- v okolí nových objektov v káblovode
- pri križovaní koľají v chráničkách pod trativodmi železničného spodku
- pri križovaní komunikácií v chráničkách v ryhe 60/120cm

Výkaz výmer neobsahuje žiadne položky týkajúce sa preložiek káblov, obsahuje len položky týkajúce sa demontáží jestvujúcich zariadení.

SO 3504 Preložky a demontáže NN a VO				
1	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESSE OBSTARÁVANIA STAVIEB		
	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a suť	t	34,38
2	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE		
	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	15,00
3	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových (prípoj. skrine, rozvádzače, zásuvkové stojany)	ks	29,00
4	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná (do 1 km)	t	34,38
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná (nad 1 km)	t	34,38

Popis udalosti

V priebehu výkopových prác dňa 15.4.2023 na SO 3203 Železničný spodok, boli nájdené jestvujúce káble CYKY-J 3x240+120, AYKY-J 3x240+120, ktoré napájajú budovu SPO ZSSK. Káblová trasa prechádza z transformovne ŽSR popod koľajisko ŽST. Zvolen os. st., kde následne v km cca 216,000 ŽSR (km 0,300 THU) križujú stavenisko v celej šírke až k jestvujúcemu sektorovému betónovému oplateniu. Za oplatením sa káblová trasa lomí a pokračuje v súbehu s horúcovodom a oplatením k budove SPO.


Dňa 17.4.2023 sa uskutočnilo miestne šetrenie, počas ktorého správca ŽSR Sekcia EE nariadil prekládku káblov a nutnosť tieto káble ochrániť podľa predpisu ŽSR TS 4.


376. Minimálna zvislá vzdialenosť vrchnej časti chráničky od najnižšej polohy (okraja) pláne železničného spodku je 1,50 m (resp. minimálne 2,10 m od hornej plochy podvalu), pričom sa musí rešpektovať väčšia zvislá vzdialenosť z týchto dvoch podmienok.

Dňa 25.05. sa uskutočnilo miestne šetrenie vo veci identifikácie káblov vedených žkm 216,000. Prejednávalo sa aj predmetné káblové vedenie, kde správca vyjadril svoju žiadosť k prekládke a ochrane predmetných káblov.

Riešenie v zmysle dokumentácie stupňa DRS

Na základe zistenej kolízie a výsledkov miestnych šetrení na úrovni Zhotoviteľa a Správcu zariadení, bola Generálnym projektantom spracovaná dokumentácia SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO doplnok č. 1.

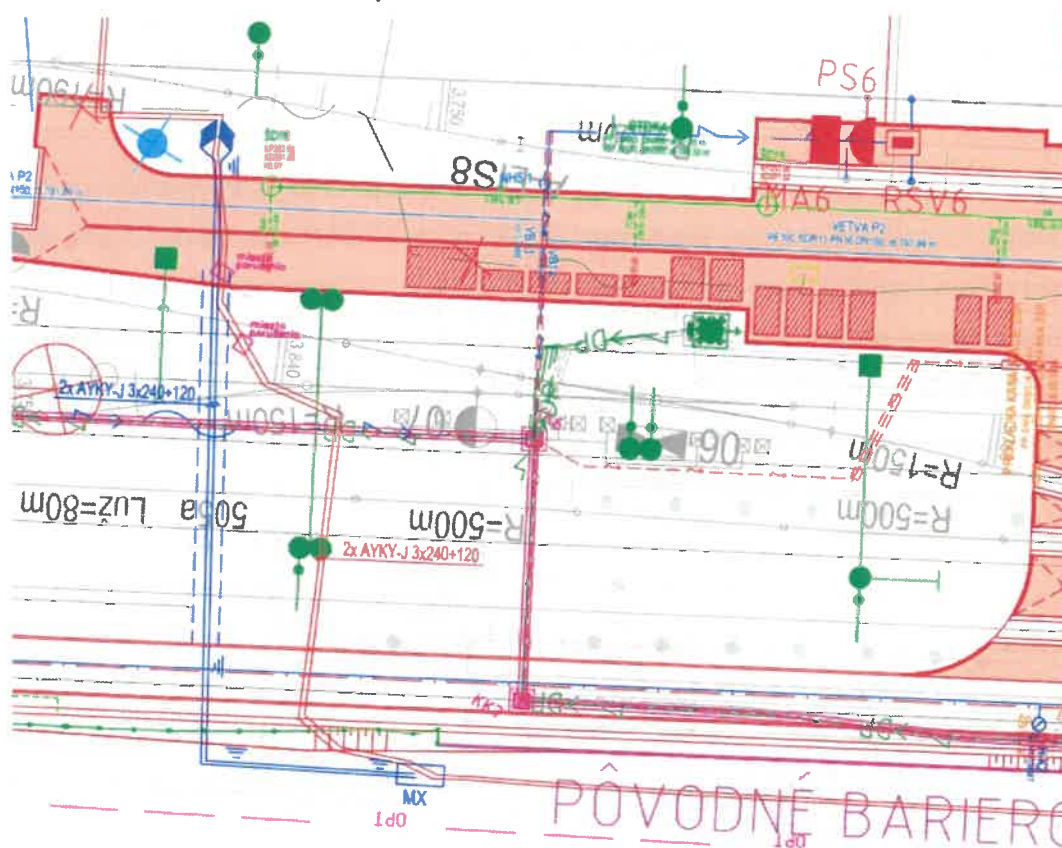

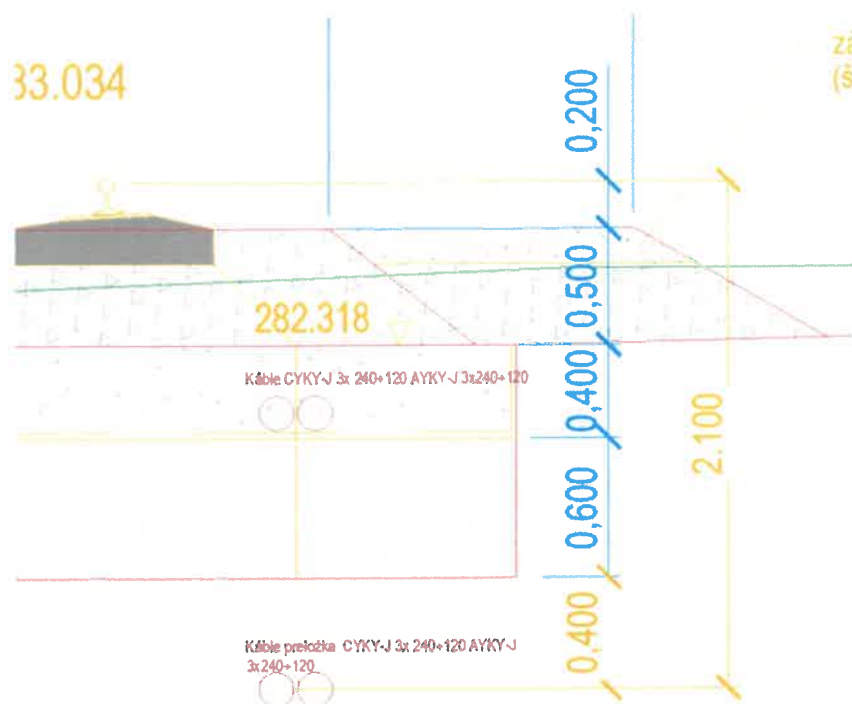

Predmetné káble je potrebné preložiť v celej šírke staveniska THU, v zmysle navrhovaného technického riešenia projektanta. Podľa požiadavky správcu ŽSR križovanie káblov má byť v čo najmenšom rozsahu. Jestvujúce káble AYKY 3x240+120 je potrebné prerušiť. Následne sa v zmysle návrhu projektanta uložia nové káble zodpovedajúcej dimenzie (dĺžka cca 2x77 m), ktoré budú na jednej strane zaspojované. Druhá strana pri bariérovom oplotení bude ukončená v svorkovnicovej skrinke MX, do ktorej budú zapojené aj jestvujúce káble od budovy SPO (Požiadavka Objednávateľa). Svorkovnicová skrinka slúži na zjednodušenie možnosti výhľadového alternatívneho pripojenia budovy SPO z Transformovne THU.

b.) Návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3

(Harmonogram prác) ZoD a lehoty realizácie

Zhotoviteľ predpokladá negatívny dopad na Lehotu realizácie v trvaní 10 dní, v nadväznosti na výkopové práce a vybudovanie konštrukčných vrstiev na SO 3203 Železničný spodok a realizáciu súvisiacich SO. Realizácia Zmeny začne po jej odsúhlasení Dozorom Objednávateľa.

c.) Návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny

Zhotoviteľ predpokladá navýšenie ceny SO nasledovne:

Cena SO 3504 podľa ZoD	8 714,19,-€
Cena SO 3504 po poslednej Zmene (Nárok č. 6)	40 984,31,-€
Cena SO 3504 Zmenou č. Z-041	55 418,22,-€
Navýšenie ceny SO 3504 Zmenou č. Z-041	+14 433,91,-€

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny,
- Príloha č. 2 – Autorizovaný Výkaz výmer,
- Príloha č. 3 – Technické riešenie, SO 3504 doplnok č. 1,
- Príloha č. 4 – Cenová ponuka PPA CONTROLL, a. s., zo dňa 29.05.2023,
- Príloha č. 5 – Zápis v Stavebnom denníku SO 3504, list č. 0144335,
- Príloha č. 6 – Miestne šetrenie zo dňa 25.05.2023.
- Príloha č. 7 – Stanovisko Generálneho projektanta č. 1850/2111//32/Ši, zo dňa 30.05.2023,
- Príloha č. 8 – Ponuka REMING CONSULT, a. s., č. 096/33/22/P, zo dňa 29.05.2023.

S pozdravom



..
Ing. Miroslav Popjak
Predstaviteľ zhotoviteľa
STRABAG s.r.o.

Príloha č. 1

NÁVRH ZHOTOVITEĽA NA OCENENIE ZMENY č. Z-041, SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO

Stavba: Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen

Objekt SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Miesto: Zvolen

Dátum: 09.08.2023

					ZOD				Nárok č. 6 SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO			Zmluvná cena po Nároku č. 6		Zmena č. Z-041 SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO			Zmluvná cena po Zmene č. Z-041	
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková dodávka	Cena jednotk ová montáž	Cena celkom	CÚ	Množstvo	Cena zmeny clekom	Množstvo celkom	Cena celkom	CÚ	Množstvo	Cena zmeny clekom	Množstvo celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45.00.00 VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB																		
1		00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	34,38	21,71		746,39		2,20	47,76	36,58	794,15		0,00	0,00	36,58	794,15
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE																		
2		05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	15,00	177,87		2 668,05		1,00	177,87	16,00	2 845,92		0,00	0,00	16,00	2 845,92
3		05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových (prípoj. skrine, rozvádzače, zásuvkové	ks	29,00	146,58		4 250,82		0,00	0,00	29,00	4 250,82		0,00	0,00	29,00	4 250,82
4		05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná (do 1 km)	t	34,38	12,60		433,19		2,20	27,72	36,58	460,91		0,00	0,00	36,58	460,91
5		05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná (nad 1 km)	t	34,38	17,91		615,75		2,20	39,40	36,58	655,15		0,00	0,00	36,58	655,15
A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene					8 714,19				292,75			9 006,95		0,00			9 006,95	
C. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny																		
6		91080101	Káble Cu - NN silové (CYKY-J 5x6, CYKY-J 5x10, CYKY-J 12x4)	m	0,00	12,88			SO 3505	270,00	3 477,60	270,00	3 477,60				270,00	3 477,60
7		01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	0,00	37,57			SO 3503	81,90	3 076,98	81,90	3 076,98				81,90	3 076,98
8		01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	0,00	12,02			SO 3503	81,90	984,44	81,90	984,44				81,90	984,44
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:					0,00				7 539,02			7 539,02		0,00			7 539,02	
D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny																		
9			Spojka káblová 1-SVCZ 240	ks	0,00	85,68			CP	2,00	171,36	2,00	171,36				2,00	171,36
10			Kábel 1-AYKY-J 3x240+120	m	0,00	23,57			CP	550,00	12 963,50	550,00	12 963,50				550,00	12 963,50
11			Káblové oko Al 70/12	ks	0,00	4,96			CP	8,00	39,68	8,00	39,68				8,00	39,68
12			Kábel 1-AYKY-J 4x70	m	0,00	10,78			CP	270,00	2 910,60	270,00	2 910,60				270,00	2 910,60
13			Káblová forma na 7x4 (káblová spojka na 7x2,5)	ks	0,00	17,83			CP	2,00	35,66	2,00	35,66				2,00	35,66
14			Káblové oko Al 240/12	ks	0,00	11,25			CP	8,00	90,00	8,00	90,00				8,00	90,00
15			Káblové lôžko	m	0,00	4,32			CP	260,00	1 123,20	260,00	1 123,20				260,00	1 123,20
16			Výstražná fólia š.33 mm	m	0,00	2,25			CP	260,00	585,00	260,00	585,00				260,00	585,00
17			Káblová platňa PVC (červená)	m	0,00	2,98			CP	260,00	774,80	260,00	774,80				260,00	774,80
18			Demontáž osvetľovacích stožiarov + demontáž svetiel, žeriav, autodoprava	ks	0,00	1 670,58			CP	2,00	3 341,16	2,00	3 341,16				2,00	3 341,16
19			Revízia	kpl	0,00	518,32			CP	1,00	518,32	1,00	518,32				1,00	518,32
20			PPV na montážne práce	kpl	0,00	717,61				1,00	717,61	1,00	717,61				1,00	717,61
21			Podružný materiál	kpl	0,00	925,71				1,00	925,71	1,00	925,71				1,00	925,71
22			Dopravné náklady na montážny materiál	kpl	0,00	154,18				1,00	154,18	1,00	154,18				1,00	154,18
23			Odvoz a likvidácia odpadu	kpl	0,00	87,56				1,00	87,56	1,00	87,56				1,00	87,56
24			Preložky a demontáže rozvodov NN a VO, dopl. 1	kpl	0,00	13 158,31								CP	1,00	13 158,31	1,00	13 158,31
			Elektromontáže															

[illegible]

		460200553.S.1	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 220 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 30 m															
		460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm 40 m															
		583110000300. S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm 4,16 t															
		460420202.S	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehľami naprieč smeru kábla šírka 35 cm 40 m															
		596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm 285,73 ks															
		460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm 40 m															
		283230008000. S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená 40 m															
		460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3 40 m															
		460560553.S.1	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 220 cm hĺbokej v zemine tr. 3 30 m															
		460620001.S	Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5 14 m2															
		460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek, 14 m2															
		460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny 32 m2															
			Revízie															
		950103001.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. do 5 vývodov 2 obv.															
			Hodinovo zaúčtovacie sadzby															
		HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín 10 hod.															
			Ostatné															
		HZS.4	Revízna správa 4 hod															
		HZS.5	Prípravné práce ku skúškam 4 hod															
		HZS.6	Komplexné skúšky zariadenia 4 hod															
25			Projektová dokumentácia	kpl	0,00	1 275,60												
			Ponuka č. 096/33/22/P vrátane koordinačnej prírážky + 6,30 %															

Cena nových položiek "D" po poslednej zmene spolu:

0,0024 438,3424 438,3414 433,9138 872,25

Spolu8 714,19

Zmluvná cena SO po Zmene č. Z-041:40 984,31

32 270,1240 984,3114 433,9155 418,22

Zhotoviteľ

STRABAG s. r. o.

Stavebný dozor

Meno: Ing. Miroslav Popjak

Dátum: 9.8.2023

Podpis:



Meno:

Dátum:

Podpis:

STRABAG s.r.o.
UB 60 Dopravné staviateľstvo
Dir. TJ/Oblasť II/Prevádzková jednotka OB

Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava
Slovensko

Odoslané e-mailom:

Váš list číslo / zo dňa:	Naše číslo:	Vybavuje:	V Bratislave dňa:
	1850/2111//32/Ši	Ing. Gabriel Šimon	30.05.2023

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:

SO 3504 – Preložky a demontáže rozvodov NN a VO, doplnok č.1

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Zvolen

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Zvolen (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby a s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s do špecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie stavebného objektu SO 3504, časť Doplnok č.1.

Predkladaná časť stavebného objektu pojednáva o oprave poškodených káblov prípojok pre budovu SPO. V čase realizácie zemných prác došlo ku obnaženiu a porušeniu dvoch jestvujúcich káblov, ktoré slúžia ako prípojka z TS ŽSR pre jestvujúcu budovu SPO. K uvedenej skutočnosti došlo z titulu plyššieho umiestnenia káblov, než bolo uvažované na základe geodetického vytýčenia káblov. Ich skutočná pozícia bola mimo normového stavu. Na základe vzniknutej situácii projektant v rámci svojej činnosti operatívne spracoval návrh riešenia. Toto spočíva v naspojovaní nových častí káblov odpovedajúceho typu a dimenzie. Na dvoch miestach sa káble odkopú, prerušia a spojkami sa spoja s novými. Nové káble budú uložené v novej trase popod trať v zmysle platných STN a predpisov ŽSR. Trasa križovania popod koľaje bude vo výkope, ktorý sa zrealizuje pred položením nových koľají. Vyššie uvedeným riešením dôjde ku uloženiu káblov, tak aby bola zabezpečená dostatočná hĺbka uloženia. Podrobnejšie sú technické návrhy zrejme z výkresovej časti projektovej dokumentácie SO 3504, časť Doplnok č.1.



Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného stavebného objektu v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom,



Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Zvolen
