


VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ - K&M&D, s. r. o.																	
Zhotovenie stavby s názvom																	
REKONŠTRUKCIA DVORA MKS – MOLDAVA NAD BODVOU																	
Týždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Postup výstavby																	
Búranie konštrukcií																	
Zemné práce																	
Osadenie odvodňovacieho potrubia																	
Betonáž základov																	
Násypy a zásypy zhutnených podkladových vrstiev																	
Osadenie obrubníkov a odvodňovacieho žlabu																	
Podkladová vrstva																	
Betonáž dosky terasy																	
Realizácia pokládky kamennej dlažby																	
Realizácia kamennej dlažby na terase																	
Povrchové úpravy betónových stien - kamenné obklady																	
Montáž oporných konštrukcií na zvislé zelené steny																	
Montáž oplatenia zábradlia																	
Zahumusovanie a výsadba zelene																	
Rekonštrukcia elektroinštalácie + odvetranie																	
Vecný a časový harmonogram predpokladá ideálne poveternostné a klimatické podmienky																	

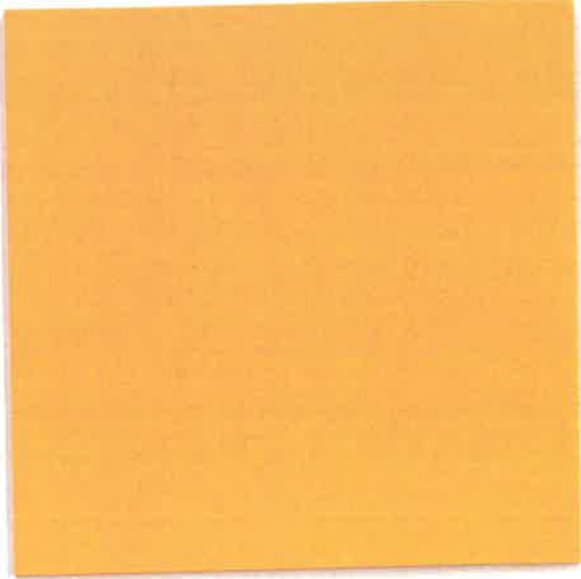

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

Miesto:

Spracoval:

IČO:

DIČ:

Stavbyvedúci:

Dňa: 12.6.2025

Cena celkom bez DPH		183 401,84	
DPH	23 %	183 401,84	42 182,42
	23 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			225 584,26

Zhotoviteľ: MKS MD s.r.o.

Projektant:

DIČ

dpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	183 401,84	0,00	183 401,84	0,00	183 401,84
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	183 401,84	0,00	183 401,84	0,00	183 401,84
ZRN	183 401,84	0,00	183 401,84	0,00	183 401,84
HSV-montáž z rozpočtu	106 727,48	0,00	106 727,48	0,00	106 727,48
HSV-dodávka z rozpočtu	50 679,01	0,00	50 679,01	0,00	50 679,01
PSV-montáž z rozpočtu	10 061,39	0,00	10 061,39	0,00	10 061,39
PSV-dodávka z rozpočtu	15 933,96	0,00	15 933,96	0,00	15 933,96
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Moldava nad Bodvou

324451

Projektant

Zhotoviteľ

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

44781393

SK2022833472

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

12.6.2025

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	50 679,01	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	106 727,48	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	15 933,96	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	10 061,39	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		183 401,84	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS							22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
								23	Súčet 7, 12, 19-22		183 401,84
								24	DPH 23,00 % z 183 401,84		42 182,42
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		225 584,26
								E Prípochty a odpočty			
								26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.6.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
47	Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou	183 401,84	42 182,42	225 584,26	0,00	183 401,84	0,00	0,00	0,00
44a	Spevnené plochy	135 880,06	31 252,41	167 132,47	0,00	135 880,06	0,00	0,00	0,00
44b	Odvodnenie - dažďová kanalizácia	43 008,03	9 891,85	52 899,88	0,00	43 008,03	0,00	0,00	0,00
44c	Sadové úpravy	4 513,75	1 038,16	5 551,91	0,00	4 513,75	0,00	0,00	0,00

Celkom

183 401,84 42 182,42 225 584,26 0,00 183 401,84 0,00 0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 47
 Stavba: Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

JKDO:
 Mesto

Objednávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Projektant:

Spracovateľ:

Podpis:

KS:
 Dátum: 12.6.2025

ICO:
 IČ DPH:

ICO: 44 781 393
 IČ DPH: SK2022833472

ICO:
 IČ DPH:

ICO:
 IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			183 401,84
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			183 401,84
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	183 401,84	42 182,42
Cena s DPH	v	EUR	225 584,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečať

Dátum a podpis:

Pečať


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečať

Dátum a

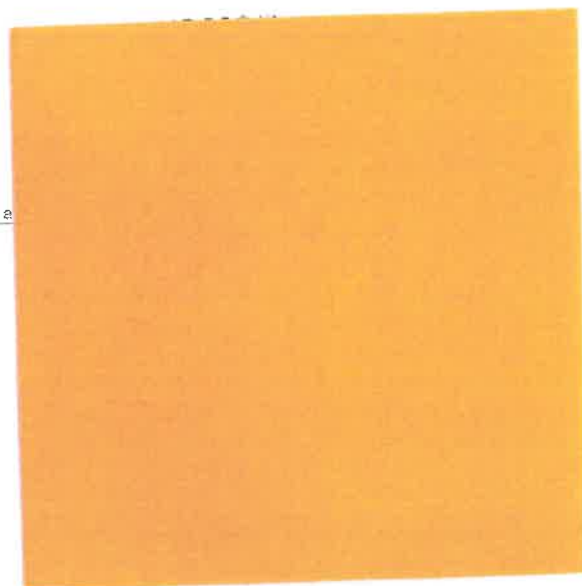

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 47
Stavba: Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou
Miesto: Mesto Moldava nad Bodvou
Objednávateľ: K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
Zhotoviteľ: Spracovateľ

Dátum: 12.06.2025
Projektant:
Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		183 401,84	225 584,26
44a	Spevnené plochy	135 880,06	167 132,47
44b	Odvodnenie - dažďová kanalizácia	43 008,03	52 899,88
44c	Sadové úpravy	4 513,75	5 551,91
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		183 401,84	225 584,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

Objekt: 44a - Spevnené plochy

JKSO:
Mesto:
Obidnávateľ:
Zhotoviteľ:
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

Mesto Moldava nad Bodvou
K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou
K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou
K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
Mesto Moldava nad Bodvou

KS:
Dátum:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

12.06.2025
44 781 393
SK2022833472

Náklady z rozpočtu	135 880,06		
Ostatné náklady	0,00		
Cena bez DPH	135 880,06		
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	135 880,06	23,00%	31 252,41
Cena s DPH	v EUR		167 132,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

Objekt:

44a - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	135 880,06
HSV - Práce a dodávky HSV	110 652,35
1 - Zemné práce	17 204,87
2 - Zakladanie	13 764,21
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 696,61
4 - Vodorovné konštrukcie	3 618,38
5 - Komunikácie	42 877,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 383,12
99 - Presun hmôt HSV	5 107,33
PSV - Práce a dodávky PSV	25 227,71
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 382,82
762 - Konštrukcie tesárske	296,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 613,55
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	7 153,88
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	4 781,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	135 880,06

Okreki

11-17-20

Datum: 12.06.2025

Projektant:
Spracovateľ

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	„Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné
Náklady z rozpočtu							135 880,06	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					110 652,35	
D	1	Zemné práce					17 204,87	
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	113,185	28,66	3 243,88	
2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	57,188	11,11	635,39	
3	K	122301102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	135,972	7,15	972,20	
4	K	122301109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	135,972	1,50	203,96	
5	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	13,968	21,89	305,76	
6	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	13,968	2,22	31,01	
7	K	132301101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	27,878	75,12	2 094,20	
8	K	132301109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	27,878	17,50	487,87	
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	194,855	3,48	678,10	
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 363,985	0,43	588,51	
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	194,855	2,49	485,19	
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	194,855	0,68	132,50	
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	266,727	27,55	7 348,33	
D	2	Zakladanie					13 764,21	
14	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm	m3	10,129	82,32	833,82	
15	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	17,580	110,47	1 942,06	
16	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,260	22,08	160,30	
17	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,260	6,29	45,67	
18	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek so zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	175,797	9,90	1 740,39	
19	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	28,732	120,87	3 472,84	
20	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	15,002	21,12	316,84	
21	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	15,002	6,39	95,86	
22	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	2,299	1 824,63	4 194,82	
23	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20- na stĺpiky	m3	7,936	121,17	961,61	
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 696,61	
24	K	311321311.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	6,840	114,03	779,97	
25	K	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	45,600	18,52	844,51	
26	K	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	45,600	2,39	108,98	
27	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,547	1 760,78	963,15	
D	4	Vodorovné konštrukcie					3 618,38	
28	K	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	3,750	155,99	588,71	
29	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,300	2 035,43	610,63	
30	K	434351145.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	3,685	33,60	123,82	
31	K	434351146.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	3,685	5,40	19,90	
32	K	451971112.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm a uchytiením sponami z betónovej ocele	m2	416,206	3,59	1 494,18	
33	M	69311000200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	424,530	1,84	781,14	Likov s.r.o. (PP) 100% 200 g/m2
D	5	Komunikácie					42 877,83	
34	K	564561111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	416,206	0,88	368,26	
35	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	149,834	16,99	2 545,68	
36	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	49,461	13,47	668,24	
37	K	564772114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 280 mm	m2	49,461	18,60	919,97	
38	K	594611120.1	Kladenie dlažby z kameňa ukladané do vzoru z 3-5 druhov , hr. 30 mm do lôžka zo štrkopiesku hr. 80 mm	m2	416,206	14,12	5 876,83	
39	M	583840011000.S	Doska obkladová kamenná brúsená, stupeň 2602, hrúbka 30 mm, z usadených hornín	m2	420,368	74,32	31 241,75	EUROKAMEN s.r.o. - Spišský travertín, francúzsky vzor, odtieň béžovo svetlo hnedý
40	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	416,206	3,03	1 261,10	
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					25 383,12	

41	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	25,000	7,55	188,75	
42	M	552170001800.S	Obrubník parkový, lžxv 100x50x200 mm, prírodný	ks	25,250	2,37	59,84	PREMAC Záhonový obrubník prírodný 100 x 5 x 20 cm
43	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2,917	4,55	13,27	
44	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2,917	8,80	25,67	
45	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehlí pálených, vápenopieskových, cementových na maľtu, -1,90500t	m3	18,624	34,35	639,73	
46	K	964011221.S	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ. do 3 m, do 75 kg/m. -2,40000t	m3	0,960	146,20	140,35	
47	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	8,448	101,00	853,25	
48	K	985049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaŕiny so zvráanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	8,448	56,15	474,36	
49	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	104,175	29,88	3 112,75	
50	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	312,525	1,05	328,15	
51	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	104,175	28,30	2 948,15	
52	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	28,296	65,65	1 857,63	
53	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	14,297	89,00	1 272,43	
54	K	979089812.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	104,175	129,29	13 468,79	
D 99 Presun hmôt HSV							5 107,33	
55	K	980223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	500,719	10,20	5 107,33	
D PSV Práce a dodávky PSV							25 227,71	
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 382,82	
56	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	58,599	5,66	331,67	
57	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	67,389	4,24	285,73	BMI Kft. - Pás asfaltový V60S35
58	K	711210220.S	Zhotovenie izol. stierky dvojvrstvej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	58,599	4,85	284,21	
59	M	245650001300.S	Malta hydroizolačná 2-komponentná vláknami vystužená na báze cementu	kg	421,913	2,95	1 244,64	SIKA Slovensko - Sikalastic
60	K	711531500.S	Zhotovenie jazierkovej izolácie na ploche vodorovnej položením voľne	m2	20,000	4,29	85,80	
61	M	283220003300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1 mm, pre izoláciu záhradných jazierok, rybníkov a iných vodných plôch	m2	23,000	5,21	119,83	FATRAFOL - Alkorplan 35034 hr. 1 mm
62	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,770	40,18	30,94	
D 762 Konštrukcie tesárske							296,10	
63	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	50,000	1,05	52,50	
64	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	20,000	2,56	51,20	
65	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	40,000	1,41	56,40	
66	K	762822830.S	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2, - 0,02500 t	m	50,000	2,72	136,00	
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							10 613,55	
67	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	50,000	4,55	227,50	
68	K	767914160.S	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky nad 2,2 m	m	7,500	10,56	79,20	
69	M	553510025300.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vúl 2,4x2,31 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	3,315	176,13	583,87	POZINKOVANÁ - f.zelená
70	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	6,000	11,44	68,64	
71	M	553510009830.S	Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná	ks	6,000	6,18	37,08	POZINKOVANÁ - f.zelená
72	M	553510022000.S	Stĺpik, d 38 mm, výška 2,2 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	6,000	9,87	59,22	POZINKOVANÁ - f.zelená
73	K	767916590.S	Osadenie vzpery oceľovej plotovej na oceľovú platňu	ks	2,000	8,05	16,10	
74	M	553510009840.S	Pätka vzpery 38 mm plotová, pozinkovaná	ks	2,000	5,69	11,38	POZINKOVANÁ - f.zelená
75	M	553510022300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	2,000	10,43	20,86	POZINKOVANÁ - f.zelená
76	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 000,000	1,23	1 230,00	
77	M	301	Atypické kovane zábradlie	bm	19,800	350,89	6 947,62	
78	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg- oporná konštrukcia na vinič- 60 m	kg	500,000	1,40	700,00	
79	M	132110000501	Oporná konštrukcia na vinič a popínavé rastliny	t	0,500	1 174,11	587,06	FeZn rúrka, 2,5 m Priemer 1mm 60
80	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,783	57,50	45,02	
D 772 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa							7 153,88	
81	K	772504140.S	Kladenie dlažby z kameňa ukladané do vzoru z 3 -5 druhov, hr. do 30 mm	m2	58,599	39,50	2 314,66	
82	M	583940011000.S	Doska obkladová kamenná brúsená, stupeň 2602, hrúbka 30 mm, z usadených hornín	m2	60,943	74,06	4 512,83	EUROKAMEN s.r.o. - Spišský travertín
83	K	998772101.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	11,517	28,34	326,39	
D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa							4 781,36	
84	K	782111160.S	Montáž obkladov stien stiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a lica	m2	48,780	71,09	3 467,77	
85	M	583940002400.S	Obklad/dlažba kamenná nepravidelného tvaru - priemer 100-500 mm, hrúbka 20-40 mm	m2	50,731	22,88	1 160,73	EUROKAMEN s.r.o. - Spišský travertín
86	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	4,845	31,55	152,86	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

Objekt:

44b - Odvodnenie - dažďová kanalizácia

UKSÚ:

Mesto:

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Projektant:

Spracovateľ:

Podnikateľ:

KS:

Dátum:

12.06.2025

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

44 781 393

SK2022833472

Náklady z rozpočtu

43 008,03

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

43 008,03

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

43 008,03

22,00%

9 591,65

Cena s DPH

v

EUR

52 899,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia dvora NKS - Moldava nad Bodvou

Objekt

44b - Odvodnenie - dažďová kanalizácia

Miesto

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	43 008,03
HSV - Práce a dodávky HSV	42 240,39
1 - Zemné práce	22 919,83
8 - Rúrové vedenie	11 716,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 096,43
99 - Presun hmôt HSV	4 508,07
PSV - Práce a dodávky PSV	767,64
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	654,69
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	112,95
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 008,03

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

Objekt:

44b - Odvodnenie - dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	„Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné
Náklady z rozpočtu							43 008,03	
D HSV Práce a dodávky HSV							42 240,39	
D 1 Zemné práce							22 919,83	
1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 4, do 100 m3	m3	57,600	21,50	1 238,40	
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	57,600	2,44	140,54	
3	K	132301102.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 4 nad 100 m3	m3	250,000	44,55	11 137,50	
4	K	132301109.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 4	m3	250,000	19,30	4 825,00	
5	K	133301101.S	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	2,304	91,45	210,70	
6	K	133301109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachtiet zapažených i nezapažených v hĺbke 4	m3	2,304	13,50	31,10	
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	12,000	5,11	61,32	
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	12,000	3,33	39,96	
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	57,600	5,10	293,76	
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou, pôvodná zemina, so zhrutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	189,250	4,15	785,39	
11	K	175101102.S	Obesyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	60,750	37,52	2 279,34	
12	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	72,900	15,55	1 133,60	
13	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	36,450	20,39	743,22	
D 8 Rúrové vedenie							11 716,06	
14	K	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké pínostenné PP SN 10 DN 125	m	9,000	20,10	180,90	
15	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké pínostenné PP SN 10 DN 150	m	135,000	21,55	2 909,25	
16	K	877274002.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	4,000	5,85	23,40	
17	M	286650000300	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	60,000	54,13	3 247,80	EKODREN - DRENBLOK DB60
18	M	286640069200.S	Koleno PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	4,25	17,00	výrobca: Kaczmarek
19	K	877324026.S	Montáž kanalizačnej PP obočky DN 150	ks	4,000	6,10	24,40	
20	M	286640118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	14,33	57,32	výrobca: Kaczmarek
21	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/125	ks	4,000	6,09	24,36	
22	M	286640083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	6,13	24,52	výrobca: Kaczmarek
23	K	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 850 do 1200 mm	ks	2,000	53,15	106,30	
24	M	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	44,35	88,70	výrobca: Kaczmarek
25	K	894431134.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1600 do 2000mm	ks	2,000	70,20	140,40	
26	M	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	43,34	86,68	výrobca: Kaczmarek
27	M	286610026900.S	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty	ks	2,000	44,56	89,12	výrobca: Kaczmarek
28	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku 1,2*3,6*3 vrátane geotextílie	m3	12,960	29,95	388,15	
29	M	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	60,000	53,15	3 189,00	EKODREN - DRENBLOK DB60
30	M	286650003312.S	Geotextília pre vsakovací box PP 200 g, pre vsakovanie dažďovej vody	m2	40,000	2,97	118,80	GEOTOP PP - polypropylenu (PP) 100% 200 g/m2
31	K	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	28,72	28,72	
32	M	286610047600.S	Filterčno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 600, výška 2000 mm	ks	1,000	971,24	971,24	EKODREN Filterčno-usadzovacia šachta FŠ 600 s filtr.prenážkou a s poklopom
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 096,43	
33	K	935114422.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy B 125	m	14,000	16,80	235,20	
34	M	592270007300.S	Čaluná koncová stena, pre žlab betónový s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	11,61	11,61	BG-FILCOTEN tec NW150
35	M	592270007500.S	Koncová stena s nátrubkom DN 150, pre žlab betónový s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	26,99	26,99	BG-FILCOTEN tec NW150
36	M	592270015300.S	Mriežkový rošt, šírka 30x10 mm, dl. 1 m, B 125, pozinkovaný s rynchlouzáverom, pre žlab betónový s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	14,000	89,11	1 247,54	BG-FILCOTEN tec NW150
37	M	592270022300.S	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	14,000	98,23	1 375,22	BG-FILCOTEN tec NW150
38	K	935114592.S	Osadenie vpusu pre odvodňovací betónový žlab štandardný svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	25,72	25,72	
39	M	592270007200.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpus betónový svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	32,18	32,18	BG-FILCOTEN tec NW150
40	M	592270029000.S	Liatinový rošt, šírka 18x145 mm, dl. 0,5 m, D 400, pre štandardné betónové žlaby svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	44,98	44,98	BG-FILCOTEN tec NW150

41	M	592270030700.S	Vpust betónový, h&xv 500x270x570 mm, pre štandardné betónové žľaby svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	96,99	96,99	BG-FILCOTEN tec NW150
D 99 Presun hmôt HSV								4 508,07
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	114,447	39,39	4 508,07	
D PSV Práce a dodávky PSV								767,64
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti								654,69
43	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	25,000	0,64	16,00	
44	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	28,750	1,75	50,31	GEOTOP PP - polypropylénu (PP) 100% 400 g/m2
45	K	711531500.S	Zhotovenie jazierkovej izolácie -2 vrstvy- na ploche vodorovnej položení voľne	m2	50,000	5,44	272,00	
46	M	283220003300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1 mm, pre izoláciu záhradných jazierok, rybníkov a iných vodných plôch	m2	67,500	5,44	312,80	Fólia zemná Aikordlan 35034 hr. 1 mm
47	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,079	45,35	3,58	
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								112,95
48	K	721242121.S	Lapač střešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	3,000	37,65	112,95	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia diaľnice MKS - Moldava nad Bodvou
Objekt: 44c - Sadové úpravy

KSO:		KS:	
Objekt:		Dátum:	12.06.2025
Objednávateľ:	Mesto Moldava nad Bodvou	IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou	IČO:	44 781 393
		IČO DPH:	SK2022833472
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Projekťár:			

Náklady z rozpočtu			4 513,75
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			4 513,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	4 513,75	23,00%	1 038,16
Cena s DPH	v	EUR	5 551,91

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum
----------------	----------	-------



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

Objekt:

44c - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

12.06.2025

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Zhotoviteľ:

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 513,75

HSV - Práce a dodávky HSV

4 513,75

1 - Zemné práce

4 367,85

99 - Presun hmôt HSV

145,90

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 513,75

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia dvora MKS - Moldava nad Bodvou

Objekt:

44c - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

12.06.2025

Objednávateľ:

Mesto Moldava nad Bodvou

Projektant:

Fotograf:

K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	.Označenie konkrétnych typov materiálov, výrobkov a konštrukcií, ktoré uchádzač navrhuje a v položkách, kde je to uplatniteľné aj výrobné označenia stavebných materiálov, výrobkov a konštrukcií uchádzača v položkách, kde je to uplatniteľné
Náklady z rozpočtu							4 513,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 513,75	
D	1		Zemné práce				4 367,85	
1	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	20,000	0,25	5,00	
2	M	0265100018011	Báľsky	ks	20,000	8,07	161,40	Levandula úzkolistá 40 - 60 cm
3	K	183205113.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hĺbke 4	m2	97,037	1,05	101,89	
4	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	30,000	4,40	132,00	
5	M	026550000500.S	Rastlina popínava Brečtan popínavý - previsajúci	ks	10,000	1,87	18,70	Brečtan popínavý Hedera helix
6	M	026550001200.S	Rastlina popínava Pavinič - Parthenocissus	ks	10,000	2,16	21,60	Pavinič trojlaločný
7	M	026550001201	Rastlina popínava Vinič	ks	10,000	9,10	91,00	Vinič ozdobný- Vitis coignetiae
8	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	20,000	15,28	305,60	
9	M	026530000800.S	Krík listnatý Ruža dekoratívny kvetom	ks	10,000	1,84	18,40	Rosa multiflora
10	M	026530004100.S	Krík listnatý Hortenzia kalinolistá - Hydrangea macrophylla - odrody, v 40/60, dekoratívny kvetom	ks	10,000	13,10	131,00	Hortenzia kalinolistá
11	K	1842111111	Výsadba rastliny do veľkorozmerových kvetníc	ks	3,000	7,35	22,05	
12	M	02651000180111	Okrasné dreviny na kmeňku - v. cca 2,5 m	ks	3,000	456,20	1 368,60	Cerešňa plikáta - SAKURA
13	M	6582 769311	veľkoobjemový kvetník	ks	3,000	482,59	1 447,77	
14	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	97,037	2,15	208,63	
15	M	693710000200.S	Mulčovacia textília písne hmotnosť 50 g/m2	bal	0,613	29,55	18,11	Strend Pro Garden netkaná textília 3,2x10m, 50 g/m2
16	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	97,037	1,49	144,59	
17	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	3 430,258	0,05	171,51	Mulčovacia kôra Fioria
D	99		Presun hmôt HSV				145,90	
18	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,002	48,80	145,90	
