PRÍLOHA č. 1

449/2022 P

Multifunkčná hala Moldava nad Bodvou

Identifikátor	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Poznámky
1						
2		**SO 01 Multifunkčná hala**	**368 dni**	**Ut 1.6.21**	**Pi 28.10.22**	
3		Zemné práce	88 dni	Ut 1.6.21	Pi 1.10.21	
4		Zemné práce kompletaže	12 dni	Št 25.8.22	Po 12.9.22	
5		Zakladanie - pätky, pásy, podkladný betón časť	28 dni	Str 11.8.21	Po 20.9.21	
6		Zakladanie - podkladné betóny zázemie	3 dni	Str 12.1.22	Po 17.1.22	
7		Zakladanie - podkladné betóny hracia plocha,	21 dni	Po 7.3.22	Ut 5.4.22	
8		Izolácia proti vode a vlhkosti 1.časť	18 dni	Ut 14.9.21	Pi 8.10.21	
9		Izolácia proti vode a vlhkosti 2.časť	70 dni	Po 15.11.21	Po 21.2.22	
10		Zvislé konštrukcie	46 dni	Po 6.9.21	Ut 9.11.21	
11		Vodorovné konštrukcie	47 dni	Po 27.9.21	Str 1.12.21	
12		Skelet finalizácia, dodatočné úpravy	7 dni	Št 25.8.22	Po 5.9.22	
13		OK	88 dni	Št 25.11.21	Ut 29.3.22	
14		OK - finalizácia, dokončovacie úpravy	8 dni	Št 25.8.22	Ut 6.9.22	
15		Strecha - zázemie	14 dni	Po 29.11.21	Pi 17.12.21	
16		Strecha - hala	25 dni	Po 10.1.22	Po 14.2.22	
17		strecha dokončovacie úpravy	12 dni	Po 10.10.22	Str 26.10.22	
18		Výplňové murivo	12 dni	Pi 19.11.21	Ut 7.12.21	
19		Priečky	50 dni	Po 22.11.21	Po 31.1.22	
20		murovanie - kompletáže, vysprávky	5 dni	Po 5.9.22	Po 12.9.22	
21		Sendvičové panely	45 dni	Št 16.12.21	Št 17.2.22	
22		Sendvičové panely - kompletáže	12 dni	Po 10.10.22	Str 26.10.22	
23		Zasklievanie	40 dni	Po 11.7.22	Pi 2.9.22	
24		Hliníkové okná	7 dni	Pi 14.1.22	Ut 25.1.22	
25		Výplne otvorov - kompletizácia	10 dni	Št 25.8.22	Št 8.9.22	
26		Strešný výlez	3 dni	Št 9.12.21	Ut 14.12.21	
27		Strešný svetlík	11 dni	Po 11.4.22	Ut 26.4.22	
28		Pergola	35 dni	Po 14.3.22	Po 2.5.22	
29		Pergola dokončovacie pr	3 dni	Št 25.8.22	Ut 30.8.22	
30		Polykarbonátové steny	27 dni	Po 7.3.22	Str 13.4.22	
31		polykarbonátové steny - kompletizácie	7 dni	Št 25.8.22	Po 5.9.22	
32		Maľaniny	14 dni	Ut 2.8.22	Pi 19.8.22	
33		Omietky	35 dni	Po 25.4.22	Po 13.6.22	
34		Kompletáže pri omietkách	15 dni	Št 25.8.22	Št 15.9.22	
35		Izolácia podláh	15 dni	Po 7.3.22	Po 28.3.22	
36		SDK	19 dni	Po 25.4.22	Pi 20.5.22	
37		Kompletáže pri SDK	14 dni	Št 25.8.22	Ut 13.9.22	
38		Podhľady hala	49 dni	Po 6.6.22	Pi 12.8.22	
39		Podhľady zázemie	45 dni	Po 15.8.22	Po 17.10.22	
40		Obloženie stien THERMWOOD	45 dni	Po 15.8.22	Po 17.10.22	
41		Kompletáže - THERMWOO	7 dni	Po 17.10.22	Str 26.10.22	
42		Zábradlia	15 dni	Po 29.8.22	Po 19.9.22	
43		Kompletáže Zábradlie	14 dni	Po 3.10.22	Pi 21.10.22	
44		Kovové konštrukcie - trapéz strechy	11 dni	Po 6.12.21	Ut 21.12.21	
45		Opláchovanie parapetov	10 dni	Ut 15.3.22	Ut 29.3.22	
46		Záchodové stienky	25 dni	Po 5.9.22	Po 10.10.22	
47		Záchodové stienky - kompletáže	3 dni	Str 19.10.22	Po 24.10.22	
48		**Podlaha haly**	**54 dni**	**Str 10.8.22**	Ut 25.10.22	
49		Hydroizolácia, rošt	27 dni	Str 10.8.22	Pi 16.9.22	
50		OSB doska, ochranná fólia, drevené parkety	21 dni	Po 26.9.22	Ut 25.10.22	
51		Keramické obklady	45 dni	Po 6.6.22	Pi 5.8.22	
52		Keramické obklady, dokončievacie práce	10 dni	Po 3.10.22	Po 17.10.22	
53		Maľby	35 dni	Po 5.9.22	Po 24.10.22	
54		Dvere protipožiarne	27 dni	Po 5.9.22	Str 12.10.22	
55		Dvere	20 dni	Po 12.9.22	Po 10.10.22	
56		Dvere kompletáže	7 dni	Po 17.10.22	Str 26.10.22	
57		Vyčistenie	10 dni	Pi 14.10.22	Pi 28.10.22	
58		**Elektroinštalácia**	**320 dni**	**Po 19.7.21**	Po 10.10.22	
59		Uzemnenie	7 dni	Po 19.7.21	Str 28.7.21	
60		Hrubé rozvody	60 dni	Po 24.1.22	Po 18.4.22	
61		Kompletáž	35 dni	Po 22.8.22	Po 10.10.22	
62		**EPS**	**140 dni**	**Po 4.4.22**	**Po 17.10.22**	
63		Káblové rozvody	40 dni	Po 4.4.22	Po 30.5.22	
64		Kompletáž	20 dni	Po 19.9.22	Po 17.10.22	
65		**HSP**	**140 dni**	**Po 4.4.22**	**Po 17.10.22**	
66		Káblové rozvody	40 dni	Po 4.4.22	Po 30.5.22	
67		Kompletáž	20 dni	Po 19.9.22	Po 17.10.22	
68		**Ústredné vykurovanie**	**160 dni**	**Po 7.3.22**	**Po 17.10.22**	
69		Rozvody, rozdeľovače, výmenníková stanica	45 dni	Po 7.3.22	Po 9.5.22	
70		Rozvody hracia plocha	16 dni	Po 5.9.22	Ut 27.9.22	
71		ÚVK kompletáž	5 dni	Po 10.10.22	Po 17.10.22	
72		**ZTI**	**322 dni**	**Po 19.7.21**	Str 12.10.22	
73		Ležaté rozvody	12 dni	Po 19.7.21	Str 4.8.21	
74		ZTI rozvody	35 dni	Po 24.1.22	Po 14.3.22	
75		Kompletáže	12 dni	Po 26.9.22	Str 12.10.22	
76		**VZT**	**149 dni**	**Ut 15.3.22**	Po 10.10.22	
77		Rozvody	29 dni	Ut 15.3.22	Po 25.4.22	
78		VZT Jednotky	15 dni	Pi 1.7.22	Pi 22.7.22	
79		Vybavenie haly	45 dni	Po 8.8.22	Po 10.10.22	
80		Funkčné skúšky, zaregulovanie, zaškolenie				ukončenie 15 dní od prepoj na trvalý prívod elektrickej energie
81		**SO 02 - Vodovodná prípojka**	**233 dni**	**Pi 19.11.21**	Str 12.10.22	
82		Prípojka	93 dni	Pi 19.11.21	Str 30.3.22	
83		Kompletáže - osadnie poklopov a pod.	7 dni	Po 3.10.22	Str 12.10.22	
84		**SO 03 - Kanalizačná prípojka**	**45 dni**	**Po 14.3.22**	**Po 16.5.22**	
85		**SO 04 - NN Prípojka**	**204 dni**	**Po 6.12.21**	**Pi 16.9.22**	
86		Káblové rozvody	91 dni	Po 6.12.21	Ut 12.4.22	
87		Porealizačné zameranie, napojenie, kompletáže	32 dni	Str 3.8.22	Pi 16.9.22	
88		**Odovzdávacie, preberacie konanie, vypratanie staveniska**	**9 dni**	**Po 17.10.22**	**Pi 28.10.22**	

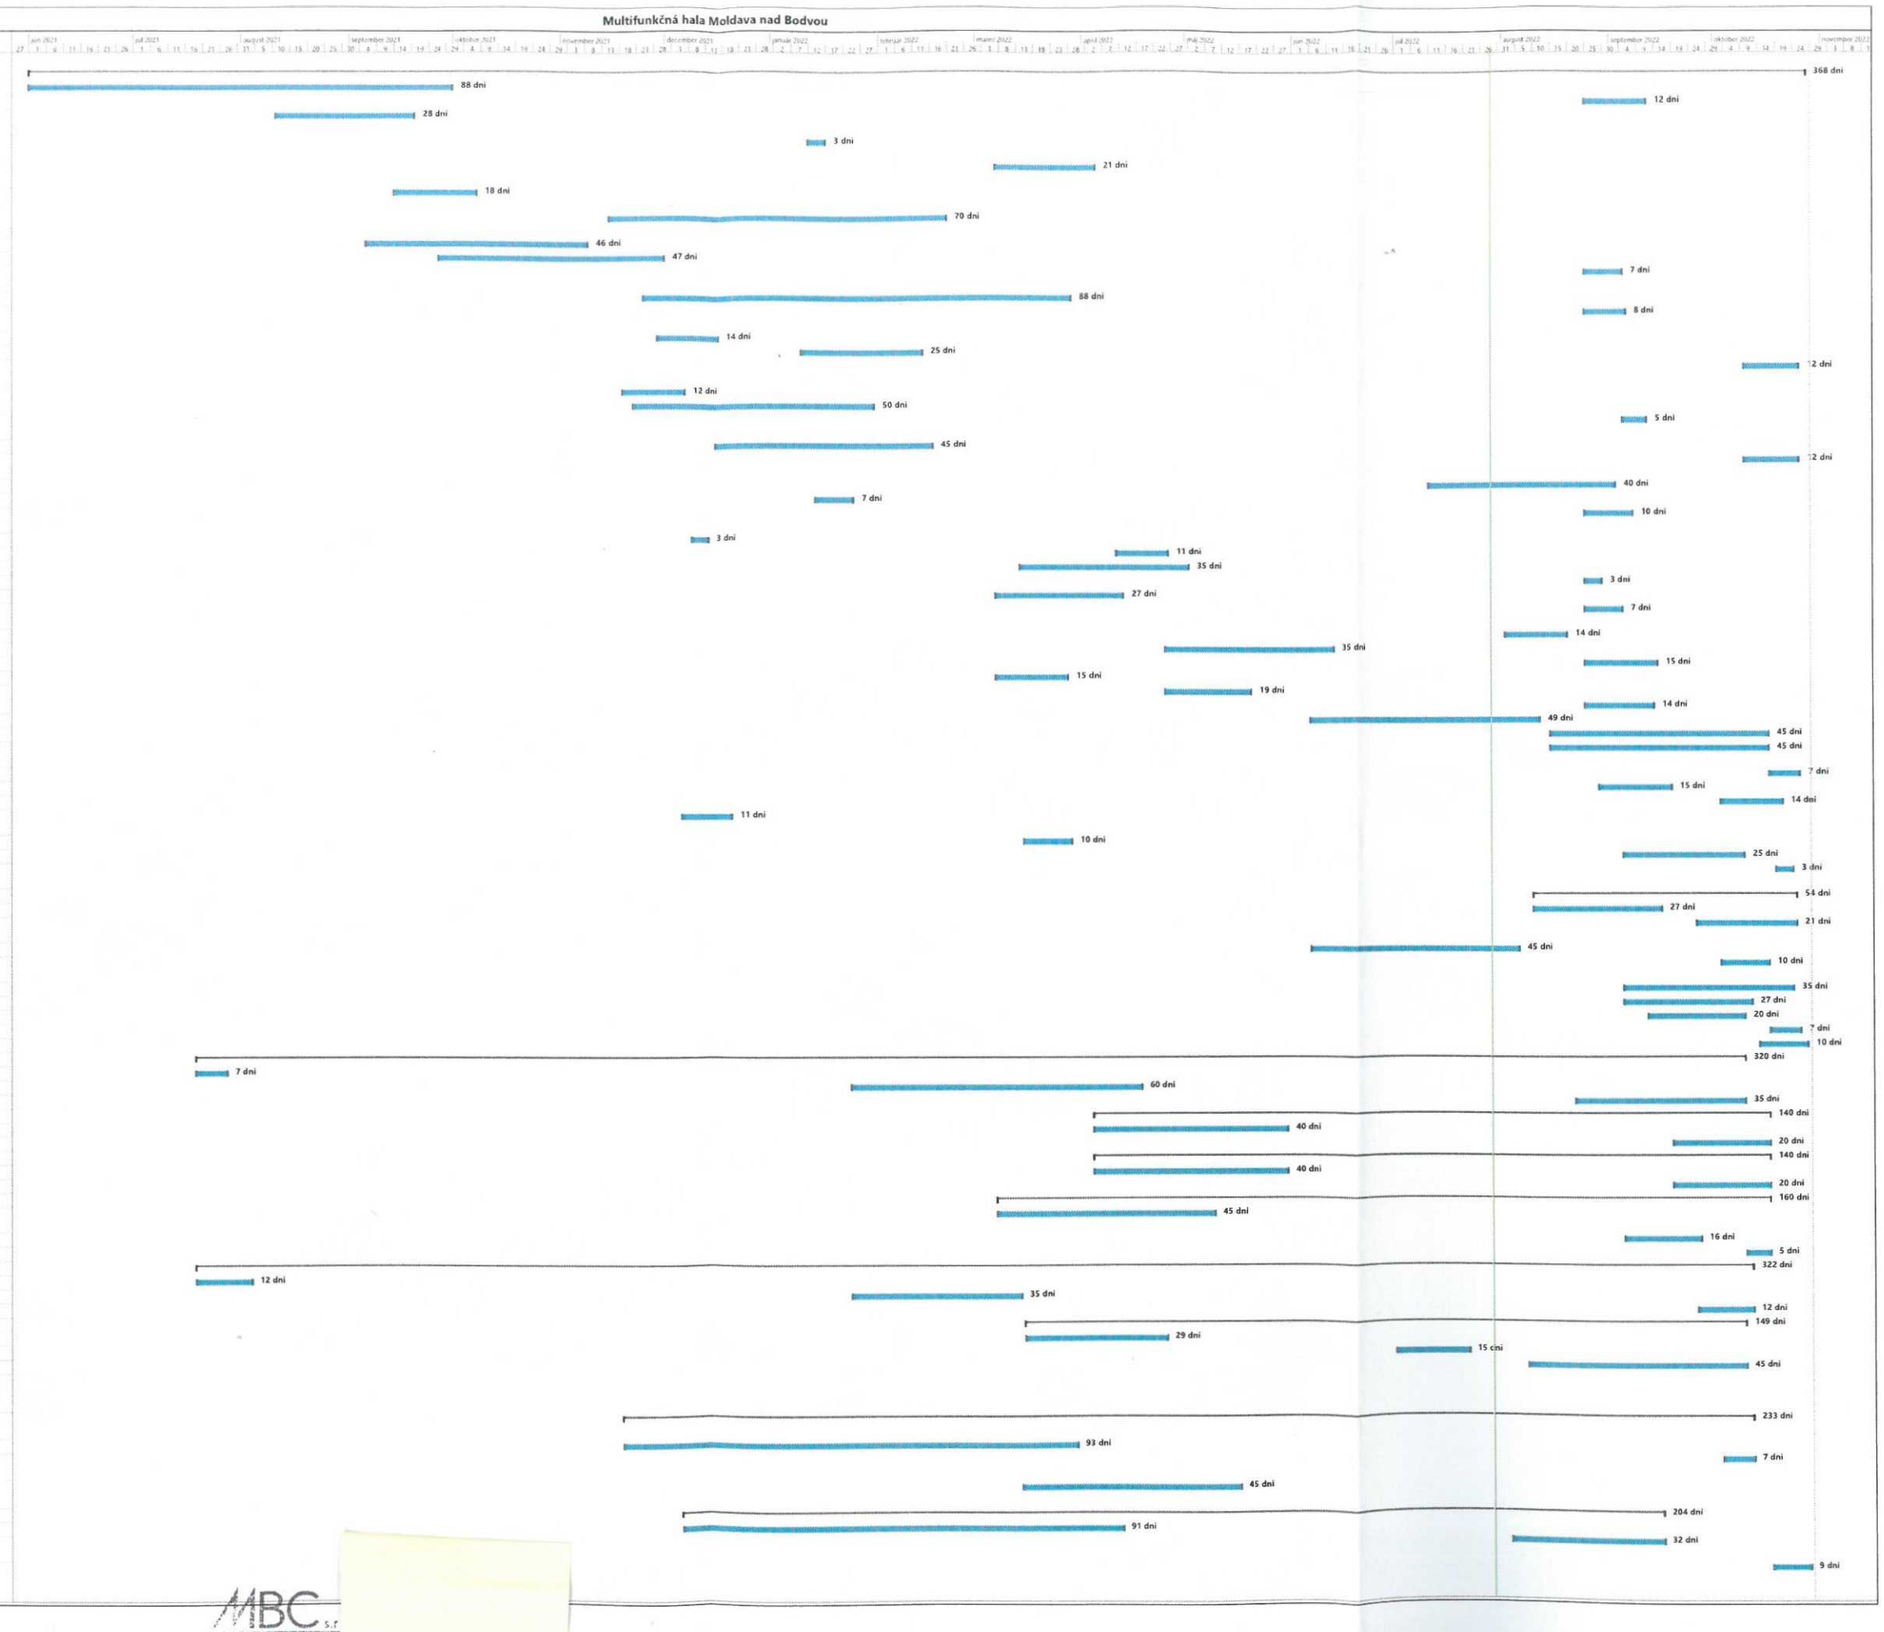

MBC s.r

MION BUILDI
COMPANY s
