	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	**Lineárny Urychlovač Nitra**	**170 dní?**	**Po 10.1.22**	**Str 31.8.22**
2	**SO_01 LU**	**146 dní**	**Po 10.1.22**	**So 30.7.22**
3	PRÁCE A DODÁVKY HSV	145 dní	Po 10.1.22	Pi 29.7.22
4	0- Vytýčenie IS	3 dni	Po 10.1.22	Str 12.1.22
5	1- Zemné práce	7 dní	Št 13.1.22	Pi 21.1.22
6	2- Základy	19 dní	Str 19.1.22	Po 14.2.22
7	3- Zvislá a kompletná konštrukcia	44 dní	Št 10.2.22	Ut 12.4.22
8	4- Vodorovné konštrukcie	14 dní	Po 14.3.22	Št 31.3.22
9	5- Komunikácie	5,2 týždne	Pi 24.6.22	Pi 29.7.22
10	8- Úpravy povrchov, podlahy, výplne	88 dní	Pi 1.4.22	Pi 29.7.22
11	omietky	2 týždne	Po 18.5.22	Po 6.6.22
12	poter	4 dni	Ut 3.5.22	Po 9.5.22
13	oceľové zárubne	1 týždeň	Pi 1.4.22	Št 7.4.22
14	odkvapový chodník	5,2 týždne	Pi 24.6.22	Pi 29.7.22
15	9- Ostatné konštrukcie a práce	1 týždeň	Pi 1.4.22	Št 7.4.22
16	PRÁCE A DODÁVKY PSV	141 dní	Po 17.1.22	So 30.7.22
17	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1,5 týždne	Št 10.2.22	Po 21.2.22
18	712 - Povlakové krytiny	2 týždne	Str 13.4.22	Ut 26.4.22
19	713 - Izolácie tepelné	24,5 dní	Str 30.3.22	Ut 3.5.22
20	podlahová TI	7 dní	Pi 22.4.22	Ut 3.5.22
21	strešná TI	1 týždeň	Str 6.4.22	Ut 12.4.22
22	zvislé steny pod úrovňou terénu	5 dní	Str 30.3.22	Ut 5.4.22
23	721 - Vnútorná kanalizácia	127 dní?	Po 10.1.22	Ut 5.7.22
38	731 - Kotolňa	1 deň	Po 10.1.22	Po 10.1.22
39	732 - Rozvod potrubia	1,5 týždne	Str 13.4.22	Pi 22.4.22
40	762 - Konštrukcie tesárske	3 dni	Pi 1.4.22	Ut 5.4.22
41	763 - Konštrukcie - drevostavby	53,5 dní	Str 6.4.22	Po 20.6.22
42	strop SDK	2 týždne	Po 6.6.22	Po 20.6.22
43	steny, predstavy SDK	2 týždne	Str 6.4.22	Ut 19.4.22
44	764 - Konštrukcie klampiarske	1 týždeň	Str 27.4.22	Ut 3.5.22
45	766 - Konštrukcie stolárske	5,3 týždne	Pi 24.6.22	So 30.7.22
46	767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné	72,5 dní	Str 30.3.22	Pi 8.7.22
47	odvetrávaná fasáda	2 mesiace	Str 4.5.22	Ut 28.6.22
48	výplne otvorov	2,5 týždne	Str 30.3.22	Pi 15.4.22
49	interiér	1 týždeň	Pi 1.7.22	Pi 8.7.22
50	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 týždne	Po 16.5.22	Po 30.5.22
51	778 - Podlahy povlakové	1 týždeň	Pi 17.6.22	Pi 24.6.22
52	777 - Podlahy zo syntetických hmôt	4 dni	Po 6.6.22	Pi 10.6.22
53	epoxid	2 dni	Po 6.6.22	Str 8.6.22
54	Kivelit	4 dni	Po 6.6.22	Pi 10.6.22
55	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 týždne	Pi 10.6.22	Pi 24.6.22
56	783 - Nátery	87,5 dní	Str 6.4.22	Pi 8.7.22
57	kov. Stav. Doplň. Konšt	3 dni	Ut 5.7.22	Pi 8.7.22
58	rozvod kyslíka	2 dni	Pi 22.4.22	Ut 26.4.22
59	tesárske konštr.	4 dni	Str 6.4.22	Po 11.4.22
60	784 - Maľby	1 týždeň	Pi 24.6.22	Pi 1.7.22
61	785 - Tapety	2 dni	Pi 24.6.22	Ut 28.6.22
62	UK	54 dní	Pi 1.4.22	Str 15.6.22
63	713 - Izolácie tepelné	3 dni	Pi 15.4.22	Ut 19.4.22
64	732 - Ústredné kúrenie, strojovne	3 dni	Pi 1.4.22	Ut 5.4.22
65	733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 týždeň	Pi 8.4.22	Št 14.4.22
66	734 - Ústredné kúrenie, armatúry	3 dni	Pi 15.4.22	Ut 19.4.22
67	735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesa	1,5 týždne	Po 6.6.22	Str 15.6.22
68	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 týždeň	Pi 1.4.22	Št 7.4.22
69	783 - Dokončovacie práce - nátery	4 dni	Pi 15.4.22	Str 20.4.22
70	VZT	83 dní	Str 6.4.22	Pi 29.7.22
71	Zariadenie 1	8,7 týždňa	Ut 14.6.22	Pi 29.7.22
72	Zariadenie 2	7,8 týždňa	Str 6.4.22	Pi 29.7.22
73	ZTI	140 dní	Po 17.1.22	Pi 29.7.22
74	PRÁCE A DODÁVKY HSV	10 dní	Po 17.1.22	Pi 28.1.22
75	1- Zemné práce	4 dni	Po 17.1.22	Št 20.1.22
76	4- Vodorovné konštrukcie	5 dní	Po 24.1.22	Pi 28.1.22
77	8 - Rúrové vedenie	5 dní	Po 24.1.22	Pi 28.1.22
78	šachty	4 dni	Po 24.1.22	Št 27.1.22
79	potrubie	3 dni	Str 26.1.22	Pi 28.1.22
80	PRÁCE A DODÁVKY PSV	78 dní	Str 13.4.22	Pi 29.7.22
81	713 - Izolácie tepelné	1 týždeň	Št 21.4.22	Str 27.4.22
82	721 - Zdravotechnika vnútorná kanalizácia	56,5 dní	Str 13.4.22	Št 30.6.22
83	rozvody	1,5 týždne	Str 13.4.22	Pi 22.4.22
84	kompletiž	4 dni	Pi 24.6.22	Št 30.6.22
85	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	56,5 dní	Str 13.4.22	Št 30.6.22
86	rozvody	6 dní	Str 13.4.22	Str 20.4.22
87	kompletiž	4 dni	Pi 24.6.22	Št 30.6.22
88	725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	5,1 týždňa	Pi 24.6.22	Pi 29.7.22
89	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4,3 týždňa	Št 30.6.22	Pi 29.7.22
90	PRÁCE A DODÁVKY M	120 dní	Str 19.1.22	So 30.7.22
91	M21 - 155 Elektromontáže	120 dní	Str 19.1.22	So 30.7.22
92	NN	89 dní	Str 30.3.22	So 30.7.22
93	rozvody	3,5 týždňa	Str 30.3.22	Pi 22.4.22
94	kompletiž	2 týždne	Ut 19.7.22	So 30.7.22
95	slaboprúd	84 dní	Str 6.4.22	So 30.7.22
96	rozvody	2 týždne	Str 6.4.22	Ut 19.4.22
97	kompletiž	3 týždne	Ut 12.7.22	So 30.7.22
98	uzemnenie	77 dní	Str 13.4.22	Št 28.7.22
99	rozvody	1 týždeň	Str 13.4.22	Ut 19.4.22
100	kompletiž	3 dni	Ut 26.7.22	Št 28.7.22
101	blesozvod	74 dní	Str 19.1.22	Po 2.5.22
102	pod terénom	1 týždeň	Str 19.1.22	Ut 25.1.22
103	nad terénom	1 týždeň	Pi 1.4.22	Št 7.4.22
104	kompletiž	4 dni	Str 27.4.22	Po 2.5.22
105	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní	1 týždeň	Pi 22.7.22	Pi 29.7.22
106	M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	1,5 týždne	Po 18.7.22	Str 27.7.22
107	**SO_02 stavebné úpravy na jestvujúcich objektoch (postup sa podriadi potrebám**	120 dní	Št 13.1.22	Str 29.6.22
132	SO_03 preložka areáloveho rozvodu STL plynu	1 týždeň	Ut 18.1.22	Po 24.1.22
133	SO_04 spevnené plochy, chodník	5,6 týždne	Str 22.6.22	Pi 29.7.22
134	sadové úpravy	24 dní	Pi 15.7.22	Po 15.8.22
135	čistenie stavby	25 dní	So 30.7.22	Str 31.8.22

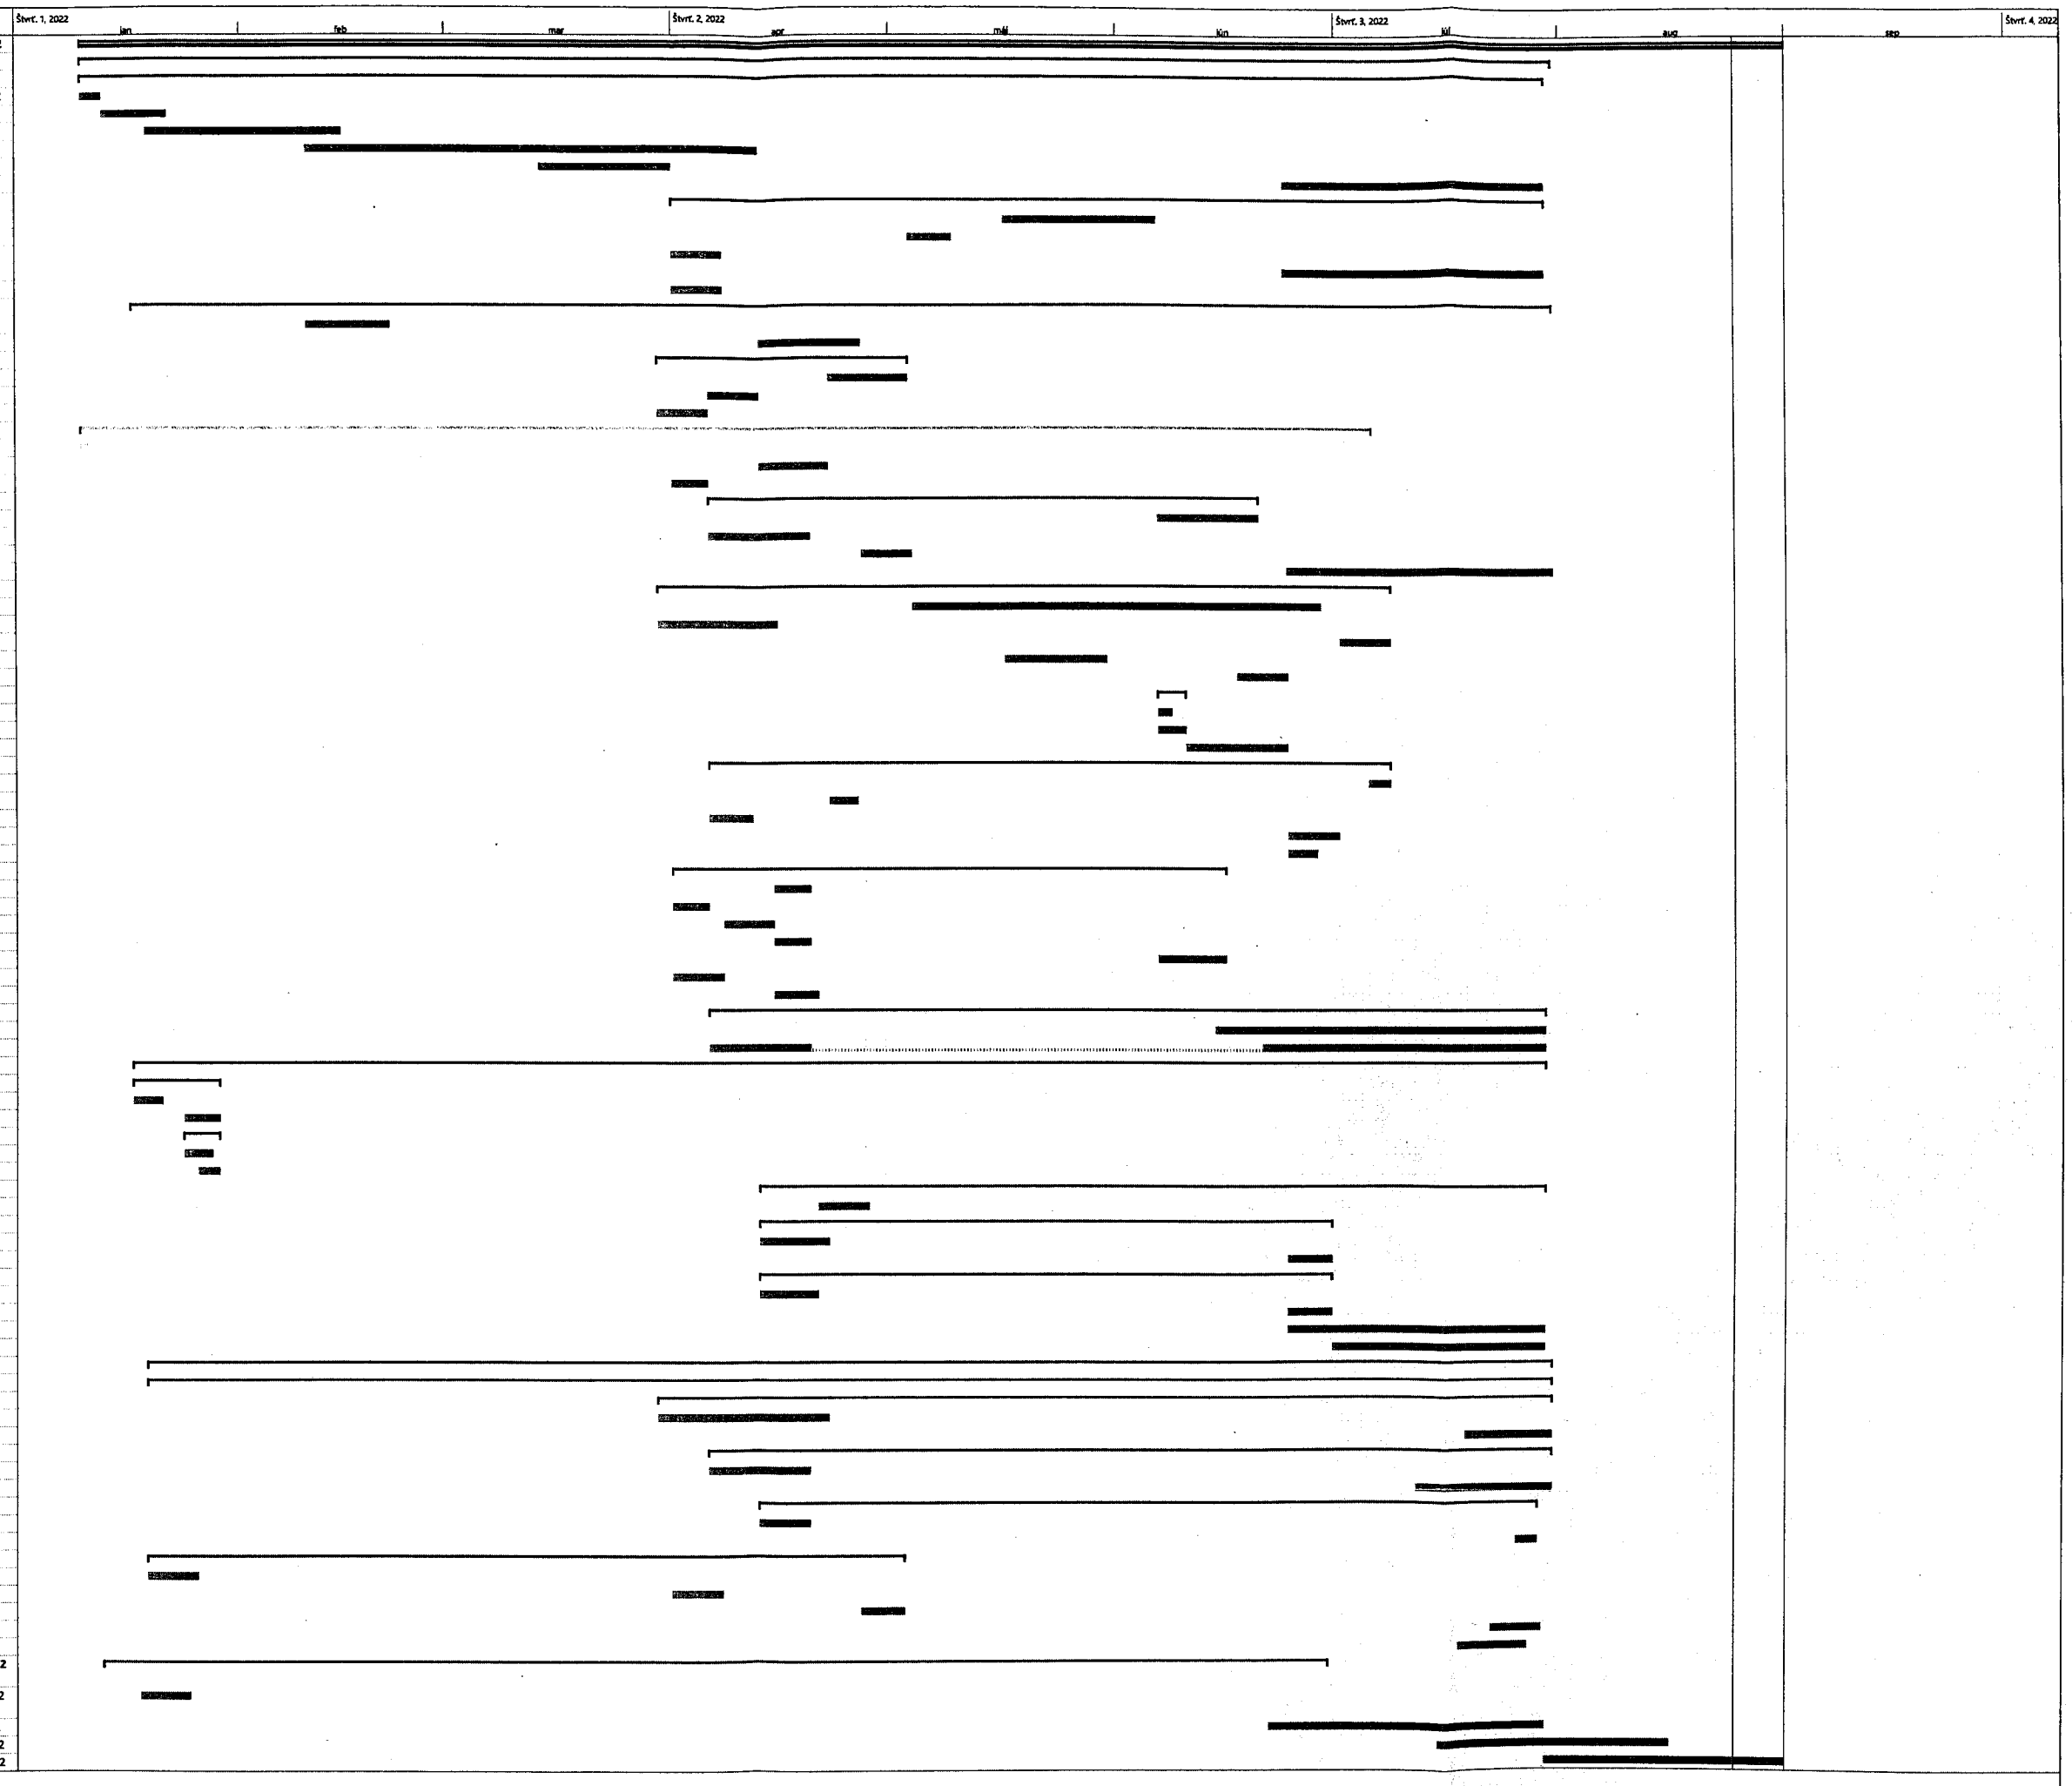

Projekt: HMG_LU_Nitra_2.kolo_p
Dátum: Št 25.8.22

Úloha · Medzník · Súhrn projektu · Neaktívny medzník · Manuálna úloha · Manuálny súhrn · Iba začiatok · Externé úlohy · Termín · Kritická rozdelenie · Manuálny priebeh
Rozdeliť · Súhrn · Neaktívna úloha · Neaktívny súhrn · Iba trvanie · Manuálny súhrn · Iba dokončiť · Externý medzník · Kritická · Priebeh
