Príloha č. 2

Stavba: MŠ ul. Ľ. Štúra, Vybudovanie zelenej strechy_II

Zhotoviteľ: R.J.R., s.r.o., Snina
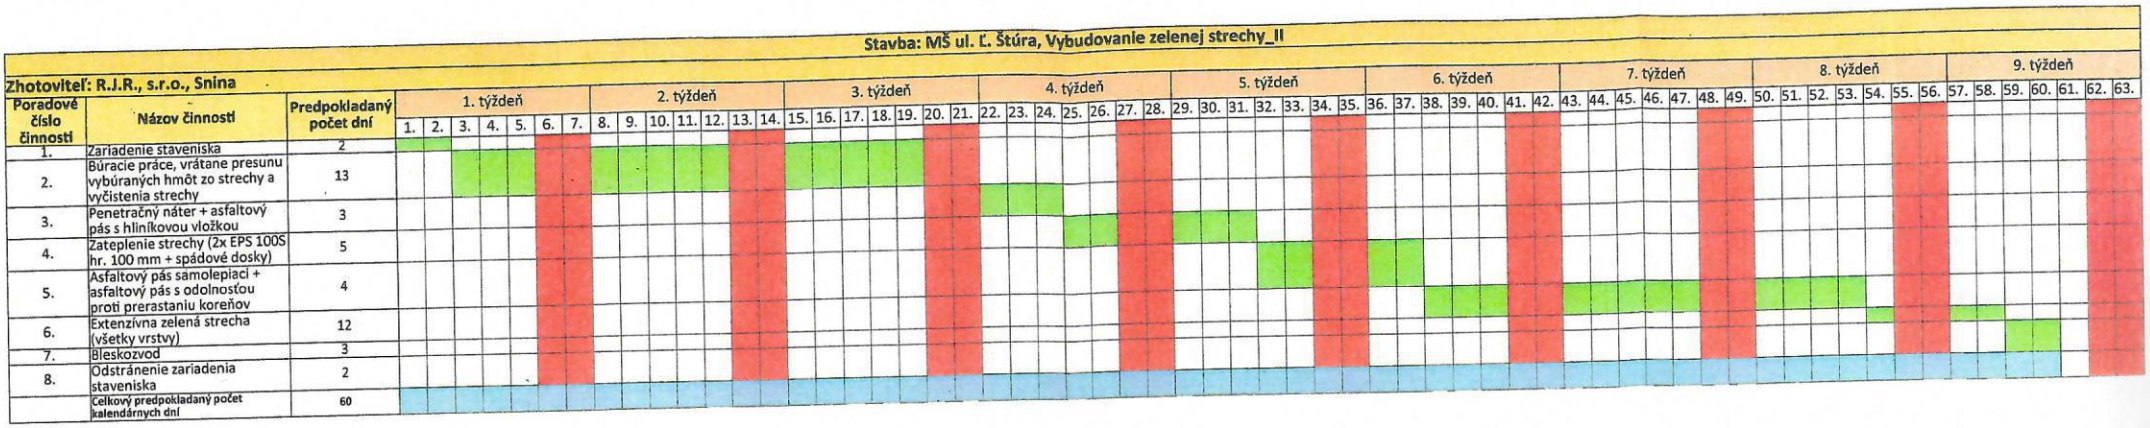
Poradové číslo činnosti	Názov činnosti	Predpokladaný počet dní
1.	Zariadenie staveniska	2
2.	Búracie práce, vrátane presunu vybúraných hmôt zo strechy a vyčistenia strechy	13
3.	Penetračný náter + asfaltový pás s hliníkovou vložkou	3
4.	Zateplenie strechy (2x EPS 100S hr. 100 mm + spádové dosky)	5
5.	Asfaltový pás samolepiaci + asfaltový pás s odolnosťou proti prerastaniu koreňov	4
6.	Extenzívna zelená strecha (všetky vrstvy)	12
7.	Bleskozvod	3
8.	Odstránenie zariadenia staveniska	2
	Celkový predpokladaný počet kalendárnych dní	60
