Identifikátor	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchod	Text10	Text1
1		*Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava*	*179 dni*	*Po 17.4.2*	*Št 21.12.2*		*Nasadenie strojov*	*Nasadenie pracovníkov*
2		***SO 01 Ručne stierané hrablice***	***21 dní***	***Št 24.8.23***	***Št 21.9.23***			
3		*Hĺbenie jám a rýh*	*2 dni*	*Št 24.8.23*	*Pi 25.8.23*	*76*	*1xJCB, 1x nákladný automobil*	*1xstrojník, 1vodič2xst.robotník*
4		*Základové dosky a pásy*	*2 dni*	*Po 28.8.23*	*Ut 29.8.23*	*3*	*autodomiešavač+ čerpadlo*	*2x betonár*
5		*Debnenie dosiek a pásov*	*2 dni*	*Str 30.8.23*	*Št 31.8.23*	*4*	*drobná mechanizácia*	*2xstavebný robotník*
6		*Výstuž*	*1 deň*	*Pi 1.9.23*	*Pi 1.9.23*	*5*	*drobná mechanizácia*	*1x viazač výstuže*
7		*Debnenie múrov*	*5 dní*	*Po 4.9.23*	*Pi 8.9.23*	*6*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
8		*Výstuž múrov*	*1 deň*	*Po 11.9.23*	*Po 11.9.23*	*7*	*ohýbačka výstuže*	*1x viazač výstuže*
9		*Betonáž múrov*	*1 deň*	*Ut 12.9.23*	*Ut 12.9.23*	*8*	*autodomiešavač+čerpadlo*	*2x betonár*
10		*oddebnenie múrov*	*1 deň*	*Str 13.9.23*	*Str 13.9.23*	*9*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
11		*betonáž stupňov*	*1 deň*	*Št 14.9.23*	*Št 14.9.23*	*10*	*drobná mechanizácia*	*2x betonár*
12		*Mazanina+výstuž*	*2 dni*	*Str 20.9.23*	*Št 21.9.23*	*14*	*autodomiešavač+čerpadlo*	*2x betonár,1x viazač výstuže*
13		*Násyp zo Štrkopiesku*	*1 deň*	*Pi 15.9.23*	*Pi 15.9.23*	*11*	*1x UNC*	*1xstrojník,1xstav.robotník*
14		*Osadenie roštu a uholníkov*	*2 dni*	*Po 18.9.23*	*Ut 19.9.23*	*13*	*drobná mechanizácia*	*2xzámočník*
15		***SO 02 Stavebné úpravy existujúcej ČOV***	***17 dní***	***Po 17.4.23***	***Ut 9.5.23***			
16		*Odkopávky*	*1 deň*	*Po 17.4.23*	*Po 17.4.23*		*1xJCB, 1x nákladný automobil*	*1xstrojník, 1vodič2xst.robotník*
17		*Základové pätky*	*1 deň*	*Ut 18.4.23*	*Ut 18.4.23*	*16*	*autodomiešavač+ čerpadlo*	*2x betonár*
18		*Oprava vnútorných omietok*	*8 dní*	*Str 19.4.23*	*Pi 28.4.23*	*17*	*drobná mechanizácia*	*2x murár-omietač*
19		*Oprava vonkajších omietok*	*5 dní*	*Ut 2.5.23*	*Po 8.5.23*	*20*	*drobná mechanizácia*	*2x murár-omietač*
20		*Mazanina +výstuž*	*1 deň*	*Po 1.5.23*	*Po 1.5.23*	*18*	*autodomiešavač+ čerpadlo*	*2x betonár*
21		*Násyp zo Štrkopiesku*	*1 deň*	*Po 17.4.23*	*Po 17.4.23*	*18SS-2 d*	*1x UNC*	*1xstrojník,1xstav.robotník*
22		*Vybúranie okien a dverí*	*1 deň*	*Po 1.5.23*	*Po 1.5.23*	*18*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
23		*Osekanie omietky*	*1 deň*	*Ut 2.5.23*	*Ut 2.5.23*	*22*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
24		*Zateplenie venca*	*1 deň*	*Po 1.5.23*	*Po 1.5.23*	*18*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
25		*Montáž odpadových rúr*	*1 deň*	*Ut 2.5.23*	*Ut 2.5.23*	*24*	*drobná mechanizácia*	*1x klampiar*
26		*Montáž dverí*	*1 deň*	*Ut 2.5.23*	*Ut 2.5.23*	*22*	*drobná mechanizácia*	*1x stolár*
27		*Montáž dverí, schodiska a prístrešku pre dúchadlo*	*1 deň*	*Str 3.5.23*	*Str 3.5.23*	*26*	*drobná mechanizácia*	*2x zámočník*
28		*Náter strechy*	*3 dni*	*Št 4.5.23*	*Po 8.5.23*	*27*	*drobná mechanizácia*	*2x maliar-natierač*
29		*náter tesárskch konštr*	*1 deň*	*Po 1.5.23*	*Po 1.5.23*	*26SS-1 d*	*drobná mechanizácia*	*2x maliar-natierač*
30		*Maľba interieru*	*5 dní*	*Ut 2.5.23*	*Po 8.5.23*	*29*	*drobná mechanizácia*	*2x maliar-natierač*
31		*Montáž rozvodov elektro*	*2 dni*	*Po 1.5.23*	*Ut 2.5.23*	*18*	*drobná mechanizácia*	*2x elektrikár*
32		*Montáž vypínačov, svietidiel, zásuviek*	*1 deň*	*Ut 9.5.23*	*Ut 9.5.23*	*30*	*drobná mechanizácia*	*2xelektrikár*
33		***SO 03 Budova membránovej technológie***	***82 dní***	***Str 10.5.23***	***Št 31.8.23***			
34		*Hĺbenie jám a rýh*	*1 deň*	*Str 10.5.23*	*Str 10.5.23*	*32*	*1xJCB, 1x nákladný automobil*	*1xstrojník, 1vodič2xst.robotník*
35		*debnenie základových dosiek a pásov*	*3 dni*	*Št 11.5.23*	*Po 15.5.23*	*34*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
36		*Betonáž dosiek a pásov*	*1 deň*	*Ut 16.5.23*	*Ut 16.5.23*	*35*	*autodomiešavač+ čerpadlo*	*2x betonár*
37		*Výstuž dosiek*	*1 deň*	*Ut 16.5.23*	*Ut 16.5.23*	*35*	*ohýbačka výstuže*	*2x viazač výstuže*
38		*Oddebnenie dosky a pásov*	*1 deň*	*Str 17.5.23*	*Str 17.5.23*	*36*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
39		*Murivo Heluz+ preklady*	*10 dní*	*Št 18.5.23*	*Str 31.5.23*	*38*	*drobná mechanizácia*	*3x murár*
40		*Debnenie múrov*	*10 dní*	*Št 1.6.23*	*Str 14.6.23*	*39*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
41		*Betonáž múrov+výstuž*	*2 dni*	*Št 15.6.23*	*Pi 16.6.23*	*40*	*autodomiešavač+ čerpadlo*	*2xbetonár2xst.robotník*
42		*Oddebnenie múrov*	*3 dni*	*Po 19.6.23*	*Str 21.6.23*	*41*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
43		*Debnenie prekladov*	*1 deň*	*Št 22.6.23*	*Št 22.6.23*	*42*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
44		*betonáž+výstuž prekladov*	*1 deň*	*Pi 23.6.23*	*Pi 23.6.23*	*43*	*autodomiešavač+ čerpadlo*	*2xbetonár2xst.robotník*
45		*Oddebnenie prekladov*	*1 deň*	*Po 26.6.23*	*Po 26.6.23*	*44*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
46		*Prímurovka*	*3 dni*	*Ut 27.6.23*	*Št 29.6.23*	*45*	*drobná mechanizácia*	*2x murár*
47		*Debnenie vencov+zateplenie*	*3 dni*	*Pi 30.6.23*	*Ut 4.7.23*	*46*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
48		*Betonáž vencov+výstuž*	*1 deň*	*Str 5.7.23*	*Str 5.7.23*	*47*	*autodomiešavač+ čerpadlo*	*2xbetonár2xviazač výstuže*
49		*Oddebnenie vencov*	*1 deň*	*Št 6.7.23*	*Št 6.7.23*	*48*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
50		*Debnenie stropu*	*5 dní*	*Pi 7.7.23*	*Št 13.7.23*	*49*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
51		*Betonáž+výstuž stropu*	*2 dni*	*Pi 14.7.23*	*Po 17.7.23*	*50*	*autodomiešavač+ čerpadlo*	*2xbetonár2xviazač výstuže*
52		*Oddebnenie stropu*	*1 deň*	*Ut 18.7.23*	*Ut 18.7.23*	*51*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
53		*Omietka stropov a stien*	*10 dní*	*Str 19.7.23*	*Ut 1.8.23*	*52*	*drobná mechanizácia*	*2x murár-omietač*
54		*Omietka vonkajšia*	*8 dní*	*Pi 4.8.23*	*Ut 15.8.23*	*57*	*drobná mechanizácia*	*2x murár-omietač*
55		*Mazanina+výstuž*	*1 deň*	*Str 2.8.23*	*Str 2.8.23*	*53*	*autodomiešavač+ čerpadlo*	*2xbetonár2xviazač výstuže*
56		*Poter*	*1 deň*	*Št 3.8.23*	*Št 3.8.23*	*55*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
57		*Montáž lešenia*	*2 dni*	*Str 2.8.23*	*Št 3.8.23*	*53*	*drobná mechanizácia*	*2x lešenár*
58		*Demontáž lešenia*	*2 dni*	*Str 30.8.23*	*Št 31.8.23*	*53SS+30*	*drobná mechanizácia*	*2xlešenár*
59		*Izolácia Fatrafol*	*1 deň*	*Pi 23.6.23*	*Pi 23.6.23*	*46SS-2 d*	*drobná mechanizácia*	*2x izolatér*
60		*Izolácia strechy fatrafolom*	*2 dni*	*Po 24.7.23*	*Ut 25.7.23*	*61*	*drobná mechanizácia*	*2x izolatér*
61		*Izolácia strechy spádovými doskami*	*1 deň*	*Pi 21.7.23*	*Pi 21.7.23*	*62*	*drobná mechanizácia*	*2x izolatér*
62		*Montáž krovy a debnenia*	*5 dní*	*Pi 14.7.23*	*Št 20.7.23*	*50*	*autožeriav*	*5x tesár*
63		*Montáž dreveného obkladu*	*2 dni*	*Pi 21.7.23*	*Po 24.7.23*	*62*	*drobná mechanizácia*	*2xtesár*
64		*Montáž okapnice, žlabov a zvodov*	*3 dni*	*Pi 21.7.23*	*Ut 25.7.23*	*62*	*drobná mechanizácia*	*2x klampiar*
65		*Montáž krytiny z trapezového plechu*	*3 dni*	*Pi 21.7.23*	*Ut 25.7.23*	*62*	*autožeriav*	*3x pokrývač*
66		*Montáž poklopov*	*1 deň*	*Št 3.8.23*	*Št 3.8.23*	*55*	*drobná mechanizácia*	*2xzámočník*
67		*Montáž okien a dverí+parapet*	*1 deň*	*Pi 14.7.23*	*Pi 14.7.23*	*53SS-3 d*	*drobná mechanizácia*	*2x stolár*
68		*Montáž dlažby*	*3 dni*	*Pi 4.8.23*	*Ut 8.8.23*	*56*	*drobná mechanizácia*	*2x dláždič*
69		*Maľba interieru*	*5 dní*	*Str 9.8.23*	*Ut 15.8.23*	*68*	*drobná mechanizácia*	*2x maliar-natierač*
70		*Montáž rozvodov elektro*	*5 dní*	*Št 1.6.23*	*Str 7.6.23*	*39SS+10*	*drobná mechanizácia*	*2xelektrikár*
71		*Montáž vypínačov, svietidiel, zásuviek*	*3 dni*	*Str 16.8.23*	*Pi 18.8.23*	*69*	*drobná mechanizácia*	*2xelektrikár*
72		***SO 04 Prepojovacie potrubia***	***4 dni***	***Po 21.8.23***	***Št 24.8.23***			
73		*Výkop, rýh,paženie odvoz prebytočnej zeminy*	*3 dni*	*Po 21.8.23*	*Str 23.8.23*	*71*	*1xJCB, 1x nákladný automobil*	*1xstrojník, 1vodič2xst.robotník*
74		*Murivo z DT tvárnic*	*1 deň*	*Št 24.8.23*	*Št 24.8.23*	*73*	*drobná mechanizácia*	*1x murár*
75		*Lôžko pod potrubie+podkladové dosky z betónu*	*3 dni*	*Po 21.8.23*	*Str 23.8.23*	*71*	*UNC+drob mechanizácia*	*1xstrojník+1x st.robotník*
76		*Montáž potrubia a šachietRúrové vedenia*	*3 dni*	*Po 21.8.23*	*Str 23.8.23*	*71*	*drobná mechanizácia*	*2xmontér potrubia*
77		***SO 05 Areálové spevnené plochy***	***4 dni***	***Str 20.9.23***	***Po 25.9.23***			
78		*Hutnenie podložia*	*1 deň*	*Str 20.9.23*	*Str 20.9.23*	*14*	*valec*	*1x strojník*
79		*Podklad z kameniva*	*2 dni*	*Št 21.9.23*	*Pi 22.9.23*	*78*	*1xJCB s planírovacou lyžicou*	*1x strojník, 1x stav.robotník*
80		*Osadenie cestných panelov*	*1 deň*	*Po 25.9.23*	*Po 25.9.23*	*79*	*žeriav*	*1x strojník,1x stav. Robotník*
81		***SO 06 Oplotenie a terénne úpravy***	***8 dní***	***Ut 26.9.23***	***Št 5.10.23***			
82		*výkop jám pre stĺpiky*	*1 deň*	*Ut 26.9.23*	*Ut 26.9.23*	*80*	*drobná mechanizácia*	*2x stavebný robotník*
83		*Pätky pre stĺpiky*	*1 deň*	*Str 27.9.23*	*Str 27.9.23*	*82*	*drobná mechanizácia*	*2x betonár*
84		*Stupne z betónu*	*1 deň*	*Št 28.9.23*	*Št 28.9.23*	*83*	*drobná mechanizácia*	*2x betonár*
85		*Osadenie slpikov a vzpier*	*2 dni*	*Pi 29.9.23*	*Po 2.10.23*	*84*	*drobná mechanizácia*	*2x zámočník*
86		*Montáž oplotenia a brány*	*3 dni*	*Ut 3.10.23*	*Št 5.10.23*	*85*	*drobná mechanizácia*	*2x zámočník*
87		***PS Technológia***	***55 dní***	***Pi 6.10.23***	***Št 21.12.23***	***86***	***žeriav, drobná mechanizácia***	***3x montér technológia2xelektrik***
88								

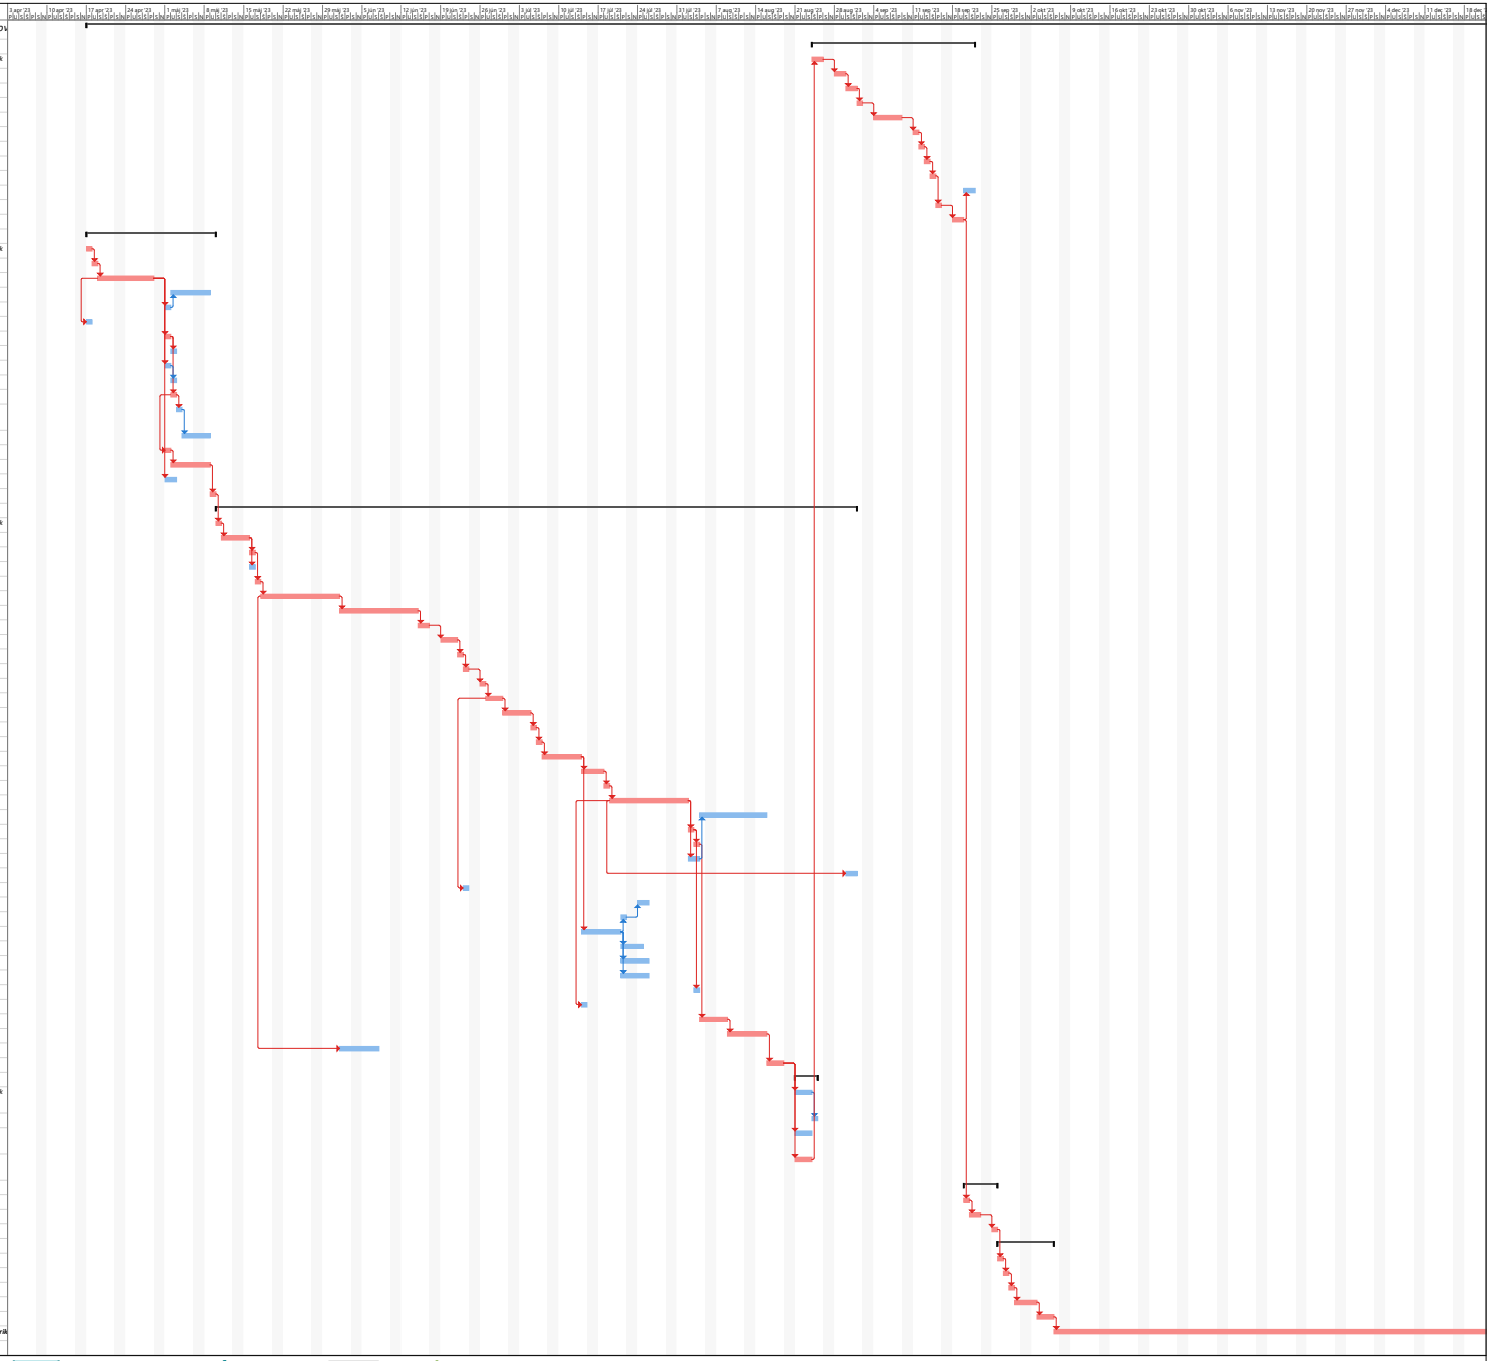

Projekt: Zvýšenie kapacity ČOV | Úloha | Rozdelé | Medzník | Súhrn | Súhrn projektu | Neaktívna úloha | Neaktívny medzník | Neaktívny súhrn | Manuálna úloha | Manuálny súhrn | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Iba dokončiť | Externé úlohy | Externý medzník | Termín | Kritické | Kritické rozdelenie | Priebeh | Manuálny priebeh
