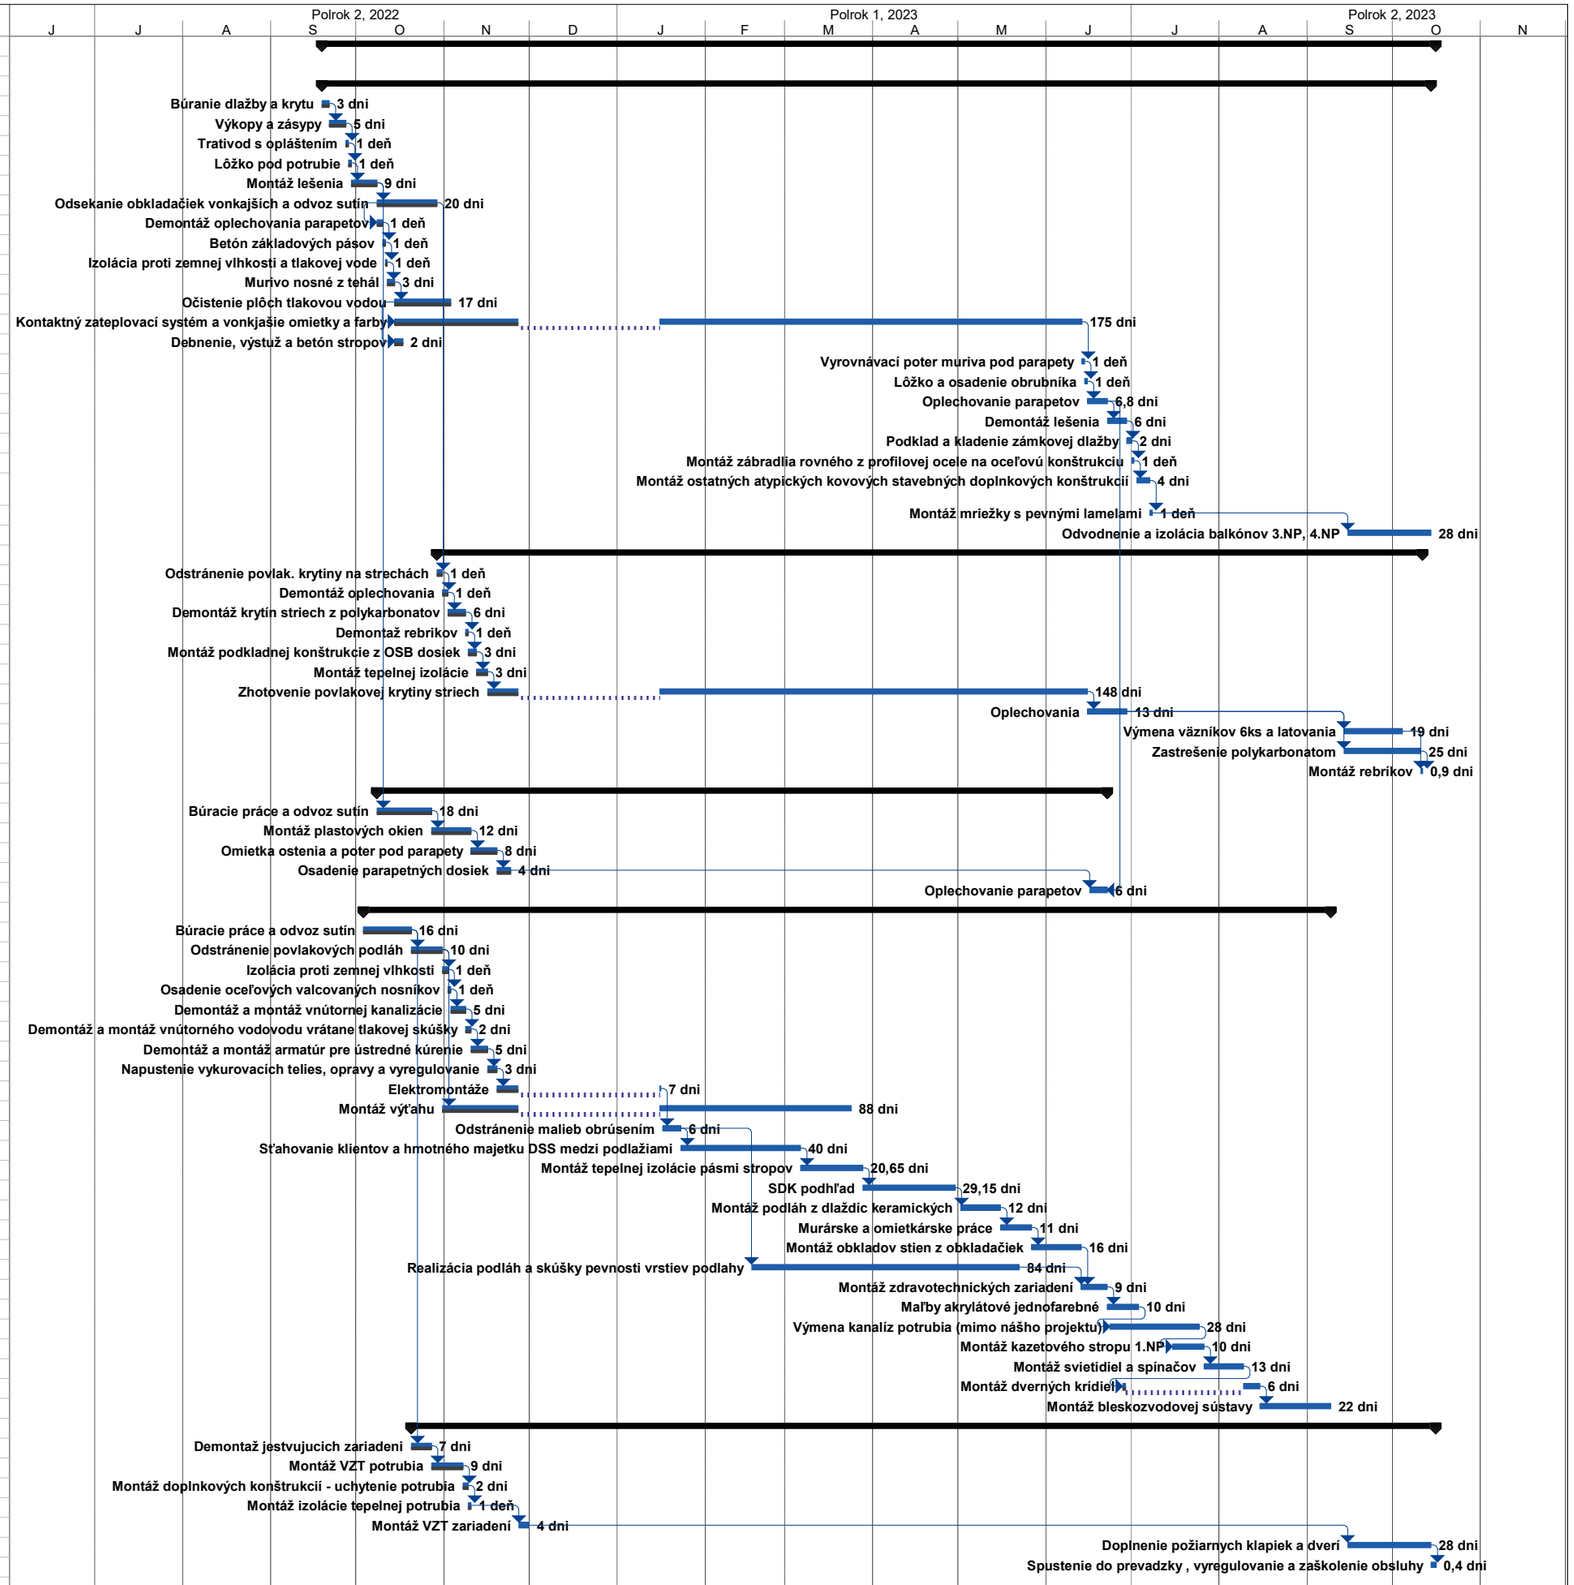Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	**DSS Jasanima**	**392 dni**	**19.9.22**	**16.10.23**
2	Začiatok výstavby	0 dni	19.9.22	19.9.22
3	**SO 01 - Zateplenie fasády**	**390,7 dni**	**19.9.22**	**14.10.23**
4	Búranie dlažby a krytu	3 dni	19.9.22	21.9.22
5	Výkopy a zásypy	5 dni	21.9.22	27.9.22
6	Trativod s opláštením	1 deň	27.9.22	28.9.22
7	Lôžko pod potrubie	1 deň	28.9.22	29.9.22
8	Montáž lešenia	9 dni	29.9.22	8.10.22
9	Odsekanie obkladačiek vonkajších a odvoz sutín	20 dni	8.10.22	29.10.22
10	Demontáž oplechovania parapetov	1 deň	8.10.22	10.10.22
11	Betón základových pásov	1 deň	10.10.22	11.10.22
12	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode	1 deň	11.10.22	11.10.22
13	Murivo nosné z tehál	3 dni	12.10.22	14.10.22
14	Očistenie plôch tlakovou vodou	17 dni	14.10.22	3.11.22
15	Kontaktný zateplovací systém a vonkjašie omietky a farby	175 dni	14.10.22	13.6.23
16	Debnenie, výstuž a betón stropov	2 dni	14.10.22	17.10.22
17	Vyrovnávací poter muriva pod parapety	1 deň	13.6.23	14.6.23
18	Lôžko a osadenie obrubníka	1 deň	14.6.23	15.6.23
19	Oplechovanie parapetov	6,8 dni	15.6.23	22.6.23
20	Demontáž lešenia	6 dni	22.6.23	29.6.23
21	Podklad a kladenie zámkovej dlažby	2 dni	29.6.23	1.7.23
22	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu	1 deň	1.7.23	1.7.23
23	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	4 dni	3.7.23	7.7.23
24	Montáž mriežky s pevnými lamelami	1 deň	7.7.23	8.7.23
25	Odvodnenie a izolácia balkónov 3.NP, 4.NP	28 dni	15.9.23	14.10.23
26	**SO 02 - Zateplenie strešného plášťa**	**347,4 dni**	**29.10.22**	**11.10.23**
27	Odstránenie povlak. krytiny na strechách	1 deň	29.10.22	31.10.22
28	Demontáž oplechovania	1 deň	31.10.22	2.11.22
29	Demontáž krytín striech z polykarbonatov	6 dni	2.11.22	8.11.22
30	Demontaž rebrikov	1 deň	8.11.22	9.11.22
31	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek	3 dni	9.11.22	12.11.22
32	Montáž tepelnej izolácie	3 dni	12.11.22	16.11.22
33	Zhotovenie povlakovej krytiny striech	148 dni	16.11.22	15.6.23
34	Oplechovania	13 dni	15.6.23	29.6.23
35	Výmena väzníkov 6ks a latovania	19 dni	14.9.23	4.10.23
36	Zastrešenie polykarbonatom	25 dni	14.9.23	10.10.23
37	Montáž rebríkov	0,9 dni	11.10.23	11.10.23
38	**SO 03 - Výmena okien**	**257,6 dni**	**8.10.22**	**22.6.23**
39	Búracie práce a odvoz sutín	18 dni	8.10.22	27.10.22
40	Montáž plastových okien	12 dni	27.10.22	10.11.22
41	Omietka ostenia a poter pod parapety	8 dni	10.11.22	19.11.22
42	Osadenie parapetných dosiek	4 dni	19.11.22	24.11.22
43	Oplechovanie parapetov	6 dni	16.6.23	22.6.23
44	**SO 04 - Interiérové úpravy**	**340,35 dni**	**3.10.22**	**9.9.23**
45	Búracie práce a odvoz sutín	16 dni	3.10.22	20.10.22
46	Odstránenie povlakových podláh	10 dni	20.10.22	31.10.22
47	Izolácia proti zemnej vlhkosti	1 deň	31.10.22	2.11.22
48	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov	1 deň	2.11.22	3.11.22
49	Demontáž a montáž vnútornej kanalizácie	5 dni	3.11.22	8.11.22
50	Demontáž a montáž vnútorného vodovodu vrátane tlakovej skúšky	2 dni	8.11.22	10.11.22
51	Demontáž a montáž armatúr pre ústredné kúrenie	5 dni	10.11.22	16.11.22
52	Napustenie vykurovacích telies, opravy a vyregulovanie	3 dni	16.11.22	19.11.22
53	Elektromontáže	7 dni	19.11.22	16.1.23
54	Montáž výťahu	88 dni	31.10.22	24.3.23
55	Odstránenie malieb obrúsením	6 dni	16.1.23	23.1.23
56	Sťahovanie klientov a hmotného majetku DSS medzi podlažiami	40 dni	23.1.23	6.3.23
57	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov	20,65 dni	6.3.23	28.3.23
58	SDK podhľad	29,15 dni	28.3.23	29.4.23
59	Montáž podláh z dlaždíc keramických	12 dni	2.5.23	15.5.23
60	Murárske a omietkárske práce	11 dni	15.5.23	26.5.23
61	Montáž obkladov stien z obkladačiek	16 dni	26.5.23	13.6.23
62	Realizácia podláh a skúšky pevnosti vrstiev podlahy	84 dni	17.2.23	22.5.23
63	Montáž zdravotechnických zariadení	9 dni	13.6.23	22.6.23
64	Maľby akrylátové jednofarebné	10 dni	22.6.23	3.7.23
65	Výmena kanalíz potrubia (mimo nášho projektu)	28 dni	23.6.23	24.7.23
66	Montáž kazetového stropu 1.NP	10 dni	15.7.23	26.7.23
67	Montáž svietidiel a spínačov	13 dni	26.7.23	9.8.23
68	Montáž dverných krídiel	6 dni	27.6.23	15.8.23
69	Montáž bleskozvodovej sústavy	22 dni	15.8.23	9.9.23
70	**SO 05 - Vzduchotechnika**	**360,8 dni**	**20.10.22**	**16.10.23**
71	Demontaž jestvujucich zariadeni	7 dni	20.10.22	27.10.22
72	Montáž VZT potrubia	9 dni	27.10.22	7.11.22
73	Montáž doplnkových konštrukcií - uchytenie potrubia	2 dni	7.11.22	9.11.22
74	Montáž izolácie tepelnej potrubia	1 deň	9.11.22	10.11.22
75	Montáž VZT zariadení	4 dni	27.11.22	30.11.22
76	Doplnenie požiarnych klapiek a dverí	28 dni	15.9.23	14.10.23
77	Spustenie do prevadzky , vyregulovanie a zaškolenie obsluhy	0,4 dni	14.10.23	16.10.23
78	Koniec výstavby	0 dni	16.10.23	16.10.23
