HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba

Dátum : 13.02.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
			101-00 - Úprava cesty III/3060		
			Náklady z rozpočtu		
1	K	113152350.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,500 t	m2	910,000
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	210,000
3	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	380,000
6	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	985,000
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 644,000
10	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 150,000
	D	5	Komunikácie		
11	K	56483110	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 450 mm	m2	1 644,000
17	K	577134271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 100,000
26	K	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m	m	219,000
29	K	914001110	Dodávka , osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky - komplet	ks	2,000
30	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	114,000
36	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	27,000
			102-00 - Chodníky pre peších		
1	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	200,000
2	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	200,000
4	K	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	111,000
5	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	74,000
7	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	82,000
			103-00 - Dočasná komunikácia k zariadeniu staveniska		
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	259,000
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	350,000
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	340,000
6	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	1 332,000
8	K	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	710,000

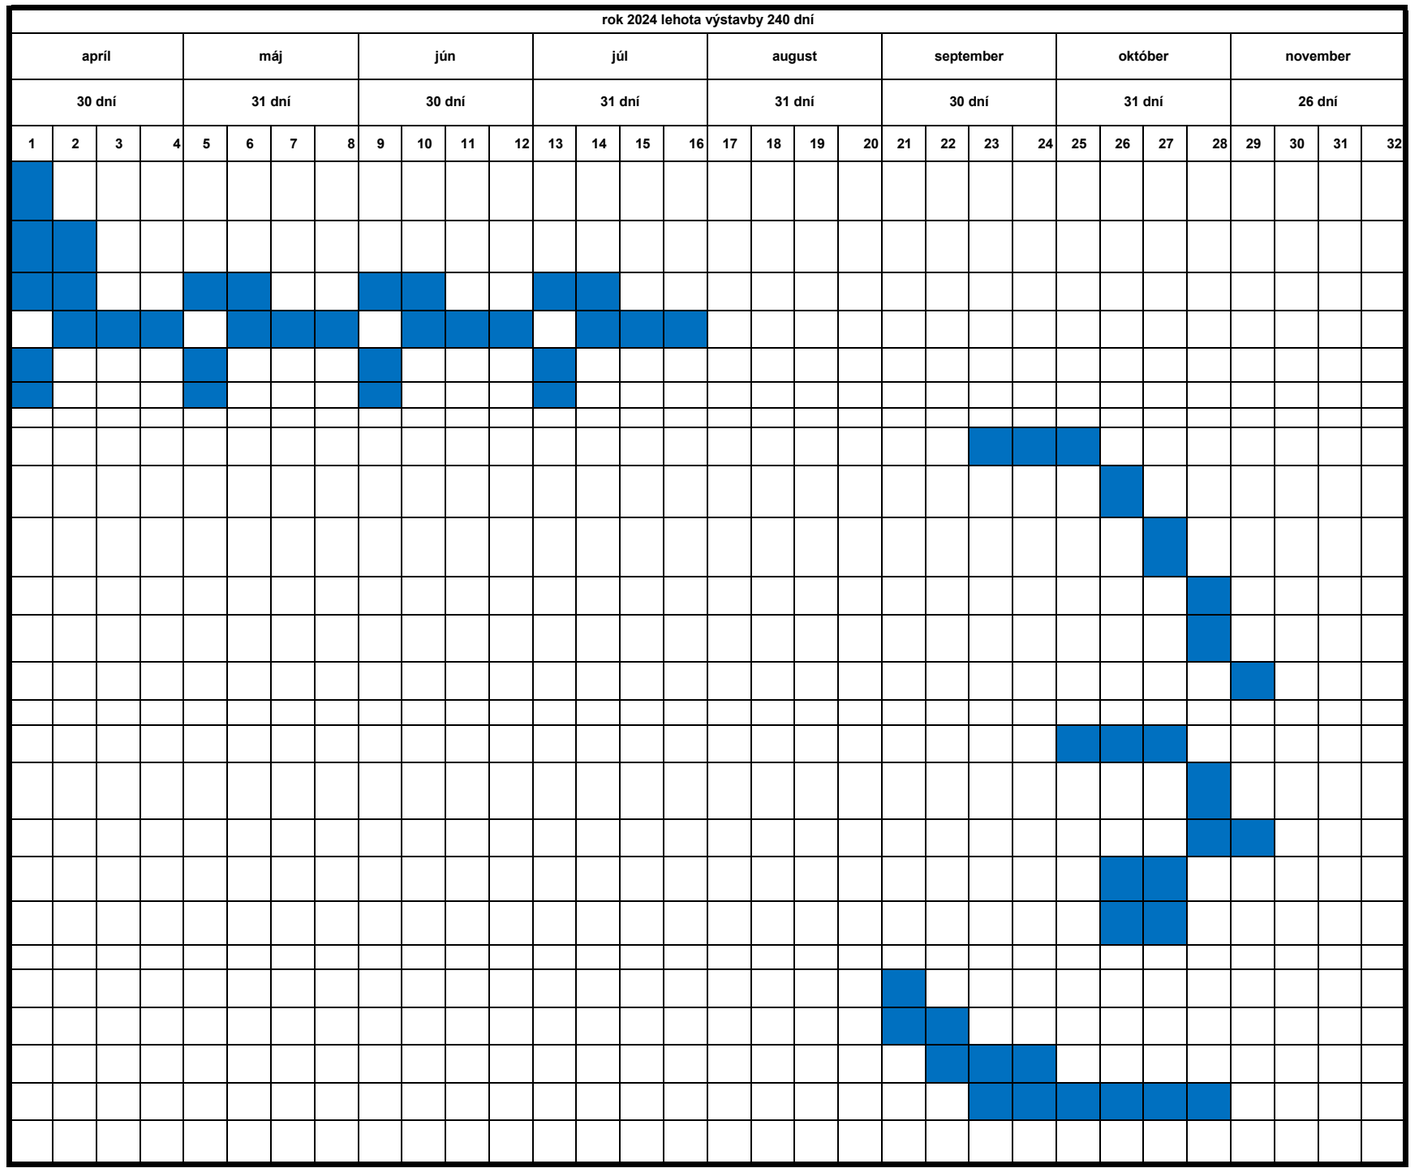

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
	D	5	Komunikácie		
11	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	259,000
12	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	194,000
14	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	65,000
19	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	81,000
21	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	114,000
			200-00 - Rekonštrukcia mostného objektu M6579		
	D	1	Zemné práce		
1	K	113106121.S	Prístupová komunikácia do koľajiska s panelovou plochou	m2	140,000
2	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	202,520
3	K	113152350.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,500 t	m2	202,520
4	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	66,500
6	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	766,800
19	K	264222113.S	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine II	m	352,000
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie		
20	K	317141110	Dodávka a osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m , komplet	m	56,110
22	K	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	21,380
26	K	334323129.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45	m3	123,440
27	K	334323139.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 35/45	m3	123,560
	D	4	Vodorovné konštrukcie		
35	K	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	15,392
36	K	421321239.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	159,036
43	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	kpl	2,000
46	K	458501112.S	Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	405,120
	D	5	Komunikácie		
52	K	577134271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	210,410
54	K	594611111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka zo štrkopiesku	m2	183,000
55	K	871264200.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 100	m	113,100
56	K	911334110	Zvodidlo oceľové mostné	m	56,120
63	K	936943130	Montáž odvodnenia mosta	m	28,000
			STAVBA PIŽMA		
66	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu -2,40000t	m3	215,800
81	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	521,595
83	K	430110000	Cestné mosty plnostenné,oceľové	t	42,460
			620-00 - Verejné osvetlenie chodníka		
19	K	210204002.S	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	6,000
24	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	140,000
37	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	125,000
41	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	125,000
			670-00 - Zriadenie neutrálneho poľa trakčného vedenia		
			671-00 - Uprava trakčného vedenia ZSR		
			672-00 - Preložka 6kV kábla ZSR		

TRATOVÉ VÝLUKY

KOĽAJ K1 / PREDPOKLAD HODÍN VÝLUKY	HODINY / DNI VÝLUK V DANOM TÝŽDNI
KOĽAJ K2 / PREDPOKLAD HODÍN VÝLUKY	HODINY / DNI VÝLUK V DANOM TÝŽDNI

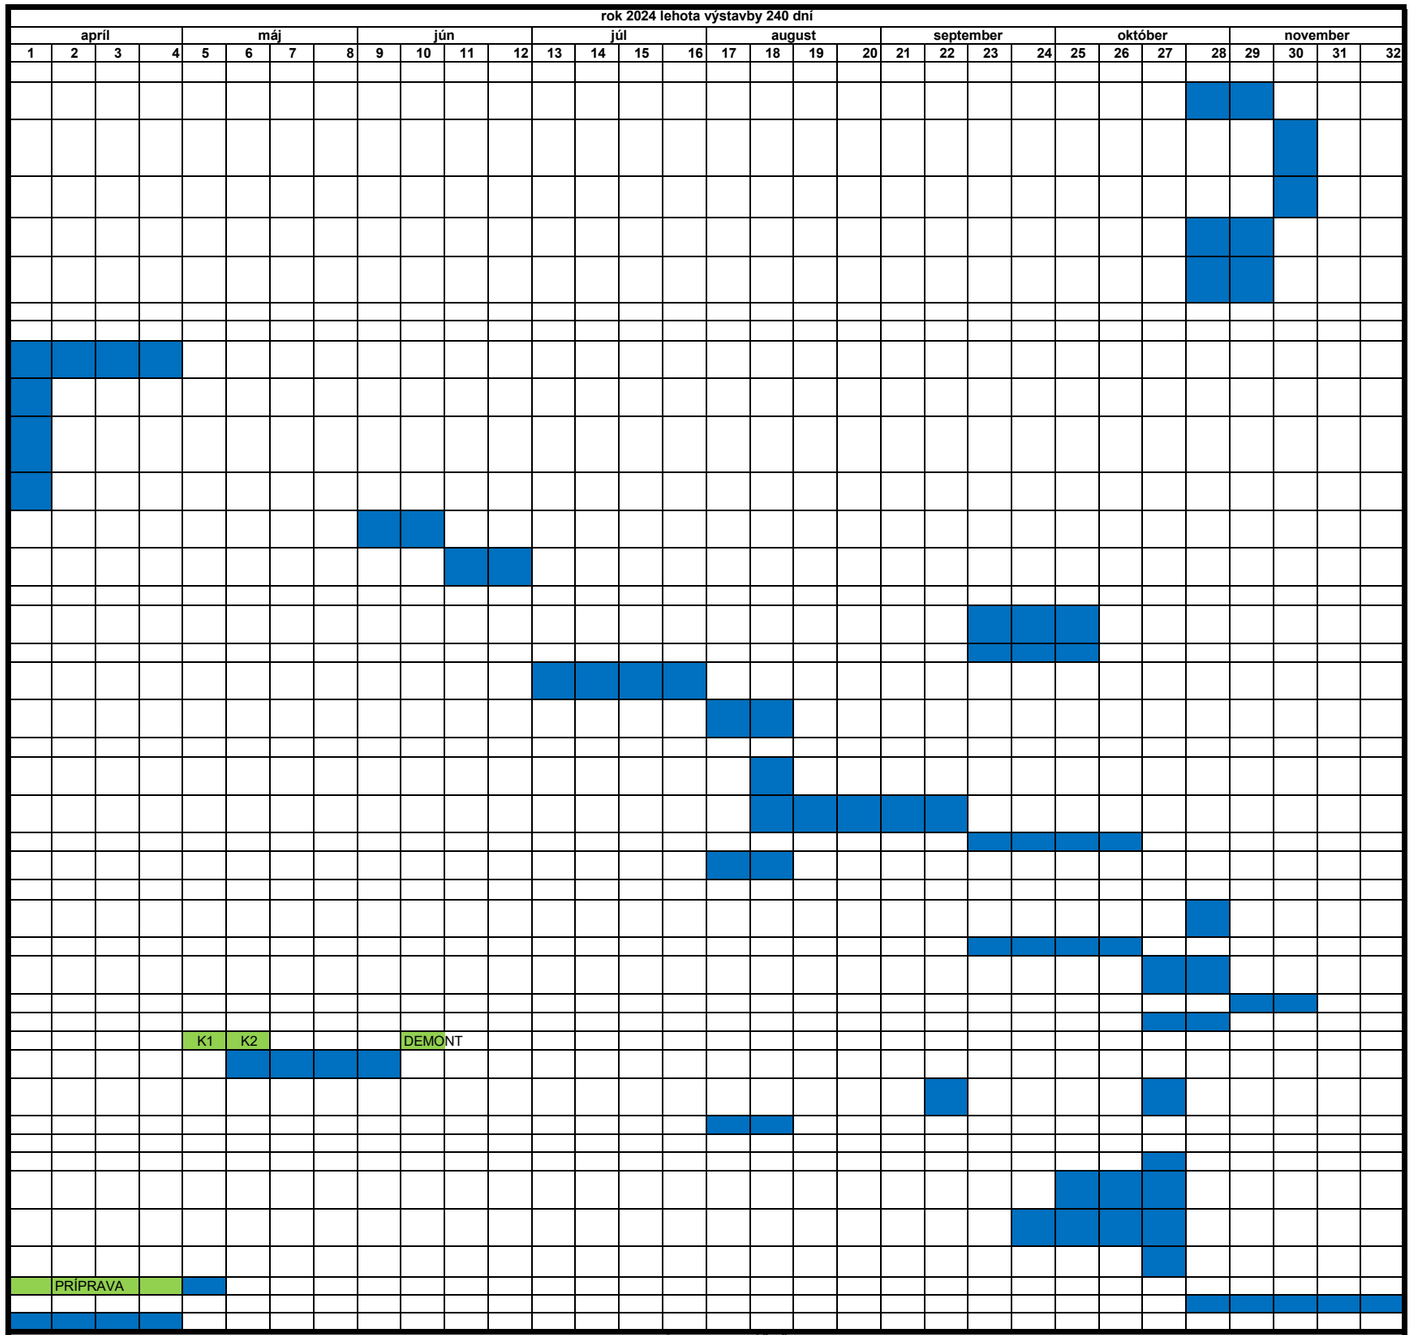

LEHOTA VÝSTAVBY V TÝŽDŇOCH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
10/7	10/7			10/3					10/3								12/7			12/7	12/7						12/7			12/7	12/7
		10/7	10/7	10/4	24/7	24/7	24/7	24/7	24/4							12/7		12/7	12/7							12/7		12/7	12/7		

POZN. DĹŽKA TRVANIA VÝLUK BUDE UPRAVENÁ PODĽA STAVU PRÁC (SKRÁTENIE)
