



\*00378968\*

**Dodatok č.1**  
**k**  
**Zmluve o dielo**

DZH/2012/0324/0001

číslo objednávateľa: ZM/2012/0324  
číslo zhotoviteľa:

**Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-209 nad traťou ŽSR, Liptovský Mikuláš, ľavý most**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami :

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Zápis v obch.reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Technický dozor:

IČO: 35 919 001  
DIČ: 202 193 7775  
IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **MBM-STAV spol. s.r.o.**  
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.213, 029 01 Námestovo  
Štatutárny orgán: Marián Brontvaj – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

Stavbyvedúci :

IČO: 36 394 645  
DIČ: 2020129628  
IČ DPH: SK2020129628

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Preambula dodatku**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.9.2012 Zmluvu o dielo č. ZM/2012/0324 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela- Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-209 nad traťou ŽSR, Liptovský Mikuláš, ľavý most (ďalej len „dielo“).

Vzhľadom na skutočnosť, že počas vykonávania diela sa objavila nutnosť vykonania prác na diele, ktoré nebolo možné vopred predvídať (najmä búracie práce – búranie betónových a asfaltových vrstiev, obnaženie koncov nosnej konštrukcie mosta z dôvodu chýbajúcich záverných múrikov), zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela, pričom táto skutočnosť má vplyv na zmluvne dohodnutú lehotu na vykonanie diela.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany podpisom tohto dodatku dohodli na predĺžení lehoty na vykonanie diela. Dôsledky zmeny rozsahu diela na jeho cenu budú predmetom ďalšieho dodatku, ktorý zmluvné strany uzatvoria po vykonaní diela na základe skutočne vykonaných prác na diele.

### **Čl. 1** **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bodu 2.1 článku 2 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením:

### **Čl. 2** **Čas plnenia**

- 2.1 *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to najneskôr do 15 týždňov odo dňa odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi.*

### **Čl.2** **Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy:
  - Príloha č.1 – aktualizovaný Harmonogram trvania a postupu prác
  - Príloha č.2 - Súhlas správcu reštrukturalizácie s uzatvorením dodatku

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Ing. Milan Gajdoš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Štefan Török  
člen predstavenstva

V Námestove dňa


Za zhotoviteľa:

Marián Brontvaj  
konateľ spoločnosti



# Júl

# AUGUST

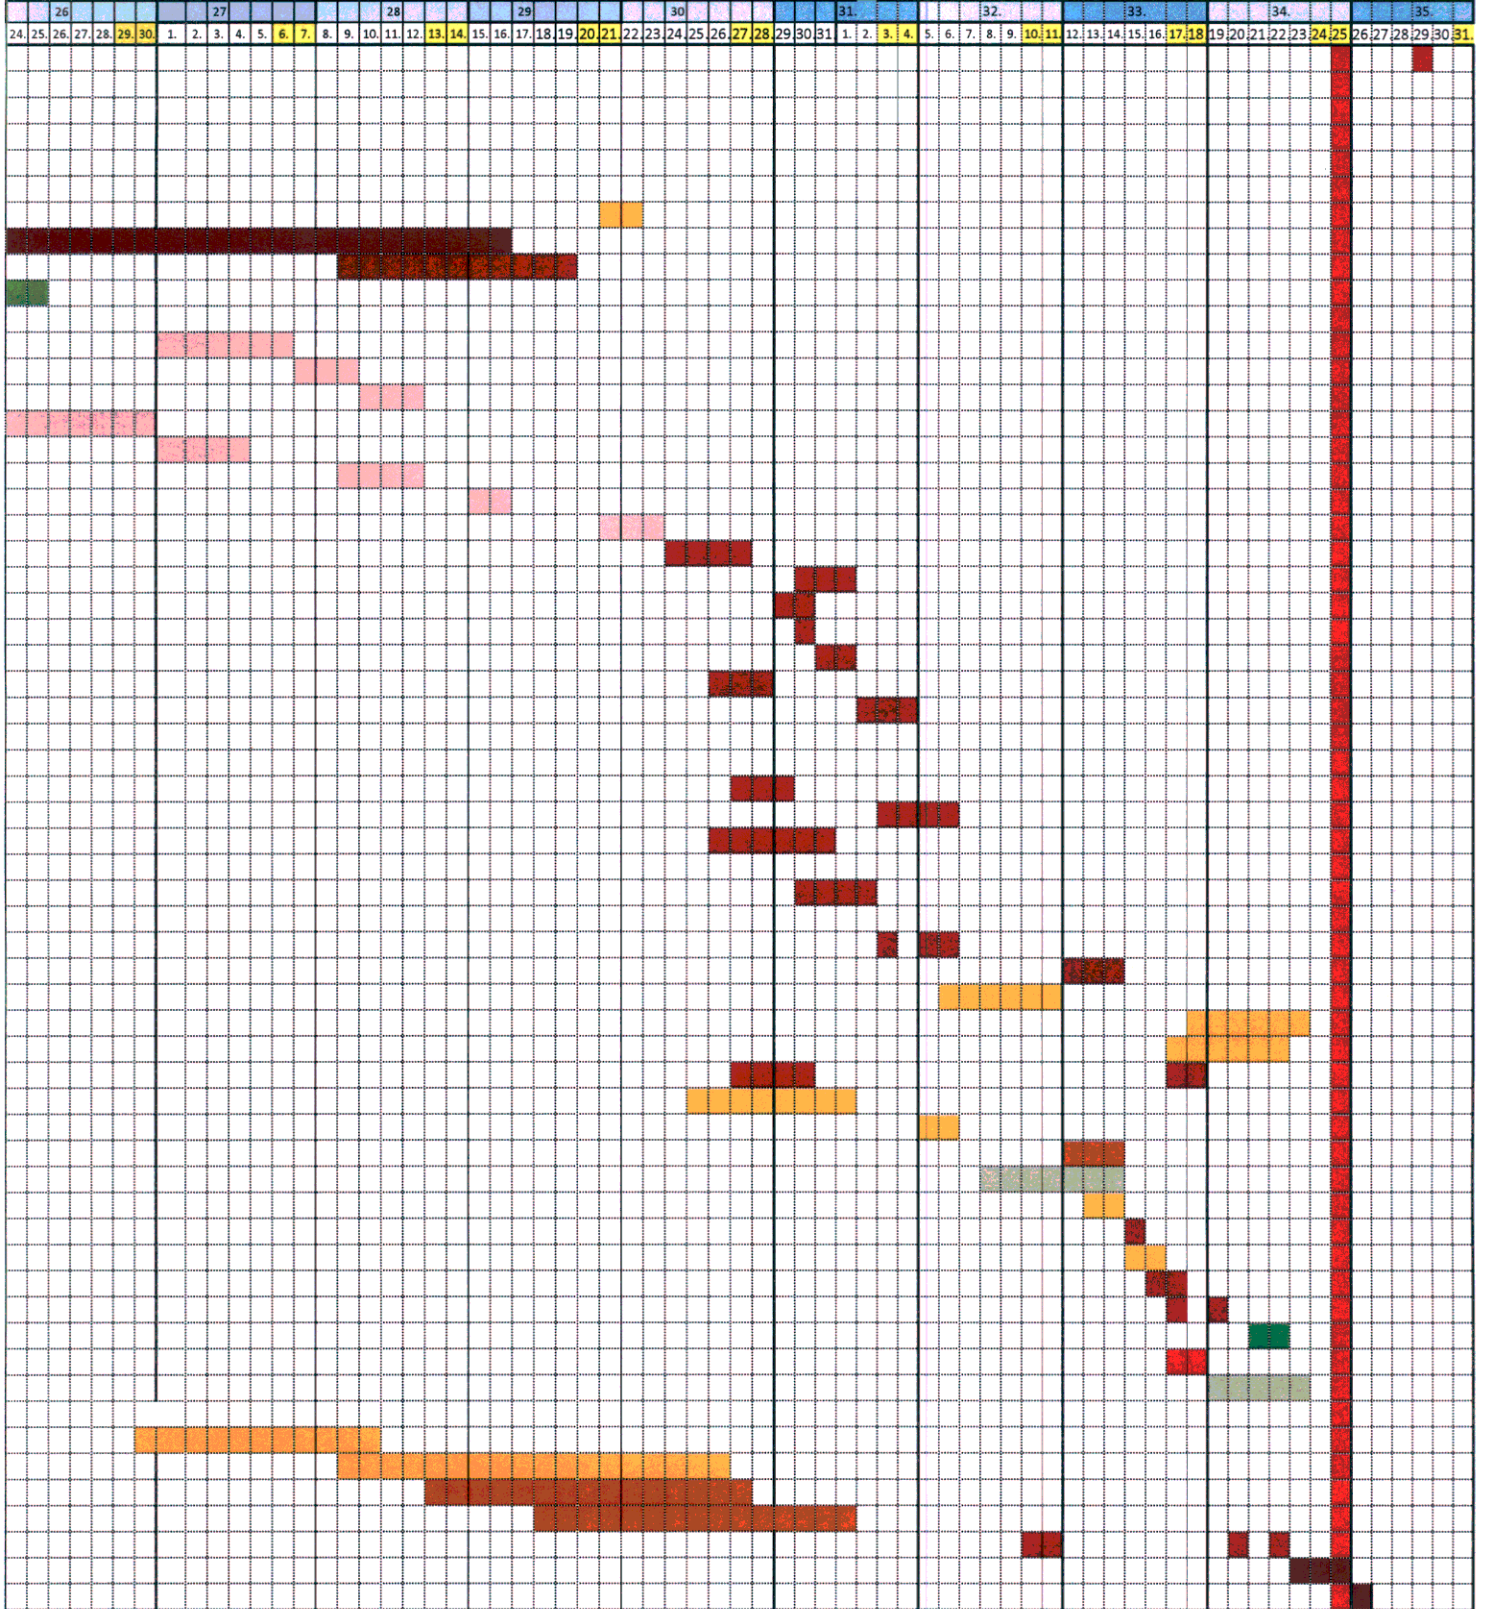

Mgr. MARÍNA GALLOVÁ  
reštrukturalizačný správca Dĺžníka:  
MBM-STAV, s.r.o.  
so sídlom Hviezdoslavovo nám. 213, IČO: 36394645  
zapísané v OR OS Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 12485/L

---

spisová značka:  
spisová značka správcovského spisu :

**Vec: Udelenie súhlasu správcu**

Dolu podpísaná Mgr. Marína Gallová, , zapísaná v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou ( ďalej len „RSP“ ) ako reštrukturalizačný správca Dĺžníka, MBM-STAV, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, IČO: 36394645, zapísaného v OR OS Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 12485/L ( ďalej len „ MBM-STAV, s.r.o.“)

**týmto udeľuje Dĺžníkovi súhlas s podpisom**

dotatku č. 1 k zmluve o dielo ZM/2012/0324 na Opravu diaľničného mosta ev. č. D1-209 nad traťou ŽSR, Liptovský Mikuláš, ľavý most uzatvorenú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava ako objednávateľom a Dĺžníkom ako zhotoviteľom, ktorým sa upravuje odsúhlasený harmonogram prác medzi zmluvnými stranami.

V Martine, dňa 1.8.2013

Mgr. Marína Gallová  
RSP dĺžníka MBM-STAV, s.r.o.
