



Dodatok č.1

k Zmluve na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) , dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), inžiniersku činnosť (IČ), a majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) pre stavbu: **Diaľnica D1 Senec- Blatné, križovatka Blatné**

Číslo objednávateľa:
ZM/2013/0283

Číslo zhotoviteľa:
7761-00

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických :

vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán
v zastúpení:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 378/B

predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO: 31 322 000

DIČ: 202054770

IČ DPH: SK202054770

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA K DODATKU

Tento dodatok k zmluve sa uzatvára na základe záverov z rokovania zmluvných strán konaného dňa 2.10.2013 (ďalej len „pracovné rokovanie“) ako aj na základe dohody zmluvných strán v zmysle listu zhotoviteľa č.8054/2013-2210/7761-00 zo dňa 28.11.2013.

Dôvodom uzavretia tohto dodatku je:

- zmena rozsahu a navýšenie ceny diela (DSP, DP) z dôvodu zmeny rozsahu stavebných objektov súvisiacich s návrhom obchádzkovej trasy na ceste I/61 počas rekonštrukcie mosta ponad D1 a v súvislosti s bezpečnostnou požiadavkou MDVRR SR na fyzické oddelenie protismerných jazdných pásov na vetvách križovatky. Uvedenú zmenu rozsahu stavebných objektov nebolo možné objektívne predvídať v čase prípravy súťažných podkladov (**zmena v čl.3 bod 3.1 a čl. 6 bod 6.2 v ČASTI 1 zmluvy**). V súvislosti s touto zmenou rozsahu diela sa zmluvné strany na pracovnom rokovaní dohodli na zmene termínov plnenia diela, a to Oznámenia 8a (termín posunutý na 28.2.2014) a DSP (termín posunutý na 31.1.2014), pričom podpisom tohto Dodatku č.1 zmluvnej strany deklarujú, že Oznámenie 8a a DSP boli objednávateľovi doručené v týchto dohodnutých termínoch.
- zmena termínov MPV a IČ na základe záverov z pracovného rokovania, na ktorom bolo dohodnuté, že MPV bude spracované podľa overených geometrických plánov vypracovaných v rámci DSP a s tým súvisiace odstránenie nesúladi ustanovení uvedených v zmluve (**zmena v čl.2 bod 2.2 v ČASTI 2 zmluvy, v čl.4 bod 4.1 ČASTI 2 zmluvy a v čl.5 ČASTI 3 zmluvy**).
- odstránenie chyby v písaní- súčtovej chyby v špecifikácii ceny za DP (**zmena v tabuľke č. 3 Prílohy č.7 zmluvy**).
- odstránenie chyby v písaní v ČASTI 2 čl.5 bod 5.2 zmluvy (**zosúladenie s tabuľkou č.5 Prílohy č.7 zmluvy**).
- úprava rozsahu IGHP prác podľa skutočne vykonaného prieskumu (**zmena v tabuľke č.7 Prílohy č.7 zmluvy**).
- úprava rozsahu geodetických prác v DSP v súvislosti s vyššie uvedenou zmenou rozsahu stavebných objektov (**zmena v tabuľke č.6 Prílohy č.7 zmluvy**).
- presun činností spojených s vybudovaním a určením vytyčovacej siete z časti DSP do časti DP z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok (**zmena v tabuľke č.2 a tabuľke č. 3 Prílohy č.7 zmluvy**).

PREDMET DODATKU

Na základe vyššie uvedeného sa mení zmluva nasledovne:

ČASŤ 1

- V ČASTI 1, Čl. 3 zmluvy sa mení bod 3.1, ktorý znie:

3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa článku 2 časti 1 je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž „Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), inžiniersku činnosť (IČ) a majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) pre stavbu

: **Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné**“ vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „Súťažné podklady“) a v prílohe č. 7 zmluvy v znení tohto dodatku.

• **V ČASTI 1, Čl. 6 zmluvy sa mení bod 6.2, ktorý znie:**

6.2 a)	Cena Oznámenia 8a bez DPH v EUR:	6 067,08 EUR
	Sadzba DPH 20% v EUR:	1 213,42 EUR
	Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR:	7 280,50 EUR
	(slovom: sedemtisícvestoosemdesiat eur päťdesiat centov);	
b)	Cena DSP bez DPH v EUR:	177 434,73 EUR
	Navýšenie v zmysle Dodatku č.1 k zmluve bez DPH v EUR (Príloha č.7, tabuľka č.2)	31 960,58 EUR
	Cena DSP bez DPH v EUR:	209 395,31 EUR
	Sadzba DPH 20% v EUR:	41 879,06 EUR
	Cena DSP vrátane DPH v EUR:	251 274,37 EUR
	(slovom: dvestopäťdesiatjedentisícvestosedemdesiatštyri eur tridsaťsedem centov);	
c)	Cena DP bez DPH v EUR	103 367,89 EUR
	Navýšenie v zmysle Dodatku č.1 k zmluve bez DPH v EUR (Príloha č.7, tabuľka č.3):	22 275,42 EUR
	Cena DP bez DPH v EUR:	125 643,31 EUR
	Sadzba DPH 20% v EUR:	25 128,66 EUR
	Cena DP vrátane DPH v EUR:	150 771,97 EUR
	(slovom: stopäťdesiatštyristosedemdesiatjeden eur deväťdesiatštyri centov);	
d)	Cena diela celkom bez DPH v EUR:	341 105,70 EUR
	Sadzba DPH 20%:	68 221,14 EUR
	Cena diela celkom vrátane DPH v EUR:	409 326,84 EUR
	(slovom: štyristodevätštyristodvadsaťšesť eur osemdesiatštyri centov.);	

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín. Rozpočet tvorí ako príloha č. 7 neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku k zmluve.

Rekapitulácia ceny podľa čl. 6 bod 6.2 tejto zmluvy:

Rekapitulácia ceny v EUR bez DPH	ZoD	Dodatok č.1 k zmluve	
		zmena ceny	výsledná cena
Oznámenie 8a	6 067,08 €		6 067,08 €
DSP	177 434,73 €	31 960,58 €	209 395,31 €
DP	103 367,89 €	22 275,42 €	125 643,31 €
Spolu	286 869,70 €	54 236,00 €	341 105,70 €

ČASŤ 2

• **V ČASTI 2, čl. 2 zmluvy sa mení bod 2.2, ktorý znie:**

2.2 Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) spočíva :

- vo vypracovaní a doručení návrhov kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, ak nie je možné vyhotoviť kúpnu zmluvu, nájomných zmlúv a výziev s doručenkou do vlastných rúk príslušným

fyzickým alebo právnickým osobám, v prípade potreby vypracovanie a doručenie aj iných zmlúv alebo vykonanie iných právnych úkonov potrebných na získanie práva k pozemkom,
- v zabezpečení uzavretia kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, ak nie je možné vyhotoviť kúpnu zmluvu, nájomných zmlúv, iných zmlúv alebo dodanie právoplatného vyvlastňovacieho rozhodnutia, resp. právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vyvlastňovanej nehnuteľnosti.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi pozemky zbavené práv tretích osôb.

Uvedené zmluvy, resp. iné právne úkony sa budú realizovať na základe overených geometrických plánov pre trvalý záber a geometrických plánov pre dočasný záber vypracovaných v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie.

- **V ČASTI 2, čl. 4 zmluvy sa mení bod 4.1, ktorý znie nasledovne:**

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať **kompletné MPV najneskôr do 7 mesiacov** od poskytnutia porealizačných GP overených Správou KN objednávateľom.

- **V ČASTI 2, čl. 5 zmluvy sa mení bod 5.2, ktorý znie nasledovne:**

5.2 Cena za MPV jedného vlastníka bez DPH v EUR:

A: Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť výstavbou priamo dotknuté + prehľadná tabuľka v MS Excel **20,00 €**

B: Vypracovanie a doručenie návrhu zmluvy a výzvy doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým a právnickým osobám + tabuľka v MS Excel. Rokovanie s vlastníkom a zabezpečenie uzavretia zmluvy, pri neuzavretej zmluve dodanie právoplatného vyvlastňovacieho alebo súdneho rozhodnutia + prehľadná tabuľka v MS Excel **90,00 €**

C: Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmluvy alebo vyvlastňovacieho rozhodnutia do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na objednávateľa + prehľadná tabuľka v MS Excel **10,00 €**

D: Zastupovanie pred súdmi v rámci celého konania alebo zabezpečenie celého konania o súdnej úschove, notárskej úschove, súčinnosť pri zabezpečovaní náhradného bývania a náhradných objektov podnikateľských subjektov, legalizácia stavieb a pod. + prehľadná tabuľka v MS Excel **10,00 €**

Celková cena za MPV bude stanovená podľa skutočného počtu vysporiadaných vlastníkov.

ČASŤ 3

- **V ČASTI 3, čl. 5 zmluvy sa menia body 5.1 až 5.6, ktoré znejú nasledovne:**

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať IČ pre stanovisko MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z.	najneskôr do 15.07.2014
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať IČ pre stavebné konanie	najneskôr do 15.09.2014
5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DSP	do 14.08.2014
5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF	najneskôr do 15.07.2014
5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF	najneskôr do 15.07.2014
5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie	do 15.09.2014 .

ČASŤ 5

V ČASTI 5, čl 5 zmluvy sa prílohy uvedené v bode 5.7 nahrádzajú prílohami č. 1 až 7 tohto dodatku.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
 - č.1 – harmonogram všetkých prác zhotoviteľa
 - č.2 – harmonogram prác zhotoviteľa Oznámenia 8a
 - č.3 – harmonogram zabezpečenia Oznámenia 8a
 - č.4 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSP
 - č.5 – harmonogram zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia
 - č.6 – harmonogram prác zhotoviteľa na DP
 - č.7 – špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (tabuľky 1 až 9)

V Bratislave dňa

Objednávatel':

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Čáidoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

V Bratislave dňa

Zhotovitel':

Odtlačok pečiatky:

Ing. arch. Gabriela Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Martin Sutka
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.

Príloha č.1-7


HARMONOGRAM PRÁC ZHOTOVITEĽA

- č.1 – harmonogram všetkých prác zhotoviteľa
- č.2 – harmonogram prác zhotoviteľa Oznámenia 8a
- č.3 – harmonogram zabezpečenia Oznámenia 8a
- č.4 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSP
- č.5 – harmonogram zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia
- č.6 – harmonogram prác zhotoviteľa na DP

Vypracovanie Oznámenia o zmenách navrhovanej činnosti (podľa Prílohy č. 8a Zákona č. 24/2006 Z.z.)
 Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

HMG k Dodatku č. 1 Zmluvy

ID	Nazov úkolu	Doba trvania	Zahŕňajúci	Dokončení
1	Hlavný program prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	335 dní	4.6.13	15.9.14
2	Zostavenie návrhu stavby	132 dní	4.6.13	14.9.14
3	Datum rozhodnutia územnosti zmluvy o diele	1 den	15.8.13	15.8.13
4	Príprava stavby v štádiu DSP	283 dní	15.8.13	15.9.14
5	I. Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dní	15.8.13	28.2.14
6	Príprava študijných podmienok a študijných podmienok	29 dní	15.8.13	14.9.14
7	Príprava študijných podmienok	22 dní	20.8.13	11.9.14
8	Vypracovanie Oznámenia zmeny navrhovanej činnosti (podľa Prílohy 8a Zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)	4 týždne	3.2.14	28.2.14
9	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	96 dní	17.9.13	28.1.14
17	MPV - Komisia zmluvy o budovkách kupných zmluvách	161 dní	15.11.13	13.6.14
18	MPV - Diskusiové konanie	73 dní	15.11.13	28.2.14
19	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	27 dní	15.11.13	29.1.14
20	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	22 dni	15.11.13	29.1.14
21	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	27 dní	15.11.13	29.1.14
22	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	22 dní	15.11.13	29.1.14
23	MPV - Vyhlásenie konanie	77 dní	28.2.14	12.6.14
24	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	68 dní	28.2.14	19.2.14
25	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	10 dní	15.2.14	25.2.14
26	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	2 dni	15.2.14	16.2.14
27	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	1 dni	15.2.14	16.2.14
28	Ukončenie MPV ku stavbeňmu povoleniu	1 den	15.2.14	16.2.14
29	III. Inštalácia činnosti	171 dní	20.1.14	15.9.14
30	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	16 dní	15.2.14	16.2.14
31	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	20 dní	15.2.14	16.2.14
32	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	13 dní	17.6.14	15.9.14
33	Príprava návrhu zmluvy o budovkách kupných zmluvách	1 den	15.9.14	15.9.14
34	Nadobudnutie právoplatného SP - 3. stupen	1 den	15.9.14	15.9.14
35	IV. Spracovanie Dokumentácie na ponuku	2 mesiace	20.6.14	14.8.14

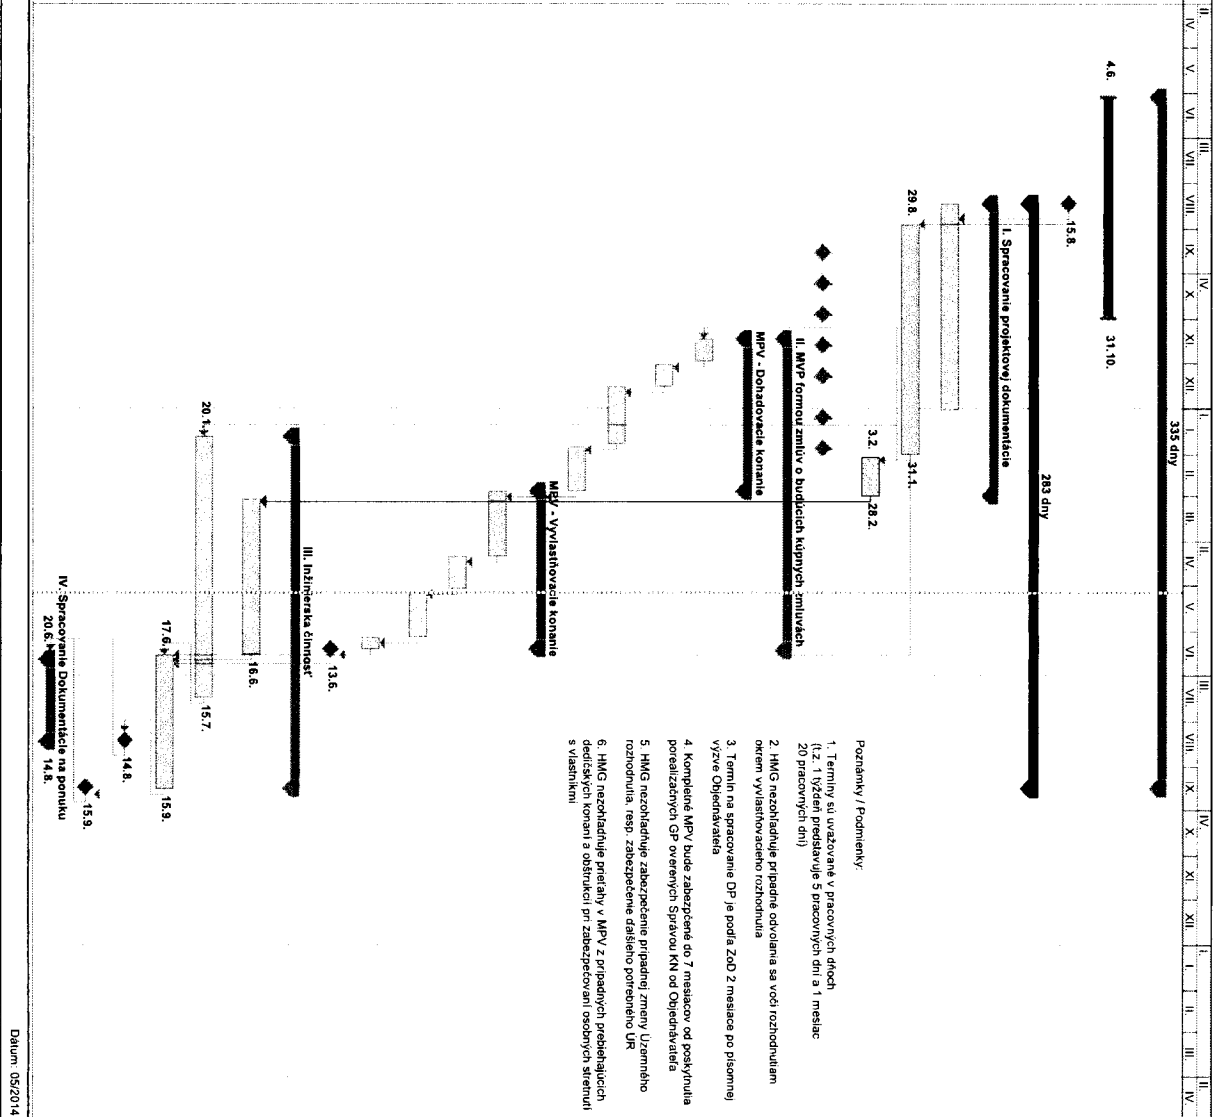

- Podrobný / Podrobný:
1. Termíny sú uvádzané v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
 2. HMG nezohľadňuje prípadne odvolania sa voči rozhodnutiam ostatných vyhlásených rozhodnutí
 3. Termín na spracovanie DP je podľa ZOD 2 mesiace po písomnej výzve Objemového
 4. Komplet MPV bude zabezpečené do 7 mesiacov od poskytnutia porúčaniať GP overených Správou KN od Objemového
 5. HMG nezohľadňuje zabezpečenie prípadnej zmeny Územného rozhodnutia, resp. zabezpečenie ďalšieho potrebného ÚR
 6. HMG nezohľadňuje prešľavy v MPV z prípadných premeničných deňskými konaniami a obmedzením zabezpečovaní osobných stretnutí s verešnosťou

Datum: 09/2014


Harmonogram prác Zhotoviteľa - Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k Oznameniu zmien navrhovanej činnosti

HIMG k Dodatku č. 1 Zmluvy

ID	Názov úlohu	Doba trvania	Začiatok	Dokončení
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnica D1 Senec – Blatná, Kráľovka Blatná	351,8 dny	4.6.13	8.10.14
2	Príprava projektovej dokumentácie	108 dny	4.6.13	31.10.13
3	Datum vydávania a účinnosti zmieny o dachu	1 deň	15.8.13	15.8.13
4	Príprava stavby v súlade ESP	299,8 dny	15.8.12	8.10.14
5	I. Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dny	15.8.13	28.2.14
6	Príprava stavby v súlade ESP	299,8 dny	15.8.12	8.10.14
7	Príprava stavby v súlade ESP	299,8 dny	15.8.12	8.10.14
8	Príprava stavby v súlade ESP	299,8 dny	15.8.12	8.10.14
9	Príprava stavby v súlade ESP	299,8 dny	15.8.12	8.10.14
17	II. MŽP Formou zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách	151 dny	15.11.13	13.6.14
18	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
19	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
20	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
21	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
22	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
23	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
24	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
25	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
26	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
27	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
28	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
29	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
30	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
31	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
32	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
33	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
34	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14
35	MŽP - Dohodovacie konanie	71 dny	15.11.13	25.2.14

Výpracoval: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Datum: 04/2014

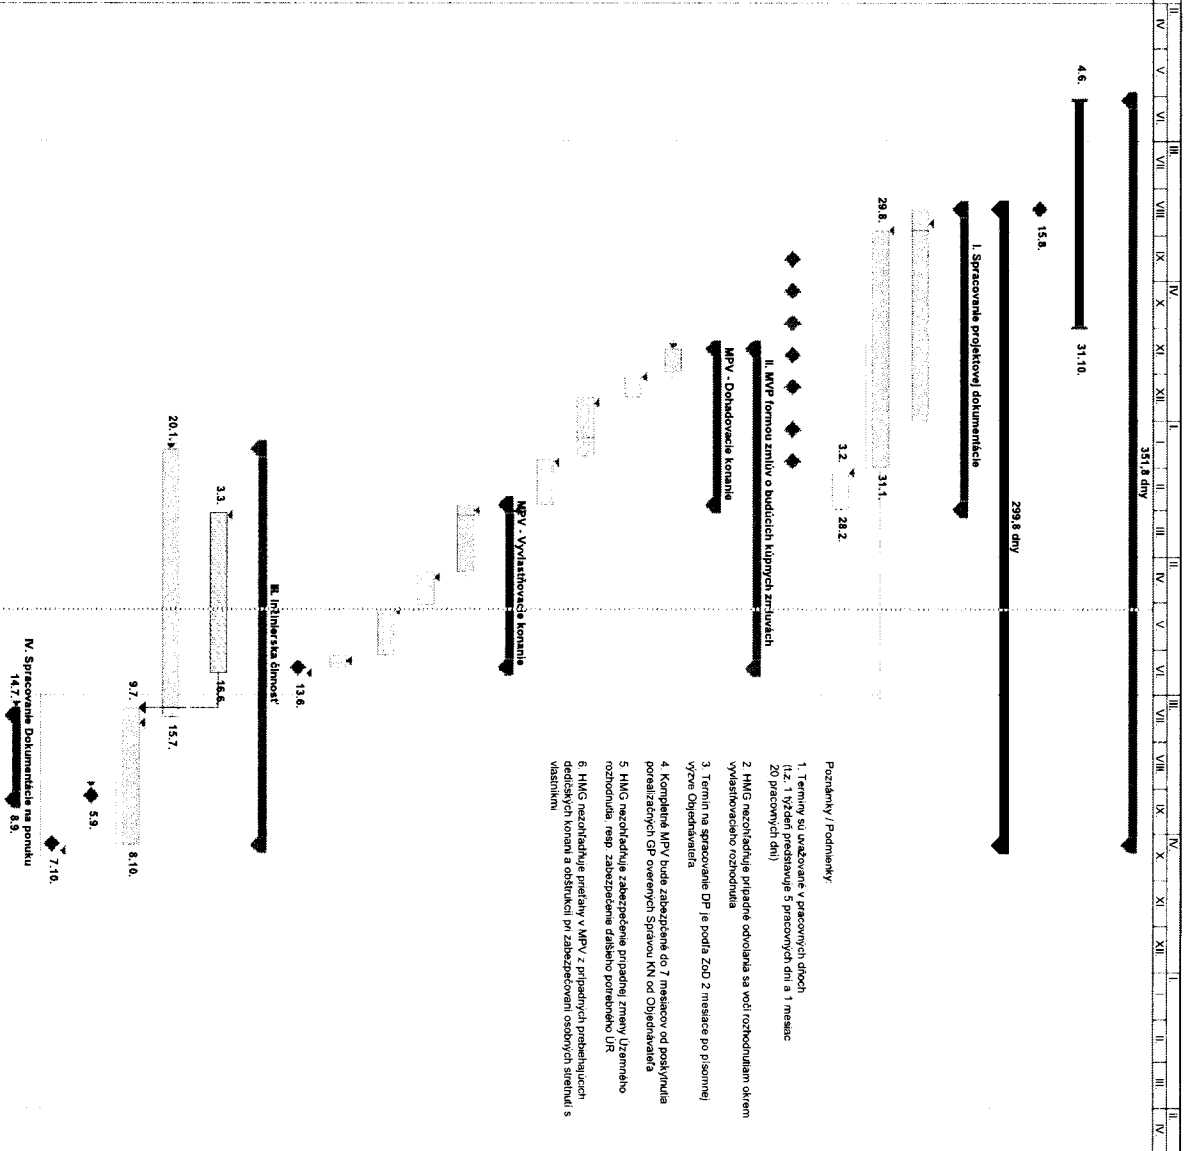

Hammonogram prác Zhotoviteľa - Spracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)


HMG k Dodatku č. 1 Zmluvy

ID	Názov úlohu	Doba trvania	Začiatok	Dokončenie
1	Hammonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, Krízovtka Blatné	335 dní	4.6.13	15.9.14
2	Príprava terénu a projektovania	1 deň	15.8.13	15.8.13
3	Datum nadovhodnotia užitočnosti zmluvy o dielo	1 deň	15.8.13	15.8.13
4	Príprava stavby v stupni DSP	283 dní	15.8.13	15.9.14
5	I. Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dní	15.8.13	28.2.14
6	Podklady (G preskum a ďalšie preskumy a štúdie)	20 dní	15.8.13	1.1.14
7	Spracovanie DSP	22.4 týždne	29.8.13	31.1.14
8	Príprava formou zmluvy o budúcej kúpenej zmluve (BKZ) - spracovanie BKZ	4 týždne	29.8.13	28.2.14
9	Formy pracovných rokovani v stupni DSP	96 dní	17.9.13	28.1.14
10	II. MFP formou zmluvy o budúcej kúpenej zmluve	151 dní	15.11.13	13.6.14
11	MFP - Dohľadovské konanie	73 dní	15.11.13	25.2.14
12	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
13	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
14	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
15	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
16	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
17	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
18	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
19	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
20	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
21	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
22	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	22 dní	27.1.14	26.2.14
23	MFP - Vyšetrenie zmluvy	77 dní	26.2.14	12.6.14
24	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	108 dní	15.8.14	10.1.15
25	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	108 dní	15.8.14	10.1.15
26	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	108 dní	15.8.14	10.1.15
27	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	108 dní	15.8.14	10.1.15
28	Ukončenie MFP na stavebnom povolení	1 deň	15.9.14	15.9.14
29	III. Informačná činnosť	171 dní	20.1.14	15.9.14
30	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	16. týždne	15.8.14	15.9.14
31	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	16. týždne	15.8.14	15.9.14
32	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	16. týždne	15.8.14	15.9.14
33	Príprava a vykonávanie MFP - vyšetrenie zmluvy	16. týždne	15.8.14	15.9.14
34	Napodobnutie napríkladného SP - 1. stupeň	1 deň	15.9.14	15.9.14
35	IV. Spracovanie Dokumentácie na povolení	2 mesiace	20.6.14	14.8.14

Vytvoril: DOPRAVOPROJEKT, s.r.o.

Datum: 05/2014

- Poznámky / Podmienky**
- Termíny sú uvádzané v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
 - HMG nezohľadňuje prípadnú ovdovenia sa voči rozhodnutiam omen vyšetrenia zmluvy
 - Termín na spracovanie DP je podľa ZbD 2 mesiace po písomnej výzve Obidvaja strán
 - Kompletné MFP bude zabezpečené do 7 mesiacov od poskytnutia poradiateľných GP overených Správou KN od Obidvaja strán
 - HMG nezohľadňuje zabezpečenie prípadnej zmeny Územného rozhodnutia, resp. zabezpečenie ďalšieho potrebného ÚR
 - HMG nezohľadňuje prechody v MFP z prípadných rozbiehajúcich projektov konaní a osôb pri zabezpečovaní osobných stretnutí s vlastníkmi

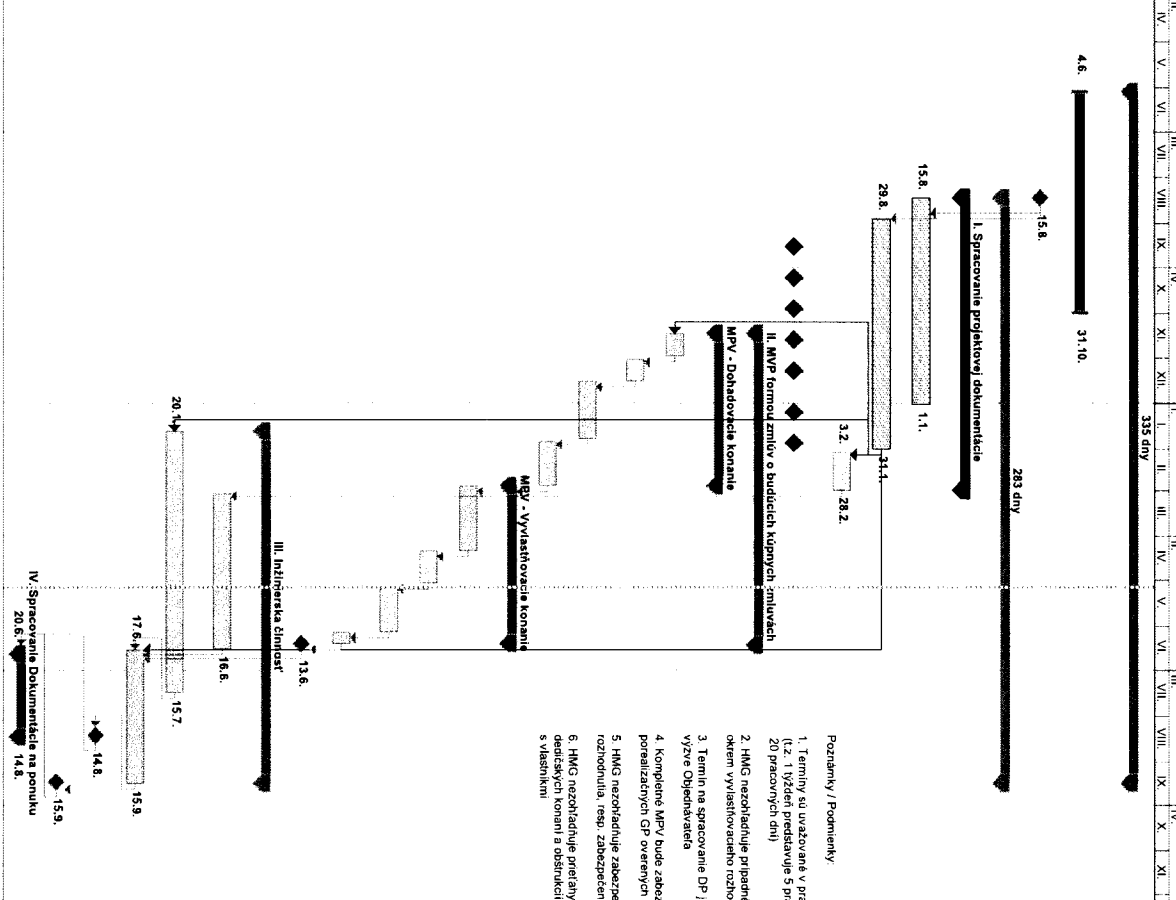

Hamnogram prác Zhotoviteľa - Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia


HMG k Dodatku č. 1 Zmluvy

ID	Názov úlohu	Doba trvania	Začiatok	Dokončení
1	Hamnogram prípravy stavby Dielne D1 Senec – Blatné, krízovka Blatné	335 dní	4.6.13	15.9.14
2	Výstavná úprava miestnosti 6	48 dní	4.6.13	27.11.13
3	Datum referenčného účinnosti zmluvy o diele	1 deň	15.8.13	15.8.13
4	Príprava stavby v stupni DSP	283 dní	15.8.13	15.9.14
5	I Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dní	15.8.13	28.2.14
6	Podanie návrhu na vydanie stavebného povolenia	30 dní	15.8.13	14.9.13
7	Príprava územného zriaďovacieho schém	28 dní	20.8.13	21.1.14
8	Príprava územného zriaďovacieho schém (2. etapa)	49 dní	5.9.13	23.9.13
9	Formulár vyhodnotenia stavby - stupeň DSP	98 dní	17.9.13	28.1.14
10	Príprava územného zriaďovacieho schém (3. etapa)	151 dní	15.11.13	13.6.14
11	MPV - Dohľadovacie konanie	73 dní	15.11.13	25.2.14
12	Príprava územného zriaďovacieho schém (4. etapa)	27 dní	15.11.13	27.1.14
13	Príprava územného zriaďovacieho schém (5. etapa)	27 dní	27.1.14	27.1.14
14	Príprava územného zriaďovacieho schém (6. etapa)	32 dní	27.1.14	28.2.14
15	MPV - Vyvlastňovacie konanie	77 dní	26.2.14	12.6.14
16	Príprava územného zriaďovacieho schém (7. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
17	Príprava územného zriaďovacieho schém (8. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
18	Príprava územného zriaďovacieho schém (9. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
19	Príprava územného zriaďovacieho schém (10. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
20	Príprava územného zriaďovacieho schém (11. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
21	Príprava územného zriaďovacieho schém (12. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
22	Príprava územného zriaďovacieho schém (13. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
23	Príprava územného zriaďovacieho schém (14. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
24	Príprava územného zriaďovacieho schém (15. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
25	Príprava územného zriaďovacieho schém (16. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
26	Príprava územného zriaďovacieho schém (17. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
27	Príprava územného zriaďovacieho schém (18. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
28	Príprava územného zriaďovacieho schém (19. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
29	Príprava územného zriaďovacieho schém (20. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
30	Príprava územného zriaďovacieho schém (21. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
31	Príprava územného zriaďovacieho schém (22. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
32	Príprava územného zriaďovacieho schém (23. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
33	Príprava územného zriaďovacieho schém (24. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
34	Príprava územného zriaďovacieho schém (25. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14
35	Príprava územného zriaďovacieho schém (26. etapa)	32 dní	26.2.14	28.2.14

Vytvoril: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Datum: 05/2014


- Poznámky / Podmienky**
- Termín sa uvádza v pracovných dňoch (t.j. 1 výdeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
 - HMG nezahŕňa prípadné odvolania sa voči rozhodnutiam okrem vyvlastňovacieho rozhodnutia
 - Termín na spracovanie DP je podľa ZbD 2 mesiace po písomnej výzve Objedávateľa
 - Kompletné MPV bude zabezpečené do 7 mesiacov od poskytnutia poraižaných GP overených Správou KN od Objedávateľa
 - HMG nezahŕňa zabezpečenie prípadnej zmeny Územného rozhodnutia, resp. zabezpečenie ďalšieho potrebného ÚR
 - HMG nezahŕňa prechody v MPV z prírodných prostredí do ďalších foriem a období pri zabezpečovaní osobných stretnutí s vlastníkmi

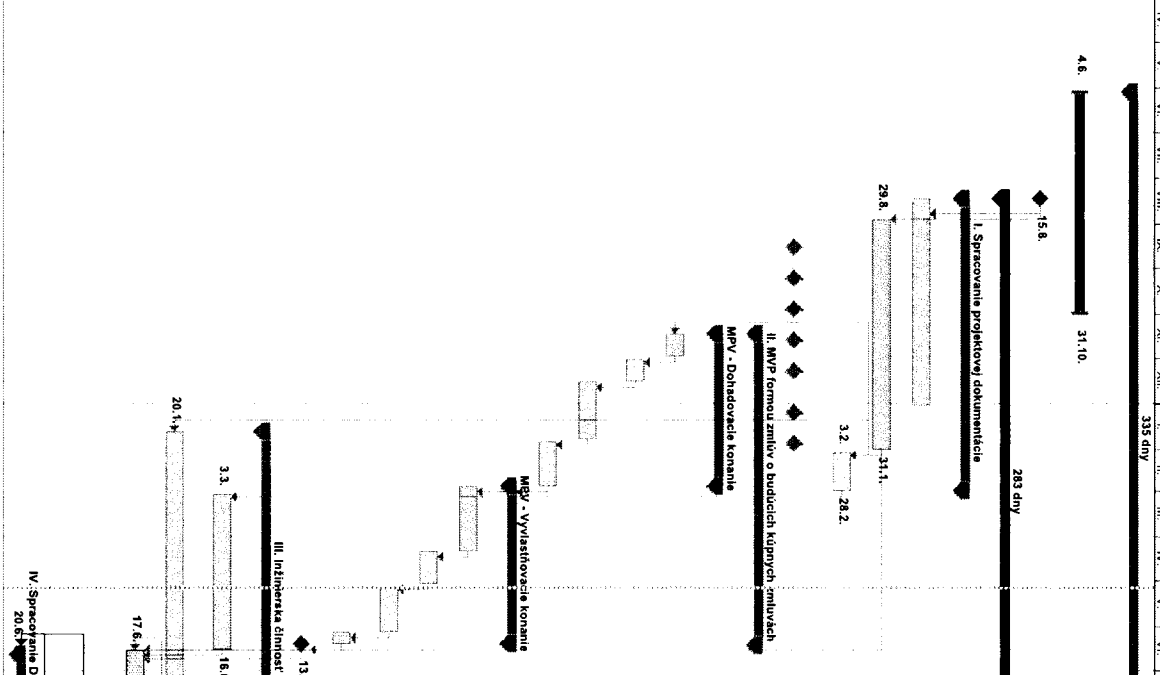

Hammonogram prác Zhotoviteľa - Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)

HMG k Dodatku č. 1 Zmluvy

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

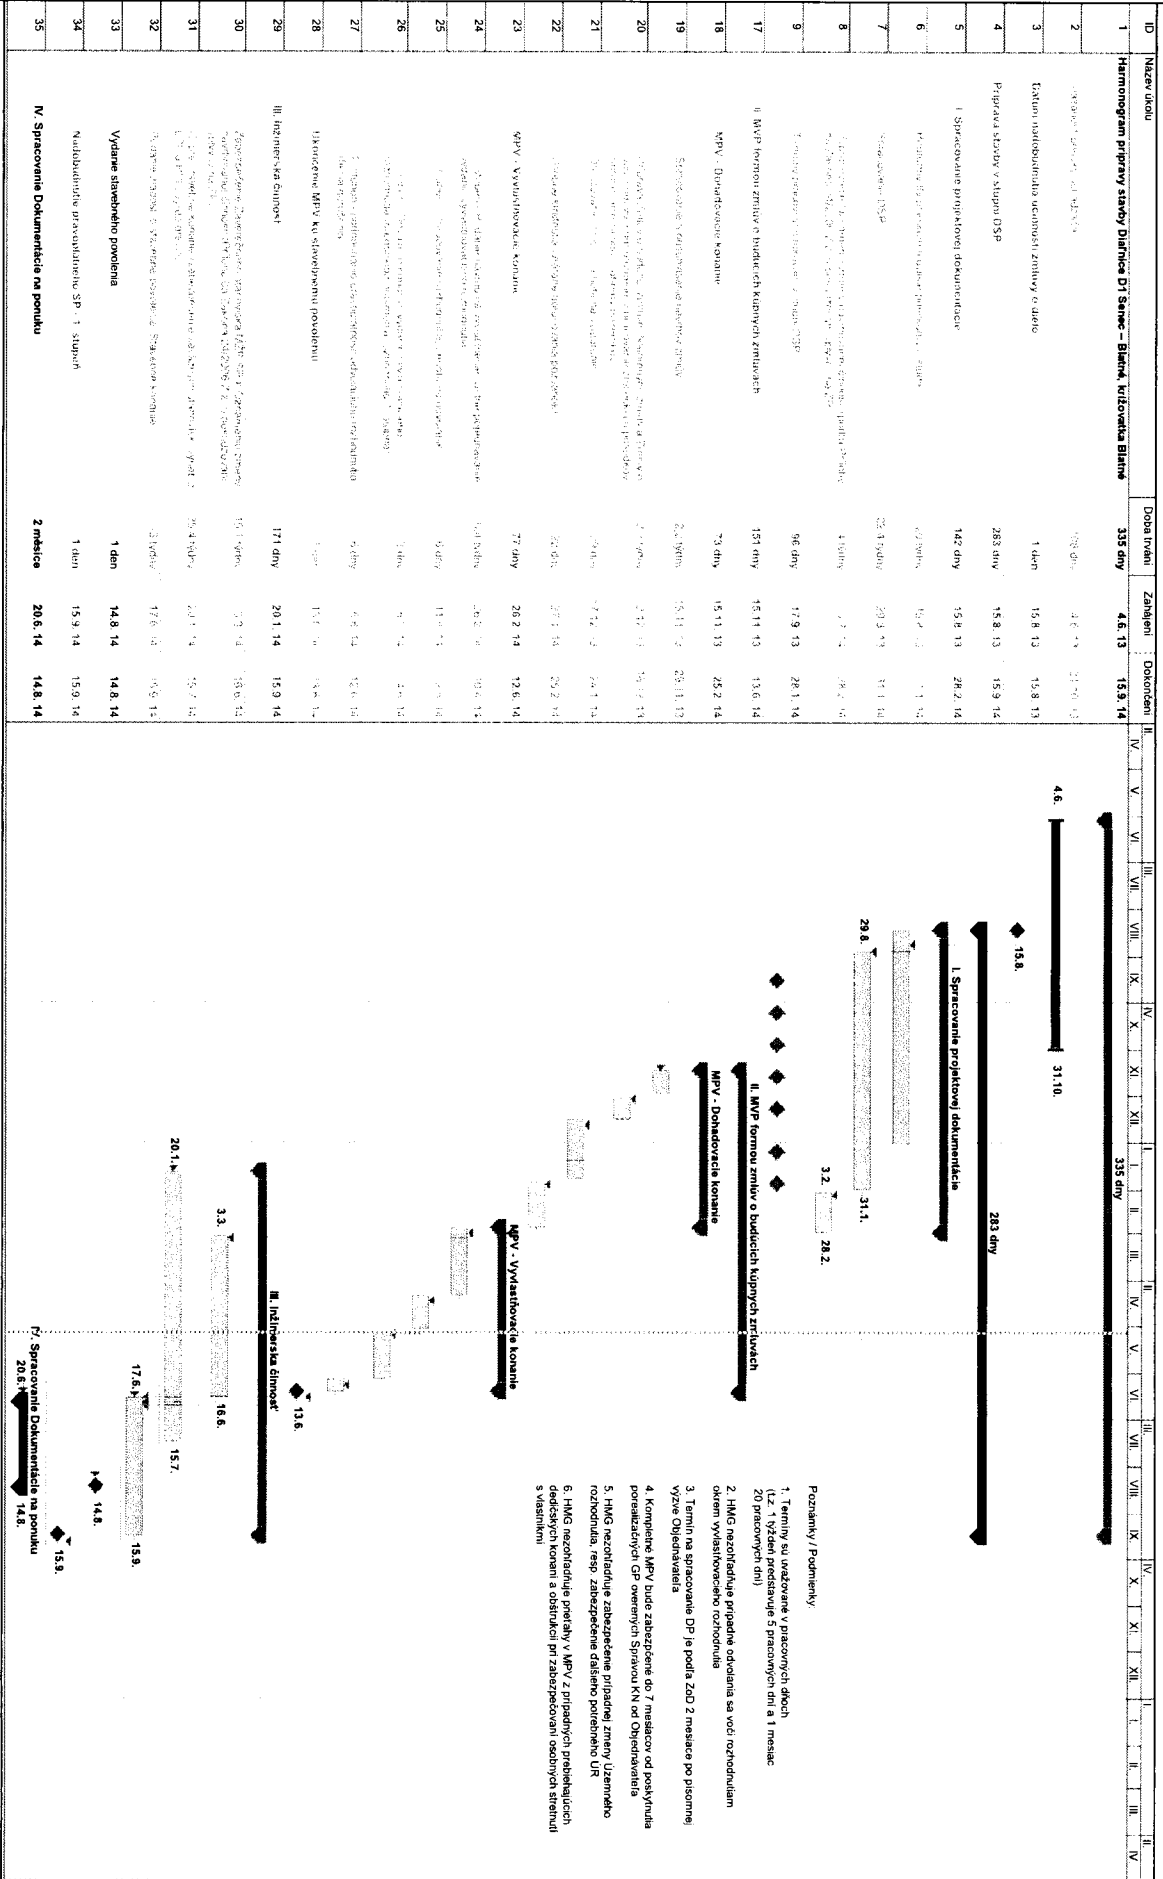

Výpracoval: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Datum: 04/2014

- Poznámky / Podmienky**
1. Termín sa udeľované v pracovných dňoch (20 pracovných dní) a 1 mesiac
 2. HMG nezohľadňuje prípadne odovznanie sa vodi rozhodnutím okrem vyvážkovacieho rozhodnutia
 3. Termín na spracovanie DP je podľa ZAD 2 mesiace po písomnej výzve Objavovateľa
 4. Kompletne MPV bude zabezpečené do 7 mesiacov od poskytnutia poriadkových GP overených Správou KN od Objavovateľa
 5. HMG nezohľadňuje zabezpečenie príjazdovej zmluvy (Jsemnoko rozhodnutia, resp. zabezpečenie ďalšieho potvrdenia UR)
 6. HMG nezohľadňuje poplatky v MPV z prírodných prebiehajúcich dedičských konaní a ošetrovaci pri zabezpečovaní osobných stretnutí s vlastníkmi

ŠPECIFIKÁCIA CENY VŠETKÝCH ČASTÍ ZMLUVY (TABUĽKY 1 AŽ 9)

Stavba: Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Špecifická cena prác

Tabuľka č. 1

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006

Klasifikácia produkcie :

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91		
1 Správa	32				1168,32
2 Prílohy	20	96			3438,36
3 Netechické zhrnutie	40				1460,40
Navrhovaná cena bez DPH					6 067,08 €
DPH 20 %					1 213,42 €
Navrhovaná cena					7 280,50 €
Cena za reprografické práce a služby za 1 ks Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti					40,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplnía žltou farbou označené bunky

- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatimé miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Názov časti dokumentácie	sazdба €/h				Cena celkom v €	sazdба €/h				Cena celkom v €	sazdба €/h				Cena celkom v €
	Potrebný počet hodín Z0D					Potrebný počet hodín Dodatok 1					Potrebný počet hodín Z0D+Dod1				
	36,51	28,21	21,91			36,51	28,21	21,91			36,51	28,21	21,91		
1 A.1 Správodná správa	10	30	20		1 649,60 €					10	30	20		1 649,60 €	
2 A.2 Netechnická zhrnutie	2	4			186,86 €					2	4	0		186,86 €	
3 B.1 Prieťahová situácia M 1:30 000			6		131,46 €					0	0	6		131,46 €	
4 B.2 Celková situácia M 1:10 000	2	20	10		856,32 €					2	20	10		856,32 €	
5 B.3 Pozdĺžny rez M 1:1000/0/0	2	10	6		486,58 €					2	10	6		486,58 €	
6 B.4 Ortofotozmapa M 1:10 000			6		357,14 €					0	0	6		357,14 €	
7 B.5 Ortofotozmapa M 1:2 000	2	12	6		469,98 €					2	12	6		469,98 €	
8 B.6 Vizualizácie	2	40	20		1 639,62 €					2	40	20		1 639,62 €	
9 B.7 Informačný materiál	2	30	10		1 138,42 €					2	30	10		1 138,42 €	
10 C.1 Koordinátny výkres M 1:1 000	20	40	30		2 515,90 €					20	40	30		2 515,90 €	
11 C.2 Dopravné zariadenie calej stavby M 1:2 000	2	30	20		1 357,52 €					2	30	20		1 357,52 €	
12 D Pisomnosti a výkresy objektov	4	40	0		1 274,44 €	2	0			73,02 €	6	48	0	1 347,46 €	
036-00 Uprava územia, úsek Bratislava - MUK Blatná	8	48	0		1 646,16 €					16	8	48	0	1 646,16 €	
043-01 Vepelácke úpravy diaľnice D1 v MUK Blatná			0		- €	16	26	8		1 492,90 €	16	26	8	1 492,90 €	
043-02 Vepelácke úpravy na ceste I/61 v MUK Blatná			0		- €	16	26	8		1 492,90 €	16	26	8	1 492,90 €	
074-00 Úprava hydraulických v km 30 075 - 30 812 (16 475 - 17 212) diaľnice D1 BA - TT v MUK	8	24	0		969,12 €	6	8	8		620,02 €	14	32	8	1 589,14 €	
101-10 Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MUK Blatná	240	480	300		28 876,20 €	34	130	-24		4 908,64 €	240	480	300	28 876,20 €	
110-00 Rekonštrukcia mimoúrovňovej križovatky Blatná	60	240	140		12 028,40 €	8	32	24		3 682,80 €	60	240	140	12 028,40 €	
118-00 Obrábisko vozidla správy a údržby diaľnic na ceste I/61 v MUK Blatná	8	32	24		1 720,64 €	-8	-32	-24		1 720,64 €	0	0	0	- €	
124-00 Obrábka na ceste I/61 v km 29 600 D1	48	240	180		12 466,68 €	48	56	16		3 682,80 €	48	56	16	3 682,80 €	
152-00 Úprava územia II. a III. triedy pred a po výstavbe MUK Blatná			0		- €	8	8	8		630,60 €	8	12	0	630,60 €	
153-00 Úprava miestnych komunikácií pred a po výstavbe MUK Blatná	160	440	240		23 512,40 €	10	16			816,48 €	160	440	240	23 512,40 €	
214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 BA - TT v km 30 206 (16 606) na ceste I/61 v MUK Blatná	42	44	30		3 431,96 €					1 095,30 €	42	44	30	3 431,96 €	
215-00 Most na vchode B1,3 a B1,4 v MUK Blatná nad rýpovcom DN 500	48	70	40		4 603,58 €					3 096,64 €	48	70	40	4 603,58 €	
501-10 Odchodňovacia diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MUK Blatná			0		- €	32	32	16		4 447,74 €	32	32	16	4 447,74 €	
640-00 Prípojka NN pre GDS v km 28 914 D1 na obchádzke c. I/61	2	6	0		242,28 €	6	8			3 096,64 €	2	6	0	242,28 €	
642-00 Čerpaná doprava signálizácia v km 28 914 D1 na obchádzke c. I/61	2	6	0		242,28 €	6	8			3 096,64 €	2	6	0	242,28 €	
660-02 Priežokka Dk v km 30 150 diaľnice D1 BA - TT v MUK Blatná	30	40	30		2 881,00 €					2 411,90 €	30	40	30	2 881,00 €	
671-00 Čerpaná doprava isola v km 0 (86. sáv) v B1,3 v MUK Blatná	2	6	0		242,28 €	2	6			2 422,28 €	2	6	0	242,28 €	
672-00 Čerpaná doprava isola v km 0 (86. sáv) v B1,3 v MUK Blatná	2	6	0		242,28 €	2	6			2 422,28 €	2	6	0	242,28 €	
681-01 Informačný systém, úsek km 29 600 - 31 025 v MUK Blatná - stavbuňá časť (chránky pod križovatkou) všetkami diaľnicami, 3ks základov pre porfily PDZ1			0		- €	24	56	32		3 157,12 €	24	56	32	3 157,12 €	
705-00 Priežokka VTL prípojky DN 300 v km 30 240 (16 640) diaľnice D1 BA - TT v MUK Blatná	40	60	60		3 153,00 €					3 153,00 €	40	60	60	3 153,00 €	
706-00 Priežokka VTL prípojky DN 80 v MUK Blatná	8	8	8		517,76 €					517,76 €	8	8	8	517,76 €	
753-00 Úprava ochrany produktovodu v km 0 028 úpravy cesty I/61 v MUK Blatná	10	16	10		816,46 €	6	6			388,32 €	10	16	10	816,46 €	
E Doklady	10	20	10		1 148,40 €					7 216,10 €	10	20	10	1 148,40 €	
F Dokumentácia meracích prác	10	20	10		9 116,00 €					15 950,00 €	10	20	10	9 116,00 €	
G Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy	20	55			2 281,75 €					2 411,90 €	20	55		2 281,75 €	
H Dokumentácia preskúvaní			40		1 858,60 €					- €	40	40	0	1 858,60 €	
I Dendrologický preskúvanie, inventarizácia a spoločenské ochodňovanie drevín	20	40	22		620,62 €					1 128,40 €	20	40	22	620,62 €	
J Pedologický preskúvanie	40	40	80		2 256,80 €					620,62 €	40	80	80	2 256,80 €	
K Emisná štúdia	80	80	22		620,62 €					1 692,60 €	80	80	22	620,62 €	
L Dopravnoinžiniersky preskúvanie	22	60	16		350,56 €					21 840,00 €	22	60	16	350,56 €	
M Kozmory a geoelektrický preskúvanie	60	60	16		350,56 €					1 152,00 €	60	60	16	350,56 €	
N Archeologický preskúvanie			21 840,00 €		21 840,00 €					- €	21 840,00 €		21 840,00 €	21 840,00 €	
O Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický preskúvanie			507,78 €		507,78 €					- €	0		0	507,78 €	
P18 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	18	18			1 825,50 €					- €	18	18		1 825,50 €	
P19 L,1 Projekt monitoringu výšky stavby na vybrané dĺžky Zp	50	50			1 460,40 €					- €	50	50		1 460,40 €	
P20 L,2 Projekt geotechnického monitoringu	40	40			1 460,40 €					- €	40	40		1 460,40 €	
P21 M Výškové stavby na živé prostredie	40	30	20		1 294,50 €					- €	40	30	20	1 294,50 €	
P22 N Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	30	30	20		1 722,62 €					- €	30	30	20	1 722,62 €	
P23 O Nákupný projekt organizácie výstavby	12	30	20		1 138,42 €					- €	12	30	20	1 138,42 €	
P24 P Bulletin	2	30	10		1 138,42 €					- €	2	30	10	1 138,42 €	
DPH 20 %					177 434,73 €					31 960,58 €				209 395,31 €	
Navyšovanie ceny bez DPH					35 486,95 €					6 392,12 €				41 879,06 €	
Navyšovanie ceny					212 921,68 €					38 362,70 €				251 274,37 €	
Cena za rozpočtovú prácu a služby za 1 ks DSP					150,00 €									150,00 €	

Poznámky:
 - Ukladač vyplňa žltou farbou označené bunky
 - Ukladač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé kisa

Stavba : Dielnica D1 Senec- Blatné, križovatka Blatné
Autorský dozor (AD)

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č.4

Klasifikačná produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h		Cena celkom
	28,21		
1 Výkon činnosti AD	Potrebný počet hodín	1200	v € 33 852,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH		33 852,00 €
	DPH 20 %		6 770,40 €
	Navrhovaná cena s DPH		40 622,40 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta

Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny
Majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby

	Predmet	m.j.	počet m.j. *	Cena za m.j. bez DPH v €	Celková cena bez DPH v €
A	Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť vystavbou priamo dotknuté + prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	150	20,00	3 000,00 €
B	Vypracovanie a doručenie návrhu zmluvy a výzvy doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým a právnickým osobám + tabuľka v MS Excel. Rokovanie s vlastníkom a zabezpečenie uzavretia zmluvy, pri neuzavretí zmluve dodanie právoplatného vyvlastňovacieho alebo súdneho rozhodnutia + prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	150	90,00	13 500,00 €
C	Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmluvy alebo vyvlastňovacieho rozhodnutia do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa, a pod. + prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	150	10,00	1 500,00 €
D	Zastupovanie pred súdmi v rámci celého konania alebo zabezpečenie celého konania o súdnej úschove, notárskej úschove, súčinnosť pri zabezpečovaní náhradného bývania a náhradných objektov podnikateľských subjektov, legalizácia stavieb a pod. + prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	15	10,00	150,00 €
Navrhovaná cena bez DPH					18 150,00 €
DPH 20 %					3 630,00 €
Navrhovaná cena s DPH					21 780,00 €

K plneniu uvedených položiek je potrebné vypracovať prehľadnú tabuľku o stave MPV v MS Excel.
Vo výslednej cene nie sú obsiahnuté súdne a správne poplatky a pod., ktoré bude potrebné v zmysle platných právnych predpisov zaplatiť.
Pozn. * uvedený počet m.j. slúži len pre účely vyhodnotenia súťaže.

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	Zd		Dodatok č.1		Zd + Dodatok č.1		Pozn.	
			cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €	výsledné množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €		cena celkom bez DPH v €
F. Dokumentácia meračských prác										
F.1 Zameranie územia	1 ha	3	200,00	600,00	-0,7	200,00	-140,00	2,3	200,00	460,00
F.1.1 Vyčítanie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	40	80,00	3200,00	126	80,00	10380,00	166	80,00	13280,00
F.2 Vybudovanie a učenie parametrov bodu so závislou centrácou (pilier)	bod	2	1150,00	2300,00	0	1150,00	0,00	2	1150,00	2300,00
F.2 Vybudovanie a učenie parametrov bodu s ocelovou pažnicou	bod	2	750,00	1500,00	2	750,00	1500,00	4	750,00	3000,00
F.3 Vyčítanie priestorovej polohy stavby	bod	22	28,00	616,00	0,00	28,00	0,00	22	28,00	616,00
F.4 Vyhodnotenie podkladov pre všetky druhy GP	100 m	90	10,00	900,00	169,21	10,00	1692,10	259,21	10,00	2592,10
F. Dokumentácia meračských prác - cena celkom				9116,00			13132,10			22248,10
G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie										
G.1 GP pre trvalý záber	100 m	90	80,00	7200,00	-1,6	80,00	-128,00	88,4	80,00	7072,00
G.2 GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	90	50,00	4500,00	47,51	50,00	2375,50	137,51	50,00	6875,50
G.3 GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierska sieť)	100 m	40	60,00	2400,00	-8,76	60,00	-525,60	31,24	60,00	1874,40
G.4 Vykupné elaboráty	vrátnik	292	3,00	756,00	168	3,00	504,00	420	3,00	1280,00
G.5 Situácia dotknutých pozemkov	100 m	40	11,00	440,00	0,00	11,00	0,00	40	11,00	440,00
G.6 Zoznam dotknutých parciel	parcely	218	3,00	654,00	62	3,00	186,00	280	3,00	840,00
G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie - cena celkom				15950,00			2411,90			18361,90

Zmena ceny za časť F v DSP:
 Presun častí F.2 a F.3 do DP - v zmysle ZoD - 4 416,00 €
 Navštevne častí F.1 a F.4 - v zmysle Dodatku č.1 11 632,10 €
 Zmena ceny za časť F v DSP: 7 216,10 €

Zmena ceny za časť F v DP:
 Presun častí F.2 a F.3 do DP - v zmysle ZoD 4 416,00 €
 Navštevne častí F.2 a F.3 - v zmysle Dodatku č.1 1 500,00 €
 Zmena ceny za časť F v DP: 5 916,00 €

UPOZORNENIE:
 Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred

Časť	Druh práce	m.j.	Zod		Dodatok č. 1		Zod + Dod. č. 1		
			počet m. j.	m.j. v € bez DPH	počet m. j.	m.j. v € bez DPH	počet m. j.	m.j. v € bez DPH	
A 1	TERÉNNÉ PRÁCE			13660,00		-900,00		12760,00	
	inžinierskogeologické vrty vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska, ovozokovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	101	40,00	0	40,00	0,00	101	40,00
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska a dopravy	m	46	30,00	0	30,00	0,00	46	30,00
	státičné penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska a dopravy	m	46	50,00	0	50,00	0,00	46	50,00
	presonometrické inžinierskogeologické vrty vrátane prípravnych prác, zriadenia staveniska, odobralia vzoriek a dopravy, spätné úpravy vrtu	m	50	90,00	6	90,00	540,00	56	90,00
	presonometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	12	120,00	-12	120,00	-1440,00	0	120,00
A2	GEOPFYZIKÁLNE PRÁCE			1600,00		-120,00		1480,00	
	georadarové merania - priemerný náklad s vyhodnotením	m	800	2,00	-60	2,00	-120,00	740	2,00
B1	LABORATORNÉ PRÁCE – mechanika zemín			2480,00		-82,00		2428,00	
	podrobná vzorka - klasifikačný rozbor pre zariadenie podľa STN 77 1001	ks	20	42,00	-2	42,00	-84,00	18	42,00
	nepodrobná vzorka - klasifikačný rozbor pre zariadenie podľa STN 77 1001 + objemová hmotnosť + merná hmotnosť	ks	10	52,00	4	52,00	208,00	14	52,00
	zeminy - sláčikovosť s rekonštrukciou	ks	14	40,00	-2	40,00	-80,00	12	40,00
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv	ks	6	10,00	-3	10,00	-30,00	3	10,00
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	5	12,00	-3	12,00	-36,00	2	12,00
	zeminy - božnosť	ks	4	15,00	0	15,00	0,00	4	15,00
	zeminy - presadivosť	ks	4	65,00	0	65,00	0,00	4	65,00
	zeminy - presadivosť	ks	8	15,00	-2	15,00	-30,00	6	15,00
B2	LABORATORNÉ PRÁCE – chémia vôd			400,00		0,00		400,00	
	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab. Z STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	4	100,00	0	100,00	0,00	4	100,00
C	MERACSKÉ PRÁCE			300,00		-80,00		220,00	
	vyššenie vrtov, penetračných sond, bodov SF	ks	30	5,00	-8	5,00	-40,00	22	5,00
D	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY			150,00		-40,00		110,00	
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	30	5,00	-8	5,00	-40,00	22	5,00
	projekt geologických prác	ks	2	50,00	0	50,00	0,00	2	50,00
	záverečné spracovanie grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých preskúmaných -1), archívnych i realizovaných, diel a profilov, účelová (G mapa, pozdĺžne a priečne (G rezy, vvsvetlivky, geotechnické výpočty, účelová inžinierskogeologická mapa, geotechnické zhrnutie, základná a priečna (G rezy, vvsvetlivky, geotechnická výpočty, účelová inžinierskogeologická mapa, realizovaných, fotodokumentácia preskúmaných diel po odvíraní, fotodokumentácia preskúmaných diel po spätnom zásepe, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, meracia správa všetkých preskúmaných diel, technická správa) + CD, ktoré obsahujú všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečenie profi. ladeniu a kopírovaniu) + počet výtlačkov záverečnej správy v uvedení v časti B.1 príloha 1	ks	1	300,00	0	300,00	0,00	1	300,00
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)			21840,00		-1152,00		20688,00	
A	REKAPITULÁCIA								
	terénne práce			15 260,00 €		- 1 020,00 €		14 240,00 €	
	laboratorné práce			2 880,00 €		- 52,00 €		2 828,00 €	
	meracské práce			300,00 €		- 80,00 €		220,00 €	
	práce geologickej služby			3 400,00 €		- €		3 400,00 €	
	Navyšovaná cena bez DPH			21 840,00 €		- 1 152,00 €		20 688,00 €	

Stavba: Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné
 Špecifikačná cena prác
 Inžinierska činnosť k EIA a stavebnému konaniu

Tabuľka č.8

Predmet	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
		36,51	28,21	21,90	
1	IČ v rámci zabezpečenia stanoviska MŽP	20			730,20 €
2	IČ pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia	280	280		18 121,60 €
	Navrhovaná cena bez DPH				18 851,80 €
	DPH 20 %				3 770,36 €
	Navrhovaná cena s DPH				22 622,16 €
			Potrebný počet hodín		

Stavba: Dialnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Špecifikácia ceny prác spolu

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9, 79.10.00.00-5, 71.31.34.00-9.

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 9

	Cena Z0D v € bez DPH	Cena Dod. č.1 v € bez DPH	Cena Z0D + Dod č.1 v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Oznámenie 8a	6 067,08	-	6 067,08 €	1 213,42 €	7 280,50 €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	177 434,73	31 960,58	209 395,31 €	41 879,06 €	251 274,37 €
Dokumentácia na ponuku (DP)	103 367,89	22 275,42	125 643,31 €	25 128,66 €	150 771,97 €
Inžinierska činnosť (IČ)	18 851,80	-	18 851,80 €	3 770,36 €	22 622,16 €
Majetkovoprávne vysporiadanie (MPV)	18 150,00	-	18 150,00 €	3 630,00 €	21 780,00 €
Autorský dozor	33 852,00	-	33 852,00 €	6 770,40 €	40 622,40 €
Spolu	357 723,50 €	54 236,00 €	411 959,50 €	82 391,90 €	494 351,40 €

Cena naviac vyláčkov nad rámec počtov definovaných v B.1 Príloha č.1

5 paré 8a nad rámec v zmysle Prílohy č. 1, bod 4.6			200,00 €	40,00 €	240,00 €
5 paré DSP nad rámec v zmysle Prílohy č. 1, bod 4.6			750,00 €	150,00 €	900,00 €
5 paré DP nad rámec v zmysle Prílohy č. 1, bod 4.6			900,00 €	180,00 €	1 080,00 €
Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže - kritérium)			413 809,50 €	82 761,90 €	496 571,40 €
