



## Dodatok č.5

**k Zmluve na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR),  
dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
dokumentácie na ponuku (DP), majetkovoprávne vysporiadanie (MPV), inžiniersku činnosť (IČ) a  
výkon autorského dozoru (AD)  
na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

(ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: ZM/2011/0423

Číslo zhotoviteľa: 7732-00

## Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
 Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3518/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
**Ing. Milan Gajdoš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA**, podpredseda predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie  
 - vo veciach zmluvných:  
 - vo veciach technických :
- vo veciach cenových:  
 Bankové spojenie:
- Číslo účtu (IBAN):  
 SWIFT kód:  
 IČO: 35 919 001  
 DIČ: 2021937775  
 IČ DPH: SK2021937775  
 Tel./Fax:
- ďalej len „objednávateľ“  
 a
- 1.2 Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Sídlo: Kominárska 2, 4 , 832 03 Bratislava  
 Právna forma: Akciová spoločnosť,  
 Zápis v obchodnom registri: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo  
 v zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Igor Jakubík**,  
 podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.  
**Ing. Martin Šutka**,  
 člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie  
 - vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:  
 - vo veciach cenových:
- Číslo účtu:  
 IČO: 31 322 000  
 DIČ: 202054770  
 IČ DPH: SK202054770

Tel./Fax:

ďalej len „zhotoviteľ“  
ďalej spoločne „zmluvné strany“**PREAMBULA K DODATKU č.5 K ZMLUVE**

Dotatok č.5 k zmluve sa uzatvára na základe ustanovenia uvedeného v dodatku č.4 k zmluve, kde sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, že termín právoplatnosti rozhodnutia o vstupoch na pozemky a následne vykonaný IGHP nebude v termíne do 15.03.2013, zmenu termínov plnenia diela budú riešiť novým dodatkom k zmluve. Tento termín nebol dodržaný.

Dotatok č.5 k zmluve sa taktiež uzatvára na základe žiadosti objednávateľa o vypracovanie informačného systému RC v DSP a DP podľa TP 09/2008 a TP 10/2008, ako aj podľa štúdie „Konceptia aplikácii IDS na riadenie dopravy v nadradenej cestnej sieti v priestore širšieho dopravného uzla Bratislava do roku 2020“ z novembra 2013, v zmysle záverov z pracovného rokovania DSP predmetnej stavby dňa 4.11.2014. Vzhľadom k tomu, že DÚR bola vypracovaná podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v súťažných podkladoch, t.j. podľa materiálu „Informačný systém na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá - stupeň vybavenosti technológiou“, schváleným MDPS SR dňa 3.2.2005, je potrebné dopracovať dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v novej štúdii. Dotatok č.5 k zmluve sa uzatvára v súlade s čl. 6 bod 6.7 časť 1 tejto zmluvy. Predmetom dodatku č.5 k zmluve je dopracovanie častí DSP a DP o novú časť IS RC. V súvislosti so zmenou uvedených predpisov je potrebné pre objekt 791-01 IS R 7-stavebná časť navýšiť počet portálov pre premenné dopravné značenie.

Vzhľadom k zmene rozsahu a obsahu predmetu diela v časti DSP a DP sa mení termín plnenia diela a cena diela. Z dôvodu zmeny ceny diela podľa čl. 6 bod 6.8 časť 1 tejto zmluvy je cena navyiac prác ocenená podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmene osoby oprávnenej na rokovanie vo veciach technických a zároveň vykonávajúcej funkciu hlavného inžiniera projektu na strane zhotoviteľa, uvedenej v záhlaví tohto dodatku. preberá zároveň zodpovednosť za prípadné dopracovanie všetkých častí dokumentácie, za ktoré bol v zmysle Ponuky zhotoviteľa zodpovedný.

**PREDMET DODATKU****ČASŤ 1****1.1 V časti 1 čl. 5 sa bod 5.3 nahrádza novým bodom 5.3, ktorý znie:**

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa **do 30.4.2015**.

**1.2 V časti 1 čl. 6 bod 6.2 sa za podbod 6.2.4 dopĺňa nový podbod 6.2.5, ktorý znie nasledovne:****6.2.5 Cena podľa dodatku č.5 k zmluve:**

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| a) | Cena DUR bez DPH v EUR:   | 48 534,42 €  |
|    | Sadzba DPH 20% v EUR:   | 9 706,88 €   |
|    | Cena DUR vrátane DPH v EUR:   | 58 241,30 €  |
|    | (slovom: päťdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťjeden celých a tridsať stotín eura);  |              |
| b) | Cena zmena navrhovanej činnosti stavby bez DPH v EUR:                             | 11 191,80 €  |
|    | Sadzba DPH 20% v EUR:   | 2 238,36 €   |
|    | Cena zmena navrhovanej činnosti stavby vrátane DPH v EUR:                         | 13 430,16 €  |
|    | (slovom: trinásťtisícštyristotridsať celých a šesťnásť stotín eura);              |              |
| c) | Cena posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 bez DPH v EUR:                           | 9 403,10 €   |
|    | Sadzba DPH 20% v EUR:   | 1 880,62 €   |
|    | Cena posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 vrátane DPH v EUR:                       | 11 283,72 €  |
|    | (slovom: jedenásťtisícdeväťstoosemdesiattri celých a sedemdesiatdva stotín eura); |              |
| d) | Cena DSZ bez DPH v EUR:   | 122 921,65 € |
|    | Sadzba DPH 20% v EUR:   | 24 584,33 €  |
|    | Cena DSZ vrátane DPH v EUR:   | 147 505,98 € |
|    | (slovom: jednoštyridsaťsedemtisícpäťstopäť celých a deväťdesiatosem stotín eura); |              |
| e) | Cena DSP bez DPH v EUR:   | 336 635,03 € |

Sadzba DPH 20% v EUR: 67 327,01 €  
 Cena DSP vrátane DPH v EUR: 403 962,04 €  
 (slovom: štyristotritisícdeväťstošesťdesiatdva celých a štyri stotiny eura);

f) Cena DP bez DPH v EUR: 160 919,69 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 32 183,94 €  
 Cena DP vrátane DPH v EUR: 193 103,63 €  
 (slovom: jedno stodeväťdesiatritisícstoti celých a šesťdesiattri stotiny eura);

g) Cena diela celkom bez DPH v EUR: 689 605,69 €  
 Sadzba DPH 20%: 137 921,14 €  
**Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: 827 526,83 €**  
 (slovom: osemsto dvadsaťsedemtisícpäťstodvadsaťšesť celých a osemdesiattri stotiny eura);

**1.3 V časti 1 čl. 6 bod 6.2 sa tabuľka „Rekapitulácia ceny podľa čl.6 bod 6.2 tejto zmluvy“ nahrádza nasledujúcou tabuľkou:**

**Rekapitulácia ceny podľa čl. 6 bod 6.2 tejto zmluvy:**

Rekapitulácia ceny v EUR bez DPH	Zmluva	Dodatok č.1		Dodatok č.3		Dodatok č.4	
		navýšenie ceny	výsledná cena	zmena ceny	výsledná cena	navýšenie ceny	výsledná cena
Dokumentácia stavebného zámeru	176 343,92 €	17 508,48 €	193 852,40 €	- 70 930,75 €	122 921,65 €		122 921,65 €
Dokumentácia pre územné rozhodnutie	41 584,16 €	6 950,26 €	48 534,42 €		48 534,42 €		48 534,42 €
Zmena navrhovanej činnosti a netechnické zhrnutie						11 191,80 €	11 191,80 €
Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000						9 403,10 €	9 403,10 €
Dokumentácia na stavebné povolenie	223 098,63 €	30 939,05 €	254 037,68 €	70 930,75 €	324 968,43 €		324 968,43 €
Dokumentácia pre ponuku	132 737,66 €	22 330,39 €	155 068,05 €		155 068,05 €		155 068,05 €
<b>Spolu</b>	<b>573 764,37 €</b>	<b>77 728,18 €</b>	<b>651 492,55 €</b>		<b>651 492,55 €</b>	<b>20 594,90 €</b>	<b>672 087,45 €</b>

Rekapitulácia ceny v EUR bez DPH	Dodatok č.5	
	navýšenie ceny	výsledná cena
Dokumentácia stavebného zámeru		122 921,65 €
Dokumentácia pre územné rozhodnutie		48 534,42 €
Zmena navrhovanej činnosti a netechnické zhrnutie		11 191,80 €
Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000		9 403,10 €
Dokumentácia na stavebné povolenie	11 666,60 €	336 635,03 €
Dokumentácia pre ponuku	5 851,64 €	160 919,69 €
<b>Spolu</b>	<b>17 518,24 €</b>	<b>689 605,69 €</b>

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín. Rozpočet ceny podľa dodatku č.5 k zmluve tvorí ako príloha č. 10 neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.5 k zmluve.

## ČASŤ 2

### 2.1 V časti 2 čl. 5 sa bod 5.1 nahrádza novým bodom 5.1, ktorý znie nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať **kompletné MPV do 30.6.2017.**

**ČASŤ 3****3.1 V časti 3 čl. 5 sa body 5.5 až 5.9 nahrádzajú novými bodmi 5.5 až 5.9, ktoré znejú nasledovne:**

- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať IČ pre stavebné konanie najneskôr do **26.09.2015**.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DSP do **26.08.2015**.
- 5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF najneskôr do **26.08.2015**.
- 5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF najneskôr do **26.08.2015**.
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť **právoplatné stavebné povolenia do 30.09.2015**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok č.5 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
2. Dodatok č.5 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č.5 k zmluve oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Prílohy č. 1 až 10 podľa zmluvy v znení jej dodatkov k zmluve sa nahrádzajú prílohami č.1 až 10 tohto dodatku č.5 k zmluve.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.5 sú prílohy:
  - č.1 – harmonogram všetkých prác zhotoviteľa
  - č.2 – harmonogram prác zhotoviteľa na DUR
  - č.3 – harmonogram prác zhotoviteľa na zmene navrhovanej činnosti stavby
  - č.4 – harmonogram prác zhotoviteľa na posúdení vplyvu územia NATURA 2000
  - č.5 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSZ
  - č.6 – harmonogram vydania územného rozhodnutia
  - č.7 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSP
  - č.8 – harmonogram vydania stavebného povolenia
  - č.9 – harmonogram prác zhotoviteľa na DP
  - č.10 – špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (tabuľky 1.1 až 1.10)

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

**Objednávatel':**  
Odtlačok pečiatky:**Zhotoviteľ':**  
Odtlačok pečiatky:**Ing. Milan Gajdoš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ**Ing. Igor Jankubík**  
podpredseda predstavenstva  
a výrobný riaditeľ a.s.**Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA**  
podpredseda predstavenstva**Ing. Martin Šutka**  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ a.s.

## Harmonogram prác

- č.1 – harmonogram všetkých prác zhotoviteľa
- č.2 – harmonogram prác zhotoviteľa na DUR
- č.3 – harmonogram prác zhotoviteľa na zmene navrhovanej činnosti stavby
- č.4 – harmonogram prác zhotoviteľa na posúdení vplyvu územia NATURA 2000
- č.5 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSZ
- č.6 – harmonogram vydania územného rozhodnutia
- č.7 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSP
- č.8 – harmonogram vydania stavebného povolenia
- č.9 – harmonogram prác zhotoviteľa na DP

**Príloha č. 10**

**Špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (tabuľky 1.1 až 1.10)**

Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia stavebného zámery

Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Názov časti dokumentácie	Potrebný počet hodín				Cena celkom v €
	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
	36,51	28,21	21,91		
<b>1</b>	<b>Projektová časť</b>				
A	Sprievodná správa	12	12	12	1 039,56 €
B	Technická správa	12	23	12	1 349,87 €
B1	Prehľadné tabuľky	5	19	23	1 222,47 €
B2	Výpočet smerového vedľa trasy	5	12	9	718,26 €
C	Ekonomická správa	23	12	12	1 441,17 €
D	Výkresy	117	1 869	981	78 489,87 €
E	Doklady		9	47	1 283,66 €
<b>3</b>	<b>Podklady a prieskumy</b>				
1	Dopravno-inžiniersky prieskum			140	3 067,40 €
2	Pedologický prieskum	23	19		1 375,72 €
3	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného		23	23	1 152,76 €
4	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevin rastúcich mimo lesa		23	23	1 152,76 €
5	Architektonická štúdia		12		338,52 €
6	Hluková štúdia		47		1 325,87 €
7	Exhalačná štúdia		47		1 325,87 €
8	Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum				1 500,00 €
9	Korozny a geoelektrický prieskum	16	26	23	1 821,55 €
10	Seizmický prieskum	23	18		1 347,51 €
11	Archeologický prieskum		18	6	639,24 €
12	Geodetický elaborát	23	561	175	20 499,79 €
<b>4</b>	<b>G Cena verejnej práce</b>		47	23	1 829,80 €
	Navrhovaná cena bez DPH				122 921,65 €
	DPH 20 %				24 584,33 €
	Navrhovaná cena s DPH				147 505,98 €

Špecifická cena prác

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Klasifikačná produkcia : 74.23.11.22-8

Názov časti dokumentácie		Potrebný počet hodín				Cena celkom v €
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
1	Projektová časť	36,51	28,21	21,91		
A	Správná správa		12	12		601,44 €
B	Technická správa		12	12		601,44 €
C	Ekonomická správa		210	12		262,92 €
D	Výkresy		210	210		10 525,20 €
2	Doklady		12	23		842,45 €
3	Podklady a prieskumy					
1	Dopravno-inžiniersky prieskum			9		197,19 €
2	Pedologický prieskum			9		197,19 €
3	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu			9		197,19 €
4	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa			9		197,19 €
5	Architektonická štúdia			9		197,19 €
6	Hluková štúdia			9		197,19 €
7	Exhalačná štúdia			9		197,19 €
8	Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum			0		- €
9	Korozny a geoelektrický prieskum			9		197,19 €
10	Seizmický prieskum			9		197,19 €
11	Archeologický prieskum			9		197,19 €
12	Geodetický elaborát			35		1 754,20 €
4	G Cena verejnej práce			9		197,19 €
5	H Záber pozemkov	409		304	103	25 765,16 €
6	J Vplyv stavby na životné prostredie			47		1 325,87 €
7	K Projekt monitoringu	23		35	47	2 856,85 €
	Informačný bulletin			47	23	1 829,80 €
	NAVrhovaná cena bez DPH					48 534,42 €
	DPH 20 %					9 706,88 €
	NAVrhovaná cena s DPH					58 241,30 €



Názov časti dokumentácie	Potrebný počet hodín Z0d + Dodatky 1-4			Cena celkom v €	Potrebný počet hodín Dodatok 5			Cena celkom v €	Potrebný počet hodín Z0d + Dodatky 1-5			Cena celkom v €
	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
<b>Dokumentácia na stavebné povolenie</b>												
A Späťvodná správa	12	12	47	1 806,41 €				- €	12	12	47	1 806,41 €
B.1 Práhradná situácia M 1:10 000	9	12	23	1 171,04 €				- €	9	12	23	1 171,04 €
B.2 Celková situácia stavby M 1:5 000	9	12	23	1 171,04 €				- €	9	12	23	1 171,04 €
B.3 Pozdĺžny rez M 1:5 000/ 500	9	12	23	1 171,04 €				- €	9	12	23	1 171,04 €
B.4 Ortofotozmapa M 1:5 000	9	35	23	1 491,28 €				- €	0	35	23	1 491,28 €
B.5 Vizualizácia	9	47	23	2 158,39 €				- €	9	47	23	2 158,39 €
C.1 Koordinátny výkres M 1:1000	23	70	23	3 318,36 €				- €	23	70	23	3 318,36 €
C.2 Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	9	70	47	3 333,06 €	12	90	21	2 977,02 €	47	180	47	6 310,08 €
D Písomnosť a výkresy objektov	35	2 080	3 972	146 981,17 €	12	176	150	8 889,58 €	47	2 256	4 122	158 670,75 €
E Doklady	9	35	23	1 819,87 €				- €	9	35	23	1 819,87 €
F Dokumentácia metacských prác	251	251	242	21 546,94 €				- €	251	251	242	21 546,94 €
G Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	12	47	47	2 793,76 €				- €	12	47	47	2 793,76 €
H Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PRF a LPF	23	23	23	1 152,76 €				- €	0	23	23	1 152,76 €
I Dokumentácia prieskumov												
inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	6	12		557,58 €				- €	6	12	0	557,58 €
inventarizácia a spol. ohodnotenie drevin rastúcich mimo lesa	23	47		2 165,60 €				- €	23	47	0	2 165,60 €
Hluková štúdia	18	18		507,78 €				- €	0	18	0	507,78 €
Exhlačná štúdia	18	18		507,78 €				- €	0	18	0	507,78 €
Korózy a geoelektrický prieskum	6	6	19	585,55 €				- €	0	6	19	585,55 €
Dopravno-inžiniersky prieskum	82	82	82	1 796,62 €				- €	0	0	82	1 796,62 €
Pedologický prieskum	18	18		394,38 €				- €	0	0	18	394,38 €
Archéologický prieskum	6	6		131,46 €				- €	0	0	6	131,46 €
Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum	110	110	6	110 164,50 €				- €	0	0	6	110 164,50 €
J Dokumentácia pre ZSR	140	93		5 987,03 €				- €	0	140	93	5 987,03 €
K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	20	19		980,49 €				- €	0	20	19	980,49 €
L Projekt monitoringu vplyvu stavby na životné prostredie	47	47	70	4 575,54 €				- €	47	47	70	4 575,54 €
M Vplyv stavby na životné prostredie	12	12		338,52 €				- €	0	12	0	338,52 €
N Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siele	47	47	35	2 092,72 €				- €	0	47	35	2 092,72 €
O Návrh projektu organizácie výstavby	28	70	58	4 267,76 €				- €	28	70	58	4 267,76 €
Návrhovaná cena bez DPH				324 968,43 €				11 666,80 €				336 635,03 €
DPH 20 %				64 993,69 €				2 333,32 €				67 327,01 €
Návrhovaná cena s DPH				389 962,12 €				13 999,92 €				403 962,04 €

Časť	Druh prác	m.j.	I. etapa		II. etapa			
			počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH		
A1	<b>TERÉNNÉ PRÁCE</b>							
	jadrové inžierskogeologické vrtý vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m		22,00	- €	930	22,00	20 460,00 €
	jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (Wireline), vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m		55,00	- €	2	55,00	110,00 €
	presíomerické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m		22,00	- €	380	22,00	8 360,00 €
	presíomerické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks		120,00	- €	68	120,00	8 160,00 €
	horizontálny inžierskogeologický vrt s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätné úpravy vrtu	m		150,00	- €	2	150,00	300,00 €
	inclinometrické jadrové IG vrtý so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nulého a prvého merania s vyhodnotením	m		70,00	- €	2	70,00	140,00 €
	inclinometrické jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (Wireline) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nulého a prvého merania s vyhodnotením	m		80,00	- €	2	80,00	160,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrtý na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m		60,00	- €	2	60,00	120,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou (Wireline) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m		70,00	- €	2	70,00	140,00 €
	piezometrické jadrové vrtý s dvojitou jadrovnicou (Wireline) so zabudovaním, vrátane priprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m		36,00	- €	56	40,00	2 240,00 €
	hydrodynamická skúška (na 1 vrte)	ks		800,00	- €	2	800,00	1 600,00 €
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)	ks		300,00	- €	6	300,00	1 800,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy vrtu	m		22,00	- €	450	22,00	9 900,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy vrtu	m		20,00	- €	200	20,00	4 000,00 €
	kopané sondy - šachtice, vrátane spätnéj úpravy, dopravy	m		60,00	- €	50	60,00	3 000,00 €
	dočasná prístupová cesta	m2		2,00	- €	375	2,00	750,00 €
	<b>GEOFYZIKÁLNE PRÁCE</b>							
	metóda SOP - priemerný náklad s vyhodnotením	m		3,75	- €	2	3,75	7,50 €
	georadarové meranie - priemerný náklad s vyhodnotením	m		8,00	- €	2	8,00	16,00 €
vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m		1,80	- €	3600	1,80	6 480,00 €	
seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením	m		6,00	- €	2	6,00	12,00 €	
gravimetria - priemerný náklad s vyhodnotením	m		3,00	- €	2	3,00	6,00 €	
karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m		12,00	- €	80	12,00	960,00 €	
<b>LABORATORNÉ PRÁCE – mechanika zemín a skalných hornín</b>								
zeminy - ponušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks		39,00	- €	180	39,00	7 020,00 €	
zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks		50,00	- €	145	50,00	7 250,00 €	
zeminy - technologické vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zhutniteľnosť (PS, ID)	ks		50,00	- €	17	50,00	850,00 €	
zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks		102,00	- €	25	102,00	2 550,00 €	
zeminy - krabicová šmyková skúška (reziduálna šmyková pevnosť)	ks		50,00	- €	25	50,00	1 250,00 €	
zeminy - triaxiálna šmyková skúška	ks		85,00	- €	20	85,00	1 700,00 €	
zeminy - slietateľnosť bez rekonsolidácie	ks		26,00	- €	25	26,00	650,00 €	
zeminy - slietateľnosť s konsolidáciou	ks		39,00	- €	25	39,00	975,00 €	
			<b>25 328,00 €</b>					
			<b>7 491,50 €</b>					

B1	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie; cv	ks		9,00	- €	15	9,00	135,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (1 valček)	ks		13,00	- €	10	13,00	130,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín	ks		40,00	- €	17	40,00	680,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks		11,00	- €	25	11,00	275,00 €
	zeminy - Proctor štandard	ks		43,00	- €	9	43,00	387,00 €
	zeminy - bobtnavosť	ks		14,00	- €	5	14,00	70,00 €
	zeminy - priepustnosť	ks		60,00	- €	7	60,00	420,00 €
	zeminy - presadavosť	ks		14,00	- €	3	14,00	42,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlast. objemová a merná hmotnosť, nasákavosť, mrazuvzdornosť)	ks		52,00	- €	2	52,00	104,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks		90,00	- €	2	90,00	180,00 €
	skalné horniny - pretvárné vlastnosti	ks		200,00	- €	2	200,00	400,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST	ks		20,00	- €	2	20,00	40,00 €
	skalné horniny - deformáčny modul, Poissonove číslo, modul pružnosti	ks		110,00	- €	2	110,00	220,00 €
	<b>LABORATORNE PRÁCE – chémia vôd a zemín</b>				<b>€</b>			<b>3 335,00 €</b>
	B2	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks		57,00	- €	55	57,00
rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)		ks		10,00	- €	20	10,00	200,00 €
C	<b>MERACSKÉ PRÁCE</b>				<b>€</b>			<b>2 202,00 €</b>
	vyčistenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks		5,00	- €	220	5,00	1 100,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks		5,00	- €	220	5,00	1 100,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m		1,00	- €	2	1,00	2,00 €
	<b>PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY</b>				<b>€</b>			<b>10 578,00 €</b>
	projekt geologickej úľahy	ks		200,00	- €	4	200,00	800,00 €
	archivácia vrtného jadra (vzorkovnice s krytom + doprava do skladu NDS v Bratislave)	m		5,00	- €	80	5,00	400,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks		2,00	- €	200	2,00	400,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks		2,00	- €	135	2,00	270,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks		2,00	- €	19	2,00	38,00 €
vzorkovanie - voda	ks		2,00	- €	55	2,00	110,00 €	
kontrolné inklinometrické meranie	m		10,00	- €	2	10,00	20,00 €	
kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks		5,00	- €	8	5,00	40,00 €	
D	záverečné spracovanie:							
	I. etapa: z archívnych materiálov							
	II. etapa: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých preskúmaných -tj. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžiniersko-geologická mapa - inžiniersko-geologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilné výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením) a textové prílohy (inžiniersko-geologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia preskúmaných diel po odvratí, fotodokumentácia preskúmaných diel po spätnom zášype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilné výpočty, meracia správa všetkých preskúmaných diel, geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti lačeniu a kopírovaniu) + reprografické práce - počet výťažkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2	subor	1	1 500,00	1 500,00 €	1	8 500,00	8 500,00 €
	<b>Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)</b>				<b>1 500,00 €</b>			<b>110 164,50 €</b>
	<b>DPH 20 %</b>				<b>300,00 €</b>			<b>22 032,90 €</b>
	<b>Navrhovaná cena s DPH</b>				<b>1 800,00 €</b>			<b>132 197,40 €</b>

Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny

Majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby

	Predmet	m.j.	počet m.j.*	Cena za m.j. bez DPH v €	Celková cena bez DPH v €
	Zabezpečenie LV a PK vložky (výpisu) zo železničnej knihy (resp. dedičského rozhodnutia)	ks	335	2,00	670,00 €
A	Lustrácia LV, PK vložky alebo vložky zo železničnej knihy	ks	335	2,00	670,00 €
	Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť vystavbou priamo dotknuté	ks	335	40,00	13 400,00 €
B	Vypracovanie a doručenie návrhu zmluvy a výzvy doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým a právnickým osobám+tabuľka v MS Excel	ks	335	2,00	670,00 €
C	Zabezpečenie uzavretia zmluvy, pri neuzavretej zmluve dodanie právoplatného vyvlastňovacieho rozhodnutia, obmedzenia/vlastníckeho práva, alebo právoplatného súdneho rozhodnutia	ks	335	95,00	31 825,00 €
D	Podanie návrhu na zápis zmluvy do katastra nehnuteľnosti a zabezpečenie vystavenia LV na nadobudateľa	ks	335	2,00	670,00 €
E	Zastupovanie pred súdmi v rámci celého konania alebo zabezpečenie celého konania o súdnej Uschove	ks	15	2,00	30,00 €
<b>Navrhovaná cena bez DPH</b>					<b>47 935,00 €</b>
<b>DPH 20 %</b>					<b>9 587,00 €</b>
<b>Navrhovaná cena s DPH</b>					<b>57 522,00 €</b>

K plneniu uvedených položiek je potrebné vypracovať prehľadnú tabuľku o stave M/PV v MS Excel.

Vo výslednej cene nie sú obsiahnuté súdne a správne poplatky a pod., ktoré bude potrebné v zmysle platných právnych predpisov zaplatiť.

Pozn. \* uvedený počet m.j. slúži len pre účely vyhodnotenia súťaže

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifická cena prác  
 Inžinierska činnosť k územnému a k stavebnému konaniu

Tabuľka č. 1.6

Predmet	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91		
IČ za zabezpečenie Protokolu o vykonaní štátnej expertízy	50	200			7 467,50 €
IČ za zabezpečenie stanovisk k DUR	120	250	80		13 186,50 €
IČ za zabezpečenie právoplatného ÚR	100				3 651,00 €
IČ za zabezpečenie stanovisk k DSP	120	200	100		12 214,20 €
IČ za zabezpečenie rozhodnutia o vyňatí z PPF		50			1 410,50 €
IČ za zabezpečenie rozhodnutia o vyňatí z LPP		50			1 410,50 €
IČ za zabezpečenie právoplatného SP	300				10 953,00 €
<b>Navrhovaná cena bez DPH</b>					50 293,20 €
<b>DPH 20 %</b>					10 058,64 €
<b>Navrhovaná cena s DPH</b>					60 351,84 €

## Špecifikácia ceny prác

## Dokumentácia pre ponuku a výkon autorizačného dozoru

Mastické Produktie: 74.20.31

Činnosť	sazba €/h		sazba €/h		sazba €/h		Cena celkom v €	sazba €/h		sazba €/h		sazba €/h		Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91	Potrebný počet hodín	36,51	28,21		21,91	Potrebný počet hodín	36,51	28,21	21,91	Potrebný počet hodín	
<b>DOKUMENTÁCIA PRE PONUKU</b>														
3 Zväzok 3 Technické špecifikácie														
3.1 Všeobecné informácie o požiadavky		47				1 325,87 €								1 325,87 €
3.1.1 Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)		14				394,94 €								394,94 €
3.1.1.1 Zvyšná technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)		35				987,35 €								987,35 €
4 Zväzok 4 Cenové časti														
4.1 Preambula	12	12				776,64 €								776,64 €
4.2 Popis predmetu obstarávania	12	35				425,47 €								425,47 €
4.3 Celkový výkaz výmer	93	93				6 720,70 €								6 720,70 €
4.4 Súpis agregovaných položiek			23			503,93 €								503,93 €
4.5 Technické ocenenie	117	117				5 338,20 €								5 338,20 €
5 Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)														
A Správodná správa		35				2 017,12 €								2 017,12 €
B.1 Prehľadná situácia M 1:10 000	7	47				1 888,18 €								1 888,18 €
B.2 Celková situácia stavby M 1:5 000	9	47				1 961,20 €								1 961,20 €
B.3 Pozdĺžny rez M 1:5000/500	35	47				2 017,12 €								2 017,12 €
B.4.5 Ortoikomapa M 1:5 000	14	14				306,74 €								306,74 €
B.6 Vizualizácie	9	47				2 092,72 €								2 092,72 €
C.1 Koordinátny výkres M 1:1 000	23	23				1 481,35 €								1 481,35 €
C.2 Doporné zrkadlenie celaj stavby M 1:2 000	19	93				5 354,85 €								5 354,85 €
D Písomnosť a výkresy objektov	12	2 103				114 801,67 €								114 801,67 €
F Dokumentácia maraských prác	23	117				4 644,23 €								4 644,23 €
I Dokumentácia prístavkov	47	47				1 029,77 €								1 029,77 €
<b>VÝKON AUTORIZAČNÉHO DOZORU</b>														
Navrhovaná cena bez DPH														
DPH 20 %														
Navrhovaná cena s DPH														
172 528,00 €							5 851,64 €							178 447,69 €
34 519,21 €							1 170,33 €							35 689,54 €
207 115,28 €							7 021,97 €							214 137,23 €

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná

Tabuľka č. 18

Špecifikačná cena prác

Zmena navrhovanej činnosti a netechnické zhrnutie

Klasifikačná produkcie : 74.23.11.22-8

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91		
	Potrebný počet hodín				
1	Zmena navrhovanej činnosti stavby	80	140	70	8 403,90 €
2	Netechnické zhrnutie	30	60		2 787,90 €
					- €
	Navrhovaná cena bez DPH				11 191,80 €
	DPH 20 %				2 238,36 €
	Navrhovaná cena s DPH				13 430,16 €

Stavba : Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác  
 Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000  
 Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91		
		Potrebný počet hodín			
1 Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000	140	90	80		9 403,10 €
Navrhovaná cena bez DPH					- €
DPH 20 %					9 403,10 €
Navrhovaná cena s DPH					1 880,62 €
					11 283,72 €



Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác spolu

Tabuľka č. 1.10

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia stavebného zámeru	122 921,65 €	24 584,33 €	147 505,98 €
Dokumentácia pre územné rozhodnutie	48 534,42 €	9 706,88 €	58 241,30 €
Zmena navrhovanej činnosti a netechnické zhrnutie	11 191,80 €	2 238,36 €	13 430,16 €
Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000	9 403,10 €	1 880,62 €	11 283,72 €
Dokumentácia na stavebné povolenie	336 635,03 €	67 327,01 €	403 962,04 €
Inžinierska činnosť k územnému a k stavebnému konaniu	50 293,20 €	10 058,64 €	60 351,84 €
Dokumentácia pre ponuku a výkon autorského dozoru	178 447,69 €	35 689,54 €	214 137,23 €
Spolu	757 426,89 €	151 485,38 €	908 912,27 €
Majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie	47 935,00 €	9 587,00 €	57 522,00 €
Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže - kritérium)	805 361,89 €	161 072,38 €	966 434,27 €


Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifická cena prác spolu

Rekapitulácia ceny v EUR bez DPH	Zmluva	Dodatok č.1		Dodatok č.3		Dodatok č.4		Dodatok č.5	
		navýšenie ceny	výsledná cena	zmena ceny	výsledná cena	navýšenie ceny	výsledná cena	navýšenie ceny	výsledná cena
Dokumentácia stavebného zámernu	176 343,92 €	17 508,48 €	193 852,40 €	70 930,75 €	122 921,65 €	- €	122 921,65 €	- €	122 921,65 €
Dokumentácia pre územné rozhodnutie	41 584,16 €	6 950,28 €	48 534,42 €	- €	48 534,42 €	- €	48 534,42 €	- €	48 534,42 €
Zmena navrhovanej činnosti a technické zhrnutie						11 191,80 €	11 191,80 €	- €	11 191,80 €
Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000						9 403,10 €	9 403,10 €	- €	9 403,10 €
Dokumentácia na stavebné povolenie	223 098,63 €	30 939,05 €	254 037,68 €	70 930,75 €	324 968,43 €	- €	324 968,43 €	11 666,60 €	336 635,03 €
Dokumentácia pre poruku	132 737,66 €	22 330,39 €	155 068,05 €	- €	155 068,05 €	- €	155 068,05 €	5 851,64 €	160 919,69 €
Spolu	573 764,37 €	77 728,18 €	651 492,55 €	- €	651 492,55 €	20 594,90 €	672 087,45 €	17 518,24 €	689 605,69 €

# Harmonogram prác Zhotoviteľa na DSZ Úseku východnej časti R7 Bratislava - Dunajská Lužná

HMG & Dodateľka č. 8 Zmluvy

ID	Názov úlohu	Začiatok	Dokončenie
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku východnej časti R7 Bratislava - Dunajská Lužná	18.8.11	30.8.17
2	Vydanie zverejnenie stanovisko MŽP k Zámernu (proces EIA ukončený) dňa 9.8.2009	31.8.11	31.8.11
3	Viazanosť ponuky uchádzača	19.8.11	29.7.12
4	Podpis ZOD	28.11.11	28.11.11
5	Dodanie zaznamných podkladov potrebných pre zahájenie prác zo strany Obchodníka	26.1.12	20.1.12
6	Príprava stavby v stupni UR (DSZ)	23.1.12	27.6.14
7	Geodetický zábor (zameranie)	25.1.12	27.4.12
8	Predbežné preskúmy a štúdie orient. (G, a H): preskúmanie možnosti výstavby	28.3.12	15.9.12
9	Spracovanie dokumentácie DÚR	23.1.12	28.1.12
10	Termíny pracovných rokovani v stupni DÚR	15.2.12	12.9.12
22	Spracovanie dokumentácie DSZ	2.4.12	28.9.12
23	Termíny pracovných rokovani v stupni DSZ	4.4.12	18.8.12
33	Spracovanie časti H Dokumentácia pre zábery pozemkov	30.7.12	21.9.12
34	<b>MDVAER / Situačná expertíza</b>	1.10.12	27.6.13
35	Vypisovanie expertízneho posudku (vrátane možnosti vypisovania expertízneho protokolu externou organizáciou)	1.10.12	23.11.12
36	Vypisovanie expertízneho protokolu k situačnej expertíze	26.11.12	27.6.13
37	Podmienka Objedávateľa na zabezpečenie Údržby a znečistenia navrhovanej činnosti a Posudzovanie vplyvov Stavby na územie Oblasť ochrany prírody n.č. 13 (Príloha 83 Zákonu 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)	17.1.13	17.1.13
39	Informačná omnoha pre územné konanie (vrátane zabezpečenia stanovisk a rozhodnutí k DÚR)	11.1.13	15.4.14
41	Územné konanie	21.1.14	26.6.14
42	Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia	27.6.14	27.6.14
43	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	13.1.14	30.9.15
44	Právoptákosť rozhodnutia o výstavbe na pozemky a sýkonajnosť stavu	26.5.14	27.9.14
45	Podroby (G predkum a štúdie podrobné preskúmy a štúdie Spracovanie DSP	2.6.14	9.1.15
46	Spracovanie dokumentácie pre majetkovú úpravu (MÚV):	13.1.14	29.2.15
47	Oskuchávanie vzrovoých zmluv pre MÚV	28.7.14	27.2.15
48	Majetkové úpravy vysořované k stavbeřnému povoleniu	17.2.14	28.11.14
49	IC pre stavbuje konanie (vrátane zabezpečenia stavu, vyňati z ÚP a PPF a ďalších rozhodnutí k DSP), zisťovanie v konaní Stavbeřné konanie	12.1.15	25.9.15
51	Nadobudnutie právoplatnosti stavbeřného povolenia	17.1.15	21.1.14
52	Príprava DP	30.9.15	30.9.15
53	Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)	30.9.15	30.11.15
54	<b>Forsalizačný majetkovoprávny usporiadanie</b>	30.9.15	30.11.15
55	<b>Kompletné majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti a zabezpečenie vyřadenia stavby viestieřiva</b>	18.3.15	30.6.17

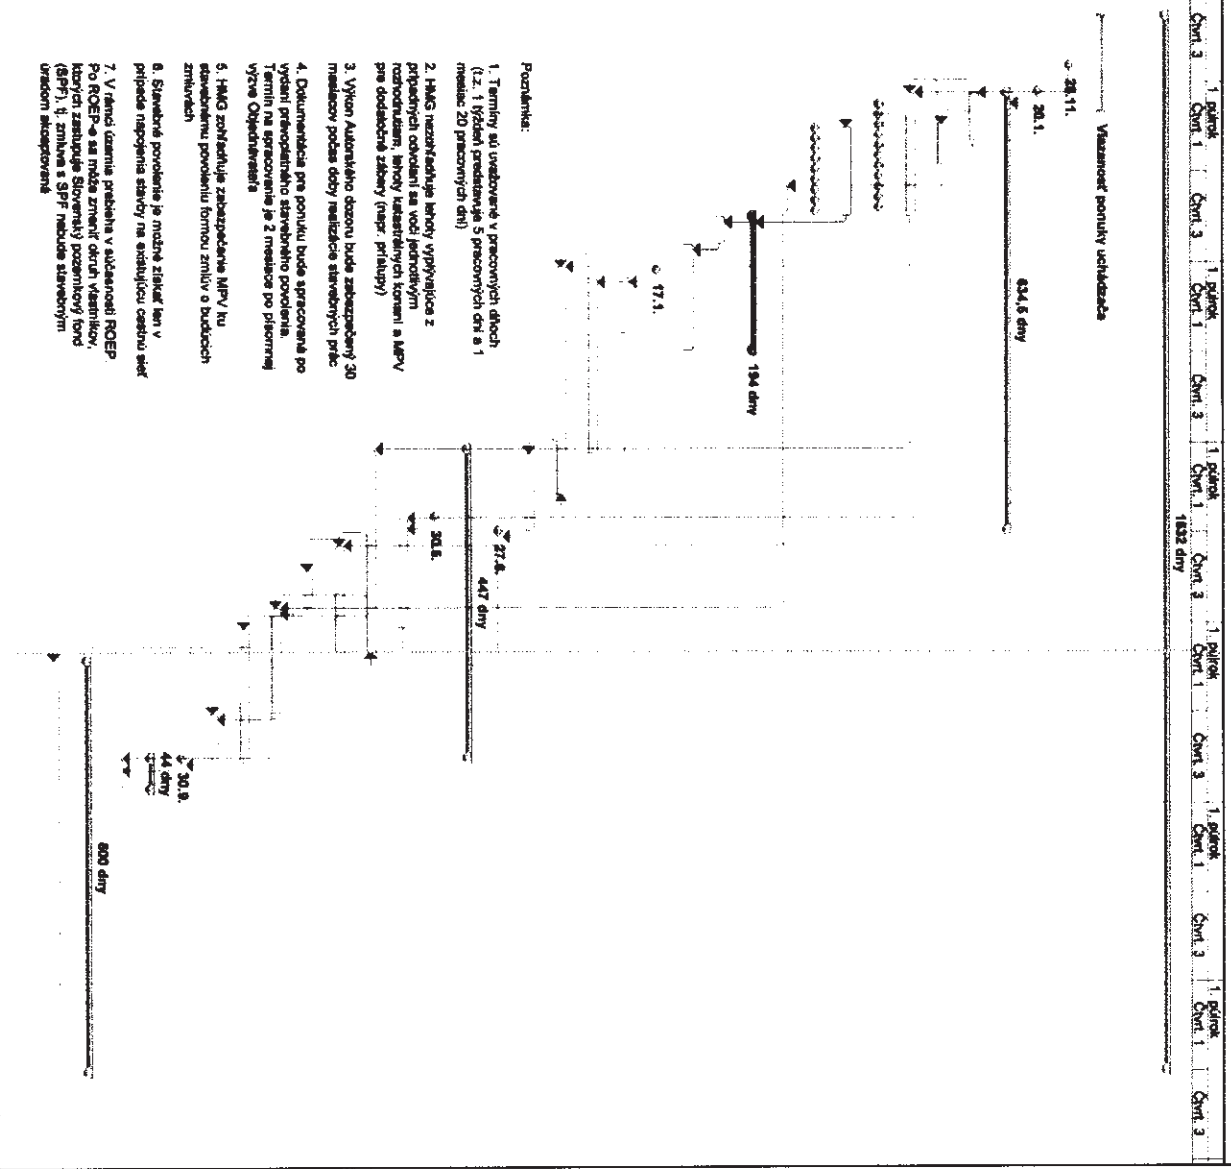






# Harmonogram prác Zhotoviteľa na DSP Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

HMG k Dodávku č. 6 Zmluvy

ID	Názov úlohu	Zahŕňajú	Dokončení	Čiast. 1 1. polrok Čiast. 1	Čiast. 2 1. polrok Čiast. 1	Čiast. 3 1. polrok Čiast. 1	Čiast. 4 1. polrok Čiast. 1	Čiast. 5 1. polrok Čiast. 1	Čiast. 6 1. polrok Čiast. 1
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	18.8.11	30.6.17						
2	Vybrané záverečné stanovisko MŽP k Zameriu (proces EIA ukončený) dňa 8.6.2008	31.8.11	31.6.11						
3	Významnosť poruby uchádzača	19.6.11	29.2.11						
4	Pospis ZČO	28.11.11	29.11.11						
5	Dodanie záverečných podkladov potrebných pre zahájenie prác zo strany Objedávateľa a	20.1.12	20.1.12						
6	Príprava stavby v stupni ÚR (DSZ)	20.1.12	27.6.14						
7	Gradený aljabur (Zameranie)	22.1.12	27.4.12						
8	prírodné preskúmy a študie ovken (j. a HIG preskúmy, porubno možno vďaka)	26.3.12	15.5.12						
9	Spracovanie dokumentácie DÚR	28.1.12	28.9.12						
10	Terminy pracovných rokovani v stupni DÚR	15.2.12	12.9.12						
22	Spracovanie dokumentácie DSZ	24.12	28.9.12						
23	Terminy pracovných rokovani v stupni DSZ	4.4.12	19.9.12						
33	Spracovanie časť H. Dokumentácia pre záberý kócenkov	30.7.12	27.9.12						
34	MDVARR / Štírna expertiza	1.10.12	27.6.13						
35	Výpracovanie expertizného preskúmu (vrátane možnosti upravenia expertizného protokolu externou organizáciou) Výpracovanie expertizného protokolu k štírne expertize	1.10.12	23.11.12						
36		26.11.12	27.9.13						
37	Požiadavka Objedávateľa na zabezpečenie Ozámenenia o zrušení vyhodnotenia činnosti a Posúdenie stavby stavby na území Ozámenenie zmeny navrhovanej činnosti (Príloha B4 Zábera 24.2008 Z 2) Posúdenie vplyvu stavby na území NATURA 2000	17.11	11.1.13						
38		17.11	25.5.13						
39	Inžinierska činnosť pre uzatvorenie kócení k DÚR) územné kócenie	12.13	15.4.14						
40		11.13	27.9.14						
41		21.14	27.9.14						
42	Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia	27.6.14	27.9.14						
43	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	13.1.14	30.8.15						
44	Právnoplatnosť rozhodnutia v súlade so stavbou a vykonávaním stavby	20.7.14	8.5.14						
45	Podrobný IG preskúmanie a ďalšie podrobné preskúmy a štúdie	2.6.14	9.1.15						
46	Spracovanie DSP	13.1.14	28.2.15						
47	Spracovanie dokumentácie a príprava certifikátu vysokej kvalifikácie (MP V)	28.7.14	27.1.15						
48	Odobudovanie územných znakov pre MIPV	17.9.14	29.11.15						
49	Manifikovacie vysokej kvalifikácie k stavbe (MIPV)	17.12.14	29.9.15						
50	IG pre stavbu kócení (vrátane záberného stanoviska vyhlásenia a prípravy ďalších rozhodnutí k DSP), zaslanie v kócení Stavovacie kócenie	17.1.15	29.9.15						
51		17.1.15	29.9.15						
52	Nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia	30.9.15	30.9.15						
53	Príprava DP	30.9.15	30.11.15						
54	Spracovanie Dokumentácie pre Porubu (DP)	30.9.15	16.11.15						
55	Poružovací majetkovoprávna usporiadanie	16.3.16	30.6.17						
56	Kompletná majetkovoprávna usporiadanie nehnuteľností a zabezpečenie vestavných listov vlastníctva	16.3.16	30.6.17						

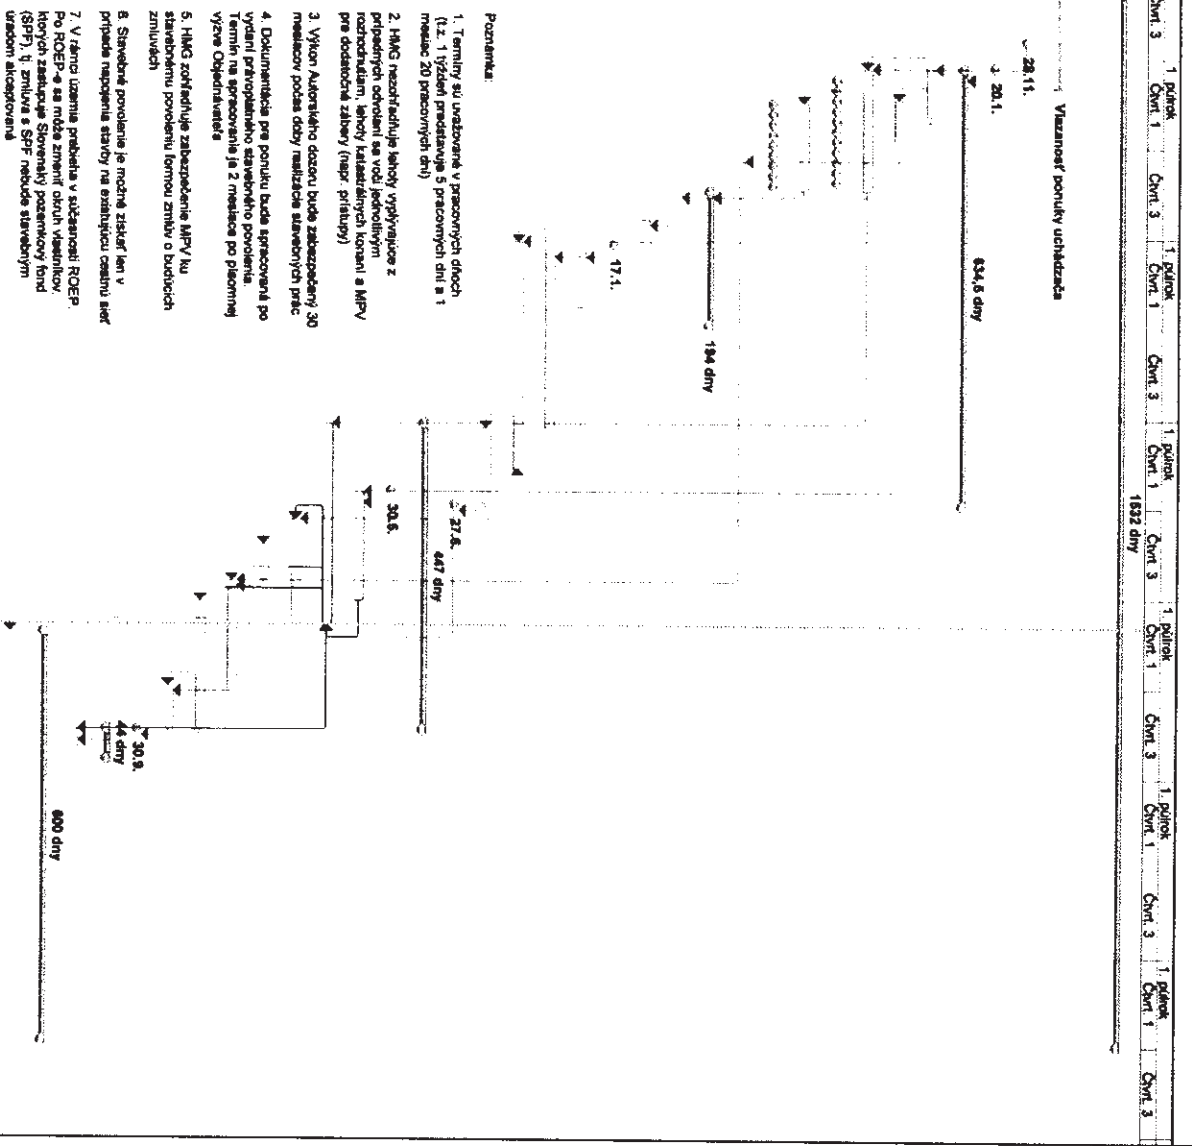


- Poznámka:**
1. Termíny sú ustanovené v pracovných dňoch (t.j. 1 výdeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
  2. HMG nezohľadňuje žiadny vplyv z prírodných odrod na voľ jednotlivých rozhodnutí, žiadny kášených kócení a MIPV pre dodatočné záberý (napr. príslušný)
  3. Výkon Autoritného dozoru bude zabezpečovaný 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
  4. Dokumentácia pre porubu bude spracovaná po vydaní rozhodnutia stavebného povolenia. Termín na spracovanie je 2 mesiace po písomnej výzve Objedávateľa
  5. HMG zohľadňuje zabezpečenie MIPV/ku stavebnému povoleniu formou znaku o budúch zmluvách
  6. Stavebné povolenie je možná získať len v prípade naplnenia stavby na stanovenú časť úseku
  7. V rámci územia poruby v úseku ROEP Po ROEP-e sa môžu zmeniť obchádzajúce trasy, ktoré zaberajú (stavebné) pracovný území (SPP), v prílohu a SPP rozhodne stavebným úradom akceptovaním

**Harmonogram prác zhotoviteľa na Ozánenie zmeny navrhovanej činnosti podľa Zákona č. 24/2006 Z.z. Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

HMO k Dodatku č. 6 Zmluvy

ID	Názov úlohu	Začiatok	Dokončenie
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	18.8.11	30.6.12
2	Výdaja záverečné stanovisko MŽP k Zameru (proces EIA ukončený) dňa 9.8.2009	18.8.11	31.8.11
3	Viazanosť ponuky uchádzača	18.8.11	29.2.12
4	Podpis ZbO	28.11.11	29.11.11
5	Dojatie zázračných podkladov potrebných pre záchytné prúžky zo strany Ochránovateľa	20.1.12	20.1.12
6	Príprava stavby v stupni UR (DSZ)	23.1.12	26.6.12
7	Geodetický šlaboar (zameranie)	23.1.12	27.1.12
8	Prieberbe preskúmy s štúdiom orení (G a H) preskúmanie: metóda moňže vymečiat	26.3.12	15.6.12
9	Spracovanie dokumentácie DJR	23.1.12	28.9.12
10	Termíny pracovných rokovani v stupni DJR	15.2.12	12.9.12
22	Spracovanie dokumentácie DSZ	24.4.12	28.9.12
23	Termíny pracovných rokovani v stupni DSZ	4.4.12	19.9.12
33	Spracovanie časti H Dokumentácia pre záberý pozemkov	30.7.12	21.9.12
34	<b>MDVARR - Stará expertiza</b>	130.12	27.6.13
35	Vypracovanie expertizného preskúmu vrátane možnosti výpracovania expertizného protokolu externou organizáciou	1.10.12	23.11.12
36	Vypracovanie expertizného protokolu k štádiu expertiza	26.11.12	27.6.13
37	<b>Podmienka Ochránovateľa na zabezpečenie Ozánenia o zmene navrhovanej činnosti a Posúdenie vplyvov stavby na životné Ozánenie zmeny navrhovanej činnosti (Príloha Sa Zákona 24/2006 Z.z. o posúdení vplyvov na ŽP)</b>	17.1.12	17.1.13
38	Posúdenie vplyvu stavby na území NÁ TURBA 2000	12.1.12	25.5.13
40	Ingénierska činnosť pre územné koronane vrátane zabezpečenia stanoviskú a rozhodnutí k DJRi	11.1.13	12.4.14
41	Územné koronane	27.1.14	26.2.14
42	Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia	25.6.14	26.6.14
43	Príprava stavby v stupni (DSP) (DP)	13.1.14	30.9.15
44	Pracovnosť rozhodnutie o výkonnosti na požiadavky a vykonateľnosť realiz.	26.5.14	26.5.14
45	Podrobny IG preskúman a ďalšie podrobné preskúmy a štúdie	2.5.14	9.1.15
46	Spracovanie DSP	13.1.14	28.2.15
47	Spracovanie dokumentácie pre majetkovú spracovanie (MPV)	28.7.14	27.2.15
48	Odsúhlasenie vzájomných zmluv pre MPRV	17.2.14	28.11.14
49	Majetkovú spracovanie k stavbeformu povoleniu	11.2.14	30.9.15
50	IG pre stavbu koronane (vrátane zabezpečenia stanoviskú vyhlásiť a LFP a prf a ďalších rozhodnutí k DSP), zastúpené v kompanii Stavbné koronane	16.1.15	24.9.15
51	Nadobudnutie právoplatnosti stavbného povolenia	17.2.15	29.2.15
52	Príprava DP	26.9.15	30.9.15
53	Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)	30.9.15	30.11.15
54	Portalizácie majetkovú spracovanie	30.9.15	30.11.15
56	Kompletne majetkovú spracovanie nemovitých nosí a zabezpečenie výstavby infor. vasiln. čísa	16.3.15	30.6.17
58		16.3.15	30.6.17

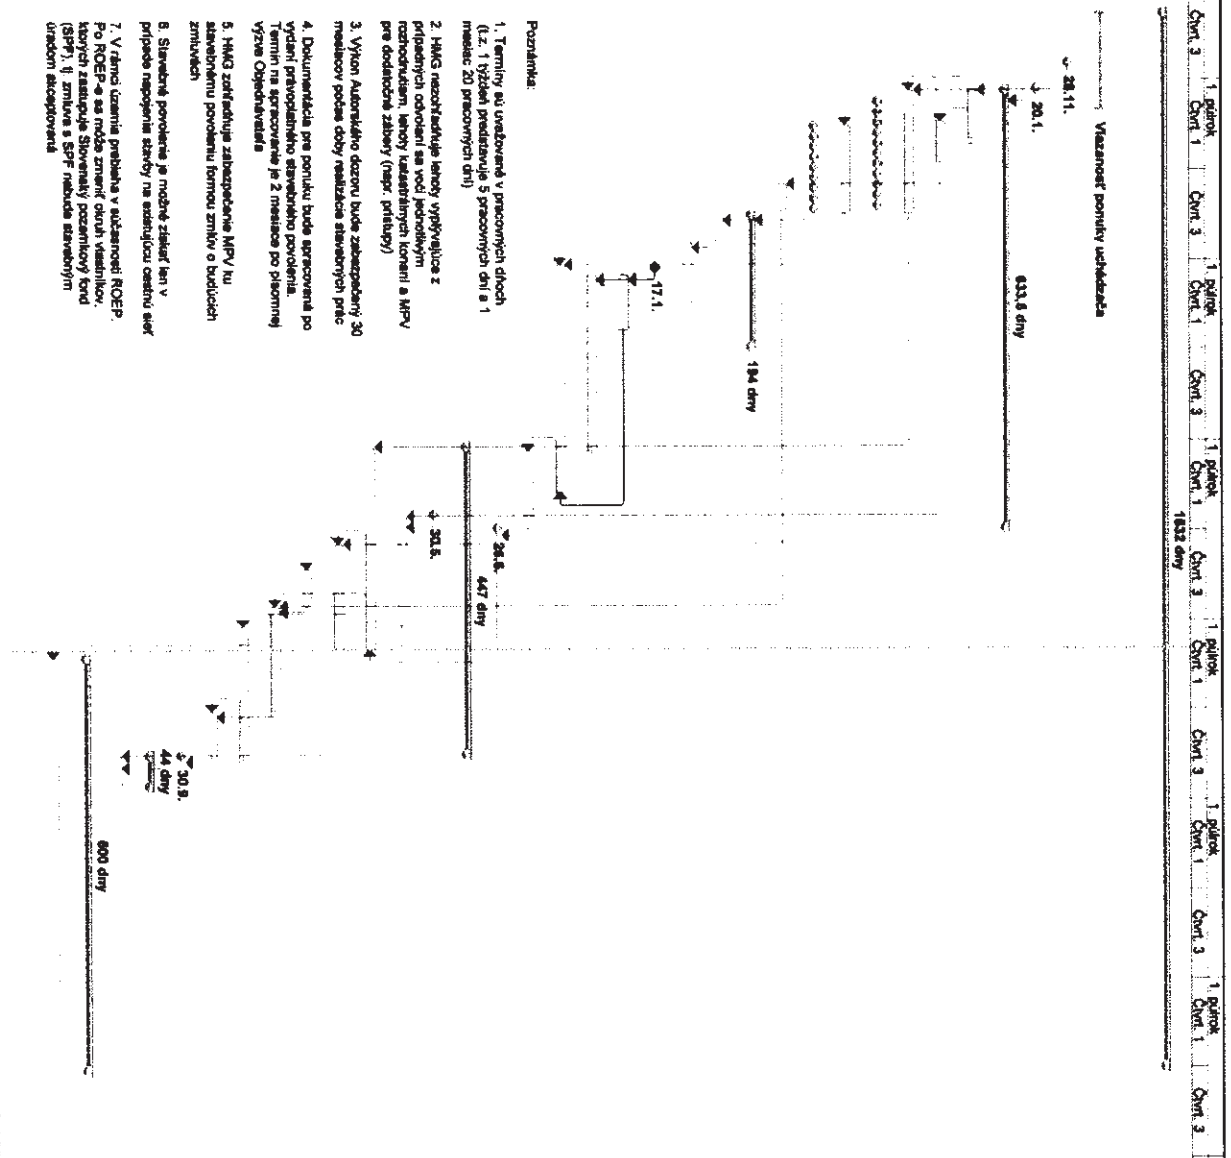




# Harmonogram prác zhotoviteľa na Posúdenie vplyvov stavby na územie Natura 2000

HWG k Dodatku č. 6 Zmluvy

ID	Názov úlohu	Začiatok	Dokončenie	Obr. 3 1. polrok Obr. 1 Obr. 3	Obr. 3 1. polrok Obr. 1 Obr. 3	Obr. 3 1. polrok Obr. 1 Obr. 3	Obr. 3 1. polrok Obr. 1 Obr. 3
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	15.8.11	30.5.17				
2	Vydanie zaverene stanoviska MŽP k Zámeru (proces EIA ukončený) dňa 9.8.2009	21.8.11	27.8.11				
3	Viazanosť ponuky uchádzača	15.8.11	29.7.11				
4	Podpis ZSÚ	28.11.11	28.11.11				
5	Dodanie zadávaných podk. ázií, územných pre. záležit. prac. zo strany Objednávateľa	28.1.12	28.1.12				
6	Príprava stavby v stupni UR (DSZ)	23.1.12	27.5.14				
7	Geodetický faktor (zameranie)	22.1.12	27.2.12				
8	Prírodné predstavený a studie orient. (S a H) preskúmanie nieleno nieleno výkonných	26.3.12	15.5.12				
9	Spriacovacie dokumentácie DJRP	23.1.12	28.4.12				
10	Termíny pracovných rokov v stupni DJRP	15.2.12	12.9.12				
22	Spriacovacie dokumentácie DSZ	24.4.12	28.7.12				
23	Termíny pracovných rokov v stupni DSZ	4.4.12	19.8.12				
33	Spriacovacie listy H, Dokumentácia pre záberý pozemkov	30.7.12	21.9.15				
34	MOVARR / Situačná expertíza	12.10.12	27.6.13				
35	Výpracovanie expertízneho posudku vrátane možnosti vypracovania expertízneho protokolu, externou organizáciou	1.10.12	23.11.12				
36	Výpracovanie expertízneho protokolu v situácii, expertíza	26.11.12	27.9.12				
37	<b>Podobavie Objednávateľa na zabezpečenie Ochrany a zneškodnenie odpadov a Pos. vplyvov stavby na územie NATURA 2000</b>	17.1.13	17.1.13				
38	Ozárnenie zmeny návrhovej prílohy I-Príloha B3 Zákonu 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP	12.1.13	29.5.13				
39	<b>Podobavie vplyvov stavby na územie NATURA 2000</b>	12.1.13	20.1.14				
40	Inžinierska úloha pre územie koróny vrátane zabezpečenia stienosti a rozhodnutí k DÚRI	11.1.13	15.4.14				
41	Územné korovanie	21.1.14	26.5.14				
42	<b>Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia</b>	27.6.14	27.6.14				
43	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	13.1.14	30.9.15				
44	Pracovný štádium rozhodnutí na podrobný a vyhodnotení návrhu	20.9.14	8.5.14				
45	Podrobný (S) preskúmanie a súčasne podanie preskúmania a studie	2.6.14	6.1.15				
46	Spriacovacie DSP	15.1.14	26.9.14				
47	Spriacovacie dokumentácie a pre majetkovú správu (MPS)	28.7.14	27.9.15				
48	Ozárnenie vzo ových záloh pre MPS	17.9.14	28.11.14				
49	Majetkovú správu vypracovanie k Stavovému (S) rozhodnutiu	11.7.14	30.8.15				
50	IC pre stavbu a korónu vrátane zabezpečenia stavov, vyhl. z LPR a PRF a ďalších rozhodnutí k DSP, zaskladovanie v konaní	10.1.15	29.9.15				
51	Stavovné korovanie	27.15	26.9.15				
52	<b>Nadobudnutie právoplatnosti stavovného povolenia</b>	20.9.15	30.9.15				
53	Príprava DP	30.9.15	30.11.15				
54	Spriacovacie Dokumentácie pre penultim. DP	30.9.15	30.11.15				
55	Porozprávacie majetkovú správu usporiadanie	16.3.15	30.5.17				
56	Kompletné majetkovú správu usporiadanie, jednolietna a zabezpečenie vyštvárenia linky Vládn. č. 13	16.3.15	30.6.17				

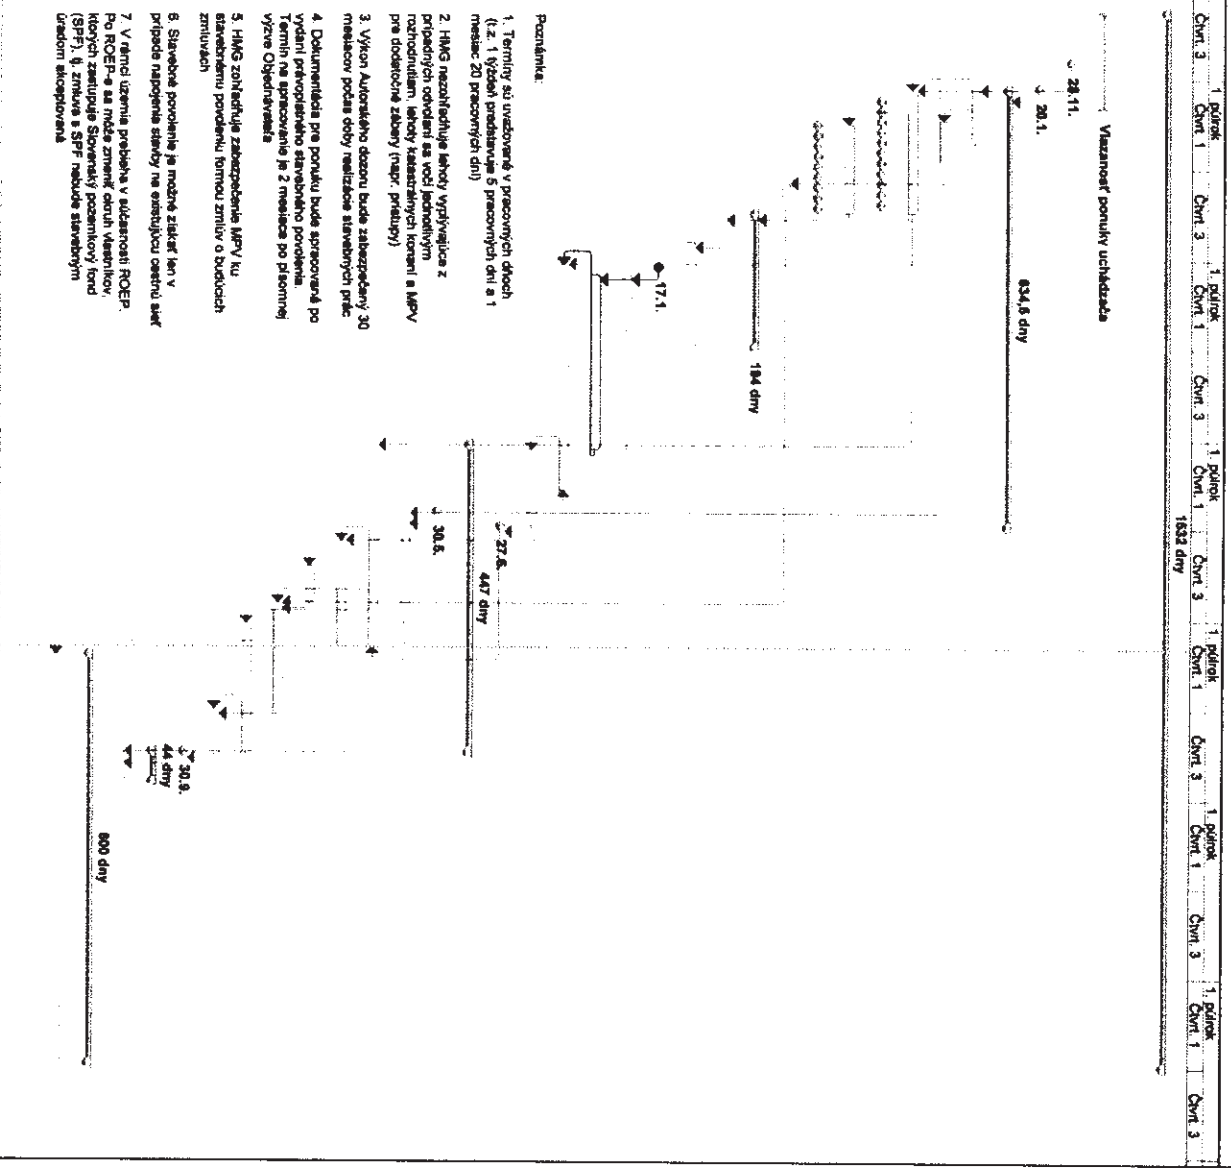

1. Termíny sú uvádzané v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HWG nezohľadňuje vplyvy vyplývajúce z prírodných odvolení na voľ jednotlým rozhodnutím, ktoré kasažných konaní a MPS pre dodatočné záberý (napr. prešly)
3. Výkon Autoritného dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavovných prác
4. Dokumentácia pre ponuku bude spracovaná po vydaní prírodného stavovného povolenia. Termín na spracovanie je 2 mesiaca po písomnej výzve Objednávateľa
5. HWG zohľadňuje zabezpečenie MPS ku stavovnému povoleniu formou zmluv o budúcných zmluvách
6. Stavovné povolenie je možné získať len v prípade naplnenia stavby na esťobný cestnú sieť
7. V rámci územia probléma v súdskosti ROEP. Po ROEP-e sa môže zmeniť obrn. vlasníkov, ktorých zaručuje Slovenský pozemkový fond (SPF). J. zmena s SPF nebude stavovným úradom akceptovaná

Výpracoval: DOPRAVOPROJEKT, a.s.


Datum: 02/2015



# Harmonogram vydania územného rozhodnutia Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

HAKG k Dodatku č. 6 Zmluvy


ID	Názov úlohu	Začiatok	Dokončení
1	Harmonogram priority pre vyštudiu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	19.8.11	30.5.17
2	Vydanie zavereneho stanoviska MŽP k Zámeru (proces EIA ukončený) dňa 9.6.2009	18.6.11	29.2.12
3	Viazanosť ponuky uchádzača	28.11.11	29.11.11
4	Podpis ZSO		
5	Dodanie zákazných objednávok poradcov pre zahájenie prác zo strany Objedávateľa	20.1.12	20.1.12
6	Príprava stavby v stupni UR (DSZ)	23.1.12	27.6.14
7	Geodetický elaborát (zameranie)	29.1.12	7.2.12
8	Prerýchovanie preskúmania a študie otečením (S1 a H15 preskúmanie, metóda ortogonálneho výpočtu)	29.3.12	16.6.12
9	Spracovanie dokumentácie DHR	23.1.12	29.9.12
10	Temný pracovný rokovací v stupni DUR	15.2.12	12.8.12
22	Spracovanie dokumentácie DSZ	24.1.12	28.9.12
23	Temný pracovný rokovací v stupni DSZ	4.4.12	18.8.12
33	Spracovanie časti H: Dokumentácia pre záberý kôzanok	30.7.12	27.2.12
34	MDVARR / Státna expertiza	11.0.12	27.6.13
35	Vypracovanie expertného posudku vrátane možnosti vypracovania expertného protokolu externou organizáciou	1.10.12	23.11.12
36	Vypracovanie expertného protokolu k štátnej expertíze	26.11.12	2.5.13
37	Podkladná Objedávateľská inžinierska zmluva - Ozmenenie o znenie ústavebných podmienok v Bratislavskom územnom úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	17.1.13	7.1.13
38	Ozmenenie zmeny navrhovanej činnosti (Príloha 9a Zákona 242/2008 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)	1.2.13	23.5.13
39	Posledné výzvy stavby na území MATURGA 2000	1.2.13	29.1.14
40	Inžinierska dienosť pre územné konanie (vrátane zabezpečenia územného konania)	11.1.13	15.4.14
41	Územné konanie	21.4.14	28.5.14
42	Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia	27.6.14	27.6.14
43	Príprava stavby v stupni DSP (DPI)	13.1.14	30.9.15
44	Právoplatnosť rozhodnutia a súhlas na poskytnutie územného úradu	1.6.14	30.9.14
45	Podrobný IG preskúmanie a štúdie podrobnej preskúšky a štúdie	2.6.14	8.1.15
46	Spracovanie DSP	13.1.14	28.2.15
47	Spracovanie dokumentácie pre majetkovú opravu v rozsahu (MPV)	28.2.14	27.2.15
48	Objednanie vzťahov zmlúv na MPV	12.9.14	29.11.14
49	Majetkové vysporiadanie k stavebnému povoleniu	11.2.14	16.6.15
50	IG pre stavbu kóranie vrátane zabezpečenia stavov, vyňatí z ÚP a PR a ďalších rozhodnutí k DSP, zaskutkovanie v konaní	12.1.15	25.9.15
51	Stavovné konanie	17.1.15	29.2.15
52	Nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia	30.9.15	30.9.15
53	Príprava DP	30.9.15	30.11.15
54	Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DPI)	30.9.15	30.11.15
55	Poradenské majetkovoprávne usporiadanie	16.3.15	30.6.17
56	Kompletné majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností a zabezpečenie výstavby (SVO, výstavba č.1)	16.3.15	30.6.17

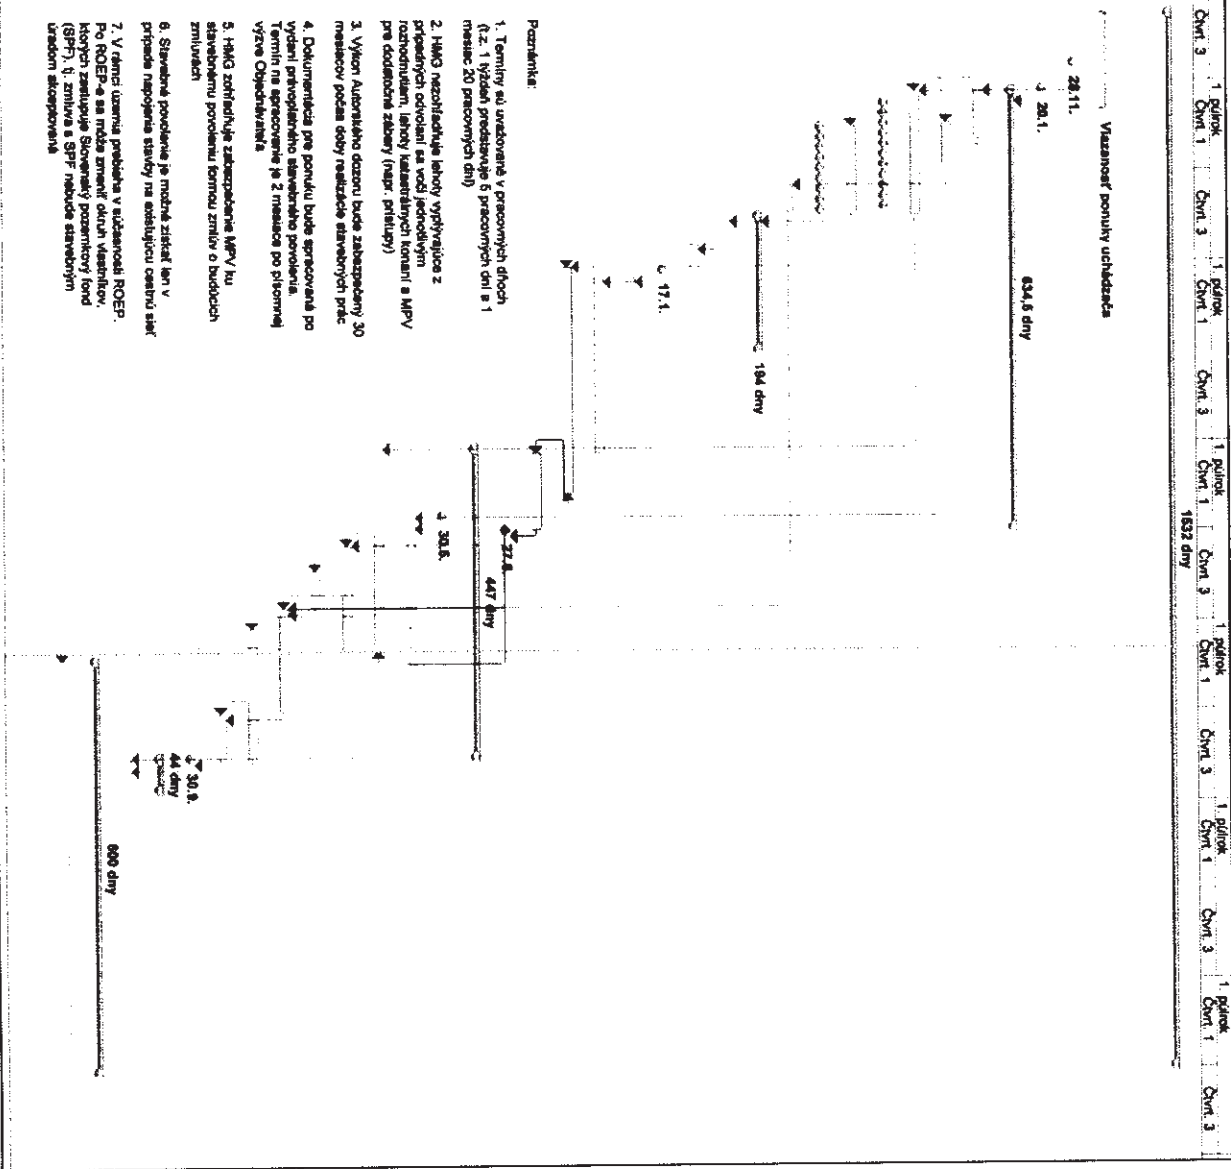

# Harmonogram vydania stavebného povolenia Usk rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

HMG & Dodateľka č. 9 Zmluva

ID	Názov úlohu	Začiatok	Dokončení	Čiast. 1 1. piatok Čiast. 1 Čiast. 1	Čiast. 2 1. piatok Čiast. 2 Čiast. 2	Čiast. 3 1. piatok Čiast. 3 Čiast. 3	Čiast. 4 1. piatok Čiast. 4 Čiast. 4	Čiast. 5 1. piatok Čiast. 5 Čiast. 5
1	Harmonogram pripravu pre vydanie uskú rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	19.8.11	30.6.17					
2	Vydanie záverečnej stanoviska MZP k Zameru (proces EIA ukončený) dňa 8.6.2009	31.8.11	31.9.11					
3	Viazanosť ponuky uchádzača	19.8.11	29.2.12					
4	Podpis ZSD	29.11.11	29.11.11					
5	Dodanie závažných podkladov potrebných pre začiatok prác zo strany Obchodnívalca	20.1.12	20.1.12					
6	Príprava stavby v stupni UR (DSZ)	23.1.12	21.6.14					
7	Geodetický nábor (zameranie)	23.1.12	23.1.12					
8	Prázdne preklady a štúdie overení IG a HIG priekopou; patolo možná výmena	29.3.12	15.6.12					
9	Spoločanie dokumentácie DJP	23.1.12	29.9.12					
10	Termíny pracovných rokovani v stupni DJP	15.2.12	12.8.12					
22	Spoločanie dokumentácie DSZ	2.4.12	28.2.12					
23	Termíny pracovných rokovani v stupni DSZ	4.4.12	19.9.12					
33	Spoločanie časti H Dokumentácia pre záber pozemkov	30.7.12	21.9.12					
34	MDVARR - Stavba expertiza	13.10.12	27.8.13					
35	Výpracovanie expertizného postupu, určenie možnosti výpracovania expertizného protokolu externou organizáciou	1.10.12	23.11.17					
36	Výpracovanie expertizného protokolu k stavbe expertiza	26.11.12	27.6.13					
37	Podmienka Objedávateľa na zabezpečenie Uznenia č. znenie (uzn. uznenia) č. 2014 a Poskytnutie informácií o územnej ochrane zmeny nariadením o posudzovaní vplyvov na ŽP	17.1.13	17.1.13					
38	Posudzovanie vplyvu stavby na územie NATURA 2000	12.1.13	30.5.13					
40	Inžinierska omnosť IPR územne konanie (vlastné zabezpečenie stanovisk a rozhodnutí k DJP)	11.1.13	15.4.14					
41	Územné konanie	21.1.14	28.9.14					
42	Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia	27.6.14	27.9.14					
43	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	13.1.14	30.9.15					
44	Prípravníci/ rozhodnutie o vstúpe na pozemky a vykurovateľnosť reáliz.	30.5.14	30.5.14					
45	Podrobný IG prešetrni a ďalšie podrobné preklady a štúdie	2.6.14	9.1.15					
46	Spoločovanie DSP	13.1.14	25.2.15					
47	Spoločovanie dokumentácie pre majstkovnane vypořádavane (MPV)	29.7.14	27.2.15					
48	Odsúhlasenie vzájomných zmluv pri MPV	17.9.14	28.11.14					
49	Majstkovnane vypořádavane k Stavobnému projektu	1.12.14	30.6.15					
50	IG pre stavebné konanie (vrátane zabezpečenia dokument. vyřni z LPF a PPF a ďalších rozhodnutí k DSP), zabezpečovane v konaní Stavebné konanie	12.1.15	28.9.15					
51	Nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia	3.7.15	29.9.15					
52	Príprava DP	30.9.15	30.11.15					
53	Spoločovanie Dokumentácie pre prípravu DP	30.9.15	29.11.15					
54	Paralelizácia majstkovnane vypořádavane	16.3.16	30.6.17					
55	Kompletné majstkovnane vypořádavane nahraditeľnosť a zabezpečovane vyřavavane listov vlastníctva	16.3.15	30.6.17					

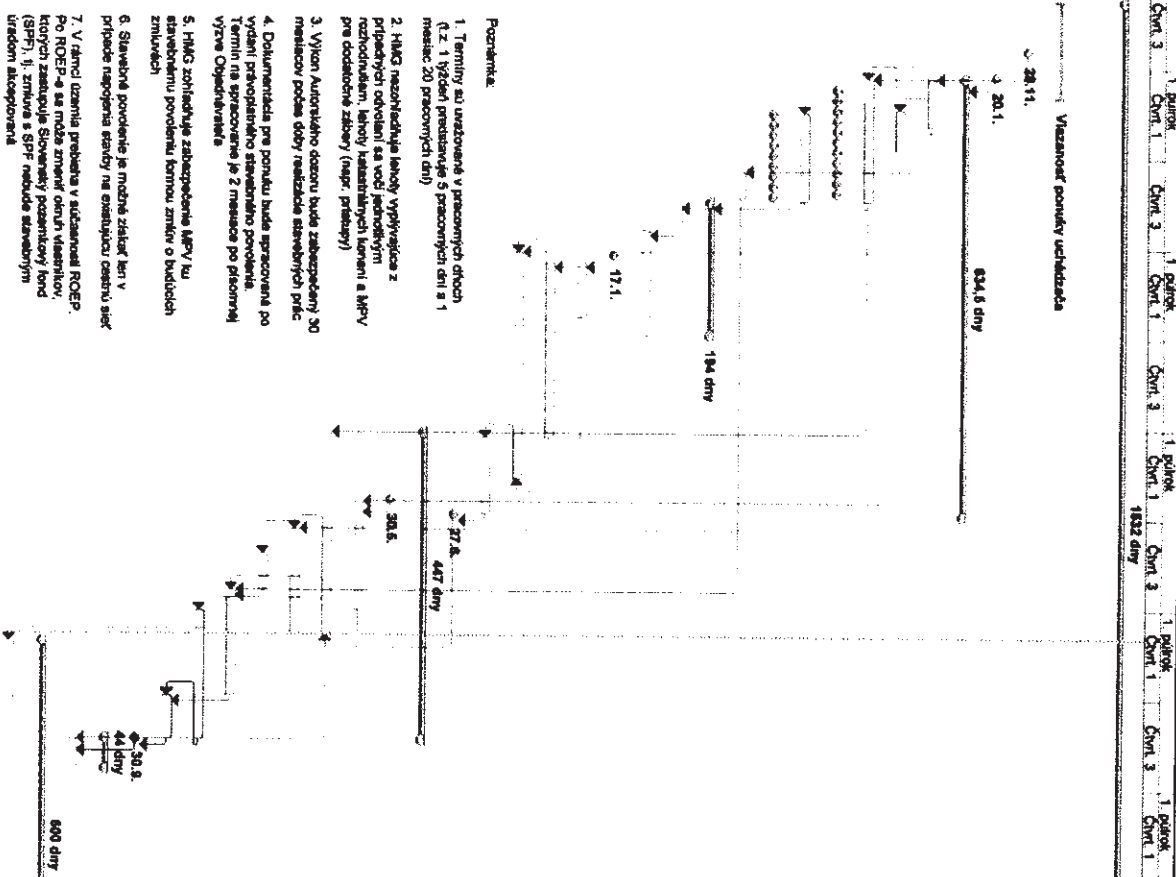

- Poznámka:**
1. Termíny sú uzatvorené v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň presahuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
  2. HMG nezohľadňuje lehoty vyplývajúce z príslušných rozhodnutí (a voči jednotlivým rozhodnutiam, lehoty hazardných konaní a MPV pre dodatočné zábery (napr. presavy))
  3. Výkon Autoritatívneho dozoru bude zabezpečovaný 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
  4. Dokumentácia pre ponuku bude spracovaná po vyřni právoplatnosti stavebného povolenia. Termín na spracovavane je 2 mesiace po prílohu výzve Objedávateľa
  5. HMG zohľadňuje zabezpečovane MPV ku stavebnému povoleniu domnou zmluvou o budúcej zmluve
  6. Stavebné povolenie je možné získať len v prípade naplnenia lehoty na exstávujúcu stavbu sieť
  7. V rámci uznenia preberav v súčasnosti ROEP. Po ROEP sa môže zmeniť ohrnú vlastníkov, ktorých zasahuje Slovenský pozemkový fond (SPF), či zmluva s SPF nebude stavebným úradom akceptovaná

