

Dodatok č.2

k Zmluve na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), inžiniersku činnosť (IČ), a majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) pre stavbu: Diaľnica D1 Senec- Blatné, križovatka Blatné

Číslo objednávateľa:
ZM/2013/0283

Číslo zhotoviteľa:
7761-00



uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických :

vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán

v zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 378/B

predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO: 31 322 000

DIČ: 202054770

IČ DPH: SK202054770

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA K DODATKU

Tento dodatok k zmluve sa uzatvára na základe záverov z rokovania zmluvných strán konaného dňa 11.11.2014 (ďalej len „pracovné rokovanie“), ako aj na základe dohody zmluvných strán v zmysle listu zhotoviteľa č.7916/2014-2210/7761-00 zo dňa 11.11.2014.

Dôvodom uzavretia dodatku je:

- obdržanie aktuálneho zamerania stredného deliaceho pásu, z čoho vyplýva potreba prepracovania smerového a výškového vedenia objektu 101-10 Diaľnica D1, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné a križovatkových vetiev v objekte 110-00 Rekonštrukcia MÚK Blatné v rámci DP (DRS). V súvislosti s touto zmenou diela sa zmluvné strany na pracovnom rokovaní dohodli na zmene termínov plnenia pre DP (termín posunutý na 30.04.2015) a ceny za DP.

PREDMET DODATKU

Na základe vyššie uvedeného sa mení zmluva nasledovne:

Záhlavie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na zmene osoby oprávnenej na rokovanie vo veciach technických a zároveň vykonávajúcej funkciu hlavného inžiniera projektu na strane zhotoviteľa, ktorou je v zmysle tohto dodatku zároveň preberá zodpovednosť za

pripadné dopracovanie všetkých častí dokumentácie, za ktoré bol v zmysle ponuky zhotoviteľa zodpovedný. Na strane objednávateľa zároveň došlo k výmene niektorých osôb oprávnených na rokovanie vo veciach technických tak, ako sú uvedené v záhlaví tohto dodatku.

ČASŤ 1

- V ČASTI 1, čl. 5 zmluvy sa mení bod 5.3, ktorý znie nasledovne:

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DP po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **30.04.2015**.

- V ČASTI 1, Čl. 6 zmluvy sa mení bod 6.2, ktorý znie:

6.2 a) Cena Oznámenia 8a bez DPH v EUR: **6 067,08 EUR**
Sadzba DPH 20% v EUR: **1 213,42 EUR**
Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: **7 280,50 EUR**
(slovom: sedemtisícdeväťstoosemdesiat eur päťdesiat centov);

- b) Cena DSP bez DPH v EUR: **177 434,73 EUR**
 Navýšenie v zmysle Dodatku č.1 k zmluve bez DPH v EUR (Príloha č.7, tabuľka č.2)
 31 960,58 EUR
 Cena DSP bez DPH v EUR: **209 395,31 EUR**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 41 879,06 EUR
 Cena DSP vrátane DPH v EUR: **251 274,37 EUR**
 (slovom: dvestopäťdesiatjedentisícdeväťdesiatštyri eur tridsaťsedem centov);
- c) Cena DP bez DPH v EUR **103 367,89 EUR**
 Navýšenie v zmysle Dodatku č.1 k zmluve bez DPH v EUR (Príloha č.7, tabuľka č.3):
 22 275,42 EUR
 Navýšenie v zmysle Dodatku č.2 k zmluve bez DPH v EUR (Príloha č.7, tabuľka č.3):
 10 929,08 EUR
 Cena DP bez DPH v EUR: **136 572,39 EUR**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 27 314,48 EUR
 Cena DP vrátane DPH v EUR: **163 886,87 EUR**
 (slovom: jednostašesťdesiattritisícosemstoosemdesiatšesť eur osemdesiatšedem centov);
- d) **Cena diela celkom bez DPH v EUR: 352 034,78 EUR**
 Sadzba DPH 20%: 70 406,96 EUR
Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: 422 441,74 EUR
 (slovom: štyristodvadsaťdvatisícštyristoštyridsaťjeden eur sedemdesiatštyri centov.);

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Rozpočet tvorí ako príloha č. 7 neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku k zmluve.

Rekapitulácia ceny podľa čl. 6 bod 6.2 tejto zmluvy:

Rekapitulácia ceny v EUR bez DPH	ZoD	Dodatok č.1 k zmluve		Dodatok č.2 k zmluve	
		zmena ceny	výsledná cena	zmena ceny	výsledná cena
Oznámenie 8a	6 067,08 €		6 067,08 €		6 067,08 €
DSP	177 434,73 €	31 960,58 €	209 395,31 €		209 395,31 €
DP	103 367,89 €	22 275,42 €	125 643,31 €	10 929,08 €	136 572,39 €
Spolu	286 869,70 €	54 236,00 €	341 105,70 €	10 929,08 €	352 034,78 €

ČASŤ 5

V ČASTI 5, čl. 5 zmluvy sa príloha č.7 uvedená v bode 5.7 nahrádza prílohou tohto dodatku.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (tabuľky 1 až 9)

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor Jakubík
podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

Ing. Pavol Kováčik PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Martin Šutka
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.

ŠPECIFIKÁCIA CENY VŠETKÝCH ČASTÍ ZMLUVY (TABUĽKY 1 AŽ 9)

Stavba: Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 1

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006

Klasifikácia produkcie :

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
1	Správa	36,51	28,21	21,91		
2	Prílohy	32				1168,32
3	Netechnické zhrnutie	20	96			3438,36
	Navrhovaná cena bez DPH	40				1460,40
	DPH 20 %					6 067,08 €
	Navrhovaná cena					1 213,42 €
						7 280,50 €
Cena za reprografické práce a služby za 1 ks Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti						40,00 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Stavba : Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Dokumentácia na stavebné povolenie

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie			sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h
			36,51	28,21	21
			Potrebný počet hodín ZoD		
1	A.1	Spravidelná správa	10	30	2
2	A.2	Netechnické zhrnutie	2	4	
3	B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000			6
4	B.2	Celková situácia M 1:10 000	2	20	1
5	B.3	Pozdĺžny rez M 1:1000/100	2	10	6
6	B.4	Ortofotomapa M 1:10 000		8	6
7	B.5	Ortofotomapa M 1:2 000		12	6
8	B.6	Vizualizácie	2	40	2
9	B.7	Informačný materiál	2	30	1
10	C.1	Koordináčný výkres M 1:1 000	20	40	3
11	C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	2	30	2
12	D	Písomnosti a výkresy objektov			
		010-10 Príprava územia, úsek Bratislava - MÚK Blatné	4	40	0
		036-00 Demolácia mosta D1-043 nad diaľnicou D1 BA - TT v km 30,206 (16.606), na ceste I/61 v MÚK Blatné	8	48	0
		043-01 Vegetačné úpravy diaľnice D1 v MÚK Blatné			
		043-02 Vegetačné úpravy na ceste I/61 v MÚK Blatné			
		074-00 Úprava hydromeliórií v km 30,075 - 30,812 (16.475 - 17.212) diaľnice D1 BA - TT, v MÚK Blatné	8	24	0
		101-10 Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné	240	480	30
		110-00 Rekonštrukcia mimoúrovňovej križovatky Blatné	60	240	14
		118-00 Obrátisko vozidiel správy a údržby diaľnic na ceste I/61, v MÚK Blatné	8	32	2
		124-00 Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné	48	240	18
		124-01 Obchádzka na ceste I/61 v km 29,600 D1			
		152-00 Úprava ciest II. a III. triedy pred a po výstavbe MÚK Blatné			
		153-00 Úprava miestnych komunikácií pred a po výstavbe MÚK Blatné			
		214-00 Most D1-043 nad diaľnicou D1 BA - TT v km 30,206 (16.606), na ceste I/61 v MÚK Blatné	160	440	24
		215-00 Most na vetvách BL3 a BL4, v MÚK Blatné nad ropovodom DN 500	42	44	3
		501-10 Odvodnenie diaľnice D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné	48	70	4
		640-00 Prípojka NN pre CDS v km 28,914 D1 na obchádzke c. I/61			
		641-00 Cestná dopravná signalizácia v km 28,914 D1 na obchádzke c. I/61			
		642-00 Ochrana podzemného vedenia NN v km 29,220 D1			
		660-01 Preložka DK v km 30,150 diaľnice D1 BA - TT, v MÚK Blatné	2	6	0
		660-02 Preložka DK v km 30,225 (16.625) diaľnice D1 BA - TT, v MÚK Blatné	30	40	3
		671-00 Ochrana telemetrického kábla v km 0,166 vetvy "BL3" v MÚK Blatné	2	6	0
		673-00 Ochrana kábla SLOVAK TELEKOM v km 28,930 D1 obchádzky na ceste I/61			
		681-01 Informačný systém, úsek km 29,600 - 31,025 v MÚK Blatné - stavebná časť (chráničky pod križovatkovými vetvami a diaľnicou, 3ks zakladov pre portály PDZ)			
		705-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 30,240 (16.640) diaľnice D1 BA - TT, v MÚK Blatné	40	60	
		706-00 Preložka VTL prípojky DN 80 v MÚK Blatné	8	8	
		752-00 Úprava ochrany produktovodu v km 0,028 úpravy cesty I/61 v MÚK Blatné	10	16	
13	E	Doklady	10	20	1
14	F	Dokumentácia meračských prác			
15	G	Dokumentácia pre MP vysporiadanie			
16	H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy	20	55	
17	I	Dokumentácia prieskumov			
		Dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín	20	40	
		Pedologický prieskum		22	
		Emisná štúdia		40	
		Dopravnoinžiniersky prieskum		80	
		Korózný a geoelektrický prieskum		22	
		Hluková štúdia		60	
		Archeologický prieskum			1
		Podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum			
18	K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		18	
19	L.1	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP	50		
20	L.2	Projekt geotechnického monitoringu	40		
21	M	Vplyv stavby na životné prostredie	40		
22	N	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete		30	2
23	O	Návrh projektu organizácie výstavby	12	30	2
24	P	Bulletin	2	30	1
		Navrhovaná cena bez DPH			
		DPH 20 %			
		Navrhovaná cena			

Cena za reprografické práce a služby za 1 ks DSP

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky

- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Stavba : Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné
 Dokumentácia na ponuku (DP)
 Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €
	36,51	28,21	21,91		
Potrebný počet hodín ZoD				v €	
Dokumentácia na ponuku					
3	Zväzok 3 Technické špecifikácie	-	-	-	1 888,44 €
1.03	Všeobecné informácie a požiadavky	10	30		1 211,40 €
4.II	Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky (TKP)		4		112,84 €
3.II	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)		20		564,20 €
4	Zväzok 4 Cenové časť	-	-	-	6 000,48 €
4.I	Popis predmetu obstarávania	8	16		743,44 €
4.II	Všeobecné položky	8	16		743,44 €
4.III	Celkový výkaz výmer		80		2 256,80 €
4.IV	Súpis agregovaných položiek		40		1 128,40 €
4.V	Teoretické ocenenie stavby		40		1 128,40 €
5	Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)	-	-	-	94 078,31 €
A	Sprievodná správa	10	20	15	1 257,95 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000			2	43,82 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000	2	12	2	455,36 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:1000/100		12	2	382,34 €
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000			8	175,28 €
B.5	Ortofotomapa M 1:2000			8	175,28 €
C.1	Koordinátny výkres M 1:1000	10	30	20	1 649,60 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	2	30	20	1 357,52 €
D	Písomnosti a výkresy objektov	-	-	-	87 865,50 €
010-10	Príprava územia, úsek Bratislava - MÚK Blatné	8	60		1 984,68 €
036-00	Demolácia mosta D1-043 nad diaľnicou D1 BA - TT v km 30.206 (16.606), na ceste I/61 v MÚK Blatné				- €
043-01	Vegetačné úpravy diaľnice D1 v MÚK Blatné				- €
043-02	Vegetačné úpravy na ceste I/61 v MÚK Blatné				- €
074-00	Úprava hydromeliorácií v km 30.075 - 30.812 (16.475 - 17.212) diaľnice D1 BA - TT, v MÚK Blatné	8	30		1 138,38 €
101-10	Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné	40	480	240	20 259,60 €
110-00	Rekonštrukcia mimoúrovňovej križovatky Blatné	40	300	160	13 429,00 €
118-00	Obrátisko vozidiel správy a údržby diaľnic na ceste I/61, v MÚK Blatné	18	36	32	2 373,86 €
124-00	Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné	40	240	160	11 736,40 €
124-01	Obchádzka na ceste I/61 v km 29.600 D1				- €
152-00	Úprava ciest II. a III. triedy pred a po výstavbe MÚK Blatné				- €
153-00	Úprava miestnych komunikácií pred a po výstavbe MÚK Blatné				- €
214-00	Most D1-043 nad diaľnicou D1 BA - TT v km 30.206 (16.606), na ceste I/61 v MÚK Blatné	200	300	240	21 023,40 €
215-00	Most na vetvách BL3 a BL4, v MÚK Blatné nad ropovodom DN 500	42	42	36	3 507,00 €
501-10	Odvodnenie diaľnice D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné	40	80	40	4 593,60 €
640-00	Prípojka NN pre CDS v km 28.914 D1 na obchádzke c. I/61				- €
641-00	Cestná dopravná signalizácia v km 28.914 D1 na obchádzke c. I/61				- €
642-00	Ochrana podzemného vedenia NN v km 29.220 D1				- €
660-01	Preložka DK v km 30.150 diaľnice D1 BA - TT, v MÚK Blatné	4	8		371,72 €
660-02	Preložka DK v km 30.225 (16.625) diaľnice D1 BA - TT, v MÚK Blatné	30	40	30	2 881,00 €
671-00	Ochrana telemetrickeho kábla v km 0.166 vetvy "BL3" v MÚK Blatné	4	8		371,72 €
673-00	Ochrana kábla SLOVAK TELEKOM v km 28.930 D1 obchádzky na ceste I/61				- €
681-01	Informačný systém, úsek km 29.600 - 31.025 v MÚK Blatné - stavebná časť (chráničky pod križovatkou vými vetvami a diaľnicou, 3ks základov pre portály PDZ)				- €
705-00	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 30.240 (16.640) diaľnice D1 BA - TT, v MÚK Blatné	32	60		2 860,92 €
706-00	Preložka VTL prípojky DN 80 v MÚK Blatné	8	8		517,76 €
752-00	Úprava ochrany produktovodu v km 0.028 úpravy cesty I/61 v MÚK Blatné	10	16		816,46 €
F	Dokumentácia meračských prác				- €
I	Dokumentácia prieskumov-prevezme sa z DSP				- €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			6	131,46 €
M	Projekt monitoringu -prevezme sa z DSP				- €
O	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete-prevezme sa z DSP				- €
P	Návrh projektu organizácie výstavby	10		10	584,20 €
	Navrhovaná cena bez DPH				101 967,23 €

Cena za reprografické práce a služby za 1 ks DP

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Cena za DP podľa platnej ZoD:

103 367,89 €

Cena za DP po oprave matematickej chyby

101 967,23 €

Rozdiel:

- 1 400,66 €

n	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom
36,51	28,21	21,91		36,51	28,21	21,91		36,51	28,21	21,91	
Potrebný počet hodín Dodatok 1			v €	Potrebný počet hodín Dodatok 2			v €	Potrebný počet hodín Zod+Dod1,2			v €
			- €				- €				1 888,44 €
			- €				- €	10	30	0	1 211,40 €
			- €				- €	0	4	0	112,84 €
			- €				- €	0	20	0	564,20 €
			- €				- €				6 000,48 €
			- €				- €	8	16	0	743,44 €
			- €				- €	8	16	0	743,44 €
			- €				- €	0	80	0	2 256,80 €
			- €				- €	0	40	0	1 128,40 €
			- €				- €	0	40	0	1 128,40 €
			23 876,08 €				10 929,08 €				128 683,47 €
			- €				- €	10	20	15	1 257,95 €
			- €				- €	0	0	2	43,82 €
			- €				- €	2	12	2	455,36 €
			- €				- €	0	12	2	382,34 €
			- €				- €	0	0	8	175,28 €
			- €				- €	0	0	8	175,28 €
			- €				- €	10	30	20	1 649,60 €
			- €				- €	2	30	20	1 357,52 €
			17 760,08 €				10 929,08 €				116 554,66 €
			- €				- €	8	60	0	1 984,88 €
8	40		1 420,48 €				- €	8	40	0	1 420,48 €
16	20	6	1 279,82 €				- €	16	20	6	1 279,82 €
16	20	6	1 279,82 €				- €	16	20	6	1 279,82 €
4		6	277,50 €				- €	12	30	6	1 415,88 €
			- €	52	110	72	6 579,14 €	92	590	312	26 838,74 €
			- €	28	90	36	4 349,94 €	68	390	196	17 778,94 €
-18	-36	-32	2 373,86 €				- €	0	0	0	- €
18	36	32	2 373,86 €				- €	58	278	192	14 110,26 €
40	48	8	2 989,76 €				- €	40	48	8	2 989,76 €
8	12		630,60 €				- €	8	12	0	630,60 €
10	16		816,45 €				- €	10	16	0	816,45 €
20			730,20 €				- €	220	300	240	21 753,60 €
			- €				- €	42	42	36	3 507,00 €
			- €				- €	40	80	40	4 593,60 €
8	24		969,12 €				- €	8	24	0	969,12 €
28	48	16	2 726,92 €				- €	28	48	16	2 726,92 €
4	8		371,72 €				- €	4	8	0	371,72 €
			- €				- €	4	8	0	371,72 €
			- €				- €	30	40	30	2 881,00 €
			- €				- €	4	8	0	371,72 €
4	8		371,72 €				- €	4	8	0	371,72 €
32	60	38	3 693,50 €				- €	32	60	38	3 693,50 €
			- €				- €	32	60	0	2 860,92 €
			- €				- €	8	8	0	517,76 €
4	2		202,46 €				- €	14	18	0	1 018,92 €
			5 916,00 €				- €				5 916,00 €
			- €				- €				- €
			- €				- €	0	0	6	131,46 €
			- €				- €				- €
			- €				- €				- €
			- €				- €	10	0	10	584,20 €
			23 676,08 €				10 929,08 €				136 572,39 €
											180,00 €

Zmena ceny za DP podľa Dodatku č.1: - oprava matematickej chyby - 1 400,66 €
- navýšenie rozsahu prác 23 676,08 €
Spolu 22 275,42 €

Zmena ceny za DP podľa Dodatku č.2. - navýšenie rozsahu prác 10 929,08 €
Spolu 10 929,08 €

Stavba : Diaľnica D1 Senec- Blatné, križovatka Blatné

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č.4

Autorský dozor (AD)

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	Cena celkom
1	Výkon činnosti AD	28,21	v €
	Navrhovaná cena bez DPH	Potrebný počet hodín	33 852,00 €
	DPH 20 %	1200	33 852,00 €
	Navrhovaná cena s DPH		6 770,40 €
			40 622,40 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta

Stavba: Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné
 Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny

Tabuľka č. 5

Majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby

	Predmet	m.j.	počet m.j. *	Cena za m.j. bez DPH v €	Celková cena bez DPH v €
A	Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť výstavbou priamo dotknuté + prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	150	20,00	3 000,00 €
B	Vypracovanie a doručenie návrhu zmluvy a výzvy doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým a právnickým osobám + tabuľka v MS Excel. Rokovanie s vlastníkom a zabezpečenie uzavretia zmluvy, pri neuzavretí zmluvy dodanie právoplatného vyvlastňovacieho alebo súdneho rozhodnutia +prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	150	90,00	13 500,00 €
C	Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmluvy alebo vyvlastňovacieho rozhodnutia do katastra nehnuteľnosti a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa, a pod. + prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	150	10,00	1 500,00 €
D	Zastupovanie pred súdmi v rámci celého konania alebo zabezpečenie celého konania o súdnej úschove, notárskej úschove, súčinnosť pri zabezpečovaní náhradného bývania a náhradných objektov podnikateľských subjektov, legalizácia stavieb a pod.+ prehľadná tabuľka v MS Excel	ks	15	10,00	150,00 €
Navrhovaná cena bez DPH					18 150,00 €
DPH 20 %					3 630,00 €
Navrhovaná cena s DPH					21 780,00 €

K plneniu uvedených položiek je potrebné vypracovať prehľadnú tabuľku o stave MPV v MS Excel.

Vo výslednej cene nie sú obsiahnuté súdne a správne poplatky a pod., ktoré bude potrebné v zmysle platných právnych predpisov zaplatiť.

Pozn. * uvedený počet m.j. slúži len pre účely vyhodnotenia súťaže.

Geodetický elaborát - účelová mapa

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Položka	m.j.	ZoD	
		predpokladané množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €
F. Dokumentácia meračských prác			
F.1 Zameranie územia	1 ha	3	200,00
F.1 Vytýčenie, zameranie a overenie priebehu inžinierskych sietí	100 m	40	80,00
F.2 Vybudovanie a učenie parametrov bodu so závislou centráciou (pillar)	bod	2	1150,00
F.2 Vybudovanie a učenie parametrov bodu s oceľovou pažnicou	bod	2	750,00
F.3 Vytýčenie priestorovej polohy stavby	bod	22	28,00
F.4 Vyhotovenie podkladov pre všetky druhy GP	100 m	90	10,00
F. Dokumentácia meračských prác - cena celkom			
G. Dokumentácia pre majetkové vypořádanie			
G.1 GP pre trvalý záber	100 m	90	80,00
G.2 GP pre dočasné zábery a zábery do 1 roka	100 m	90	50,00
G.3 GP na vyznačenie vecného bremena (inžinierska sieť)	100 m	40	60,00
G.4 Výkupné elaboráty	vlastník	252	3,00
G.5 Situácia dotknutých pozemkov	100 m	40	11,00
G.6 Zoznam dotknutých parcel	parcela	218	3,00
G. Dokumentácia pre majetkové vypořádanie - cena celkom			

Zmena ceny za časť F v DSP:

Presun častí F.2 a F.3 do DP - v zmysle ZoD - 4 416,00 €

Navýšenie častí F.1 a F.4 - v zmysle Dodatku č.1 11 632,10 €

Zmena ceny za časť F v DSP: 7 216,10 €

UPOZORNENIE:

Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce.

na celkom bez DPH v €	Dodatok č.1			ZoD + Dodatok č.1			Pozn.
	rozdiel množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €	výsledné množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €	
600,00	-0,7	200,00	-140,00	2,3	200,00	460,00	
3200,00	126	80,00	10080,00	166	80,00	13280,00	
2300,00	0	1150,00	0,00	2	1150,00	2300,00	presúva sa do DP
1500,00	2	750,00	1500,00	4	750,00	3000,00	
616,00		28,00	0,00	22	28,00	616,00	
900,00	169,21	10,00	1692,10	259,21	10,00	2592,10	
9116,00			13132,10			22248,10	
7200,00	-1,6	80,00	-128,00	88,4	80,00	7072,00	
4500,00	47,51	50,00	2375,50	137,51	50,00	6875,50	
2400,00	-8,76	60,00	-525,60	31,24	60,00	1874,40	
756,00	168	3,00	504,00	420	3,00	1260,00	
440,00		11,00	0,00	40	11,00	440,00	
654,00	62	3,00	186,00	280	3,00	840,00	
15950,00			2411,90			18361,90	

Zmena ceny za časť F v DP:

Presun častí F.2 a F.3 do DP - v zmysle ZoD 4 416,00 €

Navýšenie častí F.2 a F.3 - v zmysle Dodatku č.1 1 500,00 €

Zmena ceny za časť F v DP: 5 916,00 €

é práce, ktoré boli s objednávateľom vopred

Stavba: D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

Podrobný inžinierskogeologický prieskum – Špecifikácia ceny predpokladaného rozsahu geologických prác

Časť	Druh prác	m.j.
A 1	TERENNE PRACE	
	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, o vzorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy	m
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy	m
	presimetričné inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, odobratia vzoriek a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m
	presimetričné skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks
A2	GEOFYZIKALNE PRACE	
	georadarové merania - priemerný náklad s vyhodnotením	m
B1	LABORATORNE PRACE – mechanika zemín	
	porušená vzorka - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks
	neporušená vzorka - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + objemová hmotnosť + merná hmotnosť	ks
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou	ks
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv	ks
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks
	zeminy - bobtnavosť	ks
	zeminy - priepustnosť	ks
zeminy - presadavosť	ks	
B2	LABORATORNE PRACE – chémia vôd	
	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks
C	MERAČSKÉ PRACE	
	vytyčenie vrtov, penetračných sond, bodov GF	ks
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks
D	PRACE GEOLOGICKEJ SLUŽBY	
	projekt geologických prác	ks
	záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová IG mapa, pozdĺžne a priečne IG rezy, vysvetlivky, geotechnické výpočty, účelová inžinierskogeologická mapa, geotechnické zhodnotenie, zakladania, mostných objektov) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrtov - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, meračská správa všetkých prieskumných diel, technická správa) + CD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu) + počet výtlačkov záverečnej správy v uvedený v časti B.1 príloha 1	súbor
	Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)	

	REKAPITULÁCIA	
A	terénne práce	
B	laboratórne práce	
C	meračské práce	
D	práce geologickej služby	
	Navrhovaná cena bez DPH	

Tabulka č. 7

ZoD			Dodatok č. 1			ZoD + Dod. č. 1		
počet m. j.	m.j. v € bez	cena v € bez DPH	počet m. j.	m.j. v € bez	cena v € bez DPH	počet m. j.	m.j. v € bez	cena v € bez DPH
13660,00			-900,00			12760,00		
101	40,00	4 040,00	0	40,00	0,00	101	40,00	4 040,00
46	30,00	1 380,00	0	30,00	0,00	46	30,00	1 380,00
46	50,00	2 300,00	0	50,00	0,00	46	50,00	2 300,00
50	90,00	4 500,00	6	90,00	540,00	56	90,00	5 040,00
12	120,00	1 440,00	-12	120,00	-1 440,00	0	120,00	0,00
1 600,00			-120,00			1 480,00		
800	2,00	1 600,00	-60	2,00	-120,00	740	2,00	1 480,00
2 480,00			-52,00			2 428,00		
20	42,00	840,00	-2	42,00	-84,00	18	42,00	756,00
10	52,00	520,00	4	52,00	208,00	14	52,00	728,00
14	40,00	560,00	-2	40,00	-80,00	12	40,00	480,00
6	10,00	60,00	-3	10,00	-30,00	3	10,00	30,00
5	12,00	60,00	-3	12,00	-36,00	2	12,00	24,00
4	15,00	60,00	0	15,00	0,00	4	15,00	60,00
4	65,00	260,00	0	65,00	0,00	4	65,00	260,00
8	15,00	120,00	-2	15,00	-30,00	6	15,00	90,00
400,00			0,00			400,00		
4	100,00	400,00	0	100,00	0,00	4	100,00	400,00
300,00			-80,00			220,00		
30	5,00	150,00	-8	5,00	-40,00	22	5,00	110,00
30	5,00	150,00	-8	5,00	-40,00	22	5,00	110,00
3 400,00			0,00			3 400,00		
2	50,00	100,00	0	50,00	0,00	2	50,00	100,00
	3 300,00	3 300,00		3 300,00	0,00		3 300,00	3 300,00
1			0			1		
21840,00			-1152,00			20688,00		
		15 260,00 €			- 1 020,00 €			14 240,00 €
		2 880,00 €			- 52,00 €			2 828,00 €
		300,00 €			- 80,00 €			220,00 €
		3 400,00 €			- €			3 400,00 €
		21 840,00 €			- 1 152,00 €			20 688,00 €

Stavba: Diaľnica D1 Senec - Biatné, križovatka Biatné
 Špecifikácia ceny prác
 Inžinierska činnosť k EIA a stavebnému konaniu

Tabuľka č.8

	Predmet	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
		36,51	28,21	21,90		
		Potrebný počet hodín				
1	IČ v rámci zabezpečenia stanoviska MŽP	20				730,20 €
2	IČ pre zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia	280	280			18 121,60 €
	Navrhovaná cena bez DPH					18 851,80 €
	DPH 20 %					3 770,36 €
	Navrhovaná cena s DPH					22 622,16 €

Stavba: Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Špecifikácia ceny prác spolu

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9, 79.10.00.00-5, 71.31.34.00-9.

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 9

	Cena ZoD v € bez DPH	Cena Dod. č.1 v € bez DPH	Cena Dod. č.2 v € bez DPH	Cena ZoD + Dod č.1,2 v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Oznámenie 8a	6 067,08	-	-	6 067,08 €	1 213,42 €	7 280,50 €
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	177 434,73	31 960,58	-	209 395,31 €	41 879,06 €	251 274,37 €
Dokumentácia na ponuku (DP)	103 367,89	22 275,42	10 929,08	136 572,39 €	27 314,48 €	163 886,87 €
Inžinierska činnosť (IČ)	18 851,80	-	-	18 851,80 €	3 770,36 €	22 622,16 €
Majetkovoprávne vysporiadanie (MPV)	18 150,00	-	-	18 150,00 €	3 630,00 €	21 780,00 €
Autorský dozor	33 852,00	-	-	33 852,00 €	6 770,40 €	40 622,40 €
Spolu	357 723,50 €	54 236,00 €	10 929,08 €	422 888,58 €	84 577,72 €	507 466,30 €

Cena naviac výtlačkov nad rámec počtov definovaných v B.1 Príloha č.1


5 paré 8a nad rámec v zmysle Prílohy č. 1, bod 4.6				200,00 €	40,00 €	240,00 €
5 paré DSP nad rámec v zmysle Prílohy č. 1, bod 4.6				750,00 €	150,00 €	900,00 €
5 paré DP nad rámec v zmysle Prílohy č. 1, bod 4.6				900,00 €	180,00 €	1 080,00 €
Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže - kritérium)				424 738,58 €	84 947,72 €	509 686,30 €

Harmonogram všetkých prác Zhotoviteľa

(MPV formou Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve s prípadným vyvlastňovacím konaním)

Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	III.			
					V	VI	VII	VIII
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	500 dny	4.6. 13	4.5. 15				
2	Viazanosť ponuky uchádzača	108 dny	4.6. 13	31.10. 13				
3	Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo	1 den	15.8. 13	15.8. 13				
4	Príprava stavby v stupni DSP	448 dny	15.8. 13	4.5. 15				
5	I. Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dny	15.8. 13	28.2. 14				
6	Podrobný IG prieskum a ďalšie prieskumy a štúdie	20 týždny	15.8. 13	1.1. 14				
7	Spracovanie DSP	22,4 týždny	29.8. 13	31.1. 14				
8	Vypracovanie Oznámenia zmeny navrhovanej činnosti (podľa Prílohy 8a Zákona 24/2006 Z.z.)	4 týždny	3.2. 14	28.2. 14				
9	Termíny pracovných rokovaní v stupni DSP	96 dny	17.9. 13	28.1. 14				
17	II. MVP formou zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách	316 dny	15.11. 13	30.1. 15				
18	MPV - Dohadovacie konanie	316 dny	15.11. 13	30.1. 15				
19	Spracovanie a odsúhlasenie návrhov zmlúv	2,2 týždny	15.11. 13	29.11. 13				
20	Príprava Zmlúv o budúcej zmluve, Nájomných zmlúv a Zmlúv o budúcom vecnom bremene, Spracovanie znaleckých posudkov, Spracovanie Situácií záberov pozemkov, doručovanie zmlúv a podpis	27,6 týždny	2.12. 13	11.6. 14				
21	Doručovanie zmlúv + lehota na vyjadrenie	29 dny	12.6. 14	22.7. 14				
22	Osobné stretnutia (vrátane doručovania pozvánok)	22 dny	23.7. 14	21.8. 14				Poznámky / Podmienk
23	Uzatvorenie kúpnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) a jej zavkladovanie do katastra nehnuteľností	31,8 týždny	24.6. 14	30.1. 15				1. Termíny sú uvažova
24	MPV - Vyvlastňovacie konanie	166,5 dny	4.6. 14	22.1. 15				dňoch (t.z. 1 týždeň pr
25	Poskytnutie plnej moci Objednávateľa k vyvlastňovacím konaniam	0 dny	4.6. 14	4.6. 14				pracovných dní a 1 me
26	1. stupeň - Podanie návrhu na vyvlastnenie, Ústne pojednávanie,	6,4 týždny	24.6. 14	7.8. 14				dni)
27	1. stupeň - Doručovanie rozhodnutia, Lehota na odvolanie	26,6 týždny	21.7. 14	22.1. 15				2. HMG nezohľadňuje
28	Nadobudnutie právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia (1. stupeň)	1 den	30.1. 15	30.1. 15				prípadných odvolaní s
29	III. Inžinierska činnosť	336 dny	20.1. 14	4.5. 15				3. Kompletné MPV bu
30	Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k Oznámeniu zmeny navrhovanej činnosti (Príloha 8a Zákona 24/2006 Z.z.)	19,3 týždny	3.3. 14	15.7. 14				mesiacov od poskytnu
31	IČ pre zabezpečenie záväzných stanovísk a rozhodnutí do stavebného konania (napr. vyňatia z LPF, PPF, výrubu drevín,...)	36,4 týždny	20.1. 14	30.9. 14				overených Správou KI
32	Stavebné konanie	66 dny	2.2. 15	4.5. 15				4. HMG nezohľadňuje
33	Podanie žiadosti o stavebné povolenie, začiatok stavebného konania	1 den	2.2. 15	2.2. 15				prípadných prebiehajú
34	Oznámovanie konania doručované formou verejnej vyhlášky	2,4 týždny	18.2. 15	5.3. 15				a ROEP-u
35	Lehota na podávanie námietok	1,4 týždny	6.3. 15	16.3. 15				6. HMG platí pri ideáln
36	Vydané stavebné povolenie	1 den	1.4. 15	1.4. 15				stavebného úradu s na
37	Doručovanie stavebného povolenia účastníkom konania verejnou vyhláškou	2,4 týždny	2.4. 15	17.4. 15				7. HMG nezohľadňuje
38	Lehota na podanie odvolania	2,2 týždny	20.4. 15	4.5. 15				požiadavky NDS, a.s.
39	Nadobudnutie právoplatnosti SP - 1. stupeň	1 den	4.5. 15	4.5. 15				zmluvy so Slovenským
40	IV. Spracovanie Dokumentácie na ponuku	14,1 týždny	24.10. 14	30.1. 15				8. Po ROEP-e sa môžu

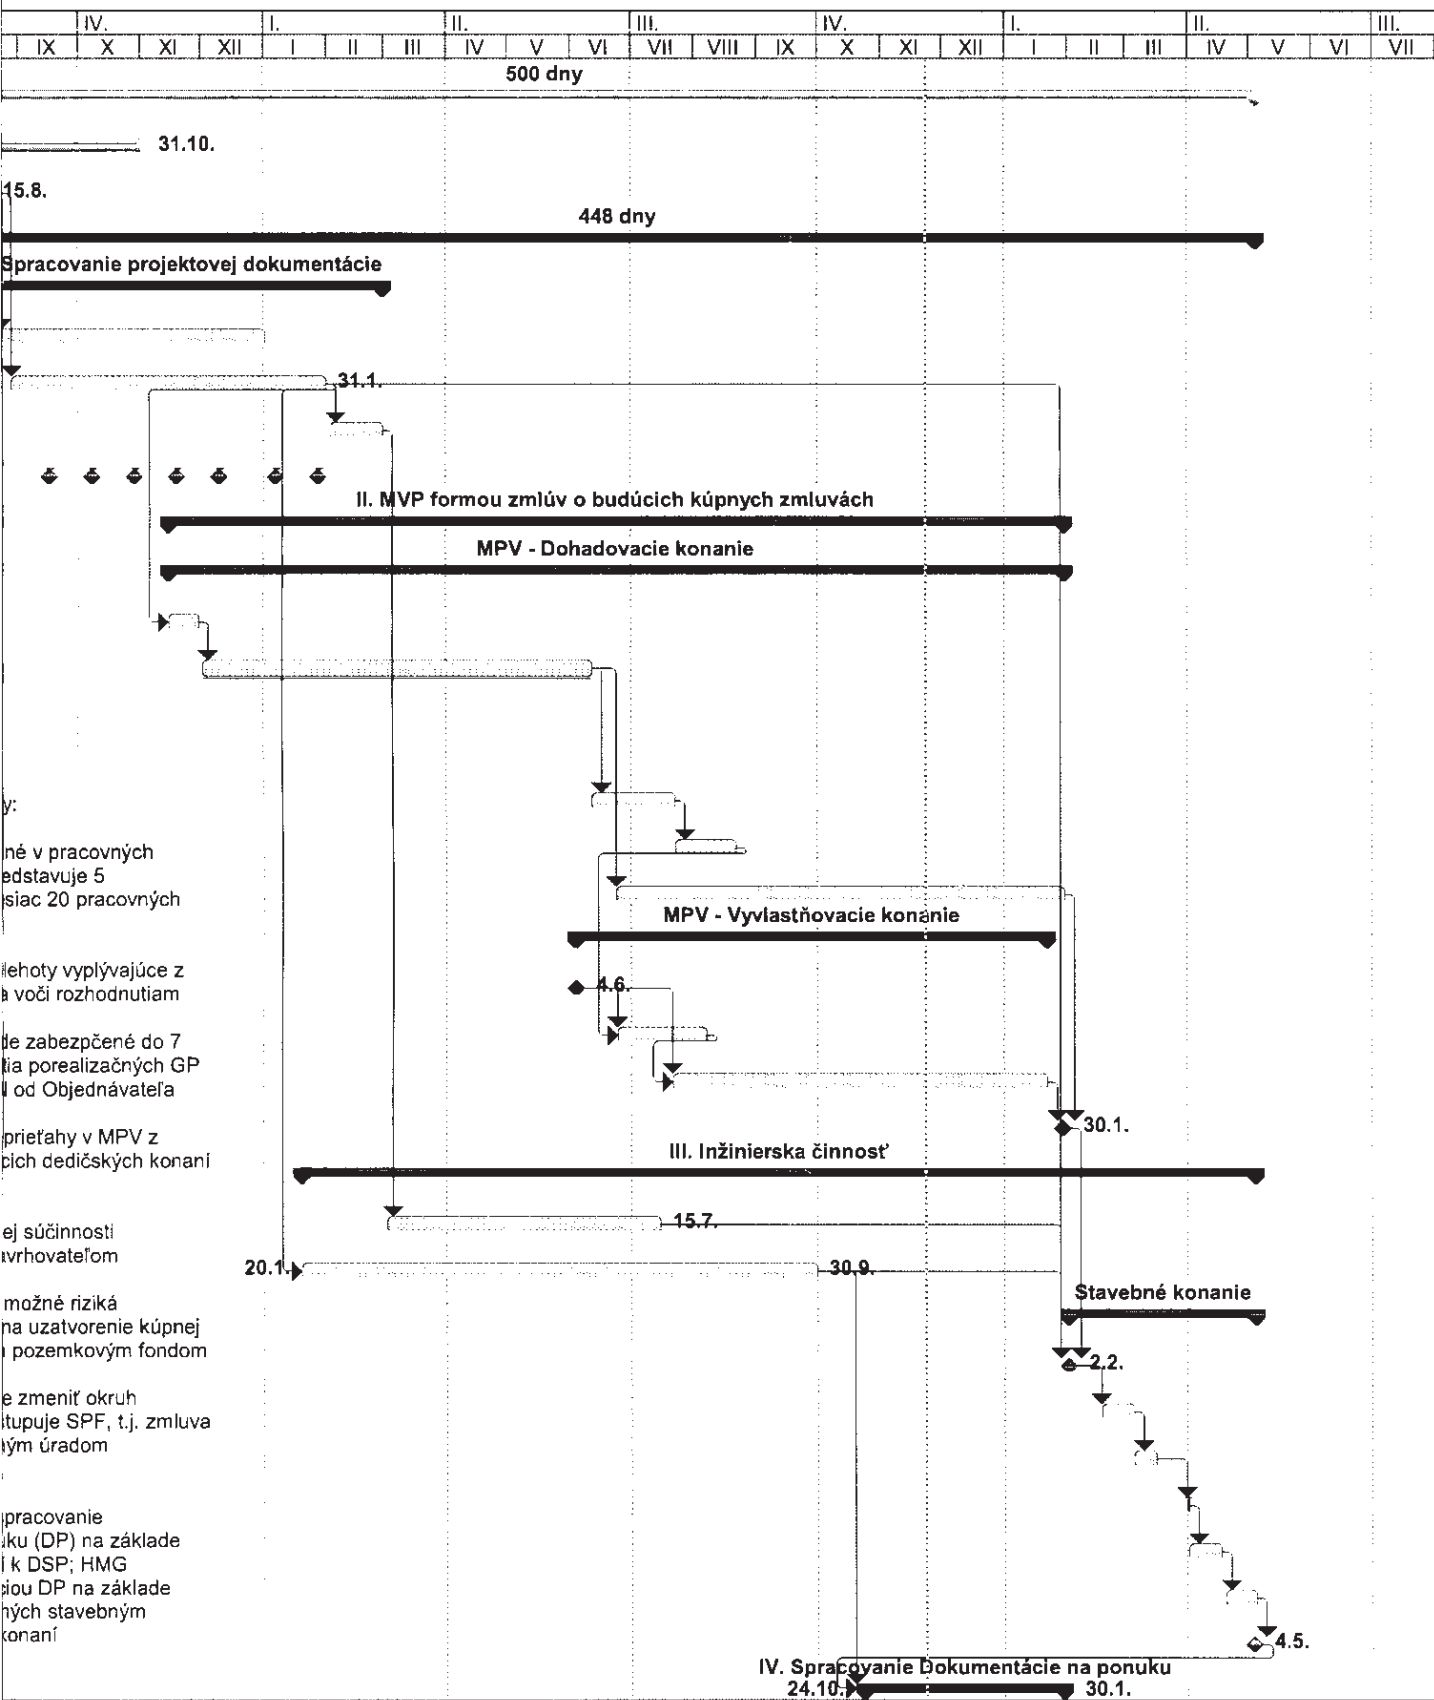


Vypracovanie Oznámenia o zmenách navrhovanej činnosti (podľa Prílohy č. 8a Zák (MPV formou Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve s prípadným vyvlastňovacím konaním)
Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	III.			
					V	VI	VII	VIII
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	500 dny	4.6.13	4.5.15				
2	Viazanosť ponuky uchádzača	108 dny	4.6.13	31.10.13				
3	Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo	1 den	15.8.13	15.8.13	4.6.			
4	Príprava stavby v stupni DSP	448 dny	15.8.13	4.5.15				
5	I. Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dny	15.8.13	28.2.14				
6	Podrobný IG prieskum a ďalšie prieskumy a štúdie	20 týždne	15.8.13	1.1.14				
7	Spracovanie DSP	22,4 týždne	29.8.13	31.1.14				
8	Vypracovanie Oznámenia zmeny navrhovanej činnosti (podľa Prílohy	4 týždne	3.2.14	28.2.14				29.8.
9	Termíny pracovných rokovaní v stupni DSP	96 dny	17.9.13	28.1.14				
17	II. MVP formou zmlúv o budúch kúpnych zmluvách	316 dny	15.11.13	30.1.15				
18	MPV - Dohadovacie konanie	316 dny	15.11.13	30.1.15				
19	Spracovanie a odsúhlasenie návrhov zmlúv	2,2 týždne	15.11.13	29.11.13				
20	Príprava Zmlúv o budúcej zmluve, Nájomných zmlúv a Zmlúv o budúcom vecnom bremene, Spracovanie znaleckých posudkov, Spracovanie Situácií záberov pozemkov, doručovanie zmlúv a podpis	27,6 týždne	2.12.13	11.6.14				
21	Doručovanie zmlúv + lehota na vyjadrenie	29 dny	12.6.14	22.7.14				Poznámky / Podmien
22	Osobné stretnutia (vrátane doručovania pozvánok)	22 dny	23.7.14	21.8.14				1. Termíny sú uvažov
23	Uzatvorenie kúpnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) a jej zavkladovanie do katastra nehnuteľností	31,8 týždne	24.6.14	30.1.15				dňoch (t.z. 1 týždeň p
24	MPV - Vyvlastňovacie konanie	166,5 dny	4.6.14	22.1.15				pracovných dní a 1 m
25	Poskytnutie plnej moci Objednávateľa k vyvlastňovacím konaniam	0 dny	4.6.14	4.6.14				dni)
26	1. stupeň - Podanie návrhu na vyvlastnenie. Ústne pojednávanie,	6,4 týždne	24.6.14	7.8.14				2. HMG nezohľadňuje
27	1. stupeň - Doručovanie rozhodnutia, Lehota na odvolanie	26,6 týždne	21.7.14	22.1.15				prípadných odvolaní s
28	Nadobudnutie právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia (1. stupeň)	1 den	30.1.15	30.1.15				3. Kompletné MPV bu
29	III. Inžinierska činnosť	336 dny	20.1.14	4.5.15				mesiacov od poskytní
30	Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k Oznámeniu zmeny navrhovanej činnosti (Príloha 8a Zákona 24/2006 Z.z.)	19,3 týždne	3.3.14	15.7.14				overených Správou K
31	IČ pre zabezpečenie záväzných stanovísk a rozhodnutí do stavebného konania (napr. vyňatia z LPP, PPF, výrubu drevín,...)	35,4 týždne	20.1.14	30.9.14				4. HMG nezohľadňuje
32	Stavebné konanie	66 dny	2.2.15	4.5.15				prípadných prebiehajú
33	Podanie žiadosti o stavebné povolenie, začiatok stavebného konania	1 den	2.2.15	2.2.15				a ROEP-u
34	Oznámovanie konania doručované formou verejnej vyhlášky	2,4 týždne	18.2.15	5.3.15				6. HMG platí pri ideál
35	Lehota na podávanie námietok	1,4 týždne	6.3.15	16.3.15				stavebného úradu s r
36	Vydané stavebné povolenie	1 den	1.4.15	1.4.15				7. HMG nezohľadňuje
37	Doručovanie stavebného povolenia účastníkom konania verejnou vyhláškou	2,4 týždne	2.4.15	17.4.15				požiadavky NDS, a.s
38	Lehota na podanie odvolania	2,2 týždne	20.4.15	4.5.15				zmluvy so Slovenský
39	Nadobudnutie právoplatnosti SP - 1. stupeň	1 den	4.5.15	4.5.15				8. Po ROEP-e sa mô
40	IV. Spracovanie Dokumentácie na ponuku	14,1 týždne	24.10.14	30.1.15				vlastníkov, ktorých za


Harmonogram prác Zhotoviteľa - Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k (MPV formou Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve s prípadným vyvlastňovacím konaním) Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

ID	Název úkolu	Doba trvaní	Zahájení	Dokončení	III.			
					V	VI	VII	VIII
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	500 dny	4.6.13	4.5.15				
2	Viazanosť ponuky uchádzača	103 dny	4.6.13	31.10.13				
3	Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo	1 den	15.8.13	15.8.13				
4	Príprava stavby v stupni DSP	448 dny	15.8.13	4.5.15				
5	I. Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dny	15.8.13	28.2.14				
6	Podrobný IG prieskum a ďalšie prieskumy a štúdie	20 týždny	15.8.13	1.1.14				
7	Spracovanie DSP	22,4 týždny	29.8.13	31.1.14				
8	Vypracovanie Oznámenia zmeny navrhovanej činnosti (podľa Prílohy	4 týždny	3.2.14	28.2.14				
9	Termíny pracovných rokovaní v stupni DSP	96 dny	17.9.13	28.1.14				
17	II. MVP formou zmlúv o budúcih kúpnych zmluvách	316 dny	15.11.13	30.1.15				
18	MPV - Dohadovacie konanie	316 dny	15.11.13	30.1.15				
19	Spracovanie a odsúhlasenie návrhov zmlúv	2,2 týždny	15.11.13	29.11.13				
20	Príprava Zmlúv o budúcej zmluve, Nájomných zmlúv a Zmlúv o budúcom vecnom bremene, Spracovanie znaleckých posudkov, Spracovanie Situácií záberov pozemkov, doručovanie zmlúv a podpis	27,6 týždny	2.12.13	11.6.14				
21	Doručovanie zmlúv + lehota na vyjadrenie	29 dny	12.6.14	22.7.14				
22	Osobné stretnutia (vrátane doručovania pozvánok)	22 dny	23.7.14	21.8.14				
23	Uzatvorenie kúpnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) a jej zavklacovanie do katastra nehnuteľností	31,8 týždny	24.6.14	30.1.15				Poznámky / Podmienk
24	MPV - Vyvlastňovacie konanie	166,5 dny	4.6.14	22.1.15				1. Termíny sú uvažova dňoch (t.z. 1 týždeň pr pracovných dní a 1 me dní)
25	Poskytnutie plnej moci Objednávateľa k vyvlastňovacím konaniam	0 dny	4.6.14	4.6.14				2. HMG nezohľadňuje prípadných odvolaní s
26	1. stupeň - Podanie návrhu na vyvlastnenie, Ústne pojednávanie,	0,4 týždny	24.6.14	7.8.14				3. Kompletné MPV bu mesiacov od poskytnu overených Správou K
27	1. stupeň - Doručovanie rozhodnutia, Lehota na odvolanie	20,6 týždny	21.7.14	22.1.15				4. HMG nezohľadňuje prípadných prebiehajú a ROEP-u
28	Nadobudnutie právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia (1. stupeň)	1 den	30.1.15	30.1.15				6. HMG platí pri ideáln stavebného úradu s n
29	III. Inžinierska činnosť	336 dny	20.1.14	4.5.15				7. HMG nezohľadňuje požiadavky NDS, a.s. zmluvy so Slovenským
30	Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k Oznámeniu zmeny navrhovanej činnosti (Príloha 8a Zákona 24/2006 Z.z.)	19,3 týždny	3.3.14	15.7.14				8. Po ROEP-e sa môžu vlastníkov, ktorých zas SPF nebude stavebn akceptovaná
31	IČ pre zabezpečenie záväzných stanovísk a rozhodnutí do stavebného konania (napr. vyňatia z LPF, PPF, výrubu crevir,...)	35,4 týždny	20.1.14	30.9.14				9. HMG predpokladá dokumentácie na pon stanovisk a rozhodnutí neuvažuje s aktualizá podmienok akceptova úradom v stavebnom
32	Stavebné konanie	66 dny	2.2.15	4.5.15				
33	Podanie žiadosti o stavebné povolenie, začiatok stavebného konania	1 den	2.2.15	2.2.15				
34	Oznámovanie konania doručované formou verejnej vyhlášky	2,4 týždny	18.2.15	5.3.15				
35	Lehota na podávanie námietok	1,4 týždny	6.3.15	16.3.15				
36	Vydané stavebné povolenie	1 den	1.4.15	1.4.15				
37	Doručovanie stavebného povolenia účastníkom konania verejnou vyhláškou	2,4 týždny	2.4.15	17.4.15				
38	Lehota na podanie odvolania	2,2 týždny	20.4.15	4.5.15				
39	Nadobudnutie právoplatnosti SP - 1. stupeň	1 den	4.5.15	4.5.15				
40	IV. Spracovanie Dokumentácie na ponuku	14,1 týždny	24.10.14	30.1.15				

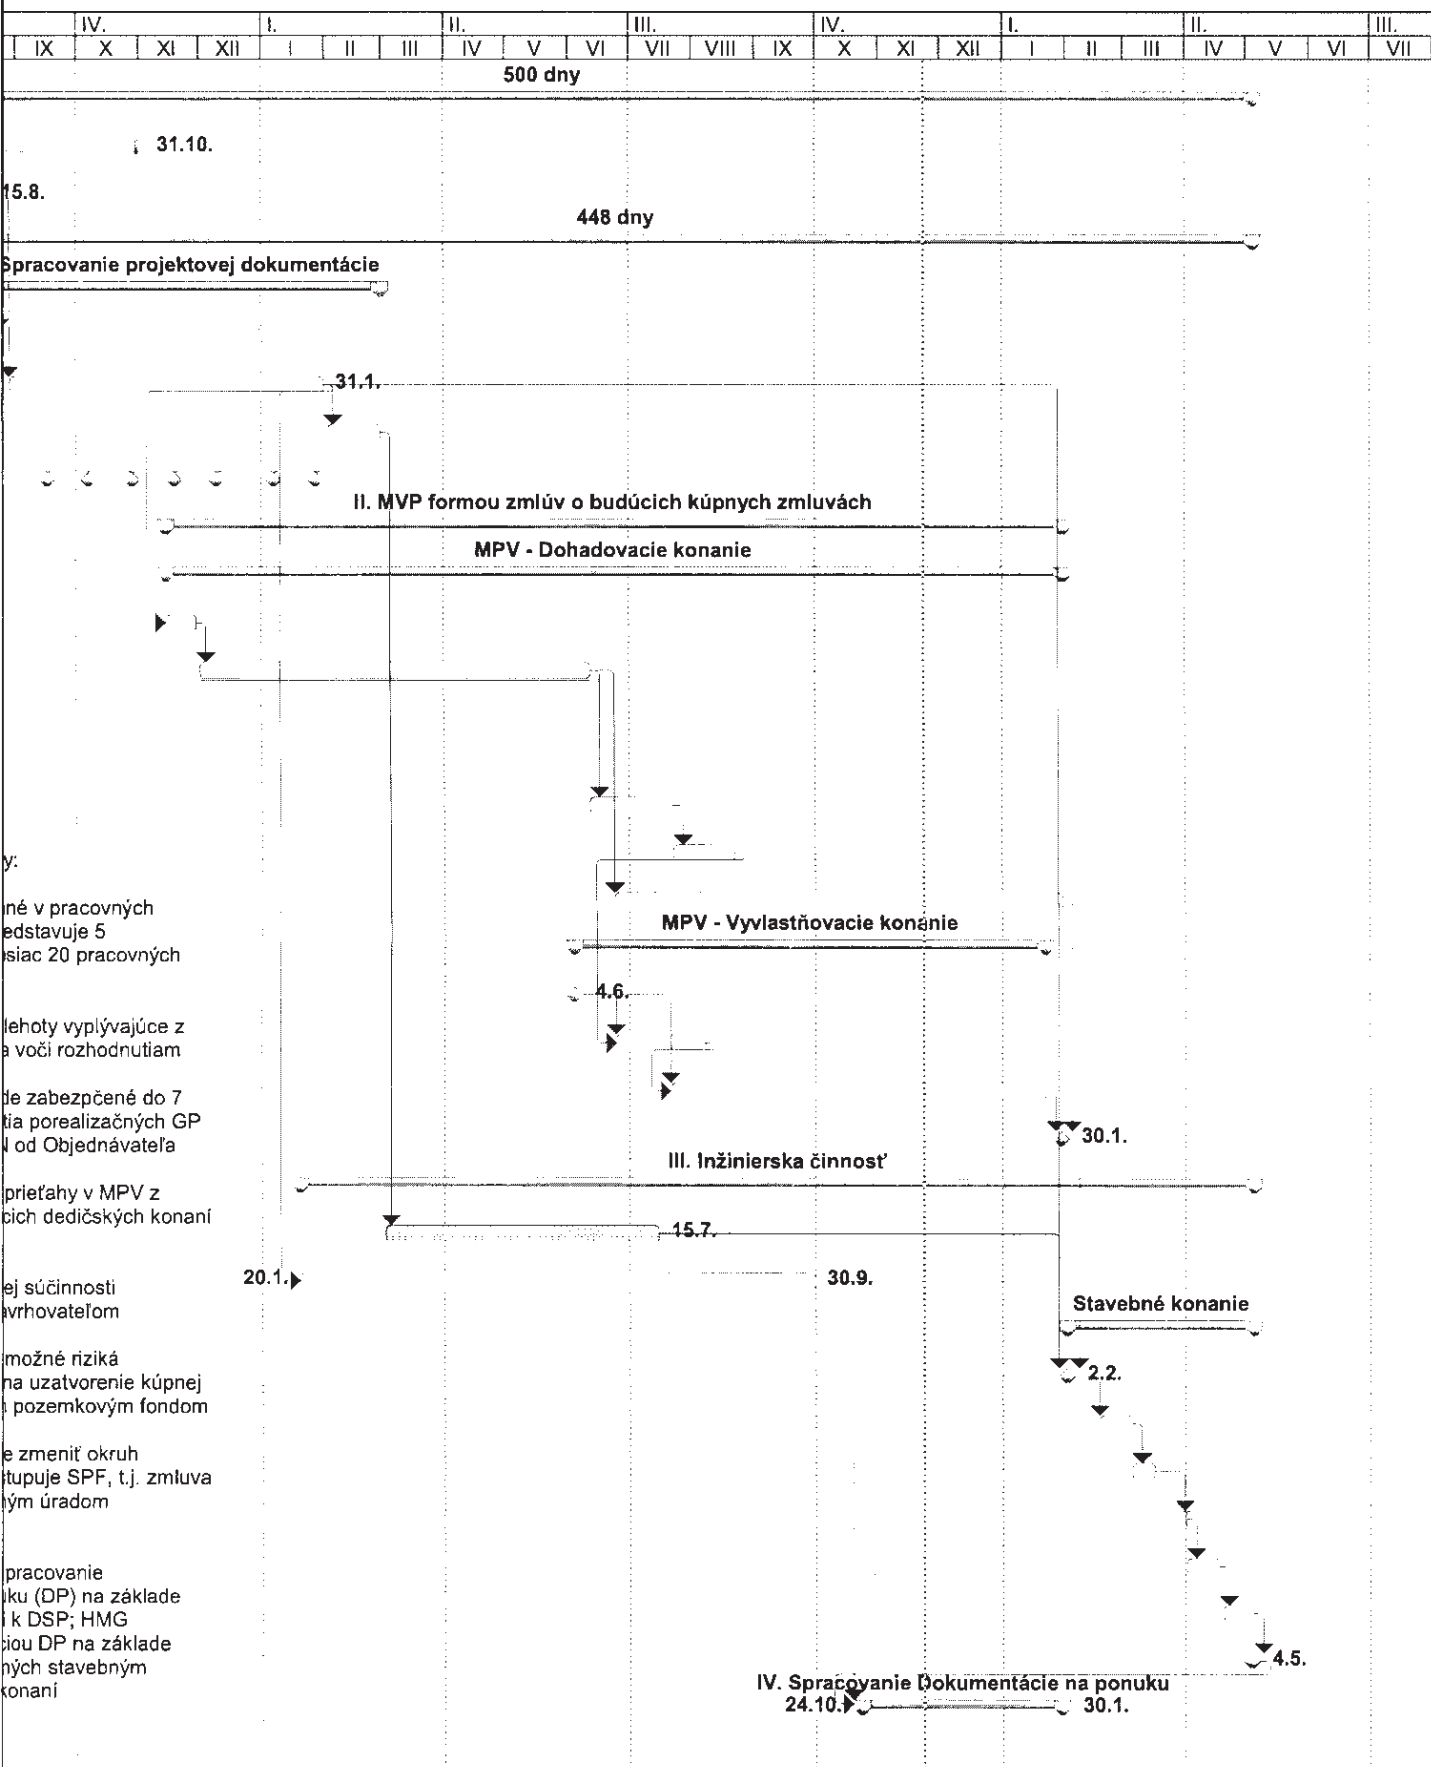

Harmonogram prác Zhotoviteľa - Spracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie (MPV formou Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve s prípadným vyvlastňovacím konaním) Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné


ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	III.			
					V	VI	VII	VIII
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	500 dny	4.6. 13	4.5. 15				
2	Viazanosť ponuky uchádzača	108 dny	4.6. 13	31.10. 13				
3	Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo	1 den	15.8. 13	15.8. 13	4.6.			
4	Príprava stavby v stupni DSP	448 dny	15.8. 13	4.5. 15				
5	I. Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dny	15.8. 13	28.2. 14				
6	Podrobný IG prieskum a ďalšie prieskumy a štúdie	20 týždny	15.8. 13	1.1. 14				
7	Spracovanie DSP	22,4 týždny	29.8. 13	31.1. 14				
8	Vypracovanie Oznámenia zmeny navrhovanej činnosti (podľa Prílohy	4 týždny	3.2. 14	28.2. 14				
9	Termíny pracovných rokovaní v stupni DSP	96 dny	17.9. 13	28.1. 14				
17	II. MVP formou zmlúv o budúcych kúpnych zmluvách	316 dny	15.11. 13	30.1. 15				
18	MPV - Dohadovacie konanie	316 dny	15.11. 13	30.1. 15				
19	Spracovanie a odsúhlasenie návrhov zmlúv	2,2 týždny	15.11. 13	29.11. 13				
20	Príprava Zmlúv o budúcej zmluve, Nájomných zmlúv a Zmlúv o budúcom vecnom bremene, Spracovanie znaleckých posudkov, Spracovanie Situácií záberov pozemkov, coručovanie zmlúv a podpis	27,6 týždny	2.12. 13	11.6. 14				
21	Doručovanie zmlúv + lehota na vyjadrenie	29 dny	12.6. 14	22.7. 14				Poznámky / Podmienk
22	Osobné stretnutia (vrátane doručovania pozvánok)	22 dny	23.7. 14	21.8. 14				1. Termíny sú uvažova
23	Uzatvorenie kúpnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) a jej zavkladovanie do katastra nehnuteľností	31,8 týždny	24.6. 14	30.1. 15				dňoch (t.z. 1 týždeň pr
24	MPV - Vyvlastňovacie konanie	166,5 dny	4.6. 14	22.1. 15				pracovných dní a 1 me
25	Poskytnutie plnej moci Objednávateľa k vyvlastňovacím konaniam	0 dny	4.6. 14	4.6. 14				dni)
26	1. stupeň - Podanie návrhu na vyvlastnenie, Ústne pojednávajúce	6,4 týždny	24.6. 14	7.8. 14				2. HMG nezohľadňuje
27	1. stupeň - Doručovanie rozhodnutia, Lehota na odvolanie	26,6 týždny	21.7. 14	22.1. 15				prípadných odvolaní s
28	Nadobudnutie právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia (1. stupeň)	1 den	30.1. 15	30.1. 15				3. Kompletné MPV bu
29	III. Inžinierska činnosť	336 dny	20.1. 14	4.5. 15				mesiacov od poskytnu
30	Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k Oznámeniu zmeny navrhovanej činnosti (Príloha 8a Zákona 24/2006 Z.z.)	19,3 týždny	3.3. 14	15.7. 14				overených Správou KN
31	IČ pre zabezpečenie záväzných stanovísk a rozhodnutí do stavebného konania (napr. vyňatia z LPF, PPF, výrubu drevín,...)	36,4 týždny	20.1. 14	30.9. 14				4. HMG nezohľadňuje
32	Stavebné konanie	66 dny	2.2. 15	4.5. 15				prípadných prebiehajú
33	Podanie žiadosti o stavebné povolenie, začiatok stavebného konania	1 den	2.2. 15	2.2. 15				a ROEP-u
34	Oznámovanie konania coručované formou verejnej vyhlášky	2,4 týždny	18.2. 15	5.3. 15				6. HMG platí pri ideáln
35	Lehota na podávanie námietok	1,4 týždny	6.3. 15	16.3. 15				stavebného úradu s na
36	Vydané stavebné povolenie	1 den	1.4. 15	1.4. 15				7. HMG nezohľadňuje
37	Doručovanie stavebného povolenia účastníkom konania verejnou vyhláškou	2,4 týždny	2.4. 15	17.4. 15				požiadavky NDS, a.s.
38	Lehota na podanie odvolania	2,2 týždny	20.4. 15	4.5. 15				zmluvy so Slovenským
39	Nadobudnutie právoplatnosti SP - 1. stupeň	1 den	4.5. 15	4.5. 15				8. Po ROEP-e sa môžu
40	IV. Spracovanie Dokumentácie na ponuku	14,1 týždny	24.10. 14	30.1. 15				vlastníkov, ktorých zas

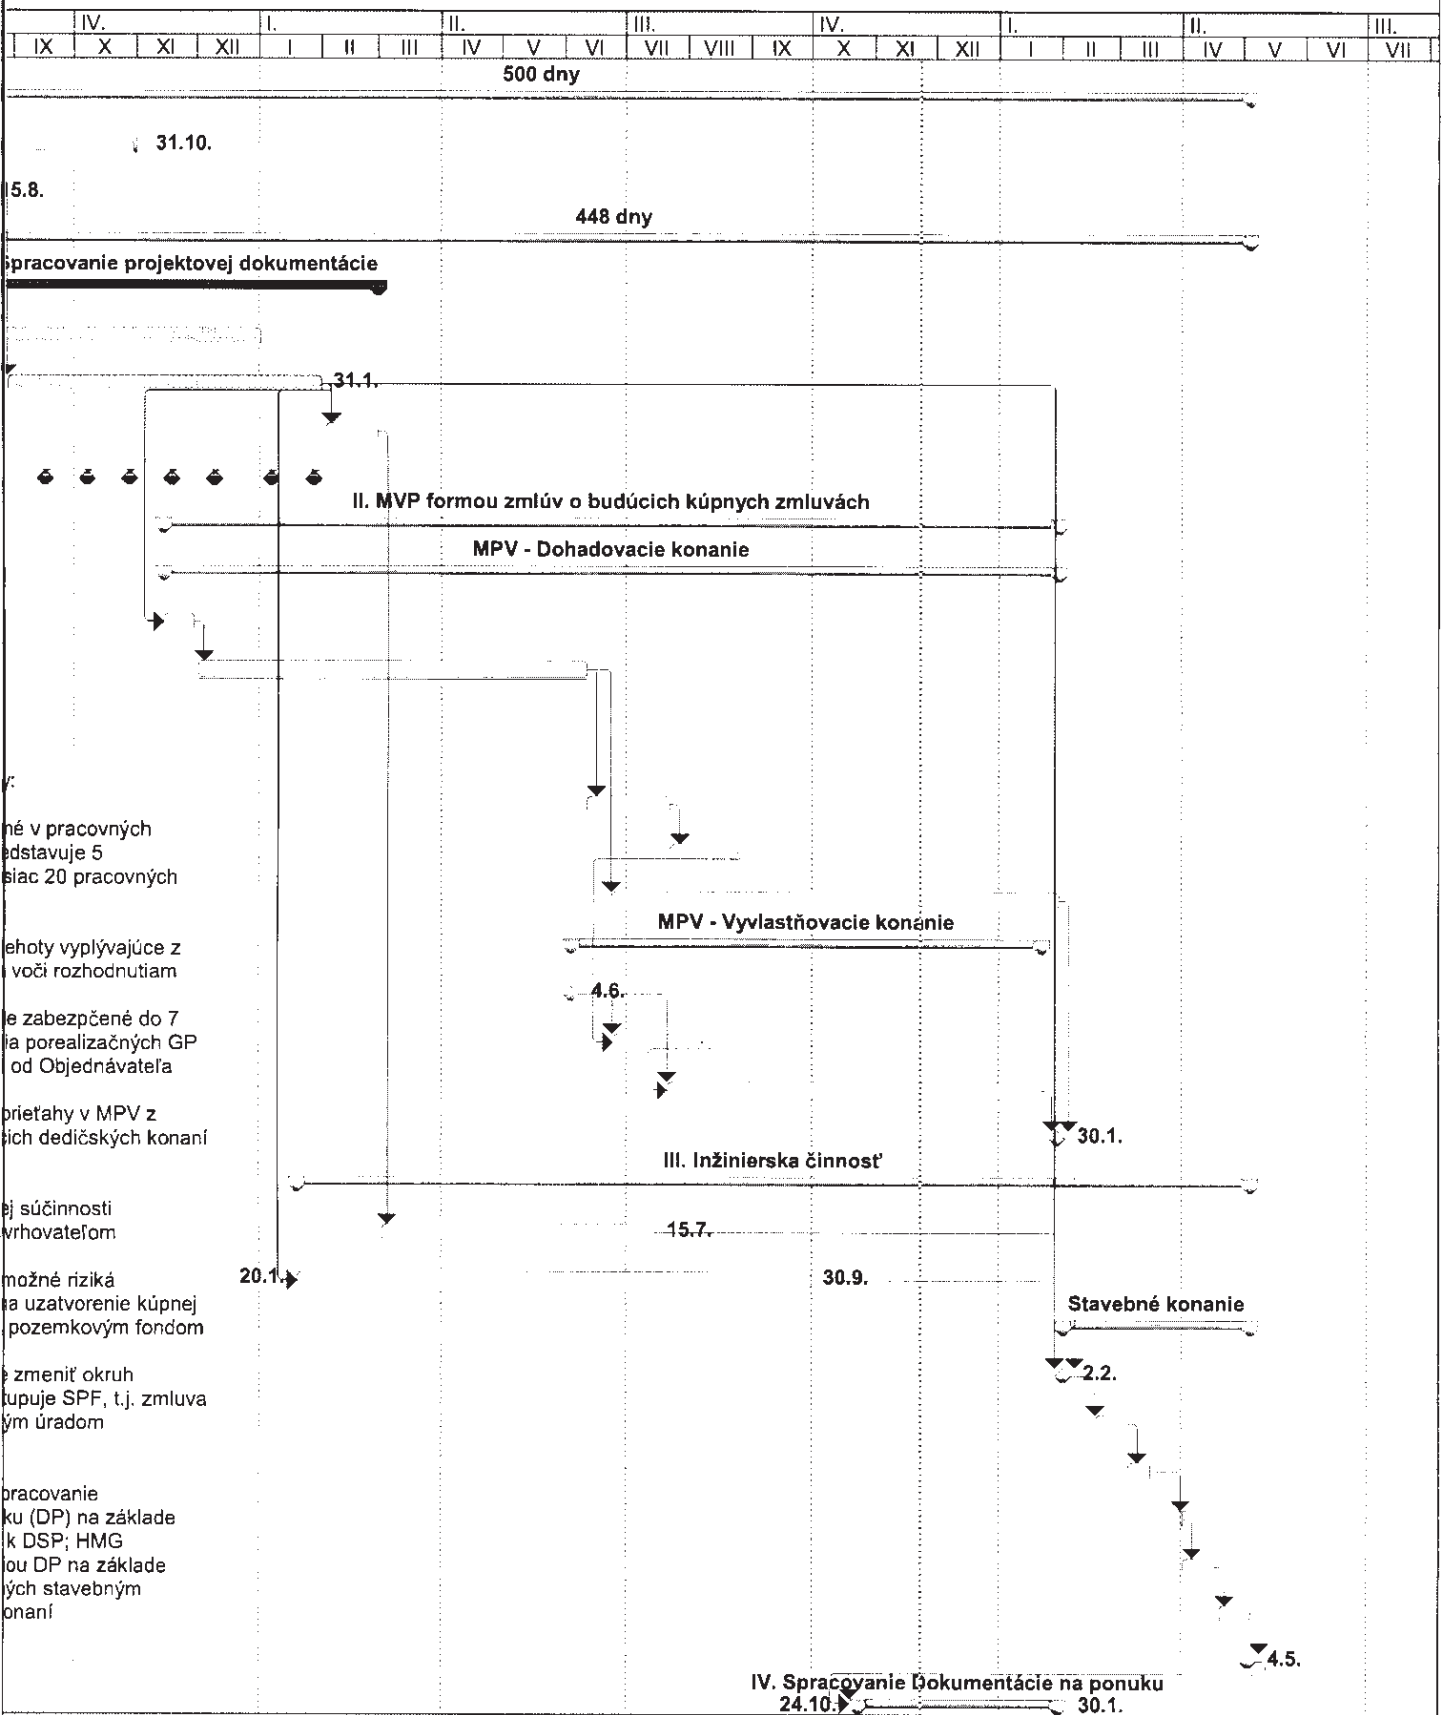

Harmonogram prác Zhotoviteľa - Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia (MPV formou Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve s prípadným vyvlastňovacím konaním) Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	III.			
					V	VI	VII	VIII
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	500 dny	4.6. 13	4.5. 15				
2	Viazanosť ponuky uchádzača	108 dny	4.6. 13	31.10. 13	4.6.			
3	Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo	1 den	15.8. 13	15.8. 13				
4	Príprava stavby v stupni DSP	448 dny	15.8. 13	4.5. 15				
5	I. Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dny	15.8. 13	28.2. 14				
6	Podrobný IG prieskum a ďalšie prieskumy a štúdie	20 týždne	15.8. 13	1.1. 14				
7	Spracovanie DSP	22,4 týždne	29.8. 13	31.1. 14				
8	Vypracovanie Oznámenia zmeny navrhovanej činnosti (podľa Prílohy	4 týždne	3.2. 14	28.2. 14				29.8.
9	Termíny pracovných rokovaní v stupni DSP	96 dny	17.9. 13	28.1. 14				
17	II. MVP formou zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách	316 dny	15.11. 13	30.1. 15				
18	MPV - Dohadovacie konanie	316 dny	15.11. 13	30.1. 15				
19	Spracovanie a odsúhlasenie návrhov zmlúv	2,2 týždne	15.11. 13	29.11. 13				
20	Príprava Zmlúv o budúcej zmluve, Nájomných zmlúv a Zmlúv o budúcom vecnom bremene, Spracovanie znaleckých posudkov, Spracovanie Situácií záberov pozemkov, doručovanie zmlúv a podpis	27,6 týždne	2.12. 13	11.6. 14				
21	Doručovanie zmlúv + lehota na vyjadrenie	29 dny	12.6. 14	22.7. 14				
22	Osobné stretnutia (vrátane doručovania pozvánok)	22 dny	23.7. 14	21.8. 14				
23	Uzatvorenie kúpnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) a jej zavkladovanie do katastra nehnuteľností	31,8 týždne	24.6. 14	30.1. 15				Poznámky / Podmien
24	MPV - Vyvlastňovacie konanie	166,5 dny	4.6. 14	22.1. 15				1. Termíny sú uvažov
25	Poskytnutie plnej moci Objednávateľa k vyvlastňovacím konaniam	0 dny	4.6. 14	4.6. 14				dňoch (t.z. 1 týždeň p
26	1. stupeň - Podanie návrhu na vyvlastnenie. Ústne pojednávanie,	6,4 týždne	24.6. 14	7.8. 14				pracovných dní a 1 m
27	1. stupeň - Doručovanie rozhodnutia, Lehota na odvolania	26,6 týždne	21.7. 14	22.1. 15				dni)
28	Nadobudnutie právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia (1. stupeň)	1 den	30.1. 15	30.1. 15				2. HMG nezohľadňuje
29	III. Inžinierska činnosť	336 dny	20.1. 14	4.5. 15				prípadných odvolaní s
30	Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k Oznámeniu zmeny navrhovanej činnosti (Príloha 8a Zákona 24/2006 Z.z.)	19,3 týždne	3.3. 14	15.7. 14				3. Kompletné MPV bu
31	IČ pre zabezpečenie záväzných stanovísk a rozhodnutí do stavebného konania (napr. vyňatia z LPF, PPF, výrubu drevín,...)	36,4 týždne	20.1. 14	30.9. 14				mesiacov od poskytn
32	Stavebné konanie	66 dny	2.2. 15	4.5. 15				overených Správou K
33	Podanie žiadosti o stavebné povolenie, začiatok stavebného konania	1 den	2.2. 15	2.2. 15				4. HMG nezohľadňuje
34	Oznámovanie konania doručované formou verejnej vyhlášky	2,4 týždne	18.2. 15	5.3. 15				prípadných prebiehaj
35	Lehota na podávanie námietok	1,4 týždne	6.3. 15	16.3. 15				a ROEP-u
36	Vydané stavebné povolenie	1 den	1.4. 15	1.4. 15				6. HMG platí pri ideál
37	Doručovanie stavebného povolenia účastníkom konania verejnou vyhláškou	2,4 týždne	2.4. 15	17.4. 15				stavebného úradu s r
38	Lehota na podanie odvolania	2,2 týždne	20.4. 15	4.5. 15				7. HMG nezohľadňuje
39	Nadobudnutie právoplatnosti SP - 1. stupeň	1 den	4.5. 15	4.5. 15				požiadavky NDS, a.s
40	IV. Spracovanie Dokumentácie na ponuku	14,1 týždne	24.10. 14	30.1. 15				zmluvy so Slovenský
								8. Po ROEP-e sa mô
								vlastníkov, ktorých za
								s SPF nebude stavek
								akceptovaná
								9. HMG predpokladá
								dokumentácie na por
								stanovísk a rozhodnu
								neuvažuje s aktualizé
								podmienok akceptov
								úradom v stavebnom

a

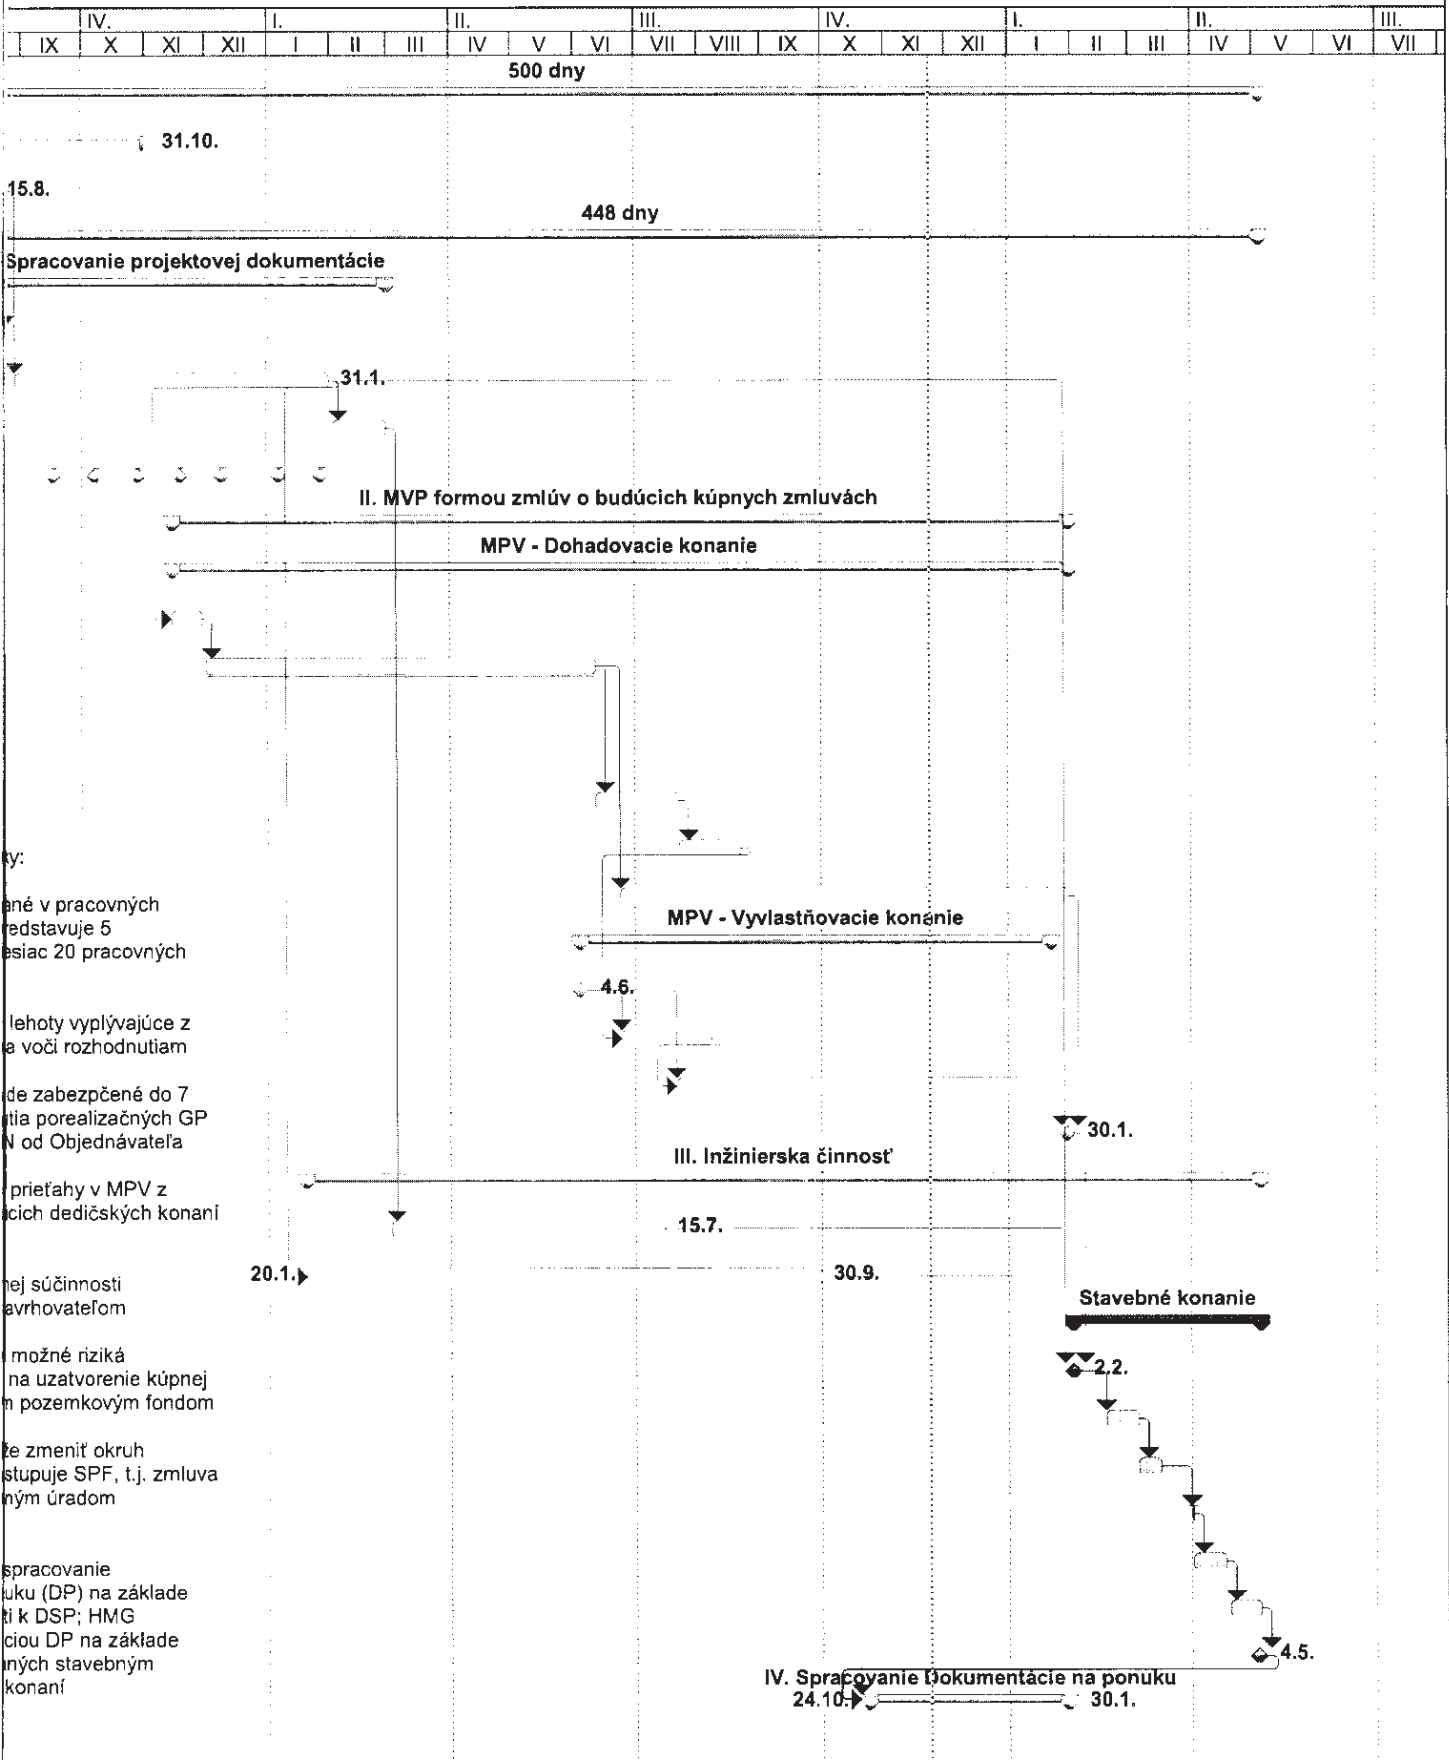

Harmonogram prác Zhotoviteľa - Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP) (MPV formou Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve s prípadným vyvlastňovacím konaním) Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	III.			
					V	VI	VII	VIII
1	Harmonogram prípravy stavby Diaľnice D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné	500 dny	4.6. 13	4.5. 15				
2	Viazanosť ponuky uchádzača	108 dny	4.6. 13	31.10. 13				
3	Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo	1 den	15.8. 13	15.8. 13				
4	Príprava stavby v stupni DSP	448 dny	15.8. 13	4.5. 15				
5	I. Spracovanie projektovej dokumentácie	142 dny	15.8. 13	28.2. 14				
6	Podrobný IG prieskum a ďalšie prieskumy a štúdie	20 týždne	15.8. 13	1.1. 14				
7	Spracovanie DSP	22,4 týždne	29.8. 13	31.1. 14				
8	Vypracovanie Oznámenia zmeny navrhovanej činnosti (podľa Príloh)	4 týždne	3.2. 14	28.2. 14				
9	Termíny pracovných rokovaní v stupni DSP	96 dny	17.9. 13	28.1. 14				
17	II. MVP formou zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách	316 dny	15.11. 13	30.1. 15				
18	MPV - Dohadovacie konanie	316 dny	15.11. 13	30.1. 15				
19	Spracovanie a odsúhlasenie návrhov zmlúv	2,2 týždne	15.11. 13	29.11. 13				
20	Príprava Zmlúv o budúcej zmluve, Nájomných zmlúv a Zmlúv o budúcom vecnom bremene, Spracovanie znaleckých posudkov, Spracovanie Situácií záberov pozemkov, doručovanie zmlúv a podpis	27,6 týždne	2.12. 13	11.6. 14				
21	Doručovanie zmlúv + lehota na vyjadrenie	29 dny	12.6. 14	22.7. 14				
22	Osobné stretnutia (vrátane doručovania pozvánok)	22 dny	23.7. 14	21.8. 14				
23	Uzatvorenie kúpnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) a jej zavedenie do katastra nehnuteľností	31,8 týždne	24.6. 14	30.1. 15				Poznámky / Podmienky
24	MPV - Vyvlastňovacie konanie	166,5 dny	4.6. 14	22.1. 15				1. Termíny sú uvažované v dňoch (t.j. 1 týždeň pracovných dní a 1 mesiac)
25	Poskytnutie plnej moci Objednávateľa k vyvlastňovacím konaniam	0 dny	4.6. 14	4.6. 14				2. HMG nezohľadňuje prípadných odvolaní s
26	1. stupeň - Podanie návrhu na vyvlastnenie, Ústne pojednávanie,	6,4 týždne	24.6. 14	7.8. 14				3. Kompletné MPV bu mesiace od poskytnutia overených Správou K
27	1. stupeň - Doručovanie rozhodnutia, Lehota na odvolanie	26,6 týždne	21.7. 14	22.1. 15				4. HMG nezohľadňuje prípadných prebiehajúcich a ROEP-u
28	Nadobudnutie právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia (1. stupeň)	1 den	30.1. 15	30.1. 15				6. HMG platí pri ideálnom stavebného úradu a na
29	III. Inžinierska činnosť	336 dny	20.1. 14	4.5. 15				7. HMG nezohľadňuje požiadavky NDS, a.s. zmluvy so Slovenským
30	Zabezpečenie Záverečného stanoviska MŽP SR k Oznámeniu zmeny navrhovanej činnosti (Príloha 8a Zákona 24/2006 Z.z.)	19,3 týždne	3.3. 14	15.7. 14				8. Po ROEP-e sa môžu vlastníkov, ktorých zasahujú s SPF nebude stavebné povolenie akceptovaná
31	IČ pre zabezpečenie záväzných stanovísk a rozhodnutí do stavebného konania (napr. vyňatia z LPF, PPF, výrubu drevín...)	36,4 týždne	20.1. 14	30.9. 14				9. HMG predpokladá s dokumentácie na ponuku stanovisk a rozhodnutí neuvažuje s aktualizáciou podmienok akceptovaných úradom v stavebnom
32	Stavebné konanie	66 dny	2.2. 15	4.5. 15				
33	Podanie žiadosti o stavebné povolenie, začiatok stavebného konania	1 den	2.2. 15	2.2. 15				
34	Oznámovanie konania doručované formou verejnej vyhlášky	2,4 týždne	18.2. 15	5.3. 15				
35	Lehota na podávanie námietok	1,4 týždne	6.3. 15	16.3. 15				
36	Vydané stavebné povolenie	1 den	1.4. 15	1.4. 15				
37	Doručovanie stavebného povolenia účastníkom konania verejnou vyhláškou	2,4 týždne	2.4. 15	17.4. 15				
38	Lehota na podanie odvolania	2,2 týždne	20.4. 15	4.5. 15				
39	Nadobudnutie právoplatnosti SP - 1. stupeň	1 den	4.5. 15	4.5. 15				
40	IV. Spracovanie Dokumentácie na ponuku	14,1 týždne	24.10. 14	30.1. 15				

