

**DODATOK č. 3**

k Zmluve o Dielo

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2015/0030

evidenčné číslo Zhotoviteľa: IZ-002/2014/CBCK

uzavretej v zmysle ustanovenia § 536 a nasledovných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi:

Objednávateľom:

obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
 sídlo: Mlynské Nivy 45
 821 09 Bratislava
 IČO: 35 919 001
 zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.**
 sídlo: Mlynské nivy 61/A
 820 15 Bratislava
 IČO: 313 55 161
 zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
 oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
 zast.: Ing. Miroslav Španner - prokurista
 Ing. Alojz Šroba - prokurista

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľa a Zhotoviteľa ďalej spolu len „zmluvné Strany“)

Zmluvné Strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 3 (ďalej len „Dodatok“) k
Zmluve o Dielo zo dňa 15.1.2015 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2,
uzavretej na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania
„Rýchlostná cesta R1 Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia“
(ďalej len „Zmluva o Dielo“) v nasledovnom znení:

**ČLÁNOK I.
PREDMET DODATKU**

1. S ohľadom na:

- a) nepovolenie dopravnej uzávierky zo strany Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave (ďalej len „KDI“), predpokladanej pri určení pôvodného vecného a časového harmonogramu, t.j. k 1.4.2015 (Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola dňa 20.7.2015 povolená čiastočná uzávierka rýchlostnej cesty R1 v termíne od 2.8.2015 do 20.9.2015) a následným nesúhlasným stanoviskom KDI zo dňa 24.8.2015 k vydaniu povolenia na predĺženie termínu čiastočnej uzávierky rýchlostnej cesty R1 do posledného možného dňa realizácie prác pred Objednávateľom nariadenou zimnou údržbou, t.j. do 31.10.2015

- b) existenciu prekážky brániacej Zhotoviteľovi v realizácii Diela (Objednávateľom realizovaná výmena stredových zvodidiel na rýchlostnej ceste R1, na ktorej sa má súčasne realizovať Dielo) a vzhľadom na obdobie zimnej údržby nariadené Objednávateľom na obdobie od 1.11.2015 do 31.3.2016, kedy nie je možné vykonávať stavebnú činnosť na rýchlostnej ceste R1

sa zmluvné Strany v súlade s ustanovením bodu 14 Zmluvy o Dielo dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o Dielo:

1.1 Lehota výstavby sa predlžuje zo 17 mesiacov na **19 mesiacov**.

Vzhľadom na to sa v Zmluve o dielo, konkrétne v Prílohe k ponuke, Zväzok 2, časť (D), ktorá tvorí prílohu a súčasť Zmluvy o Dielo v položke „Lehota výstavby“, podčlánok zmluvných podmienok 1.1.3.3, mení údaj tak, že znie:

*„trvanie: **19 mesiacov** – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)“.*

1.2 V texte Podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) Všeobecných zmluvných podmienok v znení príslušných Osobitných zmluvných podmienok meniacich a upravujúcich Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria súčasť Zmluvy o Dielo, sa upravujú jednotlivé časové a fakturačné mífniky nasledovne:

a) Nasledovné znenie (tzv. 2. mífnik):

- „fakturačné plnenie vo výške min 27% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 40% Lehoty výstavby“

sa nahrádza týmto novým znením:

- „fakturačné plnenie vo výške min 23% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 47% Lehoty výstavby“.

b) Nasledovné znenie (tzv. 3. mífnik):

- „fakturačné plnenie vo výške min 50% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do 30.4.2016“

sa nahrádza týmto novým znením:

- „fakturačné plnenie vo výške min 48% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za práce vykonané v zmysle platného Harmonogramu prác do uplynutia 68% Lehoty výstavby“.

2. Prílohou tohto Dodatku je aj Harmonogram prác platný ku dňu podpisu tohto Dodatku , ktorý zohľadňuje vyššie uvedené dohody.

ČLÁNOK II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

3. Tento Dodatok bol vypracovaný v štyroch (4) exemplároch, z ktorých každá zmluvná Strana obdrží dva (2) exempláre.
4. Zmluvné Strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné Strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Príloha:

1. Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sp.zn. 16927/2015/C212-SCDPK/43459
2. Stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave sp.zn. KRPZ-TT-KD11-193-082/2015
3. Platný Harmonogram prác

Za Objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

V Bratislave, dňa

Ing. Milan Gajdoš,
predseda predstavenstva

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Za Zhotoviteľa:

**STRABAG
Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.**


V Bratislave, dňa

Ing. Miroslav Šnanner, inžinier

Ing. Alojz Šroba, inžinier

1. marec	21. júl	11. december	1. máj	1. júl	21. september	11. apríl	1. november	21. január	11. jún	1. november
18.2.29.4.8.7	16.9.25.11.3.2	14.4.23.6	19.10.11.19.1	30.3.8.6	11.7.8.16.10.4.1	14.3.23.5	1.8.10.10.19.12.27.2	8.5.17.7	25.9.4.12	

Identif.	Medzi	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	Nie	Rychlostná cesta R1 Vičkovce - Křižovaný nad Dudváhom, protihlukové opatrenia	580 dní	Štr 1.4.15	Po 31.10.16
2	Nie	Preberanie a zariadenie staveniska	125 dní?	Štr 1.4.15	Po 3.8.15
3	Áno	Prevzatie staveniska	1 deň	Štr 1.4.15	Štr 1.4.15
4	Nie	Príprava pre realizáciu PHS- zazmluvňovanie subdodávateľov, BOZP, KSP, vyjadrenia úradov, koordinátná činnosť pred realizáciou	124 dní?	Št 2.4.15	Po 3.8.15
5	Nie	Zriadenie zariadenia staveniska	1 deň	Po 3.8.15	Po 3.8.15
6	Nie	Prípojka NN pre zariadenie staveniska	1 deň	Po 3.8.15	Po 3.8.15
7	Nie	231-00 Protihlukové opatrenia	456 dní	Po 3.8.15	Po 31.10.16
8	Nie	1. Etapa realizácie PHO; km 5,527 - 6,000- úsek A+B (DDZ 2.4 5,5-6,3 km)- 460 m	63 dní	Po 3.8.15	Ne 4.10.15
9	Nie	Zriadenie dočasného dopravného značenia	1 deň	Po 3.8.15	Po 3.8.15
10	Nie	Meranie vloženého útumu pred výstavbou	2 dni	Št 18.6.15	Pi 19.6.15
11	Nie	Búracie a zemné práce, HTÚ	8 dni	Ut 4.8.15	Ut 11.8.15
12	Nie	Pilotáž - vrtanie a betonáž	21 dni	Št 6.8.15	Štr 26.8.15
13	Nie	Betonáž hlavíc pilot	29 dni	So 8.8.15	So 5.9.15
14	Nie	Osadenie stĺpov PHS	18 dni	Ut 25.8.15	Pi 11.9.15
15	Nie	Realizácia gabiónov vrátane zemných prác	26 dni	Po 17.8.15	Pi 11.9.15
16	Nie	Osadenie soklových panelov PHS vrátane hydroizolačných náterov	19 dni	Po 7.9.15	Pi 25.9.15
17	Nie	Osadenie absorpčných panelov PHS	24 dni	Ut 8.9.15	Št 1.10.15
18	Nie	Realizácia odvodňovacích žlabov a vpusť	17 dni	Št 10.9.15	So 26.9.15
19	Nie	Montáž zvodidiel a tlmiteľov nárazu	3 dni	Štr 30.9.15	Pi 2.10.15
20	Nie	Osadenie portálov dopravného značenia, trvalé dopravné značenie	5 dni	Ut 29.9.15	So 3.10.15
21	Nie	Meranie vloženého útumu protihlukových barier počas výstavby	2 dni	Št 20.8.15	Pi 21.8.15
22	Nie	Dokončovacie práce a zrušenie dočasného dopravného značenia	1 deň	Ne 4.10.15	Ne 4.10.15
23	Nie	2. Etapa realizácie PHO; km 6,000 - 6,750 - úsek C+E + časť F (DDZ C 2.3 5,9- 7,2 km)- 766,6 m	85 dní	Pi 1.4.16	Pi 24.6.16
24	Nie	Zriadenie dočasného dopravného značenia	3 dni	Pi 1.4.16	Ne 3.4.16
25	Nie	004-00 Demolácia zbradenej chodníka	7 dni	Po 4.4.16	Ne 10.4.16

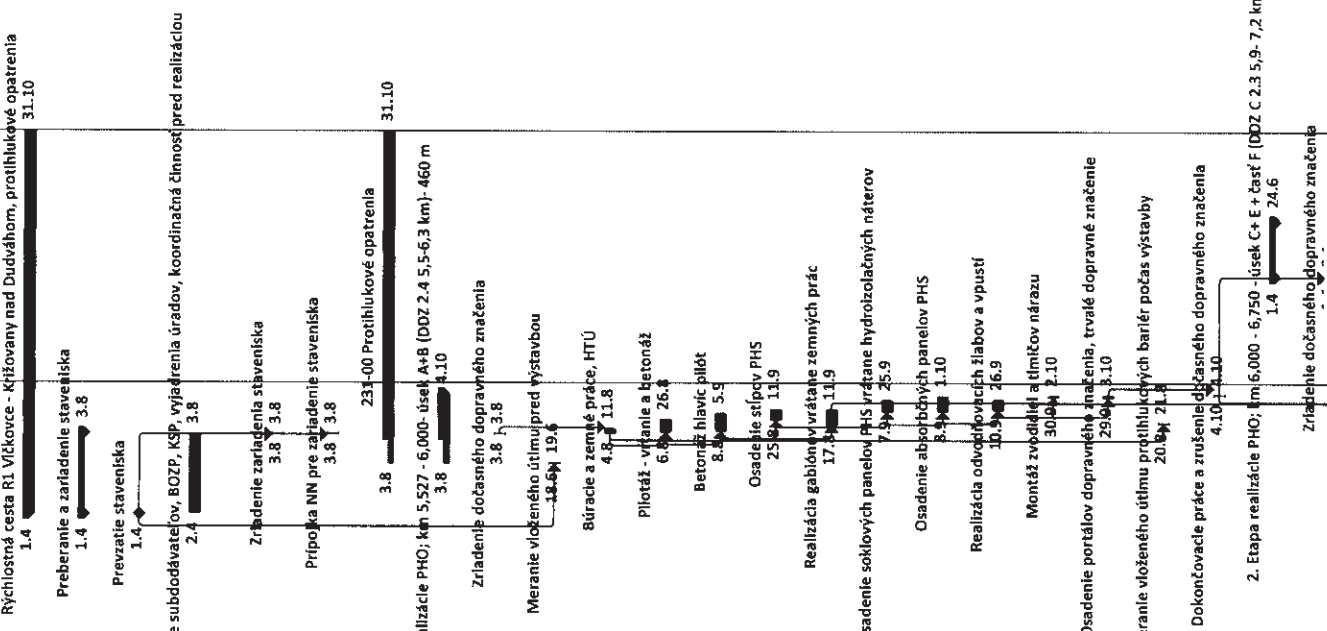

2. Etapa realizácie PHO; km 6,000 - 6,750 - úsek C+E + časť F (DDZ C 2.3 5,9- 7,2 km)- 766,6 m

87	Nie	Obklad konštrukcii zvukovopohltivým obkladom	242 dni	Po 2.11.15	Št 30.6.16	Obklad konštrukcii zvukovopohltivým obkladom 2.11 30.6
88	Nie	Realizácia obkladu oplatenia zvukovopohltivým obkladom; km 6,520 - 7,030	242 dni	Po 2.11.15	Št 30.6.16	Realizácia obkladu oplatenia zvukovopohltivým obkladom; km 6,520 - 7,030 2.11 30.6
89	Nie	1. Etapa realizácie obkladu oporných múrov zvukovopohltivým obkladom; km 6,710 - 6,800	71 dni	Po 16.11.15	Po 25.1.16	1. Etapa realizácie obkladu oporných múrov zvukovopohltivým obkladom; km 6,710 - 6,800 16.11 25.1
90	Nie	2. Etapa realizácie obkladu oporných múrov zvukovopohltivým obkladom; km 6,800 - 6,900	96 dni	Ut 26.1.16	So 30.4.16	2. Etapa realizácie obkladu oporných múrov zvukovopohltivým obkladom; km 6,800 - 6,900 26.1 30.4
91	Nie	3. Etapa realizácie obkladu oporných múrov zvukovopohltivým obkladom; km 6,900 - 6,986	61 dni	Ne 1.5.16	Št 30.6.16	3. Etapa realizácie obkladu oporných múrov zvukovopohltivým obkladom; km 6,900 - 6,986 1.5 30.6
92	Nie	010-00 Vegetačné úpravy	395 dni	So 12.9.15	Po 10.10.16	010-00 Vegetačné úpravy 12.9 10.10
93	Nie	Odvodzovanie staveniska	2 dni	Ne 30.10.16	Po 31.10.16	Odvodzovanie staveniska 30.10 31.10
94	Nie	Odstránenie zariadenie staveniska	1 deň	Ne 30.10.16	Ne 30.10.16	Odstránenie zariadenie staveniska 30.10 30.10
95	Áno	Odvodzovanie diela	1 deň	Po 31.10.16	Po 31.10.16	Odvodzovanie diela 30.10 30.10

Úloha	Súhrn projektu	Súhrn medzník	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Termin
Projekt: 2003_hmg_PHS_R1_final	Kritické
Dátum: Št 22.10.15	Medzník	Externý medzník	Manuálna úloha	Iba začiatok	Kritické rozdelenie
	Súhrn	Neaktívna úloha	Iba trvanie	Iba dokončiť	Pribeh

PRÍLOHA B2A PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM PRÁC, BOD č. 4

Plán hotovostného toku v %

Príloha k dodatku č. 3 ZoD

4

P.č.	Č. obj.	Názov objektu	Začiatok výstavby	Koniec výstavby	suma	mes	Cena (€)	Mesa	
								Júl	Aug
1		Dokumentácia DVP, DSRS, Poistenie, vytýčenie	Po 3.8.15	Po 31.10.16	18 637,00	4	18 637,00		4
2		Dočasné dopravné značenie, monitoring	Po 3.8.15	Po 31.10.16	17 111,50	11	17 111,50		11
3		Prevádzka zariadenia staveniska	Po 3.8.15	Po 31.10.16	26 786,00	15	26 786,00		15
4	001-00	Demolácia betónového oplotenia pri ČS PHM	Str 21.10.15	Ut 3.11.15	3 793,43	2	3 793,43		
5	002-00	Demolácia oplotenia s drevenou výplňou pri ČS PHM	Št 22.10.15	Str 4.11.15	1 681,78	2	1 681,78		
6	003-00	Demolácia pletivového oplotenia pri reštaurácii HOTPOT	Str 28.10.15	Ut 10.11.15	1 464,67	2	1 464,67		
7	004-00	Demolácia záhradnej chatky na opornom múre	Po 4.4.16	Ne 10.4.16	1 674,05	1	1 674,05		
8	005-00	Demolácia pletivového oplotenia na opornom múre	Po 4.4.16	Ne 10.4.16	4 918,40	1	4 918,40		
9	006-00	Preloženie Unimo bunky	Ut 12.4.16	Str 13.4.16	256,38	1	256,38		
10	010-00	Vegetačné úpravy	Ut 15.9.15	Pi 28.10.16	8 562,05	11	8 562,05		
11	SO 601-00	Preložka NN kábla pre ČS PHM	Pi 16.10.15	Pi 16.10.15	2 370,07	1	2 370,07		
12	SO 602-00	Preložka VO	Pi 16.10.15	Pi 16.10.15	1 371,01	1	1 371,01		
13		Zriadenie staveniska + pripojka NN zariadenia	Po 3.8.15	Po 3.8.15	2 000,00	1	2 000,00		
14	231-00	Protihlukové opatrenia 1. etapa, km 5,527 - 6,000 (A+B)	Po 3.8.15	Ne 4.10.15	347 335,47	3	347 335,47		72
		Búracie a zemné práce, HTÚ	Ut 4.8.15	Ut 11.8.15		1	0,00		
		Pilotáž - vrtanie a betonáž	Št 6.8.15	Str 26.8.15		1	0,00		
		Betonáž hlavic	So 8.8.15	So 5.9.15		2	0,00		
		Montáž stĺpov PHS	Ut 25.8.15	Pi 11.9.15		2	0,00		
		Realizácia gabiónov	Po 17.8.15	Pi 11.9.15		2	0,00		
		Osadzovanie soklových panelov vrátane hydroiz. náterov	Ut 8.9.15	Pi 25.9.15		1	0,00		
		Osadzovanie absorpčných a kovových panelov PHS	Ut 8.9.15	Št 1.10.15		2	0,00		
		Realizácia odvodňovacieho žľabu a vpustí	Št 10.9.15	So 26.9.15		2	0,00		
		Osadzovanie trvalého DZ a portálov	Ut 29.9.15	So 3.10.15		2	0,00		
		Dokončovacie práce a zrušenie dočasného dopravného znač.	Ne 4.10.15	Ne 4.10.15		1	0,00		
17		Protihlukové opatrenia 2. etapa, km 6,000 - 6,750 (C+E+ časť F)	Pi 1.4.16	So 25.6.16	625 756,55	3	625 756,55		
18		Protihlukové opatrenia 3. etapa, km 6,400 - 6,500 (D)	Po 19.10.15	Ne 20.12.15	119 150,82	3	119 150,82		
19		Protihlukové opatrenia 4. etapa, km 6,750 - 7,450 (F)	Št 16.6.16	Str 31.8.16	552 354,81	3	552 354,81		
20		Protihlukové opatrenia 5. etapa, km 7,450 - 7,919 (F)	Št 1.9.16	Po 31.10.16	383 333,61	2	383 333,61		
21		Realizácia obkladu oplotenia km 6,520 - 7,030	Po 2.11.15	Št 30.6.16	48 795,60	4	48 795,60		
22		Obklad oporných múrov 1. etapa, km 6,710 - 6,800	Po 16.11.15	Po 25.1.16	7 331,90	2	7 331,90		
23		Obklad oporných múrov 2. etapa, km 6,800 - 6,900	Ut 26.1.16	So 30.4.16	7 331,90	2	7 331,90		
24		Obklad oporných múrov 3. etapa, km 6,900 - 6,986	Ne 1.5.16	Št 30.6.16	7 331,90	2	7 331,90		
25		Odstránenie staveniska a odovzdanie diela	Ne 30.10.16	Po 31.10.16	-	1	0,00		
		Cena diela spolu bez DPH					2 189 348,90	0,00	80 147

