



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

SkyToll, a.s.	
Došlo dňa: 15 -03- 2021	
Číslo: I/0962	Prílohy:
SkyToll, a.s. Vybavuje: Ing. Matej Okáli	



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

5637 /16711 /20101/2021

Vybavuje

Dátum

08.03.2021

VEC: PRIJATIE NÁVRHU USKUTOČNENIA ZMENY LOKALIZÁCIE HDM SKALITÉ

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Zmena lokalizácie HDM Skalité), názov súboru (CR_00217_Zmena_lokalizácie_HDM_Skalité_v2.0_svk), doručeného do Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. dňa 18.12.2020, Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej „Zmluva“) udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredsa predstavenstva

Ing. Juraj Tlapa
predsa predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
18. 12. 2020	
Ev. číslo: 99677	č. spisu:
2	2020/2020



LL
ling Systems

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mgr. Jaroslav Ivanco
Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku
spoplatnenia a informačných technológií
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:
I/3440/2020/MRU

Miesto, dátum:
Bratislava, 18.12.2020

Vec: Predloženie aktualizovaného návrhu uskutočnenia zmeny „Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Skalité“

Vážený pán Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií, spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“), Vám v súlade s ustanoveniami článku 9 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ Súťažných podkladov č. 1/2008 a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy, predkladá aktualizovaný návrh uskutočnenia zmeny č. 00217 s názvom „Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Skalité“.

S pozdravom

Ing. Matej Okáli
Predseda predstavenstva

Ing. Robert Ševela, Ph.D.
Podpredseda predstavenstva

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1: Aktualizovaný návrh uskutočnenia zmeny „Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Skalité“
Príloha č. 2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom podpredsedu predstavenstva a riaditeľa úseku spoplatnenia a informačných technológií Mgr. Jaroslava Ivanca

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímatel':**Názov spoločnosti:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**Adresa spoločnosti: Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Meno:

Funkcia:

Odobzdávateľ:**Názov spoločnosti:** **SkyToll, a. s.**Adresa spoločnosti: Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Meno:

Funkcia:

Dokument(y):

Názov: Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Skalité

Formát: 2 papierové vyhotovenie a 1 CD nosič

Dátum dokumentu: 18.12.2020

Naše číslo: I/3440/2020/MRU

Dátum preberania: 18.12.2020

Miesto preberania: Bratislava, podateľňa NDS

Dátum a podpis Prijímateľa**Dátum a podpis Odobzdávateľa****Poznámka:**

Tento preberací protokol je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach rovnakej právnej sily v slovenskom jazyku, pričom obe strany preberacieho konania obdržia po jednom (1) datovanom a oboma stranami podpísanom vyhotovení.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava	
18. 12. 2020	
Ev. číslo:	Č. spisu:
Prílohy/lysty:	Výnosy:



01042751

D2M/1241/2010/0059

Komplexná služba elektronického výberu mýta - Riadenie zmien

Zmena lokalizácie hraničného Distribučného miesta Skalité

CR_00217_Zmena_lokalizácie_HDM_Skalité_v2.0_svk

Ref. č. 00217

Verzia 2.0

OBSAH

1	Úvod	3
2	Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty	4
3	Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy	6
4	Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému	7
5	Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy Služby	8
6	Technologická platforma a architektúra	9
7	Navrhovaný časový harmonogram	10
8	Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny.....	11
9	História dokumentu	12

1 Úvod

Spoločnosť SkyToll, a. s., predovšetkým v súlade s ustanoveniami článku 9 Súťažných podkladov č. 1/2008 (ďalej len „SP“) a článku XV. bodom 30 až 36 Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 (ďalej aj ako „Zmluva“), uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení poskytovateľa (ďalej len „Poskytovateľ“ – Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“), predkladá Objednávateľovi v rámci schváleného zoznamu Distribučných miest (plnenie číslo V3.7) na schválenie návrh uskutočnenia zmeny lokalizácie hraničného Distribučného miesta, nachádzajúceho sa v blízkosti hraničného priechodu Skalité – Zwardoń medzi Slovenskou republikou (ďalej len „SR“) a Poľskou republikou, na výstupe zo SR, v katastri obce Čierne (ďalej len „HDM Skalité“ a/alebo „Zmena lokalizácie HDM Skalité“) tak, ako je uvedené nižšie (ďalej len „Návrh uskutočnenia zmeny“).

Zmenu lokalizácie HDM Skalité tak, ako je navrhnutá v tomto Návrhu uskutočnenia zmeny, navrhujeme zrealizovať v nadväznosti na Objednávateľom prijatý Návrh uskutočnenia zmeny č. 00211 „Návrh rozšírenia/aktualizácie siete Vymedzených úsekov ciest o diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité a časť rýchlostnej cesty R2 Zvolenská Slatina – Pstruša“ predovšetkým s ohľadom na ukončenie prenájmu dočasných priestorov, v rámci ktorých sú v súčasnosti poskytované čiastkové služby „Zákaznícke služby“, súvisiace s elektronickým výberom mýta, ako aj v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných Prevádzkovateľom vozidiel a/alebo Vodičom vozidiel, pričom HDM Skalité navrhujeme umiestniť do nových trvalých priestorov Objednávateľa.


V súvislosti s implementáciou Návrhu uskutočnenia zmeny nie menej relevantnou je aj tá skutočnosť, predpokladaná tak Zmluvou, ako i Súťažnými podkladmi č. 1/2008 (ďalej len „SP“), ktorá tvorí *conditio sine qua non* (nevyhnutná podmienka – podmienka bez ktorej splnenia nedôjde k realizácii) viazanosti spoločnosti SkyToll, a. s. vyššie uvedenou zmenou – in concreto (konkrétne) ustanovením článku 9.4 časti B.3 „Obchodné podmienky Zmluvy“ SP a ustanovením článku XV. bodu 35 Zmluvy, v zmysle ktorých je Poskytovateľ povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, a to dovtedy, kým sa zmluvné strany nedohodnú na tejto zmene, t. j. bez uskutočnenia tohto zmenového konania, ktorého právnym dôsledkom bude prijatie príslušného dodatku k Zmluve, má spoločnosť SkyToll, a. s. povinnosť plniť Zmluvu a poskytovať Komplexnú službu elektronického výberu mýta (ďalej len „Služba“) v nezmenenom rozsahu.

2 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty

Lokalizácia, vrátane parametrov, pôvodných a navrhovaných objektov/priestorov HDM Skalité, je podrobne špecifikovaná v tabuľke č. 1 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny a vizuálne vyobrazená na obrázku č. 1 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny, pričom Poskytovateľ, predovšetkým v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a SP, implementuje zmenu lokalizácie HDM Skalité tak, aby poskytovanie zákazníckych služieb na vyššie uvedenom zákazníckom mieste nebolo prerušené.

Hraničné Distribučné miesto	Názov partnera	Lokalita		Súradnice severnej šírky		Súradnice východnej dĺžky		Prevádzka	Smer	Prístup nad 12 t	Počet parkovacích miest nad 12 t					
Pôvodná lokalizácia HDM																
HDM	Česmad	Hraničný prechod Skalité – Zwardoň (PL) výstup zo SR	D3	023 14	Skalité D3	okr. Čadca	49	30	13.39	18	49	33.83	Nonstop	Jednosmerný	Áno	>5
Nová lokalizácia HDM																
HDM	SkyToll	Hraničný prechod Skalité – Zwardoň (PL) výstup zo SR	D3	023 14	Skalité D3	okr. Čadca	49	30	13.39	18	49	33.83	Nonstop	Jednosmerný	Áno	>5

Tabuľka 1: Zmena lokácie HDM Skalité na výstupe zo Slovenskej republiky

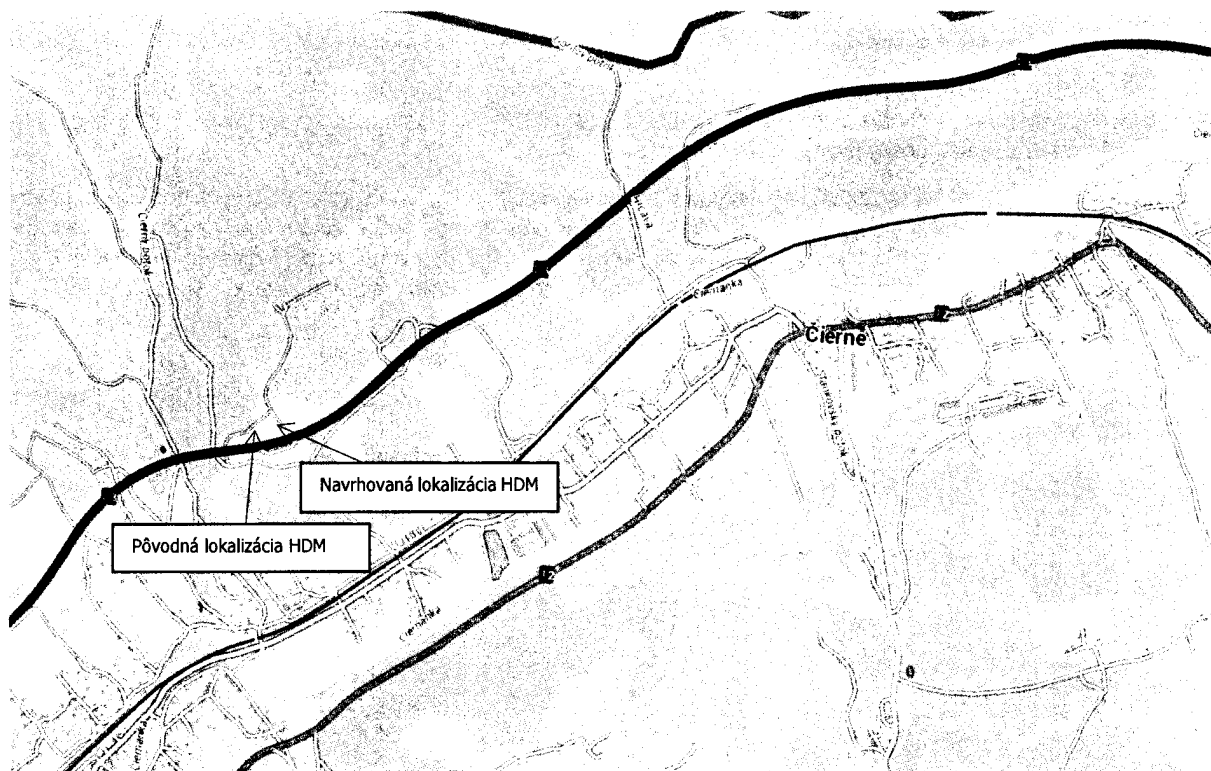

Obrázok 1: Vizuálne vyobrazenie lokalizácie pôvodného a navrhovaného HDM Skalité na výstupe zo Slovenskej republiky

3 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy

Vyššie uvedený Návrh uskutočnenia zmeny nemá žiadny dopad na Zmluvu. Predmetná zmena nemá žiadnu negatívnu implikáciu na rozsah a kvalitu poskytovanej Služby.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že predmetná zmena bude realizovaná výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy, SP a Ponukou tak, aby všetky Objednávateľom stanovené záväzné požiadavky na riešenie čiastkovej služby „Zákaznícke služby“ boli konzistentne dodržané, predovšetkým máme na mysli záväznú požiadavku P5.7, P5.8 a P5.11 kapitoly č. 11.5 „Čiastková služba Zákaznícke služby“ časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ SP.

4 Dopad zavedenia Zmeny na základné bloky Elektronického mýtného systému

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa základných blokov Elektronického mýtného systému.

5 Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy Služby

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa kľúčových procesov Služby.

6 Technologická platforma a architektúra

Neboli identifikované žiadne negatívne dopady na technologickú platformu a architektúru Elektronického mýtného systému.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Realizácia Zmeny lokalizácie HDM Skalité bude zavedená bezodkladne po prijatí tohto Návrhu uskutočnenia zmeny zo strany Objednávateľa.

8 Návrh Poskytovateľa na ocenenie Zmeny

Náklady Poskytovateľa spojené s implementovaním tohto Návrhu uskutočnenia zmeny predstavujú predovšetkým:

- priame náklady na realizáciu Zmeny lokalizácie HDM Skalité, a to vo výške 14.008,00 EUR (investičné náklady) a
- ostatné súvisiace náklady Poskytovateľa (prevádzkové náklady), pričom pôvodné ročné prevádzkové náklady HDM Skalité, uvedené v Objednávateľom schválenom Návrhu uskutočnenia zmeny č. 00211 „Návrh rozšírenia/aktualizácie siete Vymedzených úsekov ciest o diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité a časť rýchlostnej cesty R2 Zvolenská Slatina – Pstruša“, sa menia z pôvodnej sumy ročných prevádzkových nákladov vo výške 384.751,24 EUR na novú sumu ročných prevádzkových nákladov vo výške 364.685,34 EUR.

Celkovú cenu spojenú s implementáciou tohto Návrhu uskutočnenia zmeny vo výške 14.008,00 EUR je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi v jednej splátke, a to v rámci faktúry za zmluvnú odmenu za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom boli implementované zmeny riadne akceptované, pričom celková cena bude vyúčtovaná rovnako so sumou dodávateľských faktúr, ako i so sumou primeraných nákladov Poskytovateľa, nevyhnutných pre implementáciu tohto Návrhu uskutočnenia zmeny.

Prevádzkové náklady je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi prostredníctvom faktúr za poskytovanie Služby, a to za jednotlivé mesiace vo výške 1/12 zo sumy 364.685,34 EUR, pričom prevádzkové náklady zahŕňa Poskytovateľ prvý krát do faktúry v mesiaci (následne do faktúr za každý ďalší mesiac) nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola predmetná zmena implementovaná.

Náklady spojené s realizáciou plánovanej Obnovy a inovácie technológií (v maximálnej výške 7.250,00 EUR v rámci Základnej doby poskytovania Služby) je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi prostredníctvom faktúr za poskytovanie Služby za mesiac, v ktorom bola príslušná obnova technológie a/alebo inovácia technológie realizovaná.

Štruktúra investičných nákladov je uvedená v nasledovnej tabuľke č. 2 tohto Návrhu uskutočnenia zmeny, pričom zmluvné strany sa spoločne zhodli na skutočnosti, že nižšie uvedené schválené položky a ich implementovanie boli nevyhnutné, z hľadiska samotnej existencie, k realizovaniu implementovanej Legislatívnej zmeny.

#	Názov Služby	Investičné náklady (Capex)	Prevádzkové náklady (OPEX / rok)	Obnova a inovácie
1	Služba Predpis mýta			
2	Služba Výber mýta			
3	Palubné jednotky		301,00 €	7 250,00 €
4	Vynucovanie			
5	Zákaznícke služby	1 648,00 €	364 384,34 €	
6	Centrálny dohľad a riadenie akosti	1 648,00 €		
7	Poskytovanie informácií	824,00 €		
8	Obnova a inovácie technológií			
9	Súvisiace náklady	9 888,00 €		
	Celková suma nákladov	14 008,00 €	364 685,34 €	7 250,00 €

Tabuľka č. 2 – Diverzifikácia nákladov

9 História dokumentu

Verzia	Stav	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	24.04.2019	SkyToll, a. s.	Finálna verzia
2.0	F	18.12.2020	SkyToll, a. s.	Finálna verzia - aktualizovaná kapitola č. 8

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálne schválená verzia „F“
