

ZM/2016/0348/0002

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo : „Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Budimír - Bidovce“

evidenčné číslo objednávateľa: ZM /2016/0348
evidenčné číslo zhotoviteľa: SAP 10000114477/3489

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

medzi zmluvnými stranami:



Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

zastúpené:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

predstavenstvo

Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš , PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

35 919 001

SK 202 193 7775

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

akciová spoločnosť, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 5012/B

Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva

Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva

týka sa závodu :

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

závod Inžinierske stavitelstvo

31 611 788

SK2020478955

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa po vzájomnej dohode zmluvné strany v zmysle bodu 15 Zmluvy o dielo „Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Budimír - Bidovce“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“ (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzavretí Dodatku č. 2 k Zmluve, ktorým dochádza k zmene lehoty ukončenia uzlových bodov v zmysle nižšie uvedených listov vydaných Stavebným dozorcom:

V zmysle listu zn. 127/2017/SKA/LHom/B-B z 28.2.2017 vydal Stavebný dozor oznámenie Zhotoviteľovi o čiastočnom uznaní nároku č. 2 na predĺženie lehoty ukončenia uzlového bodu č. 1 a 2 o 90 dní.
 V zmysle listu zn. 588/2017/SKA/LHom/B-B z 19.9.2017 vydal Stavebný dozor oznámenie Zhotoviteľovi o predĺžení lehoty ukončenia uzlového bodu č. 1 o ďalších 318 dní.
 V zmysle listu zn. 589/2017/SKA/LHom/B-B z 19.9.2017 vydal Stavebný dozor oznámenie Zhotoviteľovi o predĺžení lehoty ukončenia uzlového bodu č. 4 o 187 dní.

O dobu predĺženia lehôt ukončenia uzlových bodov č. 1, 2 a 4 sa týmto Dodatkom č. 2 :
 - mení lehota ukončenia dotknutých uzlových bodov

ČI. I. Predmet dodatku č. 2

V texte Prílohy č. 4 k Zmluve – Harmonogram prác, časť 4.2 – Uzlové body sa mení lehota ukončenia uzlových bodov č.: 1, 2 a 4 nasledovne :

Uzlové body	Lehota ukončenia (Počet dní od začiatku LV podčlánok 8.1. FIDIC)	Popis Uzlového bodu	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Uzlového bodu
Uzlový bod č. 1 Ukončenie výstavby násypového telesa a sanácie podložia v úseku 1,475 až 1,530 a 2,06 až 2,125 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou	542	SO 100-00 Diaľnica D1 -Vybudovanie násypového telesa a sanácie podložia v úseku 1,475 až 1,530 a 2,06 až 2,125 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou	Stavebnotechnickým dozrom potvrdený termín ukončenia výstavby násypového telesa a sanácie podložia v úseku 1,475 až 1,530 a 2,06 až 2,125 na výšku 1,0 m nadzemnou pláňou
Uzlový bod č. 2 ukončenie ostrých prepojov plynovodu SO 701-00	243	SO 701-00 Kompletne ukončenie stavebného objektu v zmysle ZoD, bez väd a nedorobkov, vykonanie predpisovaných meraní, skúšok, zaslanie žiadosti o prevzatie objektu stavebnotechnickému dozoru.	Podpísaný preberací protokol verejnej práce bez väd a nedorobkov.
Uzlový bod č. 4 ukončenie výstavby zárubného múru 230-00	556	SO 230-00 – Vybudovanie zárubného múru	Stavebnotechnickým dozrom potvrdený termín dokončenia zárubného múru SO 230-00

Súčasne sa na základe dohodnutých zmien Lehôt ukončenia uzlových bodov č.1 ,2 a 4 rušia v Prílohe č.4 k zmluve pôvodné časti 4.1 – Vecný harmonogram a 4.3 – Fakturačný harmonogram a nahrádzajú sa novými tvoriacimi Prílohu č.4 k dodatku č.2.

ČI. II. Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti bez zmien.

2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú zmluvnú stranu do omylu, a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 2 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Dodatok č. 2 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
4. Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých po potvrdení oboch zmluvných strán dva obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
 - Príloha č. 1 - Fotokópia listu zn.127/2017/SKA/ LHom/ B-B z 28.2.2017 "Čiastočné uznanie nároku č. 2"
 - Príloha č. 2 - Fotokópia listu zn.588/2017/SKA/ LHom/ B-B z 19.9.2017 "Oznámenie Stavebnotechnického dozoru stavby o predĺžení lehoty uzlového bodu č.1"
 - Príloha č. 3 - Fotokópia listu zn.589/2017/SKA/ LHom/ B-B z 19.9.2017 "Oznámenie Stavebnotechnického dozoru stavby o predĺžení lehoty uzlového bodu č.4"
 - Príloha č.4 - časť 4.1 – Vecný harmonogram
časť 4.3 – Fakturačný harmonogram

V Bratislave, dňa.....

V Bratislave, dňa

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš | PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva
riaditeľ odboru Obchod a riadenie rizík

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluva o dielo : č. objednávateľ : ZM/2016/0348
č. zhotoviteľ : 10000114477/3489

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Príloha č. 1 k dodatku

- Fotokópia listu zn. 127/2017/SKA/L.Hom/B-B z 28.2.2017 „Čiastočné uznanie nároku č.2“



Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Závod Cesty, mosty SK
Alejová 2
040 11 Košice

Váš list zn. Naša značka Vybavuje Miesto/dátum
127/2017/SKA/LHom/B-B

Vec: **Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt „D1 Budimír-Bidovce“
Čiastočné uznanie nároku č. 2**

Vážený pán Inžinier,

listom č. 2016/BU-BI/087 zo dňa 22.11.2016 ste nám v súlade s článkom č. 20, podčlánkom č. 20.1 Všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC) predložili Vaše oznámenie o nároku č. 2 na predĺženie lehôt ukončenia Uzlových bodov. Listom č. 4423/2017 zo dňa 24.1.2017 ste nám predložili plne detailný nárok na predĺženie lehôt ukončenia Uzlových bodov č. 1 až č. 6 z dôvodu technologicky nevyhnutnej doby na realizáciu stavebných prác s ohľadom na posun dátumu začatia prác z 1.6.2016 na 1.11.2016, čo znamená začiatok zimného obdobia. Prevládajúce klimatické podmienky v zimnom období nedovoľujú realizovať archeologický prieskum a počas zimných mesiacov nie je možné realizovať prepojenie na existujúci plynovod u preložiek plynového vedenia. Prepojenie je možné až po skončení vykurovacej sezóny.

Z vyššie uvedených bodov Vám v súlade s článkom č. 3, podčlánkom č. 3.1 Všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC) čiastočne uznávame Váš nárok č. 2, ktorý Vám vznikol v súlade s článkom č. 8, podčlánkom č. 8.4 Všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC) na predĺženie lehoty ukončenia Uzlového bodu č. 1 a č. 2 o 90 dní.

Predĺženie ukončenia Uzlových bodov č. 3, 4, 5 a 6, ktoré sú taktiež súčasťou Vášho nároku č. 2 je v súčasnej dobe neopodstatnené, máte dostatok času uskutočniť také opatrenia, aby pôvodné lehoty ukončenia týchto Uzlových bodov boli dodržané. Nárok č. 2 obsahujúci predĺženie ukončenia uzlových bodov č. 3, 4, 5 a 6 aj napriek tomu ostáva v platnosti a bude naďalej evidovaný ako priebežný a STD na základe budúcich okolností rozhodne o jeho oprávnenosti prípadne o jeho zamietnutí.

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájum 1233/2, 155 00 Praha
tel.:
e-mail:

ESP Consult, s.r.o
Vicenzv 2209/8A 931 01 Šamorín
tel.:
e-mail

INFRAPROJEKT, s.r.o.
Kominárska 4, 832 03 Bratislava
tel.:
e-mail:

SGS**ESP**
Consult

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Predĺženie lehoty ukončenia Uzlových bodov č. 1 a 2 nebude mať žiadny vplyv na predĺženie Lehoty Výstavby Diela. Žiadame Vás, aby ste na základe čiastočného uznania nároku č. 2, predĺženia ukončenia Uzlových bodov č. 1 a 2 stiahli späť svoj nárok č. 3, ktorým požadujete predĺženie ukončenia Uzlového bodu č. 1 a predložili upravený Vecný a Finančný harmonogram – aktualizácia č. 1.

S pozdravom

Na vedomie:

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájum 1233/2, 155 00 Praha
tel.:
e-mail:

ESP Consult, s.r.o
Vicenzy 2209/8A 931 01 Šamorín
tel.:
e-mail:

INFRAPROJEKT, s.r.o.
Kominárska 4, 832 03 Bratislava
tel.:
e-mail:

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluva o dielo : č. objednávateľ : ZM/2016/0348
č. zhotoviteľ : 10000114477/3489

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Príloha č. 2 k dodatku

- Fotokópia listu zn. 588/2017/SKA/LHom/B-B z 19.9.2017 „Oznámenie Stavebnotechnického dozoru stavby o predĺžení lehoty uzlového bodu č.1“



Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum Naša značka Vybavuje Miesto/dátum
588/2017/SKA/LHom/B-B

**Vec: Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“
Oznámenie Stavebnotechnického dozoru stavby o predĺžení Lehoty uzlového bodu č. 1**

Vážený pán Inžinier,

na základe písomného súhlasu Objednávateľa, list č. 3665/78847/30802/2017 zo dňa 7.8.2017 Vám Stavebnotechnický dozor v zmysle Zmluvy o dielo Objednávateľa ev. č. ZM 2016/0348, v súlade s podčlánkom 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru Všeobecných zmluvných podmienok, upravenými Osobitnými zmluvnými podmienkami písmeno a), vydávame Oznámenie o predĺžení Uzlového bodu č.1 ukončenie výstavby násypového telesa a sanácie podložia v úseku 1,475 až 1,530 a 2,06 až 2,125 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou. Požadovaná lehota predĺženia ukončenia uzlového bodu č. 1 je o ďalších 318 dní podľa nároku Zhotoviteľa č. 8.

Zhotoviteľ dňa 6.3.2017 prerušil práce na objekte SO 517-00 Ochrana vodovodu úsek č. 3 železobetónová chránička v km 1,500 z dôvodov, ktoré boli potvrdené pri obhliadke dňa 7.3.2017 za účasti zástupcov Objednávateľa, Stavebnotechnického dozoru a Zhotoviteľa, kde bolo konštatované:

1. Pri odkope jestvujúceho potrubia v dĺžke cca 8 m bola zistená 0,5 m pod úrovňou terénu hladina podzemnej vody,
2. Svahy výkopu nie je možné podľa platnej projektovej dokumentácie stupňa DRS realizovať vzhľadom na geologické podmienky daného územia,
3. Pod jestvujúcim vodovodným potrubím sa nachádza neúnosné podložie s veľkým obsahom organických zložiek.

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájum 1233/2, 155 00 Praha
tel.:
e-mail:

ESP Consult, s.r.o.
Vicenzky 2209/8A 931 01 Šamorín
tel.:
e-mail:

INFRAPROJEKT, s.r.o.
Kominárska 4, 832 03 Bratislava
tel.:
e-mail:

SGS**ESP
Consult**
INFRAPROJEKT

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Na základe písomného súhlasu Objednávateľa list č. 3665/20669/30802/2017 zo dňa 13.2.2017 bolo ukončenie uzlového bodu č. 1 posunuté o 90 dní od začiatku výstavby. Dôvody na nedodržanie ukončenia uzlového bodu č. 1 pretrvávali po dobu spracovania projektovej dokumentácie zmeny DRS Zmena č. 1 – 04.2017 SO 517-00 Ochrana vodovodu úsek č. 3 železobetónová chránička v km 1,500.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami Stavebnotechnický dozor listom č. 391/2017/SKA/LHom/B-B zo dňa 21.6.2017 doručil Zhotoviteľovi Pokyn na realizáciu prác v zmysle podčlánku 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok, vrátane zmenenej projektovej dokumentácie stupňa DRS Zmena č. 1 – 04.2017 podľa ktorej má Zhotoviteľ pokračovať v prácach na SO 517-00 Ochrana vodovodu úsek č. 3 železobetónová chránička v km 1,500.

Vzhľadom k tomu vzniklo Zhotoviteľovi oneskorenie, ktoré má priamy dopad na lehotu ukončenia Uzlového bodu č. 1 (o ďalších 318 dní) a zároveň vznikol Zhotoviteľovi nárok na dodatočnú platbu za navyše práce. Zhotoviteľ v konečnom nároku č. 8 predložil nový Harmonogram prác verzia 06/2017 na realizáciu SO 517-00 Ochrana vodovodu úsek č. 3 železobetónová chránička v km 1,500.

Predĺženie lehoty ukončenia uzlového bodu č. 1 ukončenie výstavby násypového telesa a sanácie podložia v úseku 1,475 až 1,530 a 2,06 až 2,125 na výšku 1,0 m nad zemnou pláňou nebude mať vplyv na predĺženie Lehoty výstavby Diela. Na základe uznania nároku č. 8, predĺženia lehoty ukončenia uzlového bodu č. 1 Vás žiadame o predloženie návrhu Dodatku ku Zmluve o dielo Objednávateľa ev. č. ZM/2016/0348 na predĺženie lehoty uzlového bodu č. 1 o ďalších 318 dní.

S pozdravom

Na vedomie:

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájum 1233/2, 155 00 Praha
tel.:
e-mail:

ESP Consult, s.r.o.
Vicenzny 2209/8A 931 01 Šamorín
tel.:
e-mail:

INFRAPROJEKT, s.r.o.
Kominárska 4, 832 03 Bratislava
tel.
e-mail:

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluva o dielo : č. objednávateľ : ZM/2016/0348
č. zhotoviteľ : 10000114477/3489

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Príloha č. 3 k dodatku

- Fotokópia listu zn. 589/2017/SKA/LHom/B-B z 19.9.2017 „Oznámenie Stavebnotechnického dozoru stavby o predĺžení lehoty uzlového bodu č.4“

SGS**ESP
Consult****INFRAPROJEKT**

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Skanska SK a.s.

D1 Budimír - Bidovce
Bidovce 316
044 45 Bidovce

Váš list zn./dátum	Naša značka	Vybavuje	Miesto/dátum
	589/2017/SKA/LHom/B-B		

**Vec: Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“
Oznámenie Stavebnotechnického dozoru stavby o predĺžení Lehoty uzlového
bodu č. 4**

Vážený pán Inžinier,

na základe písomného súhlasu Objednávateľa, list č. 3665/79770/30802/2017 zo dňa 15.8.2017 Vám Stavebnotechnický dozor v zmysle Zmluvy o dielo Objednávateľa ev. č. ZM 2016/0348, v súlade s podčlánkom 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru Všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC), upravenými Osobitnými zmluvnými podmienkami písmeno a), vydávame Oznámenie o predĺžení Uzlového bodu č.4 ukončenie výstavby zárubného múru SO 230-00 o 187 dní.

Zhotoviteľ archeologického výskumu predložil k 24. týždňu roku 2017 aktualizovaný harmonogram postupu prác s aktualizovanými termínmi vykonávania výskumu po etapách na jednotlivých lokalitách. Z harmonogramu je zrejmé, že práce na výskume pokračujú a stále budú pokračovať. Zhotoviteľ stavebných prác z dôvodu prebiehajúceho archeologického výskumu naďalej nemohol vykonávať plánované stavebné práce v zmysle platného Harmonogramu prác (vrátane Fakturačného harmonogramu) čo má dopad na Lehotu výstavby.

Dátum začiatku archeologického výskumu v mieste SO 230-00 bol 24.11.2016.

Dátum uvoľnenia etapy č. 3 lokality 7 a 9 potrebnej na vykonávanie prác na SO 230-00 bol 30.5.2017.

Celkové oneskorenie Zhotoviteľa na SO 230-00 spôsobené realizáciou archeologického výskumu je 187 dní.

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájum 1233/2 155 00 Praha
tel.:
e-mail:

ESP Consult, s.r.o.
Vícenzy 2209/8A 931 01 Šamorín
tel.:
e-mail:

INFRAPROJEKT, s.r.o.
Kominárska 4, 832 03 Bratislava
tel.:
e-mail:

SGS**ESP
Consult**
INFRAPROJEKT

Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájum 1233/2, 155 00, Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Zhotoviteľ si z dôvodu oneskorenia vzniknutého vykonávaním archeologického výskumu v mieste stavebného objektu SO 230-00 v súlade s podčlánkami 4.24 Nálezy na stavenisku, 8.4 Predĺženie Lehoty výstavby a 20.1 Nároky Zhotoviteľa, Všeobecných zmluvných podmienok nárokuje predĺženie Lehoty ukončenia uzlového bodu č. 4 o 187 dní. Pôvodná lehota ukončenia uzlového bodu č. 4 je 369 dní, odsúhlasené predĺženie ukončenie uzlového bodu č.4 je 187 dní, celková Lehota ukončenia uzlového bodu č. 4 je 556 dní od začiatku lehoty výstavby.

Predĺženie lehoty ukončenia uzlového bodu č. 4 nebude mať vplyv na predĺženie Lehoty výstavby Diela. Na základe uznania nároku Zhotoviteľa č. 5, predĺženia lehoty ukončenia uzlového bodu č. 4 Vás žiadame o predloženie návrhu Dodatku ku Zmluve o dielo Objednávateľa ev. č. ZM/2016/0348 na predĺženie lehoty uzlového bodu č. 4 ukončenie výstavby zárubného múru SO 230-00 o 187 dní.

S pozdravom

Na vedomie:

SGS Czech Republic, s.r.o.
K Hájum 1233/2, 155 00 Praha
tel.:
e-mail:

ESP Consult, s.r.o
Viceny 2209/8A 931 01 Šamorín
tel.:
e-mail:

INFRAPROJEKT, s.r.o.
Kominárska 4, 832 03 Bratislava
tel.:
e-mail:

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Zhotoviteľ : Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava

Zmluva o dielo : č. objednávateľ : ZM/2016/0348
č. zhotoviteľ : 10000114477/3489


Dodatok č.2 k zmluve o dielo

Príloha č. 4 k dodatku

- časť 4.1 – Vecný harmonogram
- časť 4.3 – Fakturačný harmonogram

VECNÝ HARMONOGRAM - tzv. Ganttov graf - HARMONOGRAM VÝSTAVBY, PRÁC
DJAINICA D1 BUDIMÍŘ - BIDOVCE

SKANSKA

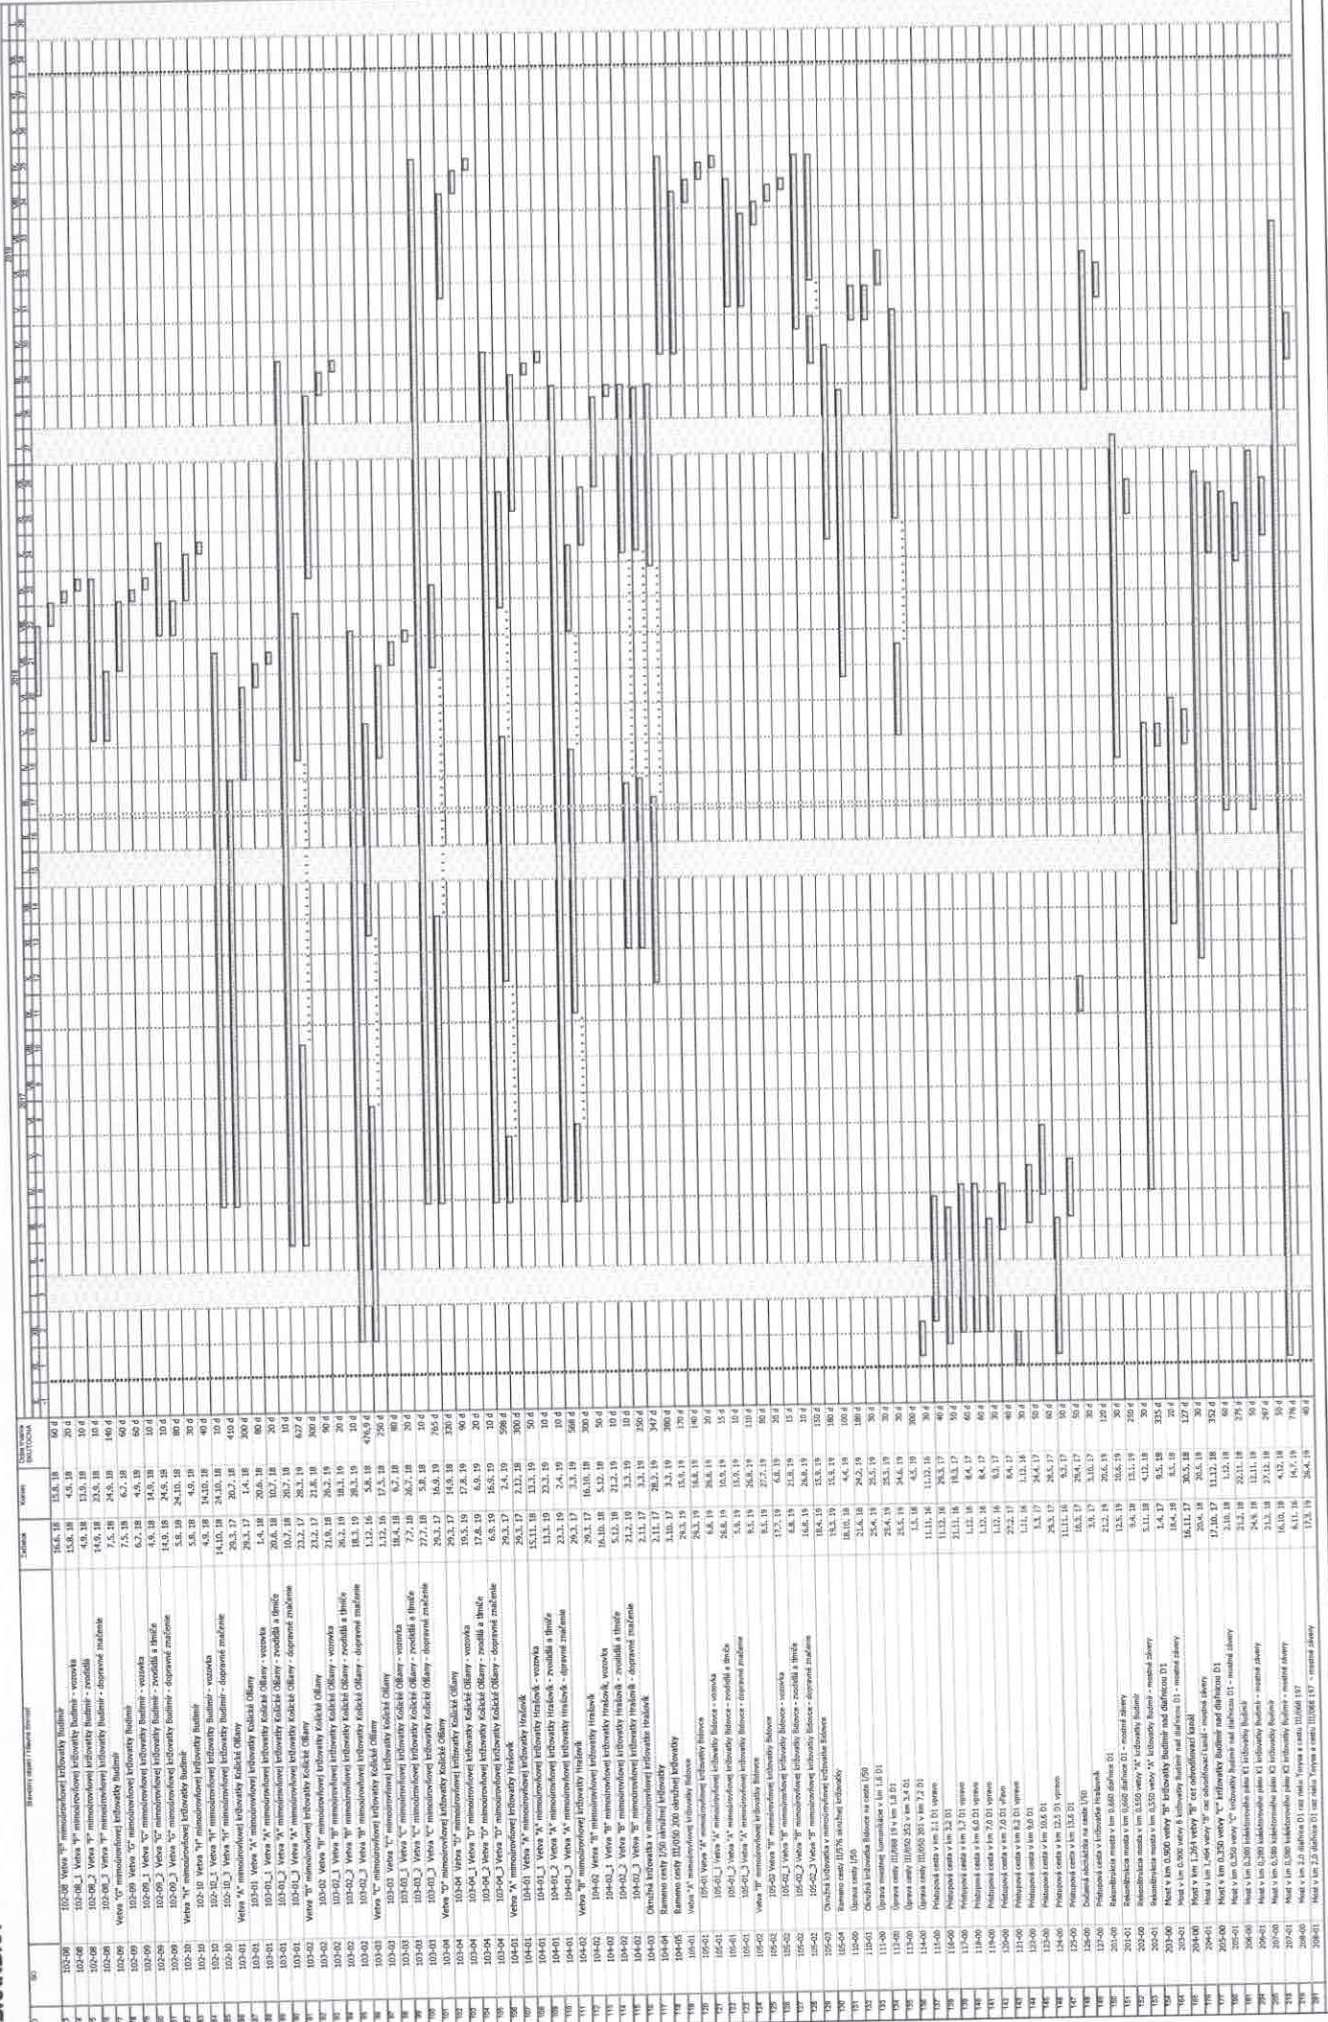

Fakturačný harmonogram

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

