

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa : 2021/0164

č. zhotoviteľa : 10000141427/3489

uzatvorenej dňa 19.03.2021, v znení Dodatkov č.1 až 3 k nej, medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na predmet obstarávania „**Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - 2. etapa (km 3,800 - 8,455)**“

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0065 4591
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 - a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
 - b) a technických: Ing. Martina Lamačková
Mgr. Radovan Hladký

(ďalej len "Objednávateľ")
- a
2. **Názov:** Skanska SK a.s.
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
Zapísaná v: v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B
IČO: 31 611 788
DIČ: 2020478955
IČ DPH: SK2020478955
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
 - a) zmluvných: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior
 - b) technických: Ing. Marek Štancel, oblasť manažér
p. Branislav Štefunko, vedúci RVS 89-0501

Číslo telefónu:
Číslo faxu:
Email:
(ďalej len "Zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 a 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník“), a v súlade so znením článku XVI, bod č.16.7 dodatok k Zmluve o dielo, predmetom ktorého je :

- a) zmena rozsahu diela – navyše práce - zmenový list č.4
- b) cenový dopad na ceny rozhodujúcich materiálov a prác
- c) so zmenou rozsahu a cenovým dopadom spojená zmena celkovej ceny diela,
- d) aktualizácia časového plánu výstavby diela spojená so zmenou rozsahu diela

v nasledovnom znení :

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.03.2021 Zmluvu o dielo, zverejnená 22.03.2021, účinná 23.03.2021 (č. 2021/0164) (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - 2. etapa (km 3,800 - 8,455)“ v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Zhotoviteľ doručil Objednávateľovi dňa 18.05.2022 oznámenie a požiadavku na zmenu Zmluvy ohľadom prác navyše a možnosti navýšenia hodnoty plnenia na základe súčasných mimoriadnych udalostí resp. okolností, ktoré nemohol Zhotoviteľ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedenú situáciu rieši aj všeobecné metodické usmernenie č. 6/2022 Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) ZVO zo dňa 16.5.2022.
2. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy vzhľadom na finančnú hodnotu zmeny podľa § 18 ods. 3 ZVO, avšak nad rámec predmetného ustanovenia odôvodňujú potrebu jej zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a ktorými sú :
 - situácia vyvolaná ochorením COVID-19,
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku dochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o 7,50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy a ide tak o tzv. zmenu de minimis. Zmena (a odsúhlasenie navýšenia jednotlivých položiek) žiadaná Zhotoviteľom bola posúdená a odsúhlasená Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozorom a projektantom diela. Mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu a k uzavretiu dodatku je písomné odôvodnenie zvoleného postupu podľa § 18 ods. 3 ZVO s podrobným preukázaním nárastu hodnoty zákazky.

II.

PREDMET DODATKU

1. **Dodatkom sa mení Článok III. PREDMET ZMLUVY nasledovne :**

- **bod 3.1** tak, že pôvodné znenie sa dopĺňa o odstavce s nasledovným znením :

„Predmetom tejto zmluvy je aj realizácia – zhotovenie diela v rozsahu a skladbe definovanej v Prílohe č.1 tohto dodatku (Položkovitý rozpočet – Zmenový list č. 4), v Prílohe č.2 tohto dodatku (Zmenový list č. 4 - popis)“

„ Predmetom tejto zmluvy je aj cenový dopad na ceny rozhodujúcich materiálov a prác spojených s realizáciou diela spôsobený mimoriadnou situáciou (Pandémia COVID-19, vojnový konflikt na Ukrajine) v rozsahu a skladbe definovaných v Prílohe č.4 tohto dodatku“

2. Dodatkom sa mení Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY nasledovne :

- **bod 5.1** tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením :

*„ Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (Príloha č.1 k Zmluve o dielo, v znení Prílohy č.1 a Prílohy č.4 k Dodatku č.4) na sume vo výške : **4 171 433,63 € bez DPH** (slovom : štyri milióny stosedemdesiatjedentisíc štyristotridsaťtri EUR a šesťdesiattri eurocentov bez DPH). Pôvodná zmluvná cena špecifikovaná v Prílohe č.1 k zmluve o dielo sa týmto Dodatkom č. 4 navyšuje o čiastku vo výške: **283 442,78 € bez DPH** (slovom: dvestoosemdesiattritisíc štyristoštyridsaťdva EUR a sedemdesiatosem eurocentov). Položkovité rozpočty čiastky navyšujúcej pôvodnú zmluvnú cenu, vrátane celkovej rekapitulácie zmluvnej ceny po Dodatku č.4 tvorí ako Príloha č.1 a Príloha 3 nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.“*

Spolu bez DPH4 171 433,63- eur

DPH 20%..... 834 286,73- eur

Spolu.....5 005 720,36- eur

Slovom: päť miliónov päťtisíc sedemstodvadsať eur a tridsaťšesť eurocentov vrátane DPH

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

3. Dodatkom sa súčasne ruší časový plán výstavby diela tvoriaci Prílohu č.3 Dodatku č.3 a nahrádza sa aktualizovaným časovým plánom výstavby diela, ktorý ako Príloha č.3 tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatkov č.1, 2 a 3 k nej nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
 - a) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak orgán kontroly (Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo MIRRI) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly. Ak boli v rámci kontroly dodatku identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, Dodatok nenadobudne účinnosť, iba ak Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámí opak,

- b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie, resp. nenadobudnutie účinnosti tohto dodatku písomne, najneskôr do 10 dní odo dňa obdržania správy z kontroly.
3. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
 4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
 5. Nedeliteľnou súčasťou dodatku sú :
 - Príloha č.1 : Položkový rozpočet – Zmenový list č. 4
 - Príloha č.2 : Zmenový list č. 4 – popis
 - Príloha č.3 : Aktualizovaný časový plán výstavby diela
 - Príloha č.4 : Cenový dopad na ceny rozhodujúcich materiálov a prác
 - Príloha č.5 : Zdôvodnenie dodatku

V Trenčíne, dňa

V Bratislave, dňa.....

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

.....
Objednávateľ

Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

.....
Zhotoviteľ
Skanska SK a.s.

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva

.....
Zhotoviteľ
Skanska SK a.s.

Rekapitulácia ZoD a Zmenový list 4 a cenový dopad do cien rozhodujúcich materiálov a prác

Stavba: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji
Predmet: Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - 2. etapa (km 3,800 - 8,455)

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Názov	Cena bez DPH (€)
Zmluva o dielo po Dodatku č.3	3 887 990,85 €
ZL č.4 - Zvislé dopravné značenie	6 896,82 €
Cenový dopad do cien rozhodujúcich materiálov a prác	276 545,96 €

Cena celkom ZoD po Dodatku č.3 (€) bez DPH	3 887 990,85 €
Cena celkom Zmenové listy (€) bez DPH	283 442,78 €

Cena celkom ZoD a Zmenové listy (€) bez DPH	4 171 433,63 €
DPH 20%	834 286,73 €
Cena celkom vrátane DPH (ZoD a ZL 1 až 3)	5 005 720,36 €

Zmenový list č.4

Stavba: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Predmet: Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - 2. etapa (km 3,800 - 8,455)

Objekt: ZL.č.4 - Zvislé dopravné značenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Rozpočet - Zmenový list č.4)

P.Č.	K/M	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH (€)	Cena celkom bez DPH (€)
SO 103-00 Rekonštrukcia cesty km 4,119-6,900							5 746,36
n1	K	966006132.S	Odstránenie zvislej dopravnej značky	ks	51,000	13,14	670,14
47	K	22250671060212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	23,000	13,19	303,37
n2	M	404410175968.S	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA2, pozinkovaná	ks	43,000	97,89	4 209,27
52	K	22250674010110	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	40,000	26,38	1 055,20
53	M	404490008402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	40,000	27,70	1 108,00
54	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	40,000	0,66	26,40
55	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	68,000	3,96	269,28
48	M	404410172500	Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-6,000	79,15	-474,90
49	M	404410150000	Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	-4,000	88,38	-353,52
50	M	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-6,000	60,68	-364,08
51	M	404410044307	Značka upravujúca prednosť P5 (Križovatka s vedľajšou cestou), na fluorescenčnom kontrastnom ráme, fólia RA3, pozinkovaná	ks	-2,000	351,40	-702,80
SO 104-00 Rekonštrukcia cesty km 7,235-7,750							60,63
n1	K	966006132.S	Odstránenie zvislej dopravnej značky	ks	17,000	13,14	223,38
45	K	22250671060212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	13,19	26,38
n2	M	404410175968.S	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA2, pozinkovaná	ks	16,000	97,89	1 566,24
56	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	36,000	3,96	142,56
46	M	404410172500.1	Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-3,000	79,15	-237,45
47	M	404410150000.1	Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-2,000	88,38	-176,76
48	M	404410176100.1	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-1,000	60,68	-60,68
49	M	404410027407	Výstražná značka A14 (Chodci) na fluorescenčnom kontrastnom ráme, fólia RA3, pozinkovaná	ks	-2,000	351,40	-702,80
50	M	404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-3,000	135,87	-407,61
51	M	404410066800	Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-1,000	135,87	-135,87
52	M	404410039200	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-2,000	88,38	-176,76
SO 105-00 Rekonštrukcia cesty km 7,750 - 8,455							753,31
n1	K	966006132.S	Odstránenie zvislej dopravnej značky	ks	5,000	13,14	65,70
34	K	22250671060212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	5,000	13,19	65,95
n2	M	404410175968.S	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA2, pozinkovaná	ks	6,000	97,89	587,34
36	K	22250674010110	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	26,38	26,38

Zmenový list č.4

Stavba: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Predmet: Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - 2. etapa (km 3,800 - 8,455)

Objekt: ZL.č.4 - Zvislé dopravné značenie

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Rozpočet - Zmenový list č.4)

P.Č.	K/M	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH (€)	Cena celkom bez DPH (€)
37	M	404490008402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	1,000	27,70	27,70
38	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	1,000	1,32	1,32
39	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	10,000	3,96	39,60
35	M	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-1,000	60,68	-60,68
SO 222-00 Sanácia zosuvu km 7,000 vpravo							336,52
n1	K	966006132.S	Odstránenie zvislej dopravnej značky	ks	8,000	13,14	105,12
37	K	22250671060212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	39,52	39,52
n2	M	404410175968.S	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA2, pozinkovaná	ks	7,000	97,89	685,23
44	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	6,000	3,96	23,76
38	M	404410172500.1	Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-4,000	79,15	-316,60
39	M	404410176100.1	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-1,000	64,64	-64,64
40	M	404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-1,000	135,87	-135,87
Cena celkom - Zmenový list č.4 bez DPH v eur							6 896,82
DPH (20%)							1 379,36
Cena celkom - Zmenový list č.4 s DPH v eur							8 276,18

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - 2. etapa (km
3,800 - 8,455)

Číslo ZoD:

2021/0164

Poradové číslo zmenového listu:

4

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R - realizácia

Stavebný objekt: SO 103 , SO 104, SO 105, SO 222

Názov zmeny: Zvislé dopravné značenie

Popis zmeny:

Trvalé zvislé dopravné značenie

Zdôvodnenie zmeny:

- zmena projektovej dokumentácie trvalého zvislého dopravného značenia z dôvodu novej vyhlášky MV SR č.30/2020 Z. z. a aktualizovaných vzorových listov stavebných pozemných komunikácií - VL 6.1 Zvislé dopravné značky – účinnosť od 1.10.2021.
- na základe novej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Lenka Rytychová a odsúhlasenej jednotlivými inštitúciami bol vytvorený nový výkaz výmer

Posúdenie zmeny - autorský dozor projektanta:

Posúdenie zmeny - tech. dozor objednávateľa:

TODI SÚHLASÍ SO ZL.Č. 4

Stavba:	Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - 2. etapa (km 3,800 - 8,455)	Číslo ZoD:	2021/0164	Zmenový list č:	4
Dopady:	do projektovej dokumentácie:	áno		Nová PD	
	do časového plánu:	áno		Predĺženie o 25 dní	
	do ceny:	zvýšenie o:		6 896,82 € bez DPH	
		zniženie o:		8 276,18 € s DPH	
Zdroj financovania zmeny:					
Navrhovateľ zmeny:			Podpis:		
Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava Ing. Marek Štancel					
Vecná kontrola			Cenová kontrola		
Vyjadrenie zhotoviteľa:			Podpis:		
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí					
Vyjadrenie projektanta:			Podpis:		
SÚHLAS SO ZMENOU					
Vyjadrenie objednávateľa:			Podpis:		
SÚHLASÍ SO ZMENOU					
Doporučenie:			Podpis:		
Záverečné stanovisko:					

Dňa: 25.4.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Ing. Marek Štancel

Za projektanta:

Zmenový list č.4 – Zvislé dopravné značenie

Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - 2. etapa (km 3,800 - 8,455)

- nové položky boli nacenené podľa položiek z referenčného cenníka SK Cenekon 2201 a ostatné položky sa použili zo základného rozpočtu
- modrou podfarbené položky sa vyfakturujú v základnom rozpočte a taktiež v zmenovom liste č.4 ako mínusová hodnota z dôvodu zbytočného nenavýšenia danej zmeny a ceny diela
- dopad zmenového listu sa prejaví aj na predĺžení doby výstavby diela o 25 dní

Rozpočet - ZoD (Zmenové listy)

P.Č	K/M	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH (€)	Cena celkom bez DPH (€)
-----	-----	-------------	---------------	----	----------	-----------------------------	-------------------------

SO 103-00 Rekonštrukcia cesty km 4,119-6,900

5 746,36

n1	K	966006132.S	Odstránenie zvislej dopravnej značky	ks	51,000	13,14	670,14
47	K	22250671060212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	23,000	13,19	303,37
n2	M	404410175968.S	Dopravná značka zvislá, rozmer základný , fólia RA2, pozinkovaná	ks	43,000	97,89	4 209,27
52	K	22250674010110	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	40,000	26,38	1 055,20
53	M	404490008402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	40,000	27,70	1 108,00
54	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	40,000	0,66	26,40
55	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	68,000	3,96	269,28
48	M	404410172500	Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-6,000	79,15	-474,90
49	M	404410150000	Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	-4,000	88,38	-353,52
50	M	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-6,000	60,68	-364,08
51	M	404410044307	Značka upravujúca prednosť P5 (Križovatka s vedľajšou cestou), na fluorescenčnom kontrastnom ráme, fólia RA3, pozinkovaná	ks	-2,000	351,40	-702,80

SO 104-00 Rekonštrukcia cesty km 7,235-7,750

60,63

n1	K	966006132.S	Odstránenie zvislej dopravnej značky	ks	17,000	13,14	223,38
45	K	22250671060212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	13,19	26,38
n2	M	404410175968.S	Dopravná značka zvislá, rozmer základný , fólia RA2, pozinkovaná	ks	16,000	97,89	1 566,24
56	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	36,000	3,96	142,56
46	M	404410172500.1	Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-3,000	79,15	-237,45
47	M	404410150000.1	Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-2,000	88,38	-176,76

General / Obecné

48	M	404410176100.1	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-1,000	60,68	-60,68
49	M	404410027407	Výstražná značka A14 (Chodci) na fluorescenčnom kontrastnom ráme, fólia RA3, pozinkovaná	ks	-2,000	351,40	-702,80
50	M	404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-3,000	135,87	-407,61
51	M	404410066800	Zákazová značka B29b (Koniec zákazu predchádzania), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-1,000	135,87	-135,87
52	M	404410039200	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-2,000	88,38	-176,76

SO 105-00 Rekonštrukcia cesty km 7,750 - 8,455

753,31

n1	K	966006132.S	Odstránenie zvislej dopravnej značky	ks	5,000	13,14	65,70
34	K	22250671060212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	5,000	13,19	65,95
n2	M	404410175968.S	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA2, pozinkovaná	ks	6,000	97,89	587,34
36	K	22250674010110	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	26,38	26,38
37	M	404490008402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	1,000	27,70	27,70
38	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	1,000	1,32	1,32
39	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	10,000	3,96	39,60
35	M	404410176100	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-1,000	60,68	-60,68

SO 222-00 Sanácia zosuvu km 7,000 vpravo

336,52

n1	K	966006132.S	Odstránenie zvislej dopravnej značky	ks	8,000	13,14	105,12
37	K	22250671060212	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	39,52	39,52
n2	M	404410175968.S	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA2, pozinkovaná	ks	7,000	97,89	685,23
44	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn (počítame s uvedeným výrobkom)	ks	6,000	3,96	23,76
38	M	404410172500.1	Informatívna smerová značka IS18a (Smerová tabuľa s dvoma cieľmi), Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-4,000	79,15	-316,60
39	M	404410176100.1	Informatívna smerová značka IS32a (Kilometrovník), Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	-1,000	64,64	-64,64
40	M	404410066500	Zákazová značka B29a (Zákaz predchádzania), fólia RA2, pozinkovaná	ks	-1,000	135,87	-135,87

Cena celkom bez DPH v eur

6 896,82

DPH (20%)

1 379,36

Cena celkom s DPH v eur

8 276,18


Časový harmonogram


Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava - 2.etapa

Identifikácia	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	jún 2021	júl 2021	august 2021	september 2021	október 2021	november 2021	december 2021	január 2022	február 2022	marec 2022	apríl 2022	máj 2022	jún 2022	júl 2022	august 2022
1	Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto n/V - Myjava - 2.etapa	298 dní	Ut 8.6.21	Ne 31.7.22	[Gantt bar for task 1]														
2	Vytýčenie inžinierskych sietí, zriadenie zariadenia staveniska	3 dni	Ut 8.6.21	Št 10.6.21	[Gantt bar for task 2]														
3	Osadenie dočasného dopravného značenia	2 dni	Ut 8.6.21	Str 9.6.21	[Gantt bar for task 3]														
4	Odstránenie dočasného dopravného značenia, odstránenie zariadenia staveniska	2 dni	So 30.7.22	Ne 31.7.22	[Gantt bar for task 4]														
5	SO 222 Sanácia zosuvu km 7,000 vpravo (km 6,900 - km 7,235)	124 dni	Ut 8.6.21	So 9.10.21	[Gantt bar for task 5]														
6	Pravý jazdný pruh	76 dni	Ut 8.6.21	Ne 22.8.21	[Gantt bar for task 6]														
7	Odstránenie krovin a konštrukcie vozovky	23 dni	Ut 8.6.21	Str 30.6.21	[Gantt bar for task 7]														
8	Realizácia mikropilótovej steny	34 dni	So 26.6.21	Št 29.7.21	[Gantt bar for task 8]														
9	Pokládka nových konštrukčných vrstiev okrem obrusnej vrstvy	22 dni	Ut 27.7.21	Ut 17.8.21	[Gantt bar for task 9]														
10	Rekonštrukcia priepustov	21 dni	Ne 20.6.21	So 10.7.21	[Gantt bar for task 10]														
11	Montáž zvodidiel	5 dni	Str 18.8.21	Ne 22.8.21	[Gantt bar for task 11]														
12	Ľavý jazdný pruh	46 dní	Str 25.8.21	So 9.10.21	[Gantt bar for task 12]														
13	Odstránenie krovin a konštrukcie vozovky	20 dní	Str 25.8.21	Po 13.9.21	[Gantt bar for task 13]														
14	Pokládka nových konštrukčných vrstiev okrem obrusnej vrstvy	21 dní	Ut 14.9.21	Po 4.10.21	[Gantt bar for task 14]														
15	Rekonštrukcia priepustov	18 dní	So 4.9.21	Ut 21.9.21	[Gantt bar for task 15]														
16	Montáž zvodidiel	5 dní	Ut 5.10.21	So 9.10.21	[Gantt bar for task 16]														
17	SO 220 Rozšírenie krajnic km 3,800 - 4,119 (km 3,800 - km 4,119)	108 dní	Št 17.6.21	So 2.10.21	[Gantt bar for task 17]														
18	Pravý jazdný pruh	53 dní	Št 17.6.21	Ne 8.8.21	[Gantt bar for task 18]														
19	Odstránenie krovin a konštrukcie vozovky	27 dní	Št 17.6.21	Ut 13.7.21	[Gantt bar for task 19]														
20	Realizácia vystuženej krajnice	17 dní	Št 1.7.21	So 17.7.21	[Gantt bar for task 20]														
21	Pokládka nových konštrukčných vrstiev okrem obrusnej vrstvy	34 dní	Št 1.7.21	Ut 3.8.21	[Gantt bar for task 21]														
22	Rekonštrukcia priepustov	19 dní	Pi 16.7.21	Ut 3.8.21	[Gantt bar for task 22]														
23	Montáž zvodidiel	5 dní	Str 4.8.21	Ne 8.8.21	[Gantt bar for task 23]														
24	Ľavý jazdný pruh	55 dní	Po 9.8.21	So 2.10.21	[Gantt bar for task 24]														
25	Odstránenie krovin a konštrukcie vozovky	27 dní	Po 9.8.21	So 4.9.21	[Gantt bar for task 25]														
26	Realizácia vystuženej krajnice	16 dní	Št 26.8.21	Pi 10.9.21	[Gantt bar for task 26]														
27	Pokládka nových konštrukčných vrstiev okrem obrusnej vrstvy	33 dní	Št 26.8.21	Po 27.9.21	[Gantt bar for task 27]														
28	Rekonštrukcia priepustov	17 dní	So 4.9.21	Po 20.9.21	[Gantt bar for task 28]														
29	Montáž zvodidiel	5 dní	Ut 28.9.21	So 2.10.21	[Gantt bar for task 29]														
30	SO 221 Zárubný múr km 4,400 vpravo (km 4,306 - km 4,339)	56 dní	Str 1.9.21	Ut 26.10.21	[Gantt bar for task 30]														
31	Pravý jazdný pruh	56 dní	Str 1.9.21	Ut 26.10.21	[Gantt bar for task 31]														
32	Odstránenie krovin	7 dní	Str 1.9.21	Ut 7.9.21	[Gantt bar for task 32]														
33	Realizácia gabiónového gravitačného múra	51 dní	So 4.9.21	Ne 24.10.21	[Gantt bar for task 33]														

Projekt: Myjava 2.etapa
Dátum: 12.5.2022

Úkol	-----	Souhrnný	◀	Vnější mlínik	◆	Manuální úloha	◇	Manuální súhm	◆	Externé úlohy	◇	Konečný termín	⇄
Rozdělení	Souhm projektu	♥	Neaktivní medznik	□	lba trvanie	lba začiatok	=====	Externý medznik	=====		
Mlínik	◆	Vnější úkoly	-----	Neaktivní súhm	Manuální súhm	◆	lba dokončit	▶	Průběh	=====		



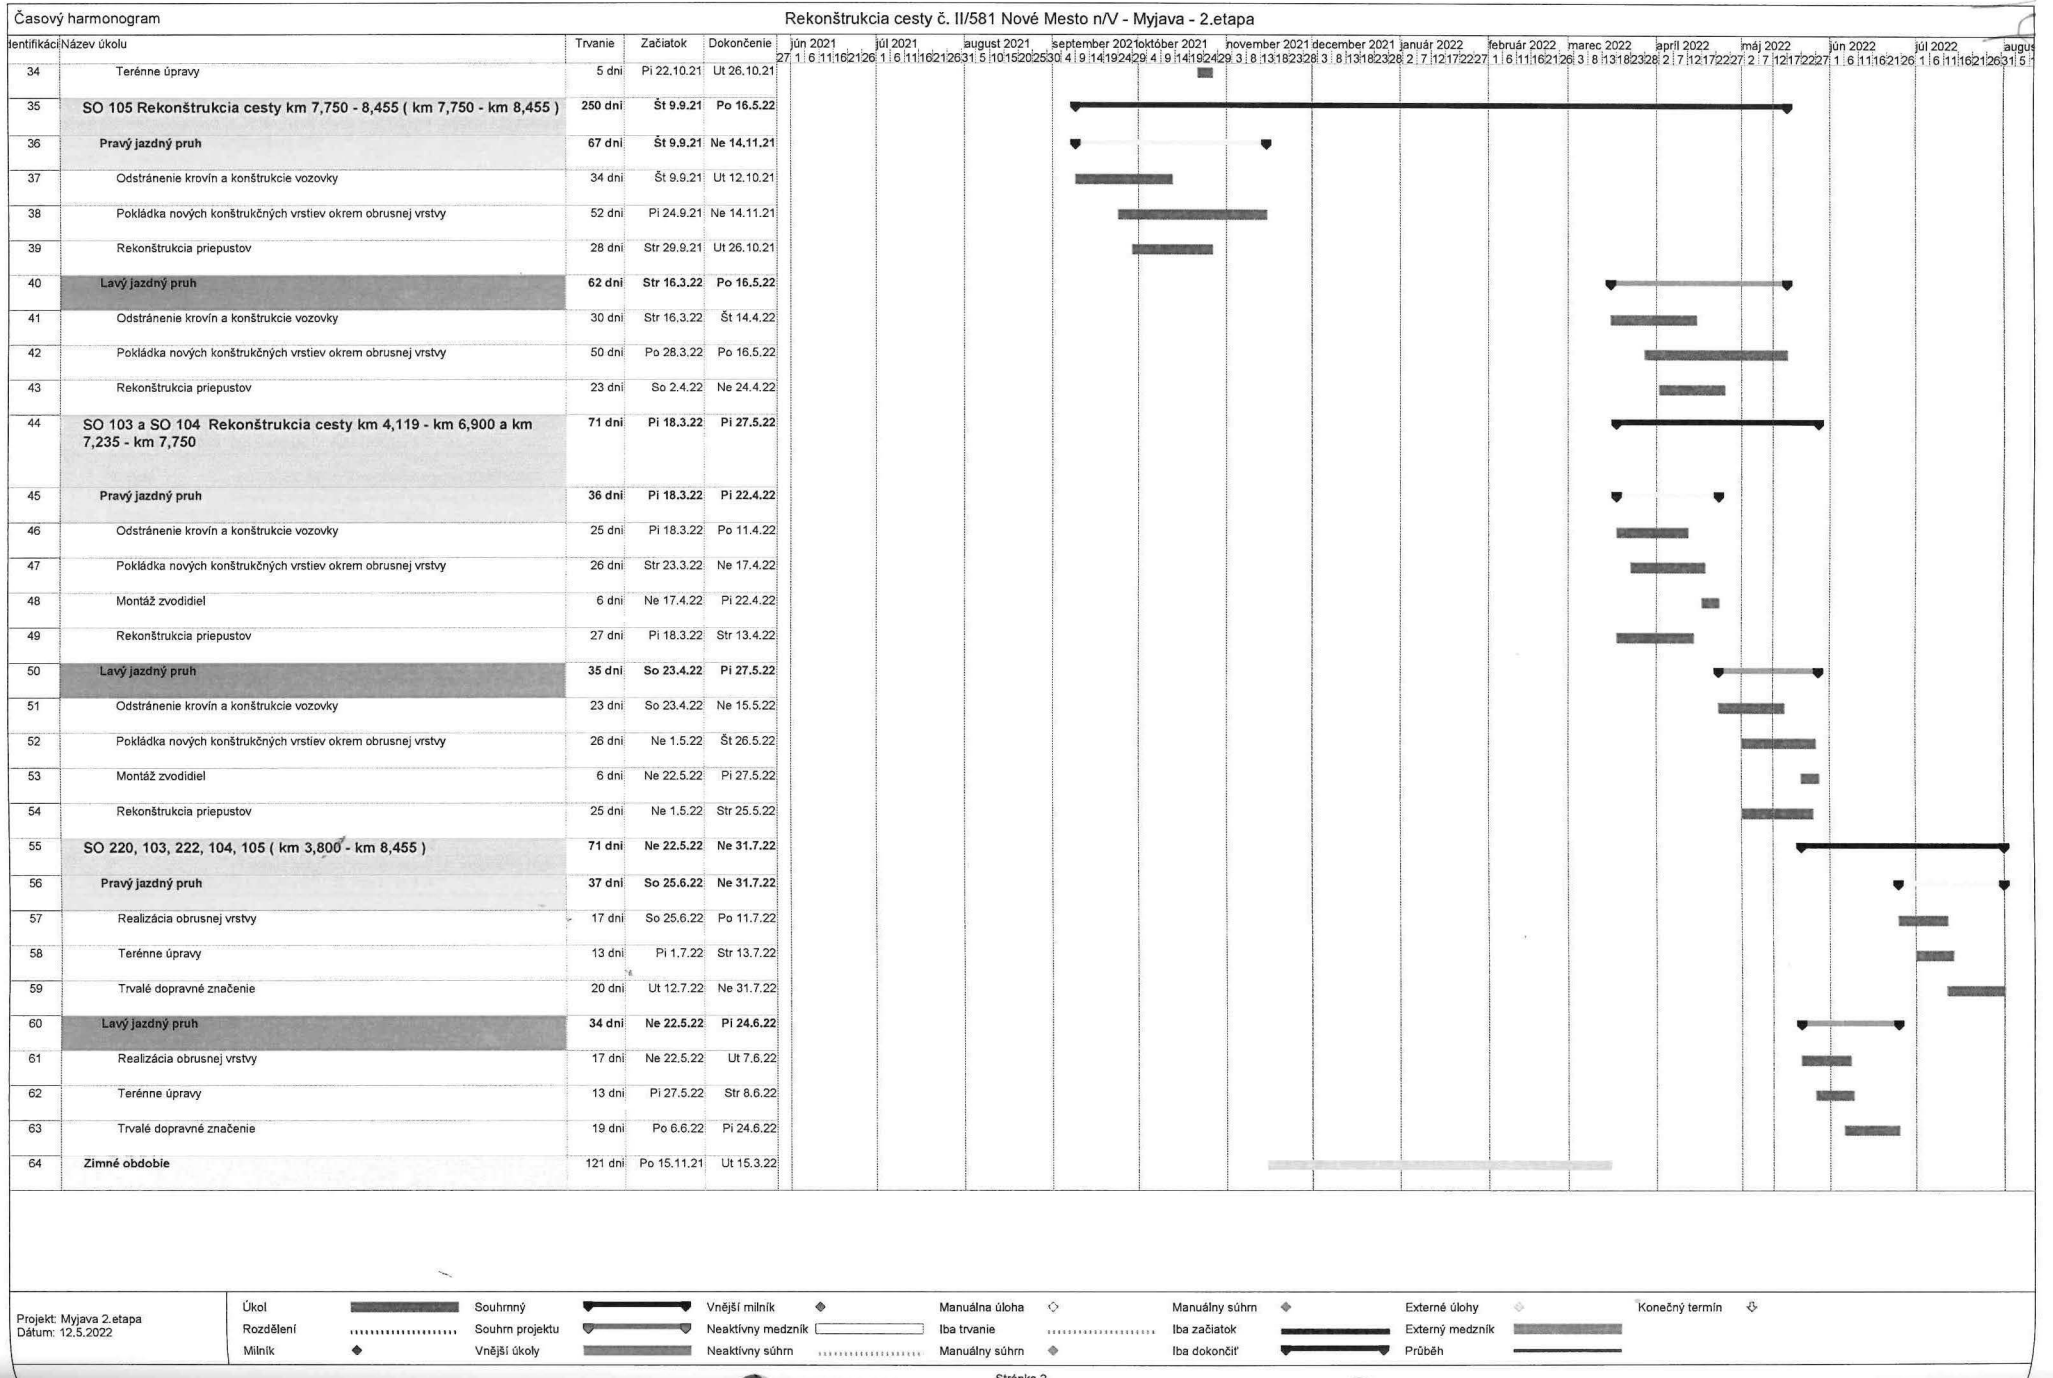

Príloha č.4 - Navýšenie jednotkových cien asfaltových zmesí počas realizácie stavby (dopad 1-kvartál 2022)

Stavba: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji

Predmet: Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - 2. etapa (km 3,800 - 8,455)

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Jednotkové ceny podľa ZOD										Jednotkové ceny aktualizované 2022			
Rozpočet - ZoD										Zostatok k 3/2022			
P.Č.	K/M	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH (€)	Cena celkom bez DPH (€)	Množstvo	Cena celkom bez DPH (€)	Množstvo	Cena jednotková bez DPH (€)	Cena celkom bez DPH (€)	Množstvo asfaltu (t)
Objekt SO 103-00 Rekonštrukcia cesty km 4,119-6,900							753 385,82	753 385,82		946 897,62			
64	K	22030330010010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	50 393,700	0,40	20 157,48	50 393,700	20 157,48	50 393,700	0,44	22 173,23	
65	K	22030640042230	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	25 196,850	14,02	353 259,84	25 196,850	353 259,84	25 196,850	17,78	447 999,99	3 714,52
66	K	22030641010230	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m ²	25 196,850	15,08	379 968,50	25 196,850	379 968,50	25 196,850	18,92	476 724,40	3 058,90
Objekt SO 104-00 Rekonštrukcia cesty km 7,235-7,750							142 743,67	142 743,67		179 388,32			
66	K	22030330010010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	9 468,900	0,40	3 787,56	9 468,900	3 787,56	9 468,900	0,44	4 166,32	
67	K	22030640042230	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	4 734,450	14,26	67 513,26	4 734,450	67 513,26	4 734,450	18,08	85 598,86	697,95
68	K	22030641010230	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m ²	4 734,450	15,09	71 442,85	4 734,450	71 442,85	4 734,450	18,93	89 623,14	574,76
Objekt SO 105-00 Rekonštrukcia cesty km 7,750 - 8,455							110 590,34	108 985,62		136 642,71			
53	K	22030330010010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	11 613,000	0,40	4 645,20	7 601,200	3 040,48	7 601,200	0,44	3 344,53	
56	K	22030640042230	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	2 081,100	13,94	29 010,53	2 081,100	29 010,53	2 081,100	17,68	36 793,85	306,80
57	K	22030641010220	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m ²	3 725,400	12,11	45 114,59	3 725,400	45 114,59	3 725,400	15,19	56 588,83	361,81
58	K	22030641010230	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m ²	2 081,100	15,29	31 820,02	2 081,100	31 820,02	2 081,100	19,18	39 915,50	252,65
Objekt SO 220-00 Rozšírenie krajnic km 3,800-4,119							35 745,86	34 635,74		43 266,93			
46	K	22030330010010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	5 550,600	0,40	2 220,24	2 775,300	1 110,12	2 775,300	0,44	1 221,13	
49	K	22030641010220	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m ²	2 775,300	12,08	33 525,62	2 775,300	33 525,62	2 775,300	15,15	42 045,80	269,54
Objekt SO 222-00 Sanácia zosuvu km 7,000 vpravo							119 454,97	40 748,28		50 849,51			
54	K	22030329010020	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	3 082,000	0,46	1 417,72	157,500	72,45	157,500	0,50	78,75	
55	K	22030330010010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	5 829,000	0,40	2 331,60	3 072,000	1 228,80	3 072,000	0,44	1 351,68	
56	K	22030640012430	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	2 914,500	15,80	46 049,10	157,500	2 488,50	157,500	19,47	3 066,53	27,21
57	K	22030640042220	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	2 914,500	11,86	34 565,97	157,500	1 867,95	157,500	14,88	2 343,60	19,35
58	K	22030641010220	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m ²	2 914,500	12,04	35 090,58	2 914,500	35 090,58	2 914,500	15,10	44 008,95	283,06
Cena celkom bez DPH v eur							1 161 920,66	1 080 499,13		1 357 045,09			
DPH (20%)							232 384,13	216 099,83		271 409,02			
Cena celkom s DPH v eur							1 394 304,79	1 296 598,96		1 628 454,11			

Rozdiel bez DPH v eur

Rozdiel s DPH v eur

276 545,96

331 855,15

Zdôvodnenie k predloženému Dodatku č. 4 k ZoD

Dňa 13. 08. 2019 Skanska SK, a. s., IČO: 31611788, sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava (ďalej len: Skanska SK, a. s. alebo „zhotoviteľ“) predložil ponuku na realizáciu diela na predmet zákazky „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava – 2. etapa (km 3,800 - 8,455)“ do súťaže vyhlásenej v Úradnom vestníku EÚ č. 2019/S 069-161295 zo dňa 08. 04. 2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 80/2019 dňa 24. 04. 2019 pod číslom 8618 – MSP.

Dňa 19. 03. 2021 Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ na strane jednej (ďalej len: „objednávateľ“) uzatvoril so Skanska SK, a. s., ako s úspešným uchádzačom a zhotoviteľom na strane druhej Zmluvu o dielo na stavbu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava – 2. etapa (km 3,800 - 8,455)“ na realizáciu stavebných prác (ďalej len: „dielo“).

Dňa 08. 06. 2021 zhotoviteľ prevzal od objednávateľa stavenisko na realizáciu diela.

Zdôvodnenie k prácam navyiac:

Nároky boli priebežne oznamované v čase ich vzniku na kontrolných dňoch stavby a ostatných stretnutiach s objednávateľom, autorským dozorom a stavebným dozorom.

Zdôvodnenie obsahuje detailné technické potreby nutnosti realizácie navyiac stavebných prác, resp. nere realizovanie v pôvodnom rozpočte definovaných prác a dodávok, navrhnuté technické riešenie spolu aj s cenovým dopadom jednotlivých zmien oproti pôvodnému zadaniu.

Stavebné práce tvoriace predmet zdôvodnenia majú cenový dopad na vybrané časti stavebných objektov SO 103-00 Rekonštrukcia cesty km 4,119-6,900, SO 104-00 Rekonštrukcia cesty km 7,235-7,750, SO 105-00 Rekonštrukcia cesty km 7,750 - 8,455 a SO 222-00 Sanácia zosuvu km 7,000 vpravo. Konkrétne ide o:

Zmenový list stavby č. 4 (Zvislé dopravné značenie) – cena 6 896,82 Eur bez DPH (8 276,18 Eur s DPH)

Predmet zmenového listu č.4 súvisí s nevyhnutnou zmenou projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia z dôvodu novej vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z., ako i aktualizovaných vzorových listov stavebných pozemných komunikácií – VL 6.1 Zvislé dopravné značenie – účinných od 1.10.2021

Cenový dopad na ceny rozhodujúcich materiálov – cena 276 545,96 Eur bez DPH (331 855,15 Eur s DPH)

Rieši a sanuje výrazný nárast cien rozhodujúcich materiálov spôsobených jednak pandemiou COVID-19, ako i vojnovým konfliktom na Ukrajine a vo vzťahu k tomuto konfliktu prijatými sankciami zo strany USA, GB a EÚ a jej jednotlivých členských štátov, ktoré sa týkajú nielen osôb (právnických/fyzických) ale aj stavebných materiálov ako je napr. : ropa a produkty z nej (bitúmeny, asfalty), ako i médií/energií.

Na základe vyššie uvedeného sa jedná jednak o práce, ktoré znamenajú úpravu rozsahu Diela a jeho zrealizovanie v súlade s platnou legislatívou k dátumu spracovania podkladov pre zmenový list č.4, a s touto skutočnosťou súvisiacimi dodatočnými nákladmi, ako i o cenový dopad do zmluvne dohodnutých cien rozhodujúcich materiálov, pričom tieto boli vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami.

Zhotoviteľ v čase podania ponuky nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti s potrebou ich realizácie, resp. s cenovým dopadom týkajúcim sa cien rozhodujúcich materiálov uvažovať a z uvedeného dôvodu neboli ani súčasťou ním predloženej Zmluvnej ceny.

Cena diela podlieha úpravám iba v prípadoch stanovených v zmluve o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, bod 5.6 článku V. Cena a platobné podmienky, ktorého znenie je nasledovné :

5.6 „Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.“

Zároveň dôvod pre uzavretie dodatku k zmluve je v súlade s článkom XIV. Ďalšie zmluvné dojednania bod 14.5. zmluvy o dielo - „Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku (ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.“

Máme zato, že v predmetnom prípade sú splnené podmienky pre postup podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písmeno c) v nadväznosti na § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorých znenie je nasledovné:

§18 ods. 1 Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak :

c) potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“

§ 18 ods. 3 Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Zvýšenie ceny diela je zároveň v súlade s §18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nakoľko navrhovaným zvýšením ceny diela nedôjde k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy o dielo. Práce navyše, ako i cenový dopad do dohodnutých cien rozhodujúcich materiálov sú ocenené tak, že boli použité najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.

Vo vzťahu k vyššie uvedeným skutočnostiam došlo k potrebe zmeny rozsahu diela, ako i k potrebe riešenia cenového dopadu do cien rozhodujúcich materiálov a tým aj k zvýšeniu ceny, čo však nebolo možné predvídať počas prípravy a vykonávania postupu verejného obstarávania a ani v čase uzavretia zmluvy o dielo.
