

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. ŽSK č. 543/2021/OD

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503697/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Iveta Šnauková, PhD, Bc. Jozef Zamiška
Telefón : +421/ 5032 407, +421/ 41 5032 254
E-mail. adresa : iveta.snaukova@zilinskazupa.sk,
jozef.zamiska@zilinskazupa.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **MBM-GROUP, a.s.**
Sídlo : Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO : 36 740 519
IČ DPH : SK2022337548
DIČ : 2022337548
Zastúpený : Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
Bankové spojenie : Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK31 3000 0000 0011 5625
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Marián Brontvaj, generálny riaditeľ
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ľubomír Glušík
č. oprávnenia : 11715*10-20*
Telefonický kontakt : +421 903 378 759
Email : office@mbmgroup.sk

Zapísaný v registri : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, vložka 7207/B
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.08.2021 Zmluvu o dielo č. ŽSK 543/2021/OD (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Rekonštrukcia cesty II/583 – k. ú. Zázrivá**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 5 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Dielo je realizované v rámci projektu: „**Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN-T v regióne Orava – II. etapa**“ (ďalej aj len ako „projekt“), ktorý realizuje Žilinský samosprávny kraj z **Integrovaného regionálneho operačného programu** na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: **IROP-Z-302011Q824-11-11**, ktorá bola dňa **9.3.2020** uzavretá medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Žilinským samosprávnym krajom ako prijímateľom.

Tento Dodatok č.1 k ZoD č. ŽSK 543/2021/OD je uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. X. bodom 10.3.3, písm. c) zmluvy, teda, z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa čl. III. zmluvy, objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti ako je nedodržanie termínu zo strany dodávateľa gabiónových košov, z dôvodu svetovej ekonomickej krízy, spôsobenej vojnovým konfliktom Ruskej federácie na území Ukrajiny, ktorý vypukol dňa 24. 02. 2022, keď zahájili vojská Ruskej federácie útok na Ukrajinu. Vypuknutie vojnového konfliktu na území susedného štátu nebolo možné v žiadnom prípade predpokladať a ani predvídať. Zároveň je to skutočnosť, ktorá zo strany Zhotoviteľa ako ani Objednávateľa nebola nijako zavinená a ani spôsobená. Vojnový konflikt, následkom ktorého bola spôsobená svetová ekonomická kríza, vyvolala nárasty cien, ale tiež nízku trhovú ponuku, keďže na mnohé odvetvia v Rusku boli uvalené Európskou úniou embargá a zostávajúce firmy na svetovom trhu nestíhali existujúci dopyt pokryť. Toto spôsobilo, že dodávatelia nedokázali garantovať ceny, ani termíny dodania. Dodávateľ gabionových košov - firma MACAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., so sídlom v Senici, vo svojom stanovisku zo dňa 13. 4. 2022 uvádza, že na termíny dodávok výrobkov z oceleového drôtu sú aktuálne lehoty dodania 3 mesiace.

Z dôvodu, že Zhotoviteľovi neboli dodané gabiónové koše včas, nemohol vykonávať stavebné práce na stavebných objektoch SO 02 a SO 03 v plnom rozsahu, čiže nemohol zrealizovať SO 02 a SO 03, z toho dôvodu sa dostal do omeškania, na čo bol aj stavebným dozorom v stavebnom denníku upozornený. Omeškanie však bolo spôsobené situáciou, ktorú nemohol predvídať, ani odvrátiť.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Predmetom uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. ŽSK 543/2021/OD je zmena lehoty na vykonanie Diela, podľa bodu 2 tohto článku .
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo č. ŽSK 543/2021/OD v **Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2 časti termínu na vykonanie a odovzdanie Diela sa odstavce týkajúci sa vykonania Diela mení nasledovne:**
 - **vykonanie Diela: do 5 (piatich) mesiacov a 21 dní** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť aj v prípade, ak opatrenia prijaté orgánmi verejnej moci počas krízovej situácie objektívne neumožňujú

Zhotoviteľovi pokračovať vo vykonávaní Diela; pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli, že vzájomne odsúhlasené prerušenie prác zaznamenajú zápisom v stavebnom denníku a že toto obdobie prerušenia prác nie je započítané do lehoty na vykonanie Diela.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1: Oznámenie o úprave cien a termínov dodania v súvislosti s vojnou na Ukrajine z firmy MACCAFERRI CENTAL EUROPE, s. r. o., so sídlom v Senici

V Žiline dňa 26.08.2022

V Bratislave dňa 17.08.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka, v.r.

.....
MBM – GROUP, a.s.
Bc. Alena Nováková, v.r.
predseda predstavenstva

MBM-GROUP a.s.

Miletičova 1

821 08 Bratislava

DIČ: 2022337548

IČ DPH:SK2022337548

Dátum: 13. Apríl, 2022

PREDMET: Oznámenie o úprave cien a termínov dodania v súvislosti s vojnou na Ukrajine


Vážený partner,

žiaľ, táto nečakaná vojna v srdci Európy, ktorá si vyžiadala stovky mŕtvych a milióny vysídlených ľudí, tiež spustila svetovú ekonomickú krízu, ktorá vážne zasiahuje občanov aj spoločnosti.

Úplná blokáda vývozu tovarov (medzi inými aj ocele) z Ruska a Ukrajiny do Európy, okrem prudkého nárastu cien ropy a plynu, vytvára inflačnú špirálu, ktorá hrozí, že spôsobí ďalšie silné zvýšenie cien surovín vrátane oceľového valcovaného drôtu a zinku pre naše výrobné kapacity.

Narušenie dodávateľského reťazca ocele vyvolalo v odvetví „dokonalú búrku“, pričom indexy cien nízkouhlíkovej ocele vyskočili na hodnotu viac ako 1 350€/t, čo predstavuje nárast o viac ako 60% v priebehu 3 týždňov. Informácie prichádzajúce z trhu naznačujú, že vyššie nárasty ešte len prídu v najbližších týždňoch, kvôli vysokému dopytu, nedostatku surovín a zvyšujúcim sa cenám energií a PHM.

EMEA

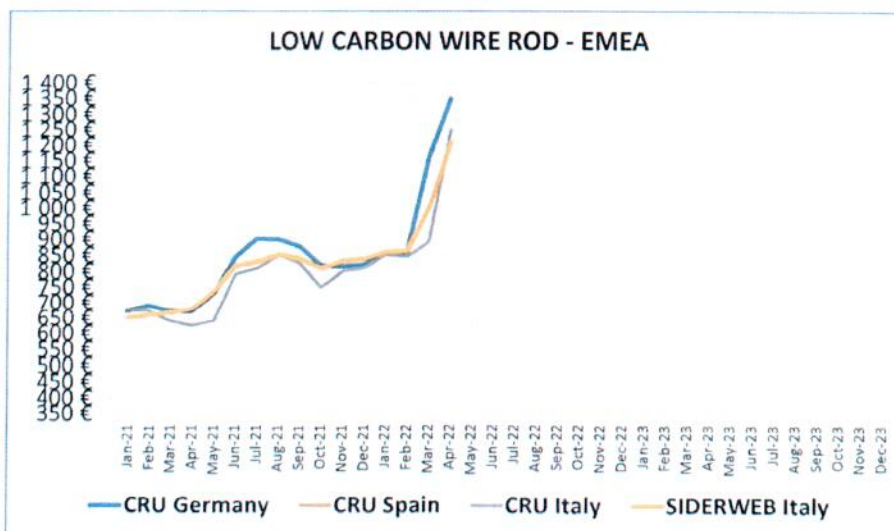

Okrem toho zvýšenie cien energií výrazne ovplyvnilo aj náklady na transformáciu oceľových prvkov (ťahanie drôtov, zváranie, galvanizáciu). Môžeme určite potvrdiť, že len náklady na ťahanie drôtu sa zvýšili o cca 100 EUR/tonu v dôsledku zvýšenia cien energií oproti cenovej hladine roku 2021.

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.

Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica

info@sk.maccalferri.com

www.maccalferri.com/sk

Commercial & Technical office:

Kopčianska 15, 851 01 Bratislava

T: +421 2 2024 0056



MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. has implemented and applies a quality management system pursuant to the standard EN ISO 9001:2008 certified by TSUS CERTICOM

Aj keď si spoločnosť Maccaferri Central Europe (Maccaferri Manufacturing Europe) zabezpečila kontraktmi nákup drôtu na apríl a máj, za týchto extrémnych okolností nám výrobcovia drôtu oznámili, že nie sú schopní dodržať zmluvné záväzky voči našej spoločnosti. Dodávatelia negarantujú ceny a ani termíny dodania. Dodatočné náklady preto nadobudli účinnosť okamžite a naša spoločnosť ich ďalej premieta do svojej politiky smerom k zákazníkom.

Vzhľadom na tieto nepredvídateľné a bezprecedentné okolnosti Vám oznamujeme, že s okamžitou platnosťou pristupujeme k aktualizácii dohodnutých cien pre dodávky tovaru v nadchádzajúcom období, s účinnosťou od 15. Apríla 2022.

V súvislosti s vyššie uvedenými faktami, sú aktuálne dodacie termíny na výrobky z oceleového drôtu z nášho výrobného portfólia nie kratšie ako 3 mesiace, pričom v prípade nepredvídateľných objektívnych okolností (v súvislosti s narušeným dodávateľským reťazcom) si naďalej vyhradzuje právo úpravy až aj vopred potvrdených termínov.

Zároveň v súčasnej turbulentnej situácii na trhu, a z dôvodov nemožnosti zakontrahovania surovín na obdobie dlhšie ako 30 dní, s cieľom zamedzenia ďalším negatívnym hospodárskym dopadom na našu spoločnosť, pristupujeme s okamžitou platnosťou k úprave cien u dohodnutých a aj nových kontraktov a taktiež zavádzame ku každej objednávke/zmluve revíznny vzorec pre úpravu cien, ktorý stanoví cenu materiálu v čase dodávky.

Tím Maccaferri je Vám samozrejme k dispozícii, tak aby sme vás podporili tým najlepším možným spôsobom pri realizácii vášho projektu a zabezpečili dodávky materiálov Green Terramesh a Terramesh system v čo najkratšej možnej dobe.

S pozdravom

Mgr. Ľuboš Lichý
obchodný riaditeľ
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica
IČO: 36274501
IČ DPH: SK2022001718
- 1 -

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica
info@sk.maccaferri.com
www.maccaferri.com/sk

Commercial & Technical office:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
T +421 2 2024 0056

