

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 170/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1. Objednávateľ: **Mesto Malacky**
Sídlo: Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení: **JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor**
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
vo veciach technických: Ing. Marek Gašpar
Bankové spojenie: PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu: 3200105003/5600
IČO: 00304913
DIČ: 2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **SYTIQ a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
v zastúpení: Ing. Juraj Kotúč – predseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj – člen predstavenstva
osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: Ing. Michal Bedaj
vo veciach technických: Ing. Slavomír Zelizňák
Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávatelom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom 170/2022 zhotoviteľa: SYTIQ a.s. zo dňa 23.03.2022 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác: **„Hromadná podzemná garáž Malacky“**.
2. Zmluvné strany sa v zmysle zmluvy, s odvolaním sa na článok III bod 2 písm. b) a e) dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č.1“).
3. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

4. Predmetom Dodatku č. 1 a zároveň dôvodom uzavretia Dodatku č. 1 je, že počas plnenia predmetu zmluvy v období od 06.04.2022 do 05.09.2022 z dôvodu:

- a) že, pretrvávali nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré bránili zhotoviteľovi v plnení si zmluvných záväzkov v požadovanej kvalite celkovo v počte 3 kalendárnych dní,
- b) v dôsledku zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa a z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré bránili zhotoviteľovi v plnení si zmluvných záväzkov sa posunul termín realizácie prác celkovo rozsahu 44 kalendárnych dní.

Celková doba vykonania diela sa predĺžila o 47 kalendárnych dní v súlade so schválenými zápismi v stavebnom denníku.

5. Zmluvné strany sa dohodli o úprave Čl. III Čas plnenia ods. 1. zmluvy v tomto znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v rozsahu stanovenom v čl. II Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať v termínoch podľa odsúhlaseného časového, vecného harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo z hľadiska času nasledovne:

- Prevzatie staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo č 170/2022.
- Dokončenie Diela: do 7 mesiacov a 47 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je stanovený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa požiadaviek objednávateľa.
- Protokolárne odovzдание predmetu Diela bez väd: do 5 pracovných dní po jeho dokončení.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že dôsledky zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa uvedených v písm. b) bodu 4 tohto článku finančne vysporiadajú v nasledujúcom dodatku k Zmluve.

6. Vzhľadom na zmeny Zmluvy uvedené v bode 5. tohto článku Dodatku č. 1 sa zmluvné strany dohodli, že príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1 v celom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu č. 2 Zmluvy.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č 170/2022 zo dňa 24.03.2022.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je :
Príloha č. 1 – Harmonogram Stavebnotechnických prác
6. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za objednávateľa:

V Malackách dňa: 10. 10. 2022

MESTO MALACKY

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa: 05. 10. 2022

SYTIQ a.s.

.....
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.


primátor mesta

.....
Ing. Juraj Kotúč

predseda predstavenstva

.....
Ing. Michal Bedaj

člen predstavenstva

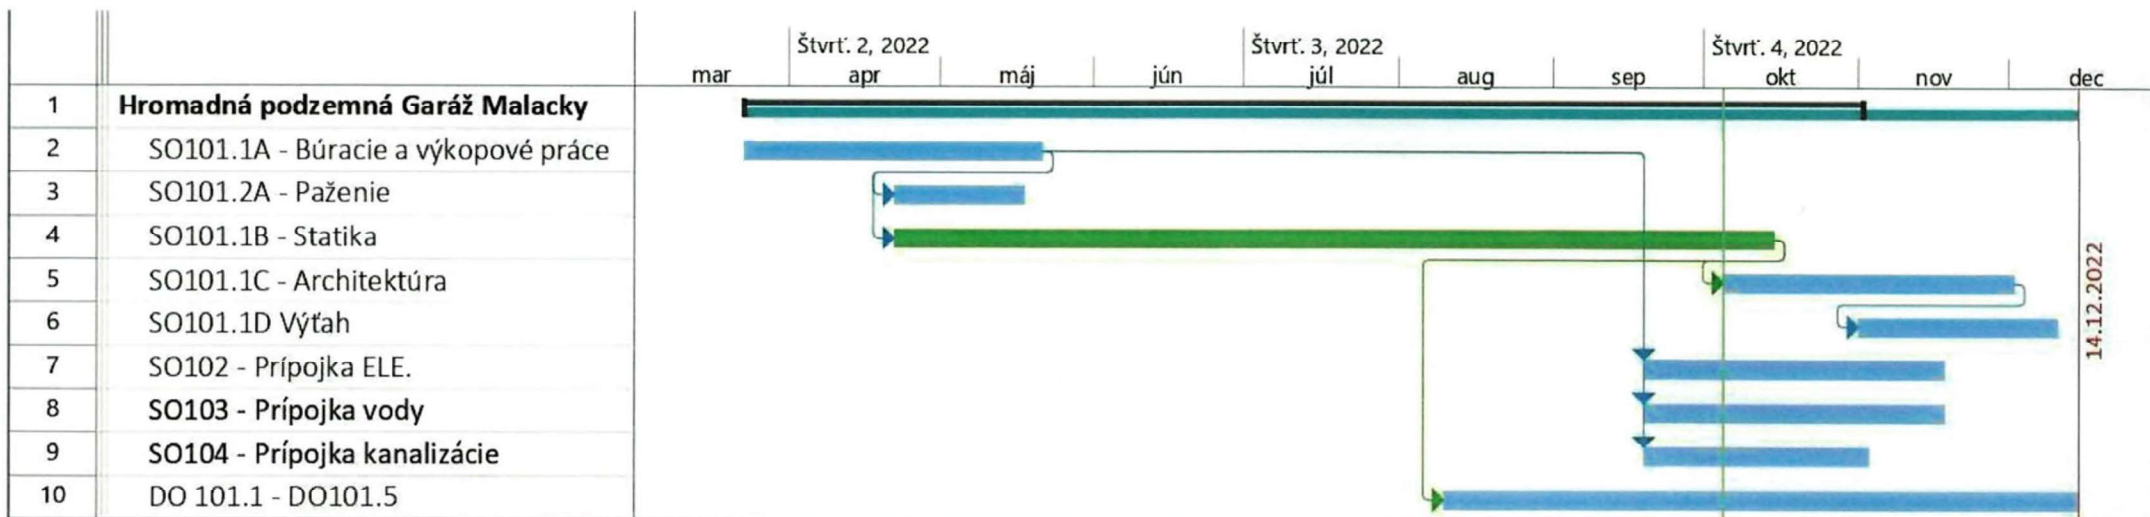

Projekt: HMG - nástrel pre ZoD
Dátum: Str 5.10.22

Úloha		Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdeliť		Neaktívny medzník		Manuálny súhrn		Termín	
Medzník		Neaktívny súhrn		Iba začiatok		Priebeh	
Súhrn		Manuálna úloha		Iba dokončiť		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Iba trvanie		Externé úlohy			
