



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

**na stavebný objekt SO 680 – Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika v km 20,9
diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever („Dodatok č. 1“)**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami

Číslo objednávateľa: ZM/2018/0325

Číslo zhotoviteľa: Z1/2018/086/15

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť
 IČO: 35 919 001
 Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúce prostredníctvom:
 Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ladislav Dudáš, PhD. – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené konať
 - vo veciach technických:

- vo veciach zmluvných:

Bankové spojenie:

IBAN:
 IČ DPH: SK2021937775
 Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B

(ďalej len "objedávateľ")

a

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
 Právna forma: akciová spoločnosť
 Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 IČO: 31 333 320
 Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 oddiel Sa, vložka číslo 581/B
 Osoba oprávnená konať: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
 Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ Závodu Bratislava, na základe potvrdenia
 o rozsahu plnomocenstva zo dňa 02.01.2019

Bankové spojenie:

IBAN:
 BIC/SWIFT:
 IČ DPH: SK7120000206

(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a každý samostatne ako „zmluvná strana“)

Preambula

Stanoviskom správcu a prevádzkovateľa objektu 680 - Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika, ktorým je Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s., IČO: 35 884 916, č. 513/ RIO/ DRS/ 2018 zo dňa 12.11.2018 bola Objednávateľovi oznámená zmena termínu uvedenia vzletovej a pristávacej dráhy RWY 22 mimo prevádzky z termínu 15.11.2018 na 15.02.2019. Z uvedeného dôvodu dochádza k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení čas plnenia diela č. 2. Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 1.

Predmet Dodatku č. 1

Zmluva o dielo č. objednávateľa ZM/2018/0325, č. zhotoviteľa Z1/2018/086/15, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.09.2018 (ďalej len „zmluva“) sa mení nasledovne:

1. **V časti III. Zmluvy, sa v Článku 2 Postup pri zhotovovaní diela bod 1 ruší a nahrádza novým znením:**

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo č. 1 v zmysle termínov uvedených v čl. 3 I. časti tejto zmluvy a dielo č. 2 do 01.06.2019 tak, aby bolo plne funkčné a užívania schopné pre plnenie potrieb letiska v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi, to znamená spolu s vydaným rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby a na to nadväzujúcich súhlasov a povolení pre potreby skúšobnej prevádzky.“

2. **V časti III. Zmluvy, sa v Článku 11 Záverečné ustanovenia bod 8 Príloha č. 1 vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 „Aktualizovaný harmonogram výstavby“ v plnom rozsahu. Zároveň sa dopĺňa Príloha č. 7 - Stanovisko správcu a prevádzkovateľa objektu 680 - Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika č. 513/ RIO/ DRS/ 2018 zo dňa 12.11.2018“. Ustanovenie bude znieť nasledovne:**

„8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram výstavby*
- Príloha č. 2 – Zoznam osôb a zakázaných predmetov, vnášaných do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska*
- Príloha č. 3 – Rozpočet*
- Príloha č. 4 – Vyhlásenie zhotoviteľa*
- Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov*
- Príloha č. 6 – Súťažné podklady, Opis predmetu zákazky*
- Príloha č. 7 – Stanovisko správcu a prevádzkovateľa objektu 680 - Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika č. 513/ RIO/ DRS/ 2018 zo dňa 12.11.2018“*

Článok 2.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní dostane každá zmluvná strana dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 1 je prejavom ich slobodnej vôle, Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1 Aktualizovaný harmonogram výstavby
Príloha č. 7 Stanovisko správcu a prevádzkovateľa objektu 680 - Svetelná približovacia sústava
Letiska M.R. Štefánika č. 513/ RIO/ DRS/ 2018 zo dňa 12.11.2018

V Bratislave, dňa: **14. JAN. 2019**

V Bratislave, dňa: **15. FEB. 2019**

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


.....
Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ ZÁvodu Bratislava
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 02.01.2019

.....
Ing. Ladislav Dudáš, ĽhD.
podpredseda predstavenstva

Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	17.9.17	24.9.17	1.10.17	8.10.17	15.10.17	22.10.17	29.10.17	5.11.17
1	680- Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4	242 dni	28.9.18	1.6.19								
2	Podpísanie zmluvy	0 dni	28.9.18	28.9.18								
3	Vypracovanie realizačného projektu	62 dni	28.9.18	28.11.18								
4	Objednávky technológií	16 dni	9.10.18	24.10.18								
5	Zadanie technológií do výroby udodávateľov zariadení	0 dni	15.10.18	15.10.18								
6	Výroba zariadení	132 dni	15.10.18	28.2.19								
7	Príprava staveniska a predpríprava zariadení na inštaláciu	97 dni	1.11.18	10.2.19								
8	RWY 22 uvedená mimo prevádzku	0 dni	15.2.19	15.2.19								
9	Svetelná približovacia sústava RWY 22 uvedená mimo prevádzku	0 dni	15.2.19	15.2.19								
10	Demontáž technológií a búracie práce	25 dni	15.2.19	11.3.19								
11	Výstavba šachiet a základov pod návestidlá	41 dni	18.2.19	30.3.19								
12	Práce v TS 5	146 dní	1.12.18	30.4.19								
13	Pokládka káblov	146 dní	1.12.18	30.4.19								
14	Montáž stožiarov	61 dni	1.3.19	30.4.19								
15	Dovoz zeminy a terénne úpravy (pôvodne 21 dní)	31 dni	31.3.19	30.4.19								
16	Montáž stožiarov a návestidiel	61 dni	1.3.19	30.4.19								
17	Previerky Dopravného úradu SR a príprava ku kolaudácii	17 dni	1.5.19	17.5.19								
18	Letové overenie a meranie kalibračným lietadlom	1 deň	20.5.19	20.5.19								
19	Kolaudácia / Predčasné užívanie	11 dni	21.5.19	31.5.19								
20	Uvedenie Svetelnej približovacej sústavy RWY 22 do prevádzky	1 deň	31.5.19	31.5.19								
21	Skúšobná prevádzka	90 dni	1.6.19	29.8.19								
22												
23												
24	Poznámka: vianočné sviatky, Nový rok a sviatok Troch kráľov sú nepracovné dni											

Projekt: Harm letisko_rev4 Dátum: 6.11.18	Úloha		Súhrn		Neaktívny medzník	Iba trvanie
	Rozdeliť		Súhrn projektu		Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn
	Medzník		Neaktívna úloha		Manuálna úloha	Manuálny súhrn

október	november	december	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

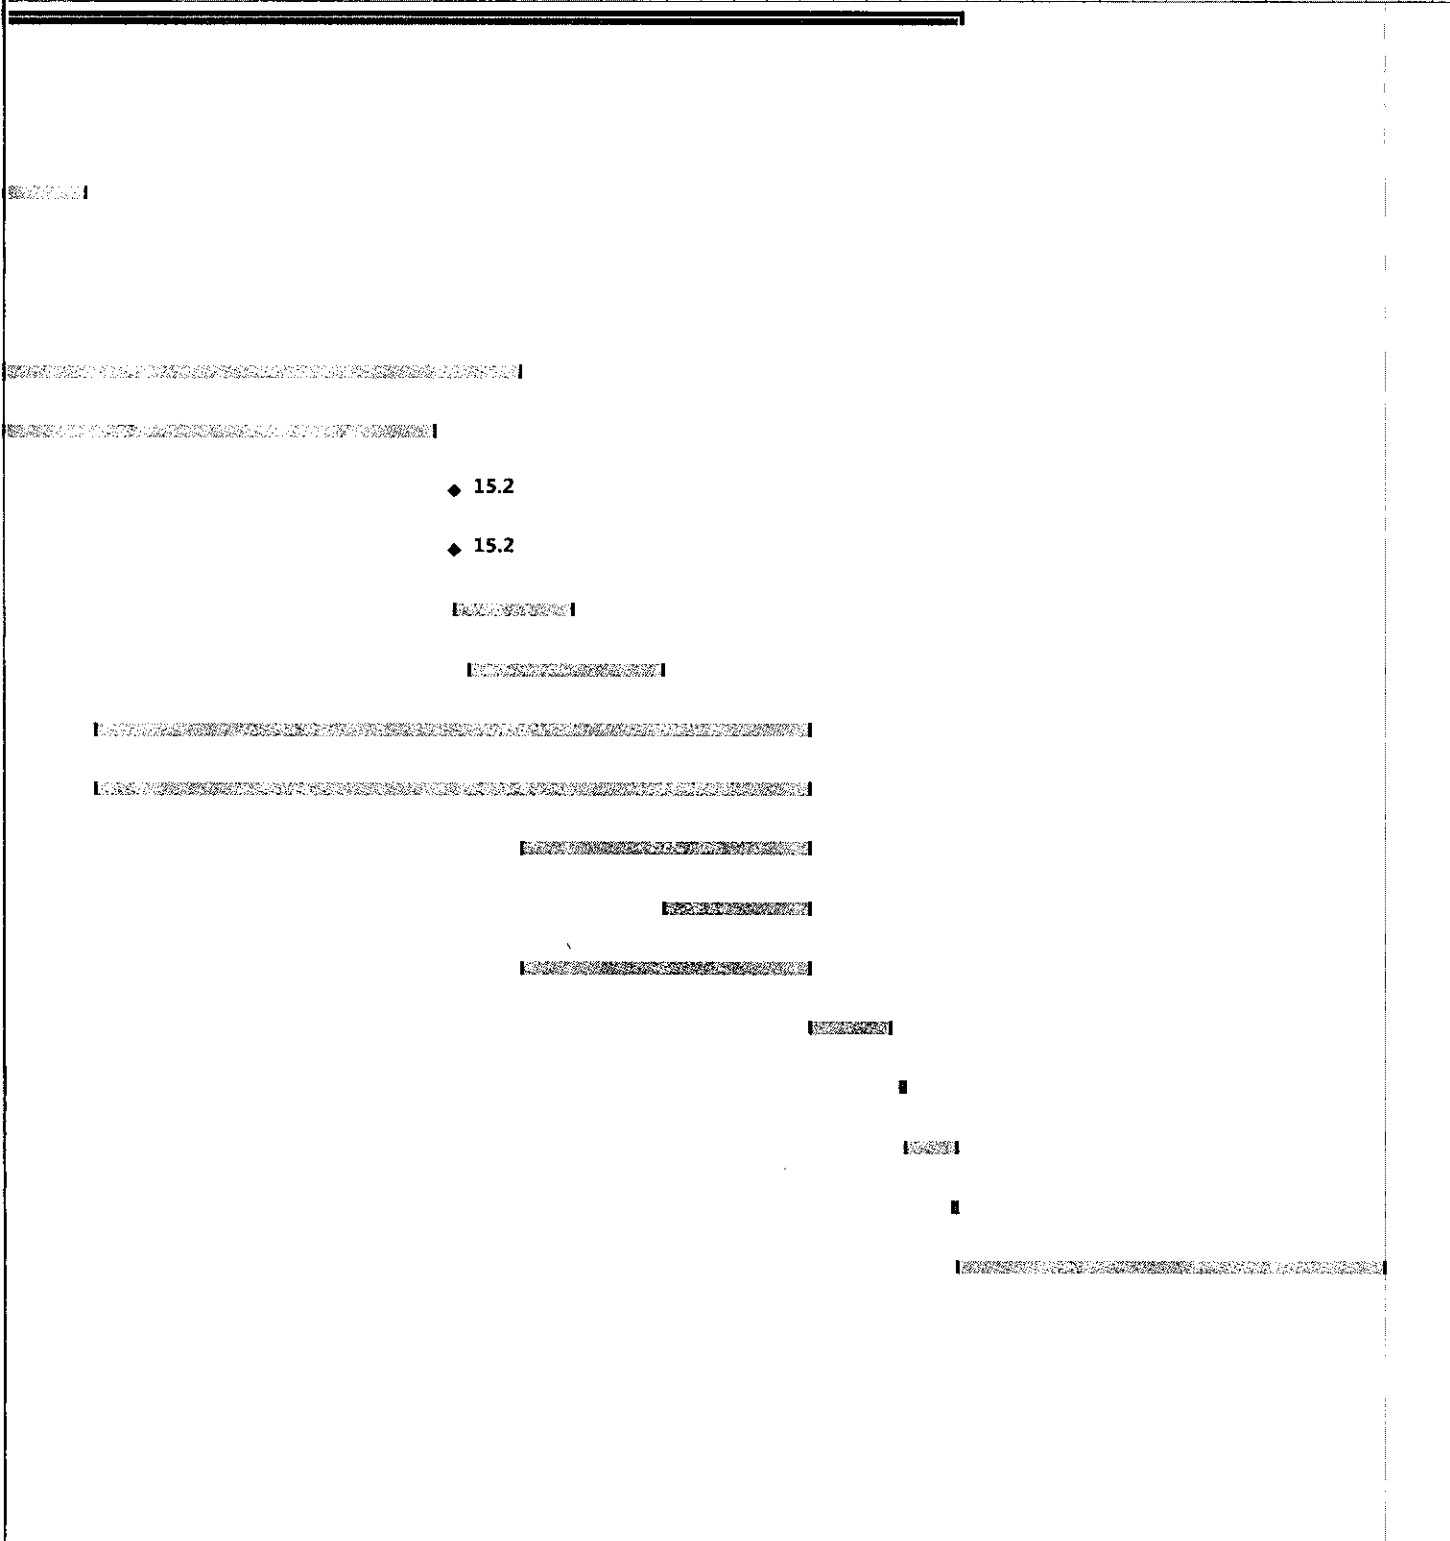

	Iba začiatok		Externý medzník		Manuálny priebeh	
	Iba dokončiť		Termín			
	Externé úlohy		Priebeh			
