

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny PS 2201 Hodinové zariadenie – zmena dĺžok káblov a oceľových roštov (ZL 44) TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY			
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	05.06.2023	Čas

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár
Vedúci stavebný dozor
Eximcom, s.r.o.

*Príloha: Ing. L. Kováčik -
06/06/2023*

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Váš list značky – zo dňa:

SR/D8/02/ZSSK/2023 zo dňa 16.01.2023

Vybavuje:

Ing. Peter Skokan

Naša značka: 14/2023/PS

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

Stavba: TECHNICKO-HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY

Vec: Pokyn č. 56/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny PS 2201 Hodinové zariadenie – zmena dĺžok káblov a oceľových roštov (ZL 44)

Vážený obchodný partner,

na základe Vášho Návrhu uskutočnenia Zmeny PS 2201 Hodinové zariadenie – zmena dĺžok káblov a oceľových roštov (ZL 44) – list pod značkou SR/D8/02/ZSSK/2023 zo dňa 16.01.2023 - ZoD a schválením investora, vydávam Pokyn č.56/2023/THU NZ na uskutočnenie Zmeny tak, ako je popísaný v Návrhu uskutočnenia Zmeny a v rozsahu prílohy č.1—Ocenený porovnávací výkaz výmer vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania zmeny – Zmenový list č.44. Podkladom pre realizáciu je schválená DRS pre PS 2301.

Predpokladaný finančný rozsah týchto prác (Zmeny) podľa zhotoviteľom oceneného

ZVV = 3 166,50€.

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email:



Zdrúženie MDŽ - NZ:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D8/02/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. Václavik Pavel
Mobil:

Nové Zámky
16.1.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 44 – PS 2201 Hodinové zariadenie

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Zdrúžením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre prevádzkový súbor PS 2201 Hodinové zariadenie a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:


- Došpecifikovanie a úprava riešenia káblových trás v detailoch pre realizáciu, ktoré neboli riešené v DSP a v súlade s dispozičnými zmenami v rámci stavebných objektov SO 3401 - Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3402 - Hala stabilného umývača podľa aktuálnej dispozície DRS.

prevzaté 16.1.23




Po prepočítaní dĺžok káblových trás a káblových konštrukcií na základe DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.

- Vytvorenie káblových nosných systémov - oceľové žľaby a rošty pre káblové trasy v priestore strešných väzníkov a v podhladoch administratívneho prístavku
- Úprava dĺžok káblov podľa dispozície DRS

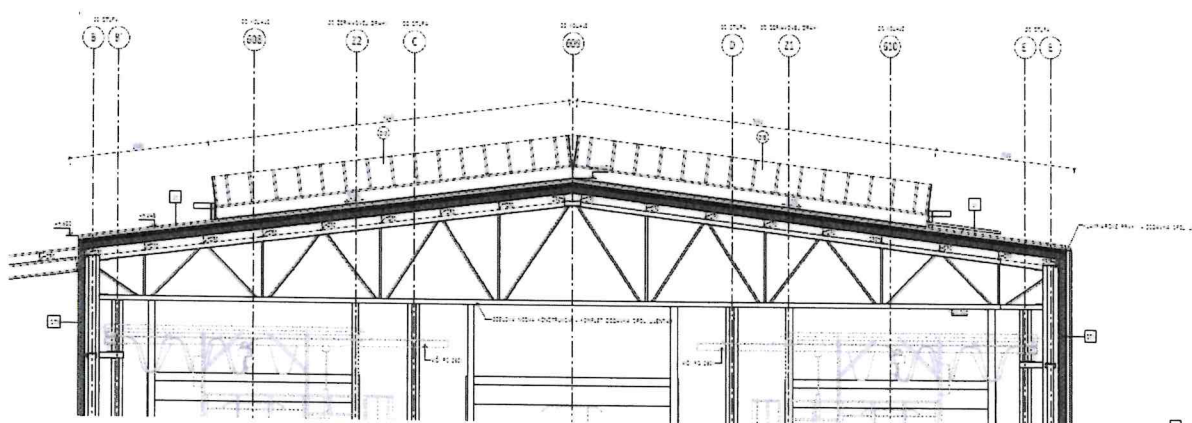

Tvar strešných väzníkov DRS

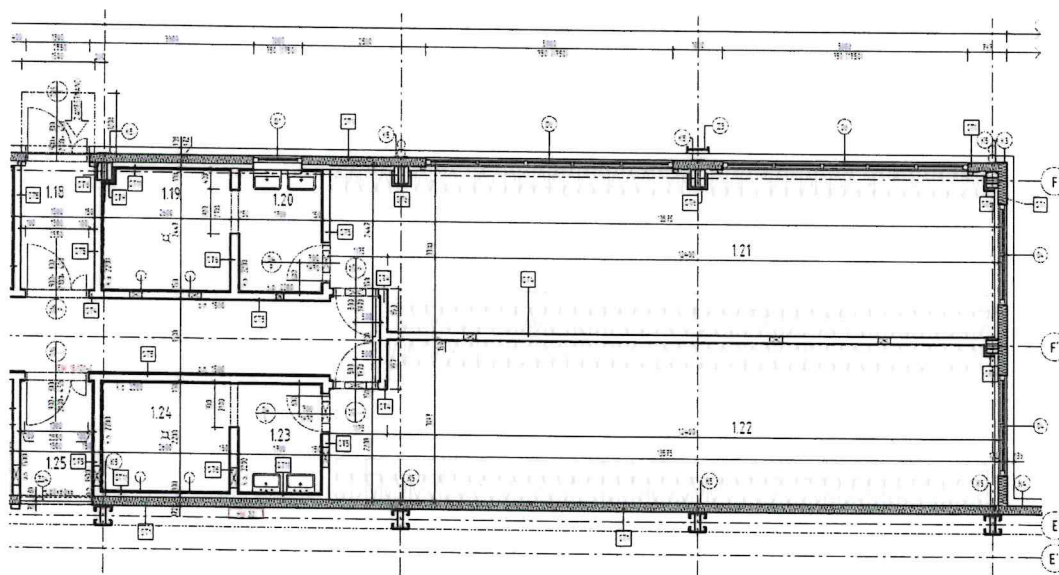

Pôdorys administratívneho prístavku DRS



Odôvodnenie Zmeny:

- Zapracovanie aktuálne platných noriem a vyhlášok (návrh káblových nosných systémov)
 - **Po prepočítaní dĺžok na základe DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.**
- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

ing. Pavel Václavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

STAV
s.r.o., Bratislava
IČO: 31 792 693
IČ DPH: SK2020253301

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 44 – 2201

Príloha číslo 2: Vyjadrenie PS 2201 – Hodinové zariadenie

Stavba: Technicko - hygienická údržba železničných kofajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
Objekt: PS 2201 Hodinové zariadenie

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., 832 72 Bratislava

P.Č.		KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD (DSP)				Zmenový list č.44 (DRS REV01)				Zmluvná cena po Zmenovom liste č.44	
1	2	3		4	5	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Čenový Údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom		
45.34.21 INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK															
1			91120401	Pristroje ističe NN inštalácie jednotlivé (Jednopolový istič do 16A, prepäťová ochrana, Kábel CYKY-J3x1,5, vodiče, šnúry a káble medené, Krabice, svorkovnice)	ks	1,00	69,85	69,85		0,00	0,00	1,00	69,85		
2			92050101	Slaboprúdové zariadenia - časové, ústredne (Hodinová ústredňa 4-linky)	ks	1,00	1 920,00	1 920,00		0,00	0,00	1,00	1 920,00		
			92050101	Slaboprúdové zariadenia - časové, ústredne (Hodinová ústredňa 1-linka)	ks	1,00	1 631,00	1 631,00		0,00	0,00	1,00	1 631,00		
3			92050103	Slaboprúdové zariadenia - časové, jednotný čas - hodiny jednostranné (Podružné hodiny okružie s priemerom 28 - 30cm)	ks	27,00	98,70	2 664,90		0,00	0,00	27,00	2 664,90		
			92050103	Slaboprúdové zariadenia - časové, jednotný čas - hodiny jednostranné (Podružné hodiny okružie s priemerom 30 - 40cm)	ks	12,00	154,80	1 857,60		0,00	0,00	12,00	1 857,60		
4			91021302	Ocelové konštrukcie - káblové žľaby plastové (bezhalogénový elektroinšt. žľab)	m	390,00	19,65	7 663,50		-140,00	-2 751,00	250,00	4 912,50		
				Došpecifikovanie a úprava riešenia podľa aktuálnej dispozície DRS. Trasovanie nebolo riešené v DSP. Rev00											
			91021302	Ocelové konštrukcie - káblové žľaby plastové (elektroinšt. žľab)	m	230,00	14,35	3 300,50		-110,00	-1 578,50	120,00	1 722,00		
				Došpecifikovanie a úprava riešenia podľa aktuálnej dispozície DRS. Trasovanie nebolo riešené v DSP. Rev00											
5			91080107	Káble Cu - NN označovacie (ulož. v chráničkách)	m	420,00	3,21	1 348,20		200,00	642,00	620,00	1 990,20		
				Došpecifikovanie a úprava riešenia podľa aktuálnej dispozície DRS											
			91080107	Káble Cu - NN označovacie (ulož. pevne)	m	390,00	2,42	943,80		440,00	1 064,80	830,00	2 008,60		
				Došpecifikovanie a úprava riešenia podľa aktuálnej dispozície DRS											
6			92050701	Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie	ks	2,00	2 100,00	4 200,00		0,00	0,00	2,00	4 200,00		
7			92050702	Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie	ks	2,00	700,00	1 400,00		0,00	0,00	2,00	1 400,00		
A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene								26 999,35		-2 622,70		24 376,65			
C. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny															
8			91020101	Ocelové konštrukcie - káblové rošty - norm. vyhotovenie, kovové	m	0,00	14,12	0,00	SO 3401, pol 4	410,00	5 789,20	410,00	5 789,20		
				Došpecifikovanie a úprava riešenia podľa aktuálnej dispozície DRS. Trasovanie nebolo riešené v DSP. Rev00											
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:								0,00				5 789,20			

TRANSSERVIS, a.s.
Rozvojová 2
040 11 Košice**Odoslané e-mailom:**

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

0026/2112//32/Ši

Ing. Gabriel Šimon

03.01.2023

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:**PS 2201 – Hodinové zariadenie***Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky*

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby a s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s do špecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie prevádzkového súboru PS 2201 a najmä s rešpektovaním dispozičných zmien vykonaných v rámci stavebných objektov SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3402 – Hala stabilného umývača, SO 3405 – Stavebné úpravy na fekálnej koľaji.

Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného prevádzkového súboru v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom,

Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Nové Zámky
