

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	9.7.2023	Čas	20:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 , Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.066/2023/THUHE SO 3801 Úprava prístupovej komunikácie, SO 3802 Úprava chodníka

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy SO 3801 Úprava prístupovej komunikácie, SO 3802 Úprava chodníka pod listom SR/D3/18/ZSSK/2023 zo dňa 1.05.2023, Vám na základe článku 9.1.4.4 ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

- Doplnenie plochy pre osadenie technológií odpadového hospodárstva.
- Položenie PVC fólie pre zamedzenie priesakov z okapov
- Spádovanie plochy a doplnenie uličnej vpuste
- Vytvorenie asfaltovej plochy so skladbou podľa PD.
- Na ploche chodníkov realizácia finálnej povrchovej úpravy asfaltových plôch za zámkovú dlažbu.
- Doplnenie chodníkov v priečnom smere objektu SO 3401 hala HPOS
- Doplnenie chodníkov k objektu SO 3402
- Doplnenie parkovacích plôch. Plochy doplniť o štrkové podložie s finálnou asfaltovou úpravou.
- Pôvodné betónové plochy a podložie odstrániť. Spádovanie plôch prispôbiť do uličnej vpuste UV7
- Pred administratívnou budovou na základe požiadavky o doplniť priestor pre možné parkovanie bicyklov. Plocha bude doplnená o štrkové podložie s finálnou úpravou zo zámkovej dlažby.
- Plochy doplniť o chodníky zo zámkovej dlažby a betónu.
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.
- Cenu za práce zhotoviteľ môže fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie v zmysle zmluvných podmienok v zmysle ZoD.

- Bez toho , aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom.

S pozdravom



Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť
2. Rozpočet – zmenový listu

točenie Zmeny zo dňa 8.6.2023

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor Investora

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/18/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. František Jantek
Mobil:

Humenné
01/05/2023

Zmluva: č.4600005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
pre stredisko Humenné**

Vec: Žiadosť o vydanie Pokynu

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 3.3.3 Vás žiadame o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1. Zmluvy pre stavebný objekt:

- SO 3801 Úprava prístupovej komunikácie
- SO 3802 Úprava chodníka

Počas prípravy realizačnej projektovej dokumentácie vznikla požiadavka na úpravu projektovej dokumentácie s ohľadom na prispôsobenie plôch prevádzke a užívaniu depa

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ prekladá:

(a) popis navrhovaných naviac prác, ktoré boli vykonané a je treba vykonať ako aj harmonogram ich uskutočnenia,

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS


korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Popis zmeny:

- Na žiadosť objednávateľa bola doplnená plocha pre možné osadenie odpadového hospodárstva. Daná plocha bude zabezpečená PVC fóliou, ktorá bude zamedzovať priesaku možných vzniknutých okapov z odpadov. Spádovanie plochy bude prispôbené doplnenej uličnej vpuste, ktorá bude kanalizáciou napojená na ORL. Povrch bude vytvorený asfaltom, pod ktorým bude vytvorené štrkové podložie v zmysle návrhu projektanta. Pôvodne uvažovaná plocha, nachádzajúca sa vedľa administratívnej budovy bude nahradená parkovacími miestami.

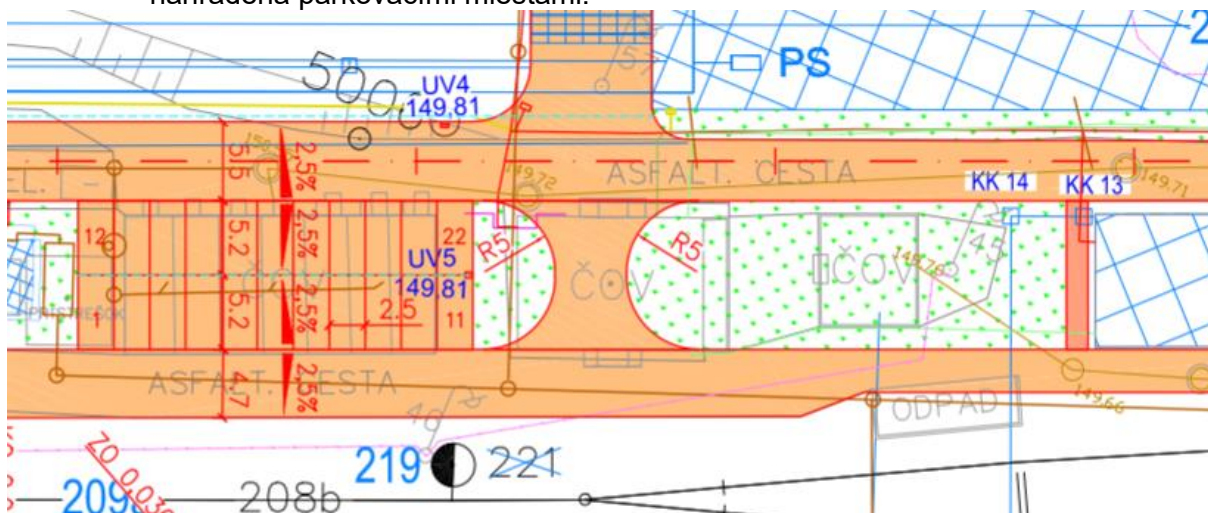

Obrázok č.1 Plocha pre rozšírenie a posun pre skladové hospodárstvo (DSP)



Obrázok č.2 Plocha po úprave, doplnenie plochy pre odpadové hospodárstvo (DRP)


ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

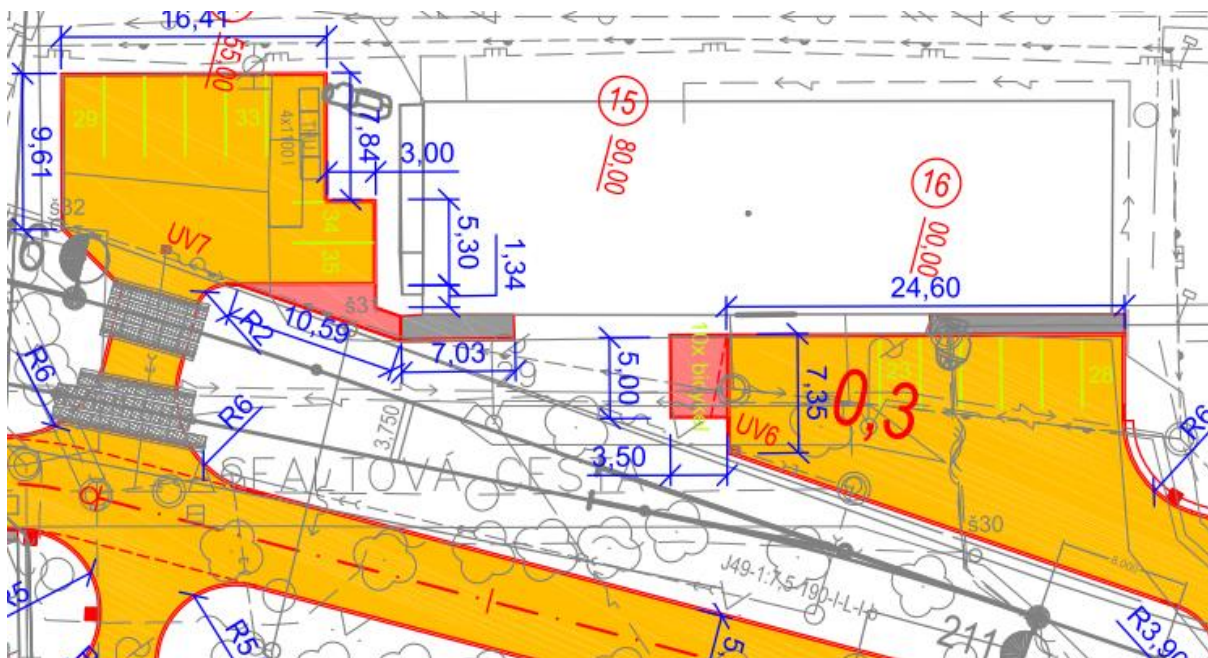

Obrázok č.4 Plocha po úprave, doplnenie plochy pre parkovacie miesta, doplnenie chodníkov, doplnenie parkovania bicyklov (DRP)

Odôvodnenie zmeny:

- Doplnenie plôch odpadového hospodárstva s prispôbením požiadaviek užívateľ
- Doplnenie parkovacích miest pri administratívnej budove
- Doplnenie plochy pre parkovanie bicyklov
- Doplnenie chodníkov, z hľadiska bezpečnej prevádzky
- Zámena povrchovej úpravy chodníkov zmenou zámkovej dlažby za asfalt. pre možné úpravy aj v prípade budúcich zmien resp. doplnení rozvodov a iného.

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstva zistené počas projektovania a realizácie diela.

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o združení schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

Prílohy:

Príloha č. 1: Položkový rozpočet

Príloha č. 2: Realizačná projektová dokumentácia

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

SO 3801, 3802_Úprava komunikácií				ZoD			Zmenový list č.34			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.34	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
		2253 " odstránenie obrubníkov_SO 3801									
K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m		3,61		Cenkros	33,000	119,13	33,000	119,13
		33,000									
		SO 3801									
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			6 675,36 €		6 675,36 €
SPOLU bez DPH				€		441 847,63 €			193 234,30 €		635 082,14 €

Združenie MDŽ – HE
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

1301 /2106/2023

Vybavuje/linka

Ing. Noga Gabriel

Košice

1.5.2023

Vec

**„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta**

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „ Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava. Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky Zhotoviteľa stavby.

SO 3801 Úprava prístupovej komunikácie SO 3802 Úprava chodníka

Na žiadosť objednávateľa bola doplnená plocha pre možné osadenie odpadového hospodárstva. Asfaltová plocha je projekčne navrhnutá na uskladnenie kontajnerov s odpadom. Je vyspádovaná do uličnej vpuste, ktorá je napojená na ORL a bude zabezpečená PVC fóliou, ktorá bude zamedzovať priesaku možných vzniknutých okapov z odpadov. Spádovanie plochy bude prispôbené doplnenej uličnej vpuste, ktorá bude kanalizáciou napojená na ORL.

Pôvodne uvažovaná plocha, nachádzajúca sa vedľa administratívnej budovy bola nahradená parkovacími miestami na žiadosť zhotoviteľa.


IČO: 31664288
IČ DPH: SK2020485115

OR: Okr. súd Košice 1
Odd: Sa, vl. č.: 366/V

Bankové spojenie
VÚB, a.s., Košice mesto
č.ú.: 61206-512/0200
IBAN: SK08 0200 0000

0000 6120 6512

BIC(SWIFT): SUBASKBX

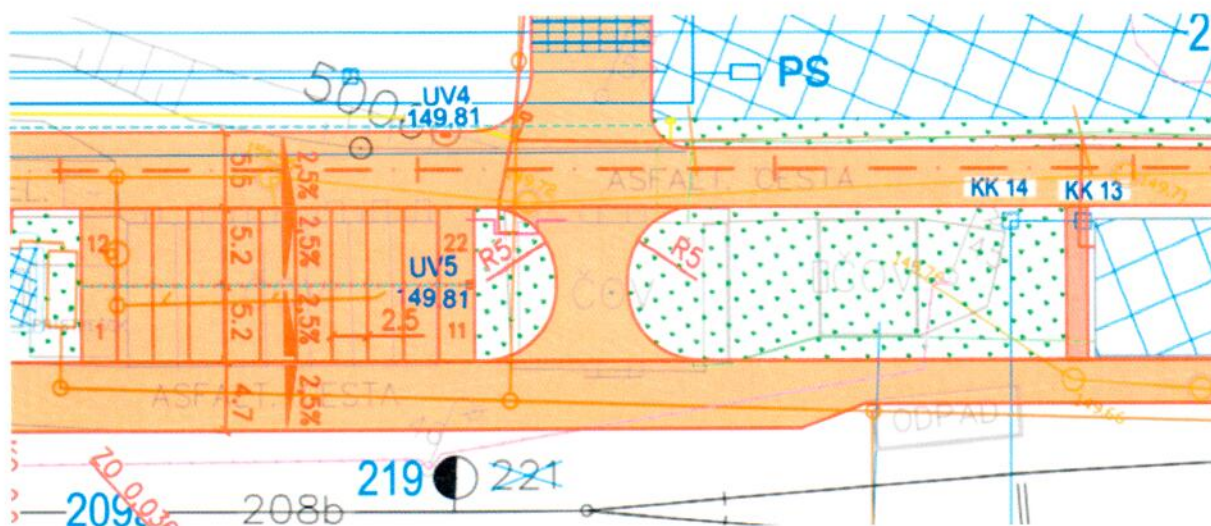


Obrázok č.1 Plocha pre rozšírenie a posun pre skladové hospodárstvo (DSP)




Obrázok č.2 Plocha po úprave, doplnenie plochy pre odpadové hospodárstvo (DRS)

Zmeny DRS na základe požiadavky objednávateľa:

- Na ploche chodníkov bola dohodnutá zámena finálnej povrchovej úpravy asfaltových plôch za zámkovú dlažbu.
- Doplnenie chodníkov v priečnom smere objektu SO 3401 hala HPOS
- Doplnenie chodníkov k objektu SO 3402
- V priestore pri administratívnej boli v zmysle požiadavky doplnené parkovacie plochy. Plochy budú doplnené o štrkové podložie s finálnou asfaltovou úpravou. Pôvodné betónové plochy a podložie je potrebné odstrániť. Spádovanie plôch bude prispôbené do uličnej vpuste UV7
- Pred administratívnou budovou vznikla požiadavka o doplnenie priestoru pre možné parkovanie bicyklov. Plocha bude doplnená o štrkové podložie s finálnou úpravou zo zámkovej dlažby.
- Plochy boli taktiež doplnené o chodníky zo zámkovej dlažby a betónu.

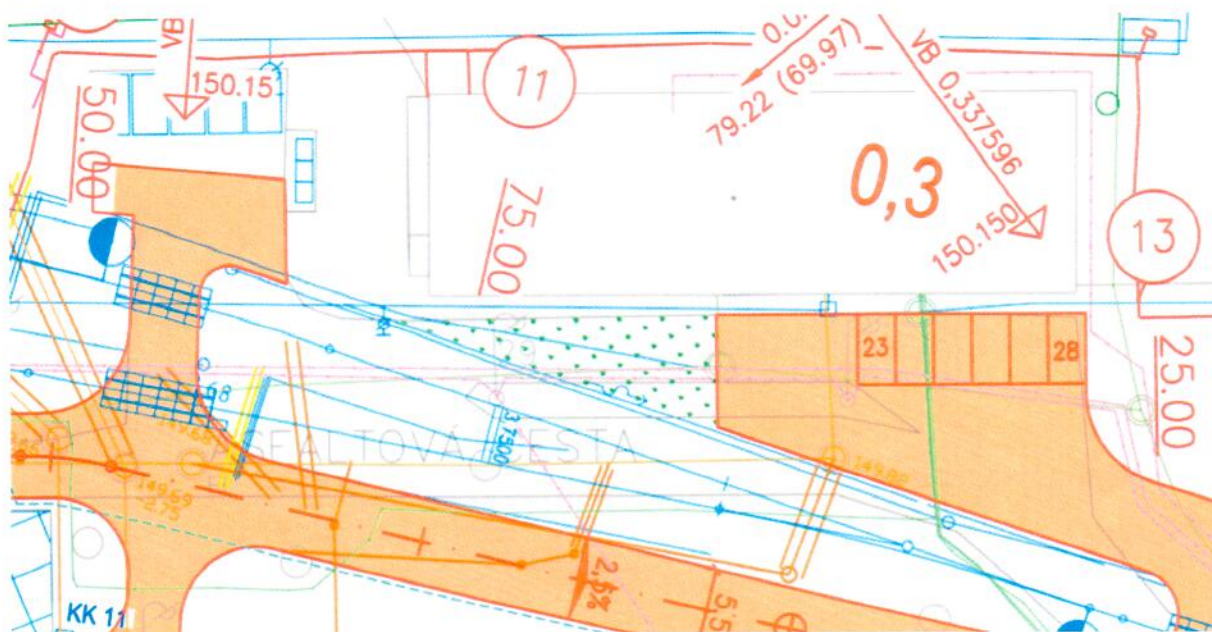

Obrázok č.3 Plocha pre doplnenie parkovacích miest + státie bicyklov (DSP)

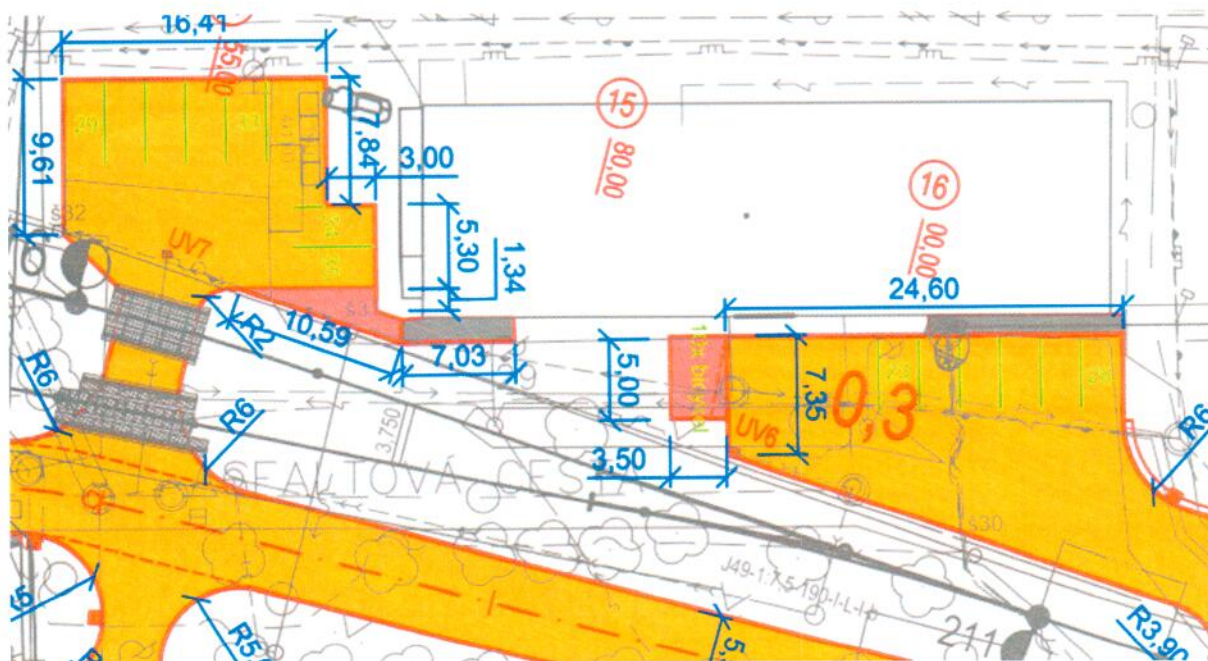

Obrázok č.4 Plocha po úprave, doplnenie plochy pre parkovacie miesta, doplnenie chodníkov, doplnenie parkovania bicyklov (DRP)

S pozdravom

SUD

040 01 K

re, a.s.

Žriedlová 1

4 -

Ing. Ján Tóth
riaditeľ a.s.

IČO: 31664288
IČ DPH: SK2020485115

OR: Okr. súd Košice 1
Odd: Sa, vl. č.: 366/V

Bankové spojenie
VÚB, a.s., Košice mesto
č.ú.: 61206-512/0200
IBAN: SK08 0200 0000

0000 6120 6512

BIC(SWIFT): SUBASKBX
