

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na stavbu: „Futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige“ dňa 25.7.2023, v znení dodatku č. 1 zo dňa 31.7.2023 (ďalej len „Zmluva“)

Číslo zmluvy Objednávateľa: 10/2023

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 03/2023

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Mestské športové zariadenia s.r.o.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Ing. Marta Gutraiová, konateľ

Ing. Matej Géci konateľ

Osoby oprávnené k jednaniam

- vo veciach realizačných :

(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO:

51 317 290

DIČ:

2120692288

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN :

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 69453/L

Tel.:

+421 44 5565447

E-mail:

info@mszlm.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené jednať :

- vo veciach realizačných:

AKORD stavby, s.r.o.

Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo

Peter Hvolka, konateľ

Bc. Peter Hvolka

Ing. Vladislav Páterek

Ing. Róbert Habiňák

44 720 955

SK2022798470

IČO:

IČ-DPH:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51135/L

Tel.:

+421 905 308 214, +421 908 200 352

E-mail:

hvolka@akordsro.sk, tpv@akordsro.sk

(ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

- A. V Zmluve, ktorej znenie vyplynulo z verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), bola stanovená podmienka účinnosti Zmluvy naviazaná na podpísanie zmluvy o dotácii s Fondom na podporu športu. Získanie požadovanej dotácie bolo nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie financovania predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa.

- B. V súvislosti s dlhšími procesmi schvaľovania dotácie zo strany Fondu na podporu športu došlo k odovzdaniu staveniska Zhotoviteľovi a k začatiu stavebných prác dňa 07.08.2023. Termín na dokončenie diela je 190 dní od odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy.

II. PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Preambule tohto dodatku sa Zmluvné strany v súlade s článkami Zmluvy č. 4.1, 4.3 a 14.2, ako aj a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní dohodli na nasledovných zmenách v znení Zmluvy:
 - 1.1 V článku 4.1 Zmluvy sa mení pôvodné znenie vety: „Dokončenie: do 190 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom“ na nové znenie: „Dokončenie: do 30.04.2024“
 - 1.2 Pôvodné znenie prílohy č. 2 Zmluvy - Harmonogram stavebných prác – sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu tohto dodatku.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a ich vzájomnej dohode, a na znak súhlasu s jeho obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

Príloha: Harmonogram stavebných prác

V Liptovskom Mikuláši, dňa 01.02.2024

V Námestove, dňa 29.01.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Marta Gutraiová
Konateľ

.....
Peter Hvolka
Konateľ


.....
Ing. Matej Géci
Konateľ

Harmonogram prác

Obstarávateľ: Mestské športové zariadenia s.r.o., Liptovský Mikuláš

Dodávateľ: AKORD stavby s.r.o., Námestovo

Stavba: Futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige

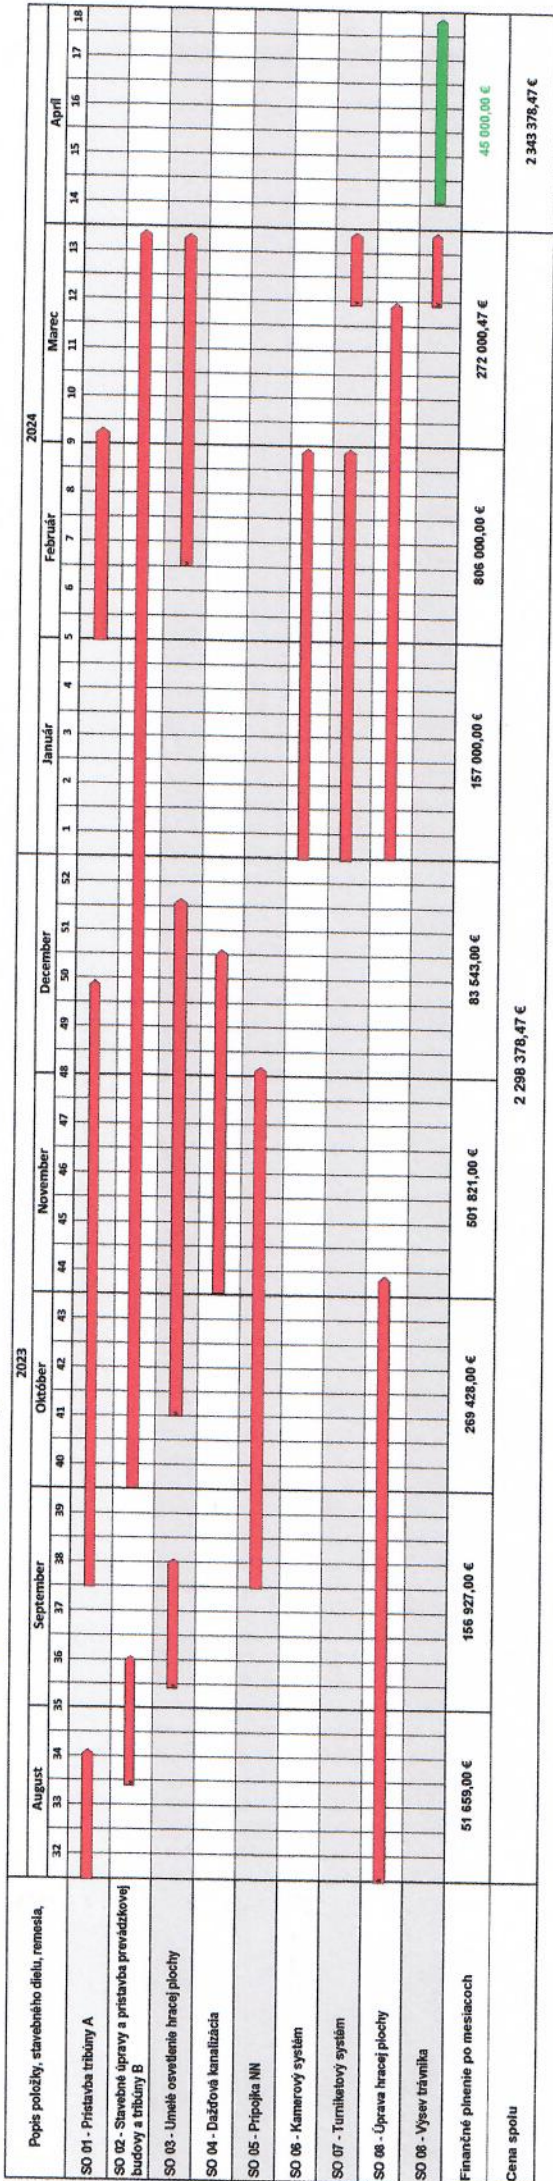

V Námestove 30.01.2024

Peter Hvoinka, konateľ spoločnosti

V harmonograme je uvádzané s dokončením SO 02 do konca marca - dokončenie finálnej úpravy podlahy, musia sa splniť vzhľadom požiadavky na pokládku PVC podlahy(linoleum)

V harmonograme je uvádzané s dokončením SO 02 do konca marca - dokončenie oceľovej konštrukcie na ochranné siete sa zrealizuje pri tribúne A po presune celkového množstva vegetačnej vrstvy, nachádzajú sa v mieste prístupovej komunikácie na hraciu plochu

V harmonograme je uvádzané s dokončením SO 07 do konca marca - dokončenie montáže turniketov sa zrealizuje pri tribúne A po presune celkového množstva vegetačnej vrstvy, nachádza sa v mieste prístupovej komunikácie na hraciu plochu

V harmonograme je uvádzané s dokončením SO 03 do konca marca - dokončenie montáže kabelových rozvodov v exteriéri v závislosti na teplotných pomeroch

V harmonograme je uvádzané s dokončením SO 03 do konca apríla - Vegetačná vrstva je pripravená(namiešaná podľa protokolu miešania), pri príznačnom počasi sa bude nakladať, presúvať, rozhltnať a následne sa zaseje trávnik.
