



**Dodatok č.4 k zmluve na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR),  
dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
dokumentácie na ponuku (DP), majetkovoprávne vysporiadanie (MPV), inžiniersku činnosť  
(IČ) a výkon autorského dozoru (AD)  
na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: ZM/2011/0423

Číslo zhotoviteľa: 7732-00

**Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
**Ing. Milan Gajdoš**, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Viktória Chomová**, podpredsedníčka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 35 919 001

DIČ: 2021937775

IČ DPH: SK2021937775

Tel./Fax:

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Kominárska 2, 4 , 832 03 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť,  
Zápis v obchodnom registri: zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
v zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Bartolomej Šechný**,  
podpredseda predstavenstva  
**Ing. Igor Jakubík**,  
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 31 322 000

DIČ: 202054770

Tel./Fax:

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

## PREAMBULA K DODATKU č.4 K ZMLUVE

Dodatok č.4 k zmluve sa uzatvára na základe žiadosti objednávateľa o predloženie návrhu dodatku č.4 zo dňa 17.01.2013. Dodatok č.4 k zmluve sa uzatvára v súlade s čl. 6 bod 6.7 časť 1 tejto zmluvy. Predmetom dodatku č.4 k zmluve je dopracovanie častí dokumentácie:

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti stavby podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane netechnického zhrnutia,
- primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 podľa prílohy 6.3 Smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (samostatná časť).

Vzhľadom k zmene rozsahu a obsahu predmetu diela časti 1 tejto zmluvy mení sa termín plnenia diela a cena diela. Z dôvodu zmeny ceny diela podľa čl. 6 bod 6.8 časť 1 tejto zmluvy je cena navyše prác ocenená podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.

Z dôvodu pretrvávania nemožnosti zabezpečenia vstupov na pozemky tretích osôb pre vykonanie inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu (IGHP), termíny plnenia diela uvedené v dodatku č.4 k zmluve vychádzajú z predpokladu zabezpečenia právoplatnosti rozhodnutia o vstupoch na pozemky a vykonateľnosti podrobného IGHP v termíne do 15.03.2013. V prípade, že uvedený termín nebude dodržaný z objektívnych dôvodov dohodli sa zmluvné strany, že zmenu termínov plnenia budú riešiť novým dodatkom k zmluve.

**Preambula sa mení a znie nasledovne:**

### PREAMBULA

Nakoľko ide o veľmi rozsiahly predmet zmluvy, zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti :

- Časť 1., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti stavby podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane netechnického zhrnutia, primeraného posúdenia vplyvu územia NATURA 2000 podľa prílohy 6.3 Smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (samostatná časť), stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP),
- Časť 2., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností (MPV),
- Časť 3., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok vykonania inžinierskej činnosti (IČ),
- Časť 4., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu autorského dozoru (AD),
- Časť 5., predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto zmluvy.

## ČASŤ 1

### Čl. 2

#### PREDMET DIELA

**V čl. 2 sa mení bod 2.1, ktorý znie nasledovne:**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, a to :

- 2.1.1 dokumentáciu na územné rozhodnutie (ďalej len „DUR“),
- 2.1.2 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti stavby podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane netechnického zhrnutia (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti stavby“),
- 2.1.3 primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 podľa prílohy 6.3 Smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (samostatná časť) (ďalej len „posúdenie vplyvu územia NATURA 2000“),
- 2.1.4 dokumentáciu stavebného zámeru (ďalej len „DSZ“),
- 2.1.5 dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“),
- 2.1.6 dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“).

### Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA

**V čl. 3 sa menia body 3.1 a 3.2, ktoré znejú nasledovne:**

- 3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 časti 1 je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), majetkovoprávne vysporiadanie (MPV), inžiniersku činnosť (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“ vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „Súťažné podklady“) a v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 17.12.2012.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa bodu 3.1 tohto článku v rámci dohodnutej ceny takto :
- 3.2.1 DUR v 6 súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD
- 3.2.2 zmena navrhovanej činnosti stavby 7x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na CD
- 3.2.3 posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 7x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na CD
- 3.2.4 DSZ v 6 súpravách v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD, resp. DVD
- 3.2.5 DSP v 6 súpravách v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD, resp. DVD
- 3.2.6 DP v 6 súpravách v tlačenej forme a 100 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD
- 3.2.7 výtlačky navyč z DUR:
- |   |       |
|---|-------|
| ➤ prehľadná situácia M 1:10 000   | 10 x  |
| ➤ situácia stavby M 1:5 000   | 10 x  |
| ➤ ortofotomapa M 1:5 000  | 10 x  |
| ➤ geometrické plány – overený trvalý záber  | 3 x   |
| ➤ geometrické plány – dočasný záber   | 3 x   |
| ➤ geometrické plány – ročný záber   | 3 x   |
| ➤ výkupový elaborát   | 3 x   |
| ➤ informačný bulletin z DUR v tlačenej forme:   | 100 x |
| v digitálnej forme navyč:   |       |
| ➤ ortofotomapa  | 1x    |
| ➤ informačný bulletin z DUR v slovenskom jazyku v digitálnej forme na CD (text, vizualizácie, animácie, ortofotomapy a pod.): | 2 x   |
- 3.2.8 výtlačky navyč z DSP
- |                                    |      |
|------------------------------------|------|
| ➤ prehľadná situácia M 1:10 000    | 10 x |
| ➤ situácia stavby M 1:5 000        | 10 x |
| ➤ ortofotomapa M 1:5 000           | 10 x |
| ➤ podklady pre vyňatie z PPF a LPF | 2 x  |
| v digitálnej forme navyč           |      |
| ➤ ortofotomapa                     | 1x   |

### Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

**V čl. 5 sa mení bod 5.3, ktorý znie :**

- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **22.11.2013**.

**Do čl. 5 sa dopĺňajú body 5.14, 5.15 a 5.16, ktoré znejú nasledovne :**

- 5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **zmenu navrhovanej činnosti stavby** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dodatku č.4 k tejto zmluve**.
- 5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **posúdenie vplyvu územia NATURA 2000** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dodatku č.4 k tejto zmluve**.
- 5.16 Na odovzdanie a prevzatie diela podľa bodov 5.14 a 5.15 sa primerane použijú ustanovenia bodov 5.7 až 5.13 tohto článku.

Čl. 6CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 6 sa menia body 6.2 a 6.3, ktoré znejú nasledovne:

## 6.2

## 6.2.1 Pôvodná cena podľa zmluvy:

- a) Cena DUR bez DPH v EUR: 41 584,16 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 8 316,83 €  
 Cena DUR vrátane DPH v EUR: 49 900,99 €  
 (slovom: štyridsaťdeväťtisícdeväťsto celých a deväťdesiatdeväť stotín eura);
- b) Cena DSZ bez DPH v EUR: 176 343,92 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 35 268,78 €  
 Cena DSZ vrátane DPH v EUR: 211 612,70 €  
 (slovom: dvestojedenásťtisícšesťstodvanásť celých a sedemdesiat stotín eura);
- c) Cena DSP bez DPH v EUR: 223 098,63 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 44 619,73 €  
 Cena DSP vrátane DPH v EUR: 267 718,36 €  
 (slovom: dvestošesťdesiatsedemtisícsemstoosemnásť celých a tridsaťšesť stotín eura);
- d) Cena DP bez DPH v EUR: 132 737,66 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 26 547,53 €  
 Cena DP vrátane DPH v EUR: 159 285,19 €  
 (slovom: jednostopäťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatpäť celých a devätnásť stotín eura);
- e) Cena diela celkom bez DPH v EUR: 573 764,37 €  
 Sadzba DPH 20%: 114 752,87 €  
**Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: 688 517,24 €**  
 (slovom: šesťstoosemdesiatosemtisícpäťstosedemsnásť celých a dvadsaťštyri stotín eura);

## 6.2.2 Cena podľa dodatku č.1 k zmluve:

- a) Cena DUR bez DPH v EUR: 48 534,42 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 9 706,88 €  
 Cena DUR vrátane DPH v EUR: 58 241,30 €  
 (slovom: päťdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťjeden celých a tridsať stotín eura);
- b) Cena DSZ bez DPH v EUR: 193 852,40 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 38 770,48 €  
 Cena DSZ vrátane DPH v EUR: 232 622,88 €  
 (slovom: dvestotridsaťdvatisícšesťstodvadsaťdva celých a osemdesiatosem stotín eura);
- c) Cena DSP bez DPH v EUR: 254 037,68 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 50 807,54 €  
 Cena DSP vrátane DPH v EUR: 304 845,22 €  
 (slovom: tristoštyritisícosemstoštyridsaťpäť celých a dvadsaťdva stotín eura);
- d) Cena DP bez DPH v EUR: 155 068,05 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 31 013,61 €  
 Cena DP vrátane DPH v EUR: 186 081,66 €  
 (slovom: jednostoosemdesiatšesťtisícosemdesiatjeden celých a šesťdesiatšesť stotín eura);
- e) Cena diela celkom bez DPH v EUR: 651 492,55 €  
 Sadzba DPH 20%: 130 298,51 €  
**Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: 781 791,06 €**  
 (slovom: sedemstoosemdesiatjedentisícsemstodeväťdesiat jeden celých a šesť stotín eura);

## 6.2.3 Cena podľa dodatku č.3 k zmluve:

- a) Cena DUR bez DPH v EUR: 48 534,42 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 9 706,88 €  
 Cena DUR vrátane DPH v EUR: 58 241,30 €  
 (slovom: päťdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťjeden celých a tridsať stotín eura);
- b) Cena DSZ bez DPH v EUR: 122 921,65 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 24 584,33 €  
 Cena DSZ vrátane DPH v EUR: 147 505,98 €  
 (slovom: jednostoštyridsaťsedemtisícpäťstopäť celých a deväťdesiatosem stotín eura);

- c) Cena DSP bez DPH v EUR: 324 968,43 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 64 993,69 €  
Cena DSP vrátane DPH v EUR: 389 962,12 €  
(slovom: tristoosemdesiatdeväťtisícdeväťstošesťdesiatdva celých a dvanásť stotín eura);
- d) Cena DP bez DPH v EUR: 155 068,05 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 31 013,61 €  
Cena DP vrátane DPH v EUR: 186 081,66 €  
(slovom: jednoosemdesiatšesťtisícosemdesiatjeden celých a šesťdesiatšesť stotín eura);
- e) Cena diela celkom bez DPH v EUR: 651 492,55 €  
Sadzba DPH 20%: 130 298,51 €  
**Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: 781 791,06 €**  
(slovom: sedemstoosemdesiatjedentisícosemdesiatdeväťdesiat jeden celých a šesť stotín eura);

**6.2.4 Cena podľa dodatku č.4 k zmluve:**

- a) Cena DUR bez DPH v EUR: 48 534,42 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 9 706,88 €  
Cena DUR vrátane DPH v EUR: 58 241,30 €  
(slovom: päťdesiatosemtisícdeväťstoštyridsaťjeden celých a tridsať stotín eura);
- b) Cena DSZ bez DPH v EUR: 122 921,65 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 24 584,33 €  
Cena DSZ vrátane DPH v EUR: 147 505,98 €  
(slovom: jednoštyridsaťsedemtisícpäťstopäť celých a deväťdesiatosem stotín eura);
- c) Cena DSP bez DPH v EUR: 324 968,43 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 64 993,69 €  
Cena DSP vrátane DPH v EUR: 389 962,12 €  
(slovom: tristoosemdesiatdeväťtisícdeväťstošesťdesiatdva celých a dvanásť stotín eura);
- d) Cena DP bez DPH v EUR: 155 068,05 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 31 013,61 €  
Cena DP vrátane DPH v EUR: 186 081,66 €  
(slovom: jednoosemdesiatšesťtisícosemdesiatjeden celých a šesťdesiatšesť stotín eura);
- e) Cena zmena navrhovanej činnosti stavby bez DPH v EUR: 11 191,80 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 2 238,36 €  
Cena zmena navrhovanej činnosti stavby vrátane DPH v EUR: 13 430,16 €  
(slovom: trinásťtisícštyristotridsať celých a šesťdesiatšesť stotín eura);
- f) Cena posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 bez DPH v EUR: 9 403,10 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 1 880,62 €  
Cena posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 vrátane DPH v EUR: 11 283,72 €  
(slovom: jedenásťtisícdeväťstoosemdesiattri celých a sedemdesiatdva stotín eura);
- g) Cena diela celkom bez DPH v EUR: 672 087,45 €  
Sadzba DPH 20%: 134 417,49 €  
**Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: 806 504,94 €**  
(slovom: osemstošesťtisícpäťstoštyri celých a deväťdesiatštyri stotín eura);

**Rekapitulácia ceny podľa čl. 6 bod 6.2 tejto zmluvy:**

Rekapitulácia ceny v EUR bez DPH	Zmluva	Dodatok č.1		Dodatok č.3		Dodatok č.4	
		navýšenie ceny	výsledná cena	zmena ceny	výsledná cena	navýšenie ceny	výsledná cena
Dokumentácia stavebného zámeru	176 343,92 €	17 508,48 €	193 852,40 €	- 70 930,75 €	122 921,65 €		122 921,65 €
Dokumentácia pre územné rozhodnutie	41 584,16 €	6 950,26 €	48 534,42 €		48 534,42 €		48 534,42 €
Zmena navrhovanej činnosti a netechnické zhnutie						11 191,80 €	11 191,80 €
Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000						9 403,10 €	9 403,10 €
Dokumentácia na stavebné povolenie	223 098,63 €	30 939,05 €	254 037,68 €	70 930,75 €	324 968,43 €		324 968,43 €

Dokumentácia pre ponuku	132 737,66 €	22 330,39 €	155 068,05 €		155 068,05 €		155 068,05 €
Spolu	573 764,37 €	77 728,18 €	651 492,55 €		651 492,55 €	20 594,90 €	672 087,45 €

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín. Rozpočet ceny podľa dodatku č.4 k zmluve tvorí ako príloha č. 10 neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.4 k zmluve.

6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2.4 písm. a) tohto článku za DÚR na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.7 až 5.13 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2.4 písm. b) tohto článku za DSZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.7 až 5.13 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2.4 písm. c) tohto článku za DSP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.7 až 5.13 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2.4 písm. d) tohto článku za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.7 až 5.13 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2.4 písm. e) tohto článku za zmenu navrhovanej činnosti stavby na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.16 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2.4 písm. f) tohto článku za posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.16 článku 5 časti 1 tejto zmluvy.

#### Čl. 7 sa mení a znie nasledovne:

#### Čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DUR, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za DUR uvedenej v bode 6.2.4 písm. a) časti 1 za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSZ, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za DSZ uvedenej v bode 6.2.4 písm. b) časti 1 za každý deň omeškania.
- 7.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSP, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za DSP uvedenej v bode 6.2.4 písm. c) časti 1 za každý deň omeškania.
- 7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DP, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za DP uvedenej v bode 6.2.4 písm. d) časti 1 za každý deň omeškania.
- 7.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením zmeny navrhovanej činnosti stavby v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za zmenu navrhovanej činnosti stavby uvedenej v bode 6.2.4 písm. e) časti 1 za každý deň omeškania.
- 7.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením posúdenia vplyvu územia NATURA 2000, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 uvedenej v bode 6.2.4 písm. f) časti 1 za každý deň omeškania.
- 7.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 časti 1 zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.8 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.9 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

## Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

**V čl. 8 sa mení bod 8.2, ktorý znie nasledovne:**

- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, v Súťažných podkladoch a v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 17.12.2012, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch a že bude bez väd.

## Čl. 9 OSOBITNÉ USTANOVENIA

**V čl. 9 sa menia body 9.3 až 9.5, ktoré znejú nasledovne:**

- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 časti 1 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola DUR, zmena navrhovanej činnosti stavby, posúdenie vplyvu územia NATURA 2000, DSZ, DSP alebo DP alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy.
- 9.4 Vlastnícke právo k DUR, zmene navrhovanej činnosti stavby, posúdeniu vplyvu územia NATURA 2000, DSZ, DSP alebo DP objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy.
- 9.5 Nebezpečenstvo škody na DUR, zmene navrhovanej činnosti stavby, posúdeniu vplyvu územia NATURA 2000, DSZ, DSP alebo DP prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 9.4 tohto článku.

## **ČASŤ 2**

### Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

**V čl. 5 sa mení bod 5.1, ktorý znie nasledovne:**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať **kompletné MPV najneskôr do 23.10.2015.**

## **ČASŤ 3**

### Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

**V čl. 5 sa menia body 5.1 až 5.9, ktoré znejú nasledovne:**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať IČ pre územné konanie najneskôr do **27.06 2013.**
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť protokol o vykonaní štátnej expertízy do **27.06.2013.**
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DUR do **31.03.2013.**
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť **právoplatné územné rozhodnutia** do **27.06 2013.**
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať IČ pre stavebné konanie najneskôr do **24.01.2014.**
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DSP do **23.12.2013.**
- 5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF najneskôr do **23.12.2013.**
- 5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF najneskôr do **23.12.2013.**
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť **právoplatné stavebné povolenia** do **27.01.2014.**

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č.4 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
2. Dodatok č.4 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č.4 k zmluve oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
4. Prílohy č. 1 až 7 podľa zmluvy v znení dodatku č.1 a č.2 k zmluve sa nahrádzajú prílohami č.1 až 9 tohto dodatku č.4 k zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.4 k zmluve.

Príloha č.8 podľa zmluvy v znení dodatku č.1 k zmluve sa nahrádza prílohou č.10 tohto dodatku č.4 k zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.4 k zmluve:

- č.1 – harmonogram všetkých prác zhotoviteľa
- č.2 – harmonogram prác zhotoviteľa na DUR
- č.3 – harmonogram prác zhotoviteľa na zmene navrhovanej činnosti stavby
- č.4 – harmonogram prác zhotoviteľa na posúdení vplyvu územia NATURA 2000
- č.5 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSZ
- č.6 – harmonogram vydania územného rozhodnutia
- č.7 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSP
- č.8 – harmonogram vydania stavebného povolenia
- č.9 – harmonogram prác zhotoviteľa na DP
- č.10 – špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (tabuľky 1.1 až 1.10)
- č.11 - cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 17.12.2012.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky:

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

**Ing. Milan Gajdoš**

predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

**Ing. Bartolomej Šechný**

podpredseda predstavenstva

**Ing. Viktória Chomová**

podpredsedníčka predstavenstva


**Ing. Igor Jakubík**


člen predstavenstva a  
výrobný riaditeľ a.s.



**Harmonogram všetkých prác Zhotoviteľa**  
**Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

ID	Názov úkolu	Zahájenie	Dokončení	2011												2012						
				VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	19.8.11	23.10.15																			
2	Vydanie záverečné stanovisko MŽP k Zameru (proces EIA ukončený) dňa 9.6.2009	31.8.11	31.8.11																			
3	Viazanosť ponuky uchádzača	19.8.11	29.2.12																			
4	Podpis ZoD	28.11.11	28.11.11																			
5	Dodanie záväzných podkladov potrebných pre zahájenie práce strany Objednávateľa	20.1.12	20.1.12																			
6	Príprava stavby v stupni ÚR (DSZ)	23.1.12	27.6.13																			
7	Geodetický elaborát (zameranie)	23.1.12	27.4.12																			
8	Predbežné prieskumy a štúdie okrem IG a HG prieskumu (neboho možné vykonať)	26.3.12	15.6.12																			
9	Spracovanie dokumentácie DÚR	23.1.12	28.9.12																			
10	Termíny pracovných rokovaní v stupni DÚR	15.2.12	12.9.12																			
22	Stavebné konanie - DÚR	2.4.12	28.9.12																			
23	Termíny pracovných rokovaní v DÚR	4.4.12	19.9.12																			
33	Spracovanie časti H, Dokumentácia pre zábery pozemkov	30.7.12	21.9.12																			
34	Môvňár / Štátna expertiza	1.10.12	27.6.13																			
35	...	1.10.12	23.11.12																			
36	...	26.11.12	27.6.13																			
37	Požiadavka Objednávateľa na zabezpečenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a Posúdenie vplyvov stavby na území NATURA 2000	17.1.13	17.1.13																			
38	Oznámenie zmeny navrhovanej činnosti (Príloha 6a Zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP)	1.2.13	23.5.13																			
39	Posúdenie vplyvu stavby na území NATURA 2000	1.2.13	23.5.13																			
40	Inžinierska činnosť pre územné konanie (vrátane zabezpečenia stanovísk a rozhodnutí k DÚR)	11.1.13	27.6.13																			
41	Územné konanie	5.4.13	27.6.13																			
42	Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia	27.6.13	27.6.13																			
43	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	29.10.12	27.1.14																			
44	Právoplatnosť rozhodnutie o vstupoch na pozemky a vykonateľnosť realizovať Podrobný IG a HG prieskum	15.3.13	15.3.13																			
45	Podrobný IG prieskum a ďalšie podrobné prieskumy a štúdie	18.3.13	25.10.13																			
46	Spracovanie DSP	29.10.12	22.11.13																			
47	Termíny pracovných rokovaní v stupni DSP	12.3.13	28.10.13																			
60	Spracovanie dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie (MPV)	10.6.13	26.8.13																			
61	Majetkovoprávne vysporiadanie k stavebnému povoleniu	18.3.13	25.10.13																			
62	IČ pre stavebné konanie (vrátane zabezpečenia stanovísk, výhľad z LPF a PPF a ďalších rozhodnutí k DSP)	7.10.13	24.1.14																			
63	Stavebné konanie	4.11.13	24.1.14																			
64	Vydanie právoplatného stavebného povolenia	27.1.14	27.1.14																			
65	Príprava DP	25.11.13	10.4.14																			
66	Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)	25.11.13	10.4.14																			
67	Kompletné majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti a zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva	8.7.13	23.10.15																			

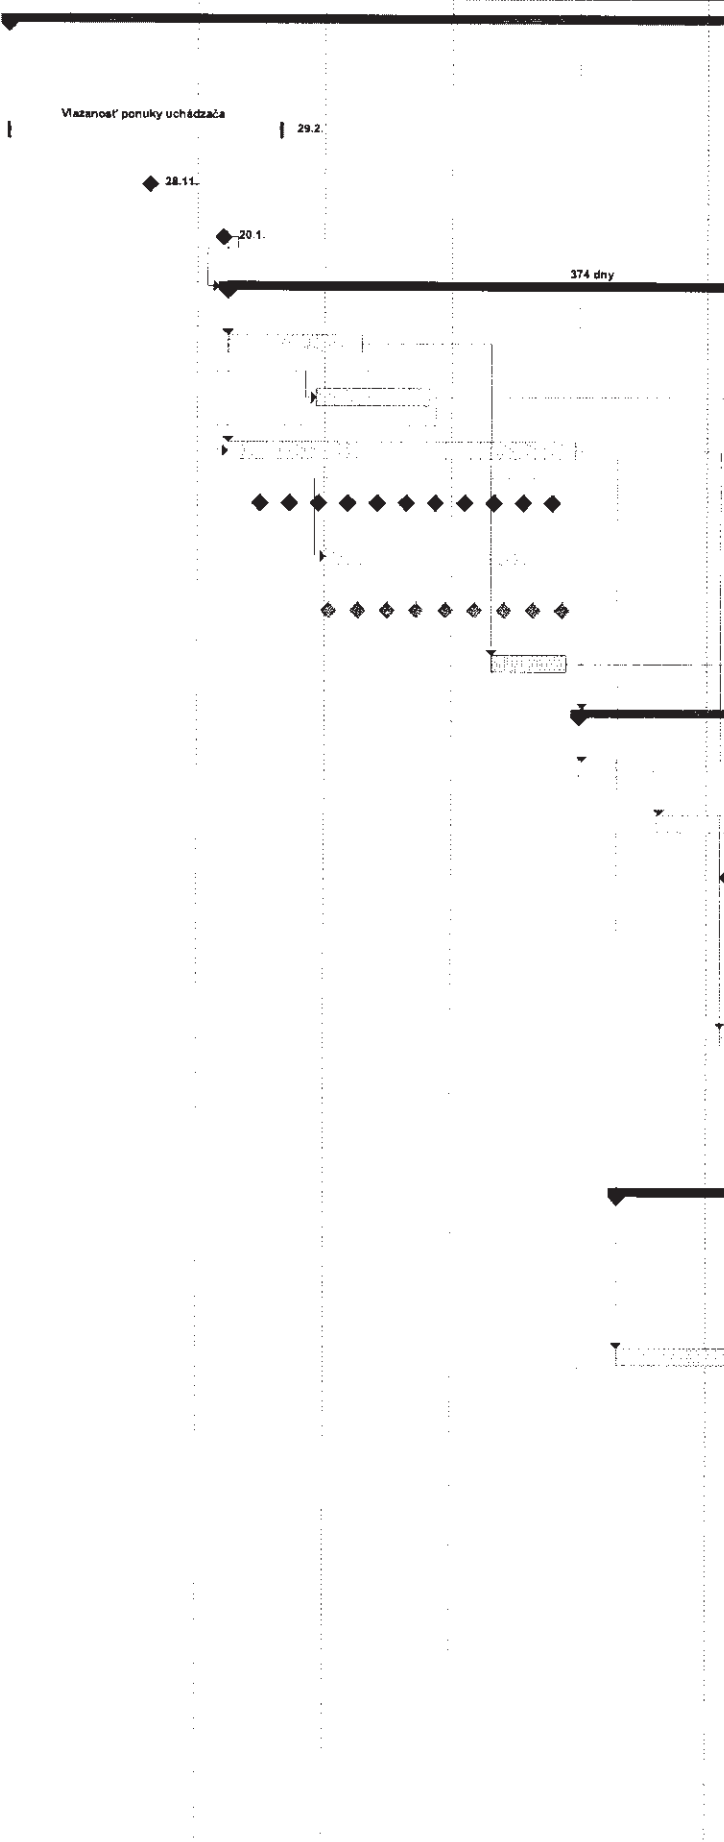

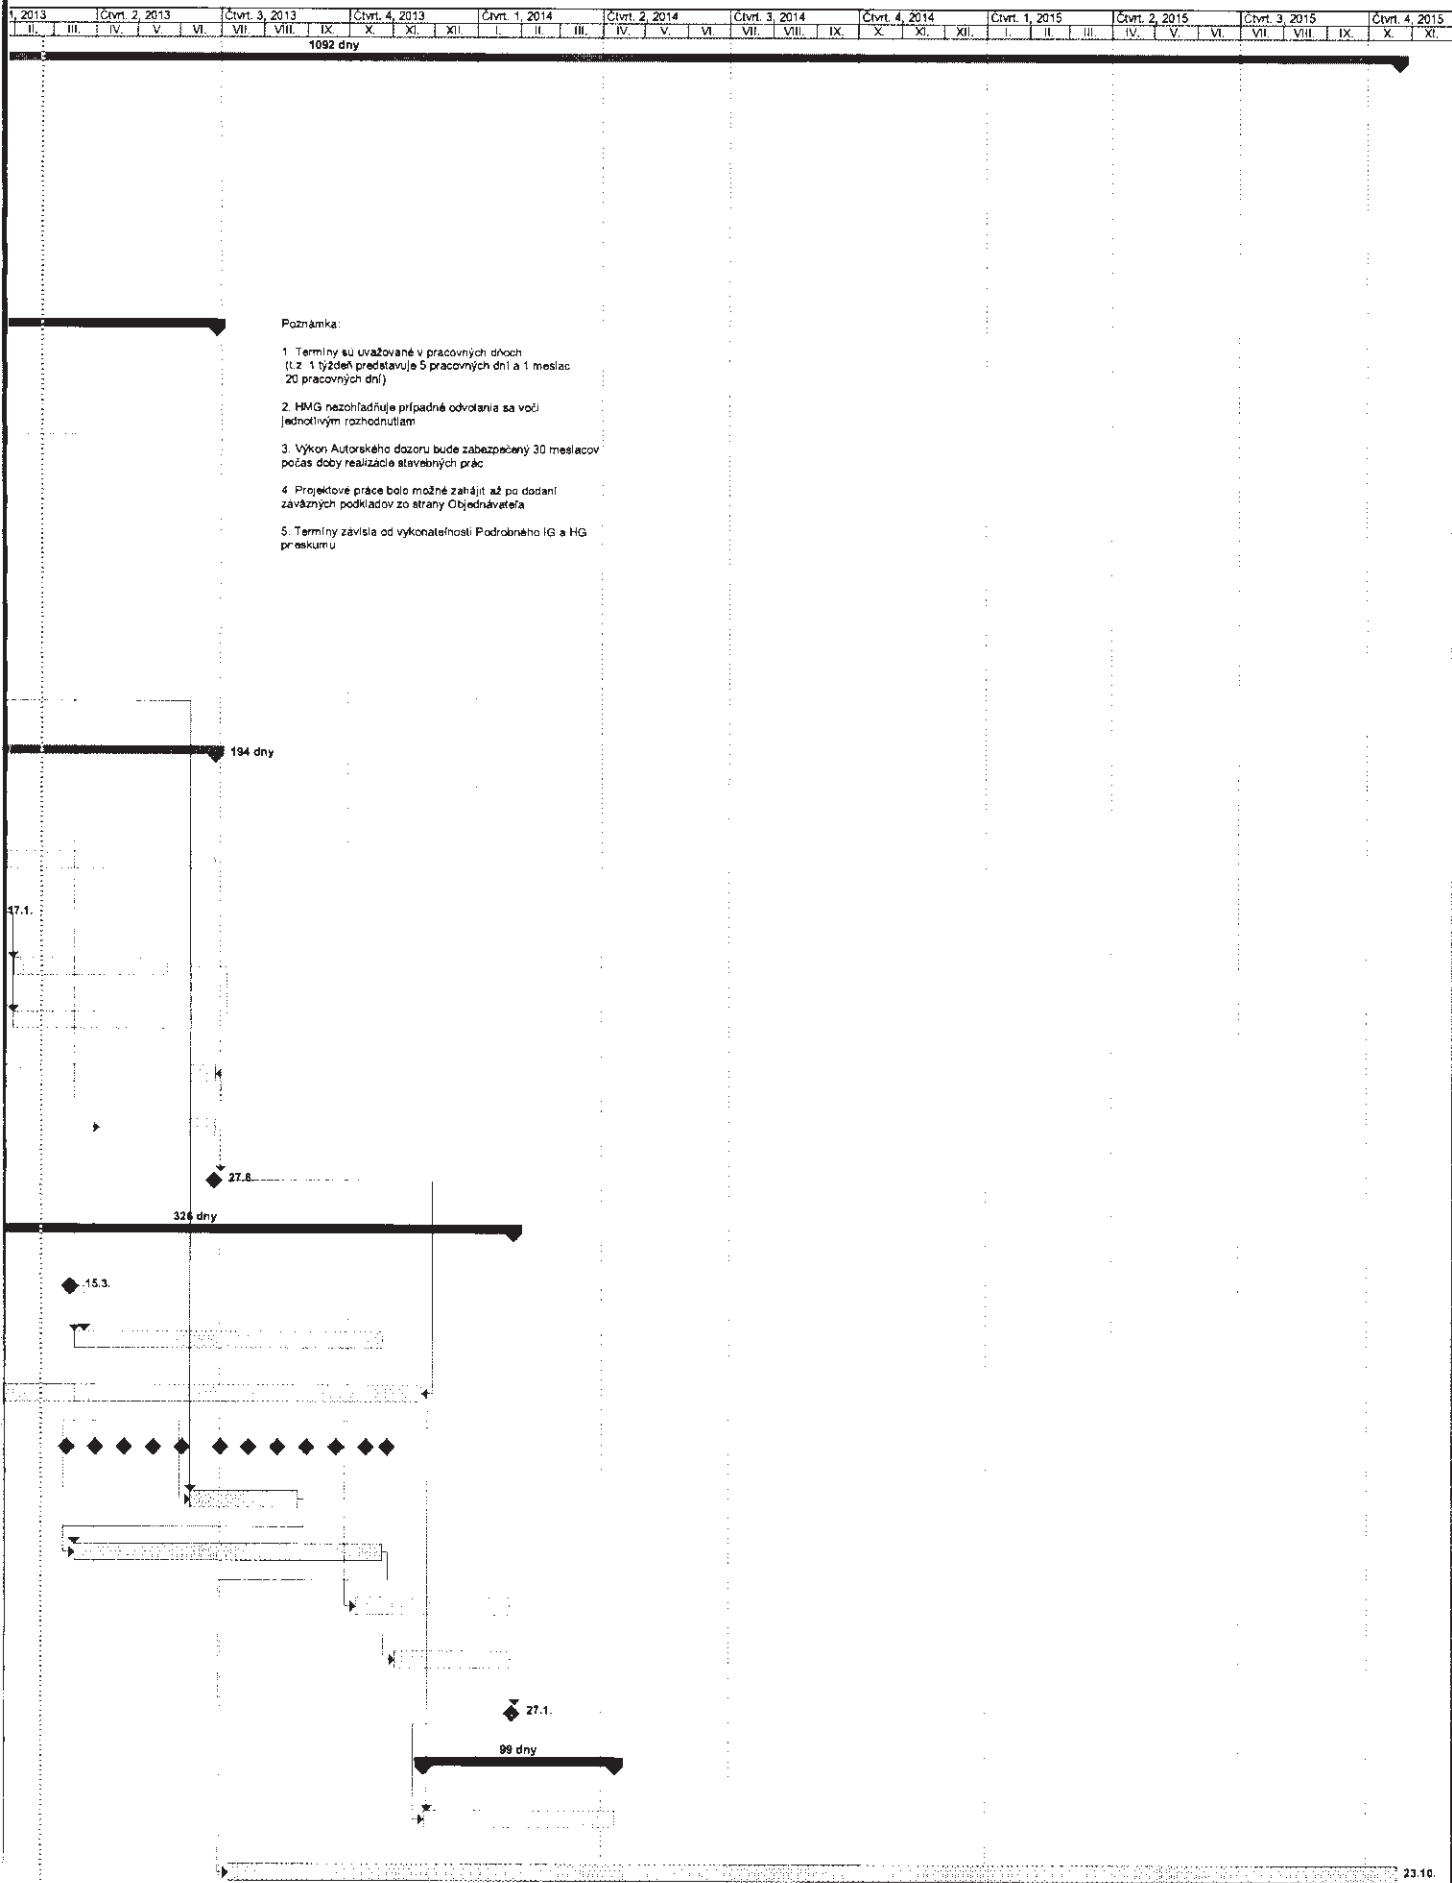


Poznámka:

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
4. Projektové práce bolo možné zahájiť až po dodaní záväzných podkladov zo strany Objednávateľa
5. Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG preskumu

**Harmonogram prác zhotoviteľa na DÚR  
Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

ID	Názov úkolu	Zahajení	Dokončení
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	19.8.11	23.10.15
2	Vydanie završenej stanovisko MŽP k Zameru (proces EIA ukončený) dňa 9.6.2009	31.8.11	31.8.11
3	Vyhodnotenie ponuky uchádzača	19.9.11	29.9.11
4	Fedors ZsC	28.11.11	28.11.11
5	Podanie žiadosti o poskytnutie potrebných prechodov pre okolité obce	20.1.12	20.1.12
6	Príprava stavby v stupni ÚR (DSZ)	23.1.12	27.8.13
7	Geodetický elaborát (zameranie)	23.1.12	27.4.12
8	Préžobné prieskumy a štúdie okrem IP a HG prieskumu (neboľ možne vykonať)	23.1.12	15.6.12
9	Spracovanie dokumentácie DÚR	23.1.12	26.9.12
10	Termíny pracovných rokování v stupni DÚR	15.2.12	12.9.12
22	Spracovanie dokumentácie DSZ	2.4.12	25.9.12
23	Termíny pracovných rokování v stupni DSZ	4.4.12	19.9.12
33	Spracovanie štátnych dokumetácií k stavbe úseku	10.7.12	20.9.12
34	MDVaRR - Štátna expertíza	1.10.12	27.6.13
35	Výpracovanie expertízneho posudku v štádiu prípravy výpracovania expertízneho posudku (vrátane možnosti vypracovania expertízneho posudku)	1.10.12	25.11.12
36	Výpracovanie expertízneho posudku k štátnej expertíze	23.11.12	27.6.13
37	Príprava štátnych dokumetácií k stavbe úseku (podľa zmluvy)	1.1.13	17.1.13
38	Stanovenie omešanie na výstavbu úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná (Začiatok 24.3.2011 ZsC)	1.2.13	23.3.13
39	Príprava štátnych dokumetácií k stavbe úseku (podľa zmluvy)	1.2.13	23.3.13
40	Príprava štátnych dokumetácií k stavbe úseku (podľa zmluvy)	1.1.13	27.6.13
41	Výpracovanie expertízneho posudku	1.4.13	27.6.13
42	Napovednosť a prístupnosť územného rozhodnutia	27.6.13	27.6.13
43	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	23.12.12	27.1.14
44	Príprava štátnych dokumetácií k stavbe úseku (podľa zmluvy)	10.3.13	19.9.13
45	Príprava štátnych dokumetácií k stavbe úseku (podľa zmluvy)	10.3.13	25.10.13
46	Príprava štátnych dokumetácií k stavbe úseku (podľa zmluvy)	25.10.12	23.11.13
47	Termíny pracovných rokování v stupni DSP	12.3.13	29.10.13
60	Stanovenie omešanie na výstavbu úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná (Začiatok 24.3.2011 ZsC)	1.2.13	20.9.13
61	Výpracovanie expertízneho posudku (vrátane možnosti vypracovania expertízneho posudku)	1.2.13	20.12.13
62	Príprava štátnych dokumetácií k stavbe úseku (podľa zmluvy)	7.1.13	21.1.14
63	Príprava štátnych dokumetácií k stavbe úseku (podľa zmluvy)	1.1.13	20.1.14
64	Vydanie právoplatného stavebného povolenia	27.1.14	27.1.14
65	Príprava DP	25.11.13	10.4.14
66	Príprava štátnych dokumetácií k stavbe úseku (podľa zmluvy)	2.11.13	10.4.14
67	Kompletné majetkové opotrebenie usporiadanie nehnuteľnosti a zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva	3.7.14	23.10.15

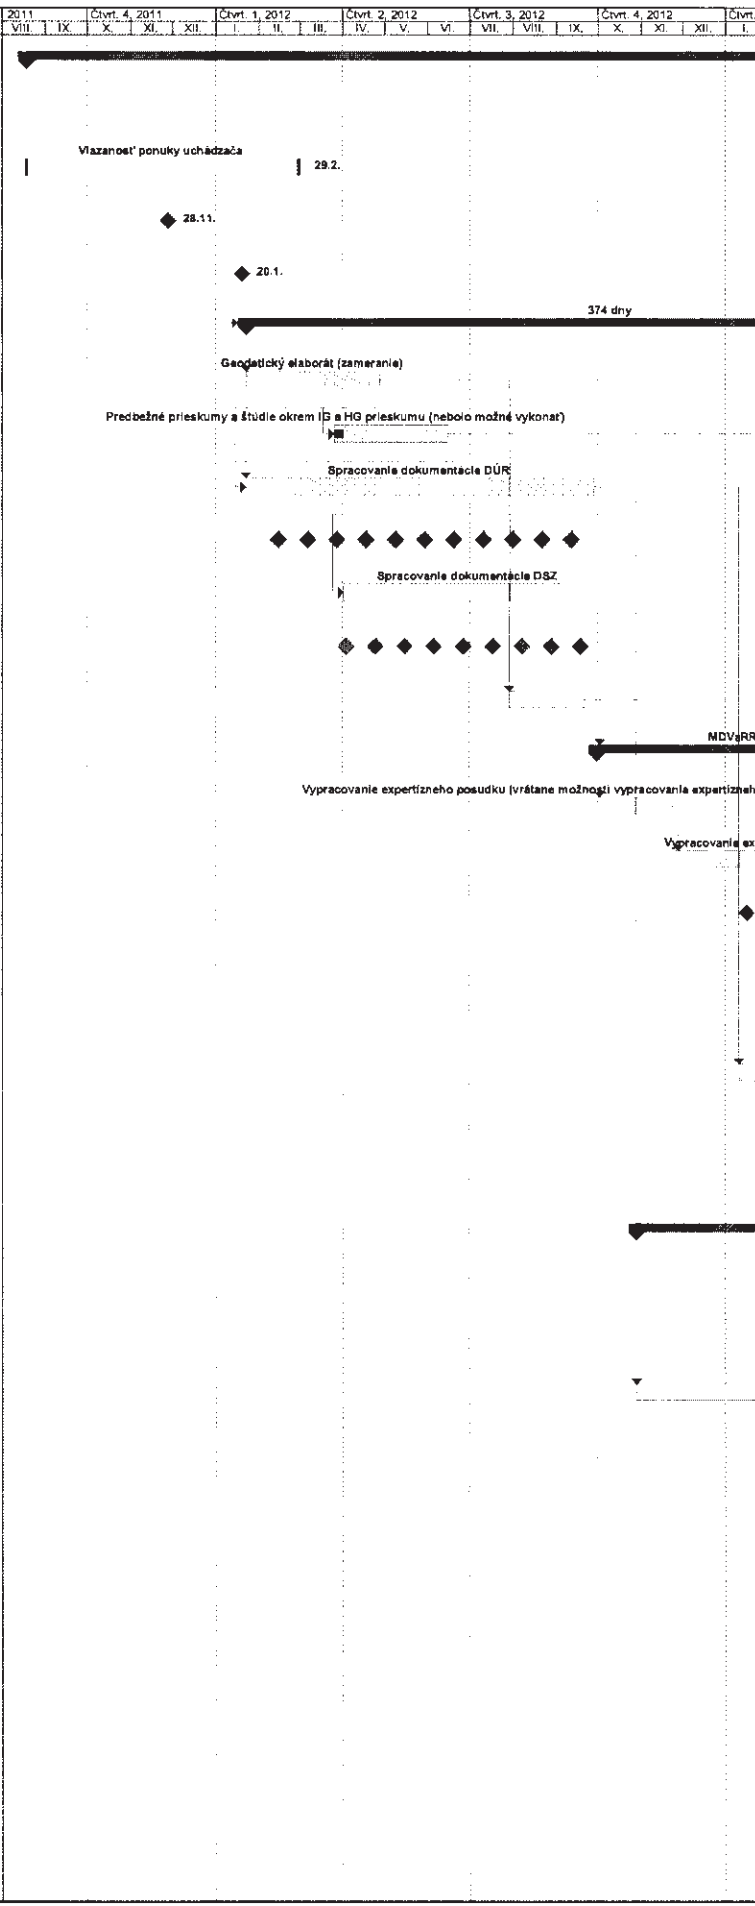

2013			Čtvrt. 2, 2013			Čtvrt. 3, 2013			Čtvrt. 4, 2013			Čtvrt. 1, 2014			Čtvrt. 2, 2014			Čtvrt. 3, 2014			Čtvrt. 4, 2014			Čtvrt. 1, 2015			Čtvrt. 2, 2015			Čtvrt. 3, 2015			Čtvrt. 4, 2015		
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	

1892 dny

**Poznámka:**

1. Termíny sú uvádzané v pracovných dňoch (t. j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezhodňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
4. Projektové práce bolo možné zahájiť až po dodaní záväzných podkladov zo strany Objednávateľa
5. Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG preskúmu

Štátna expertíza 194 dny

protokolu externou organizáciou)

rizičného protokolu k štátnej expertíze

7.1.

27.6.

326 dny

15.3

IC pre stavebné konanie (vrátane zabezpečenia stanovišťa, vyňatí z LPF a PPF a ďalších rozhodnutí k DSP)


Stavebné konanie

27.1.


99 dny


Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)



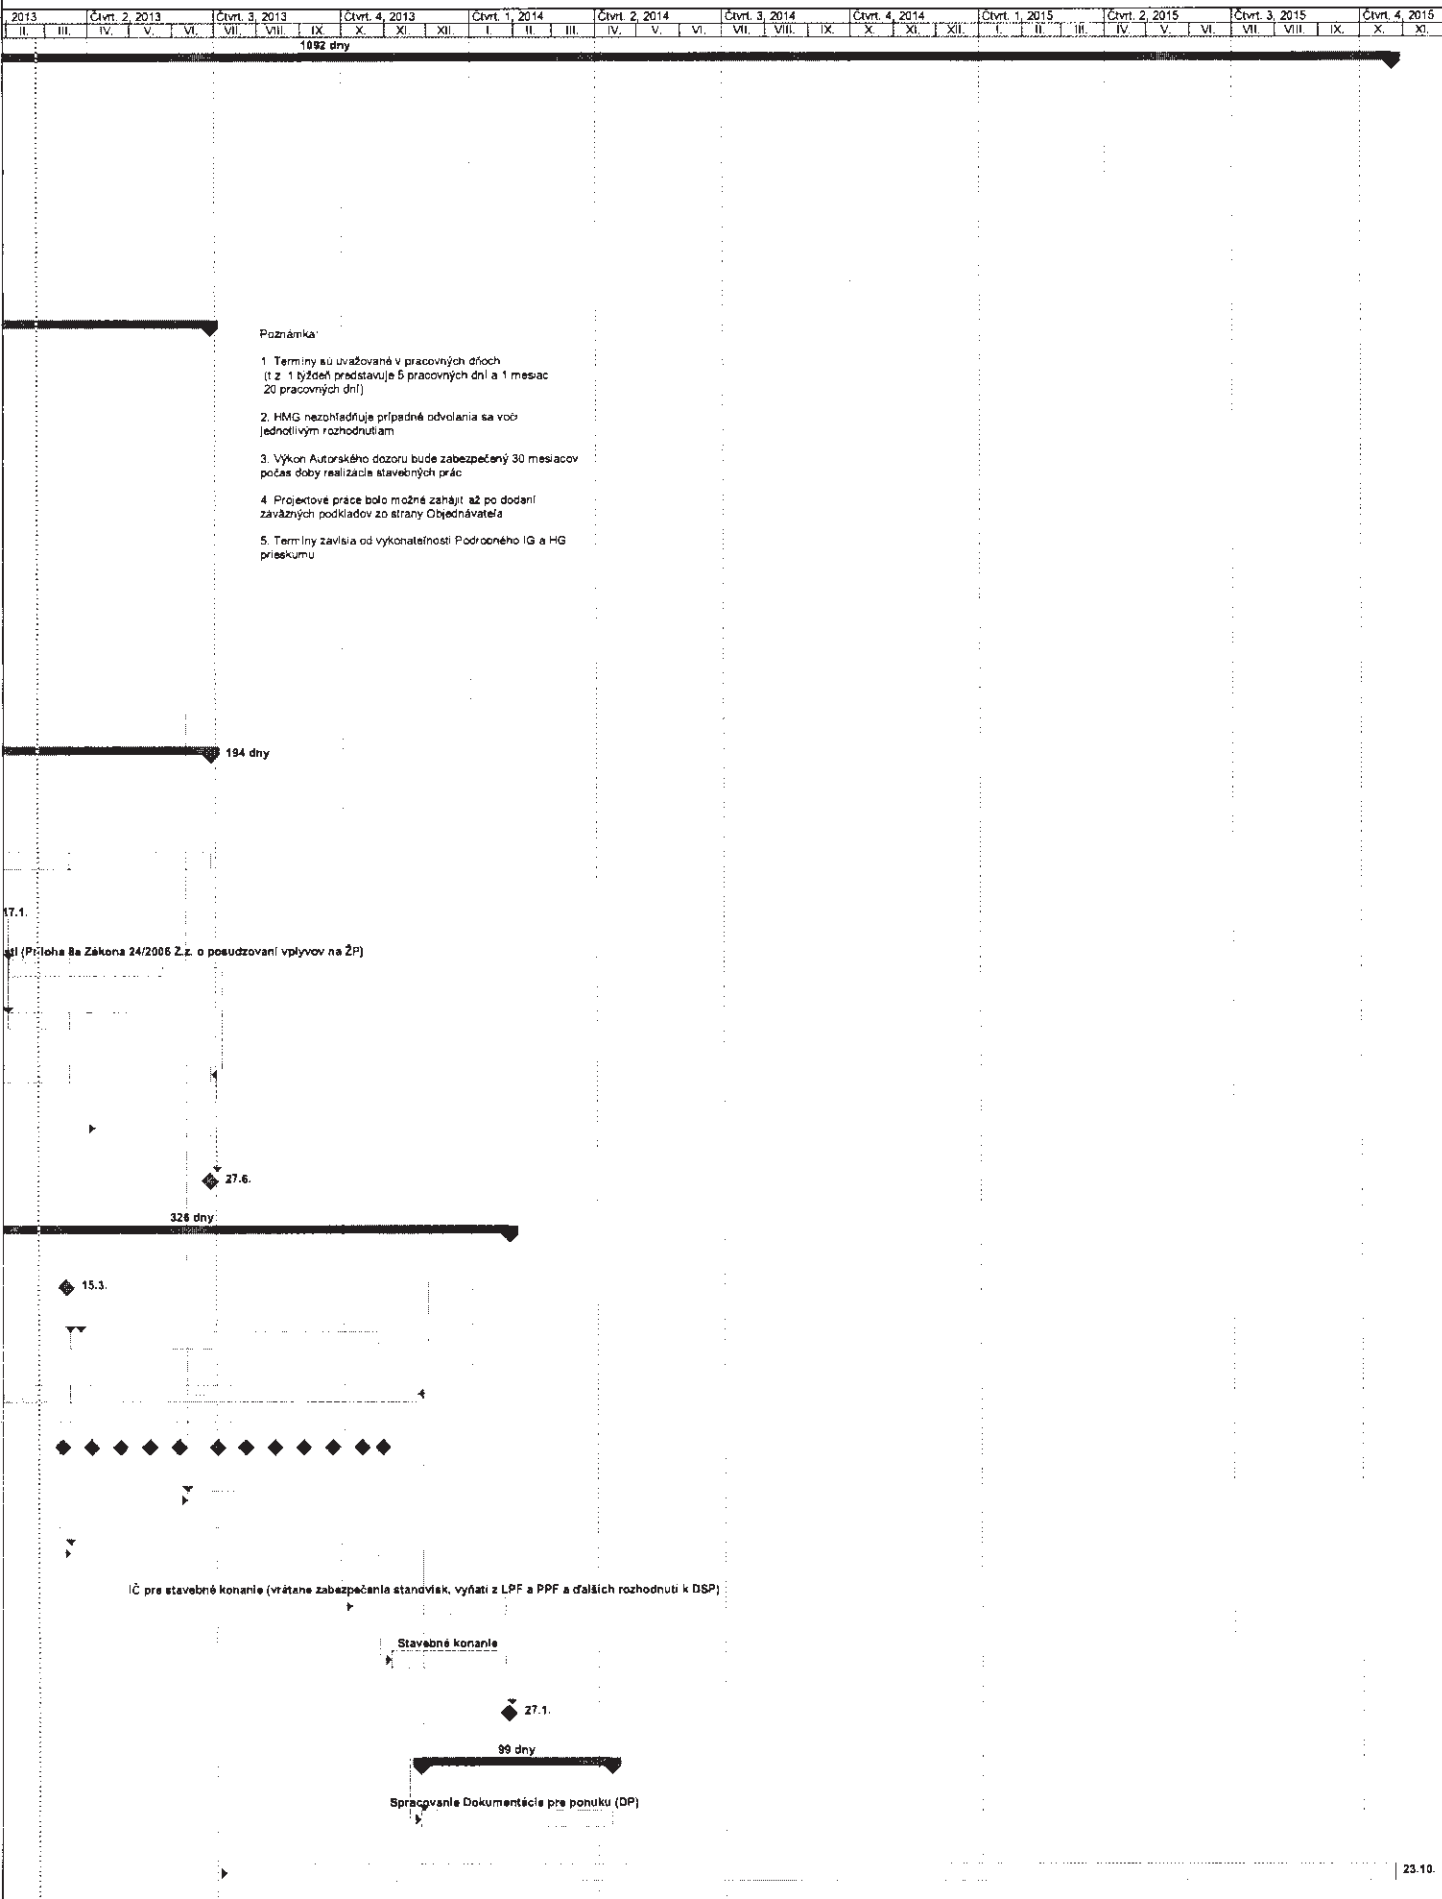

**Harmonogram prác zhotoviteľa na Posúdenie vplyvov stavby na území Natura 2000  
Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

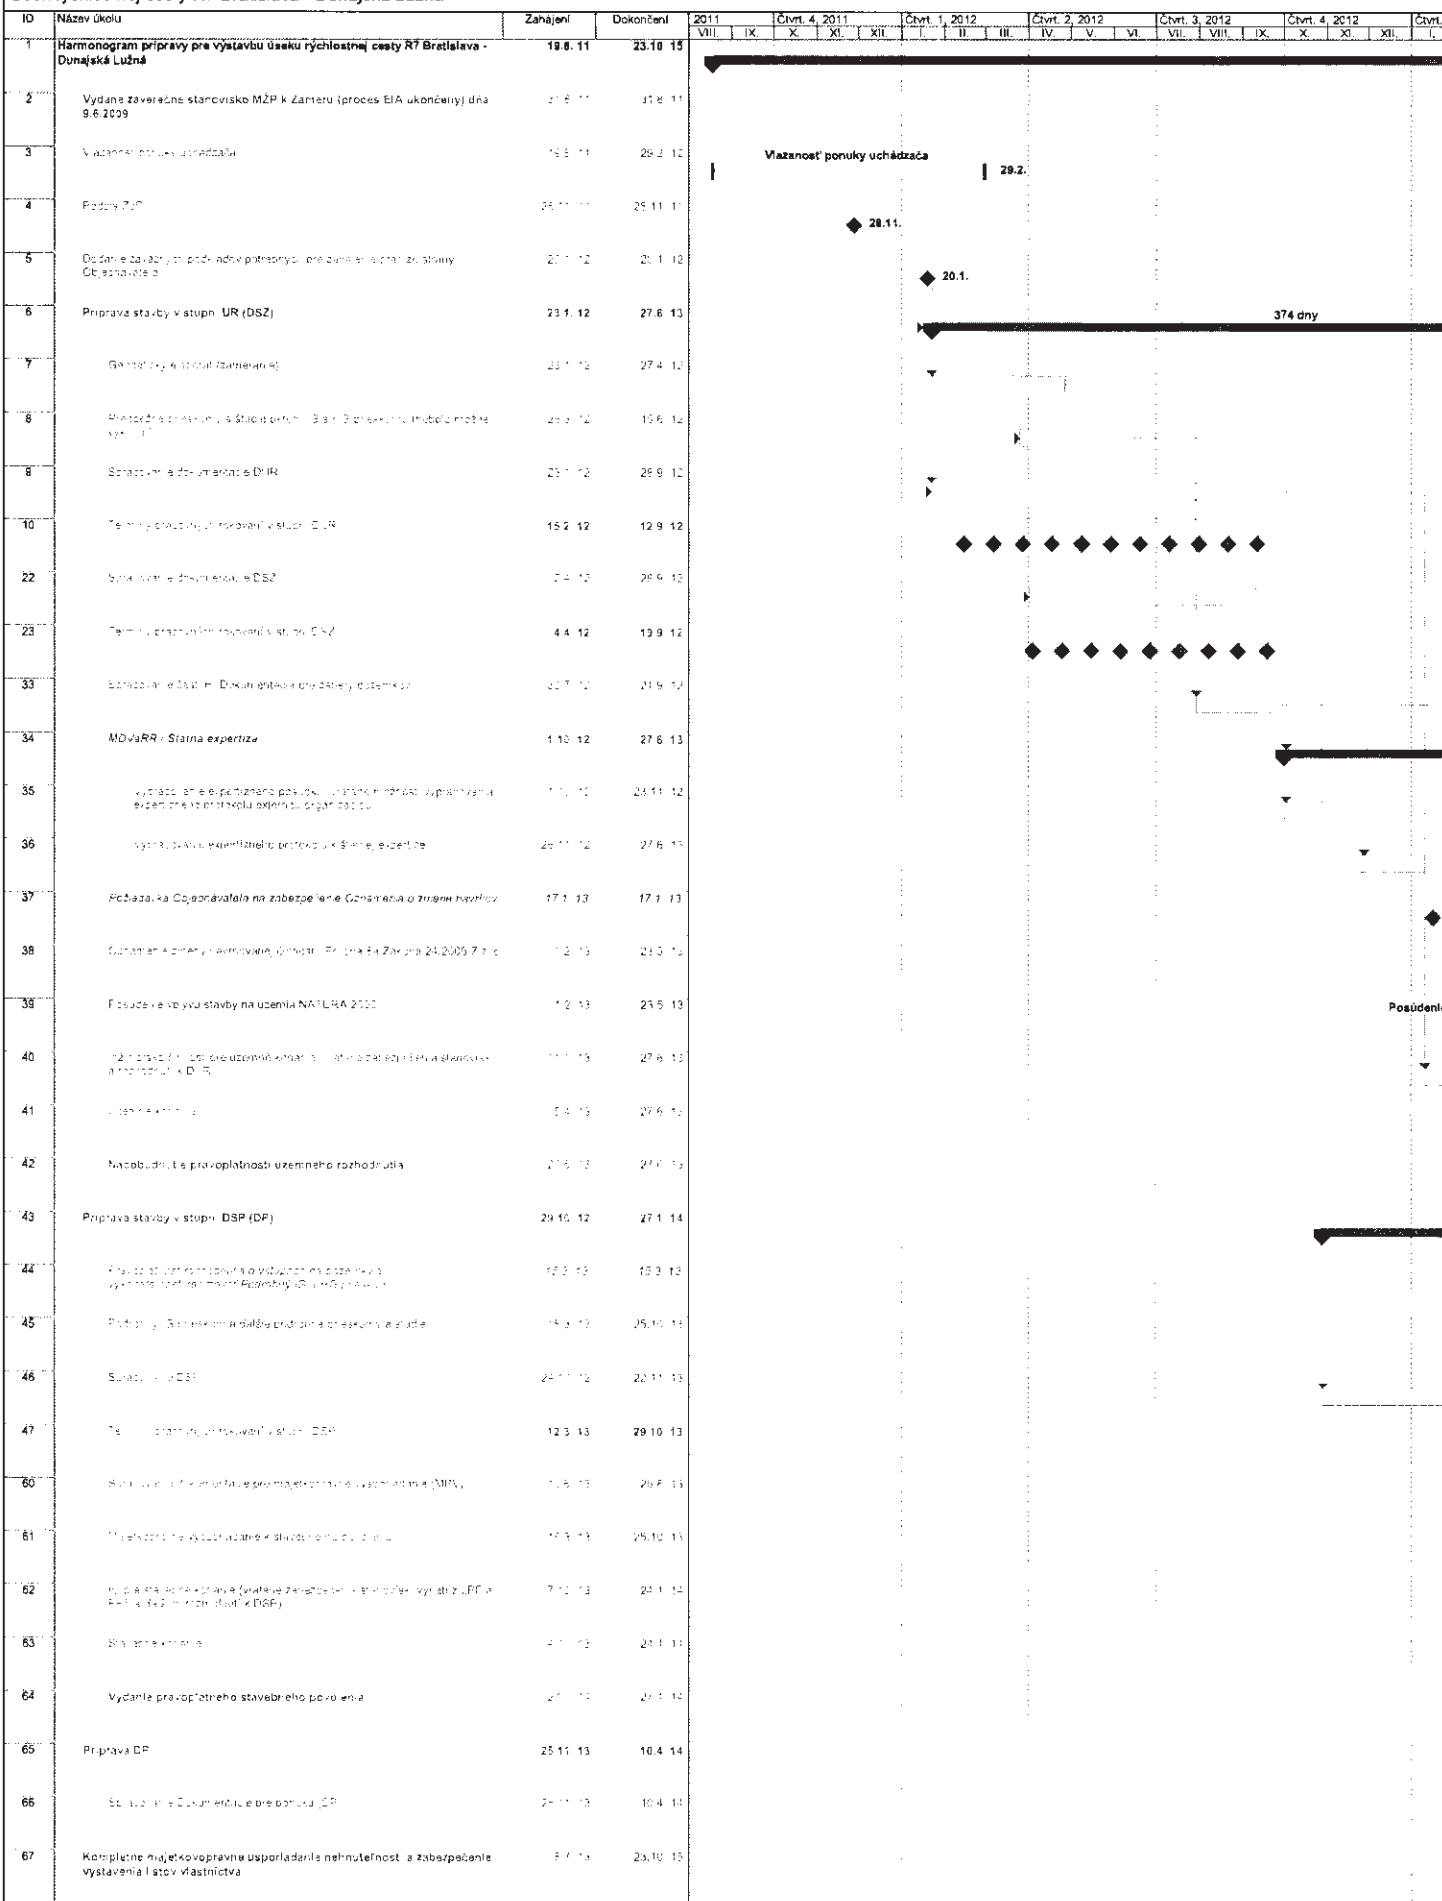

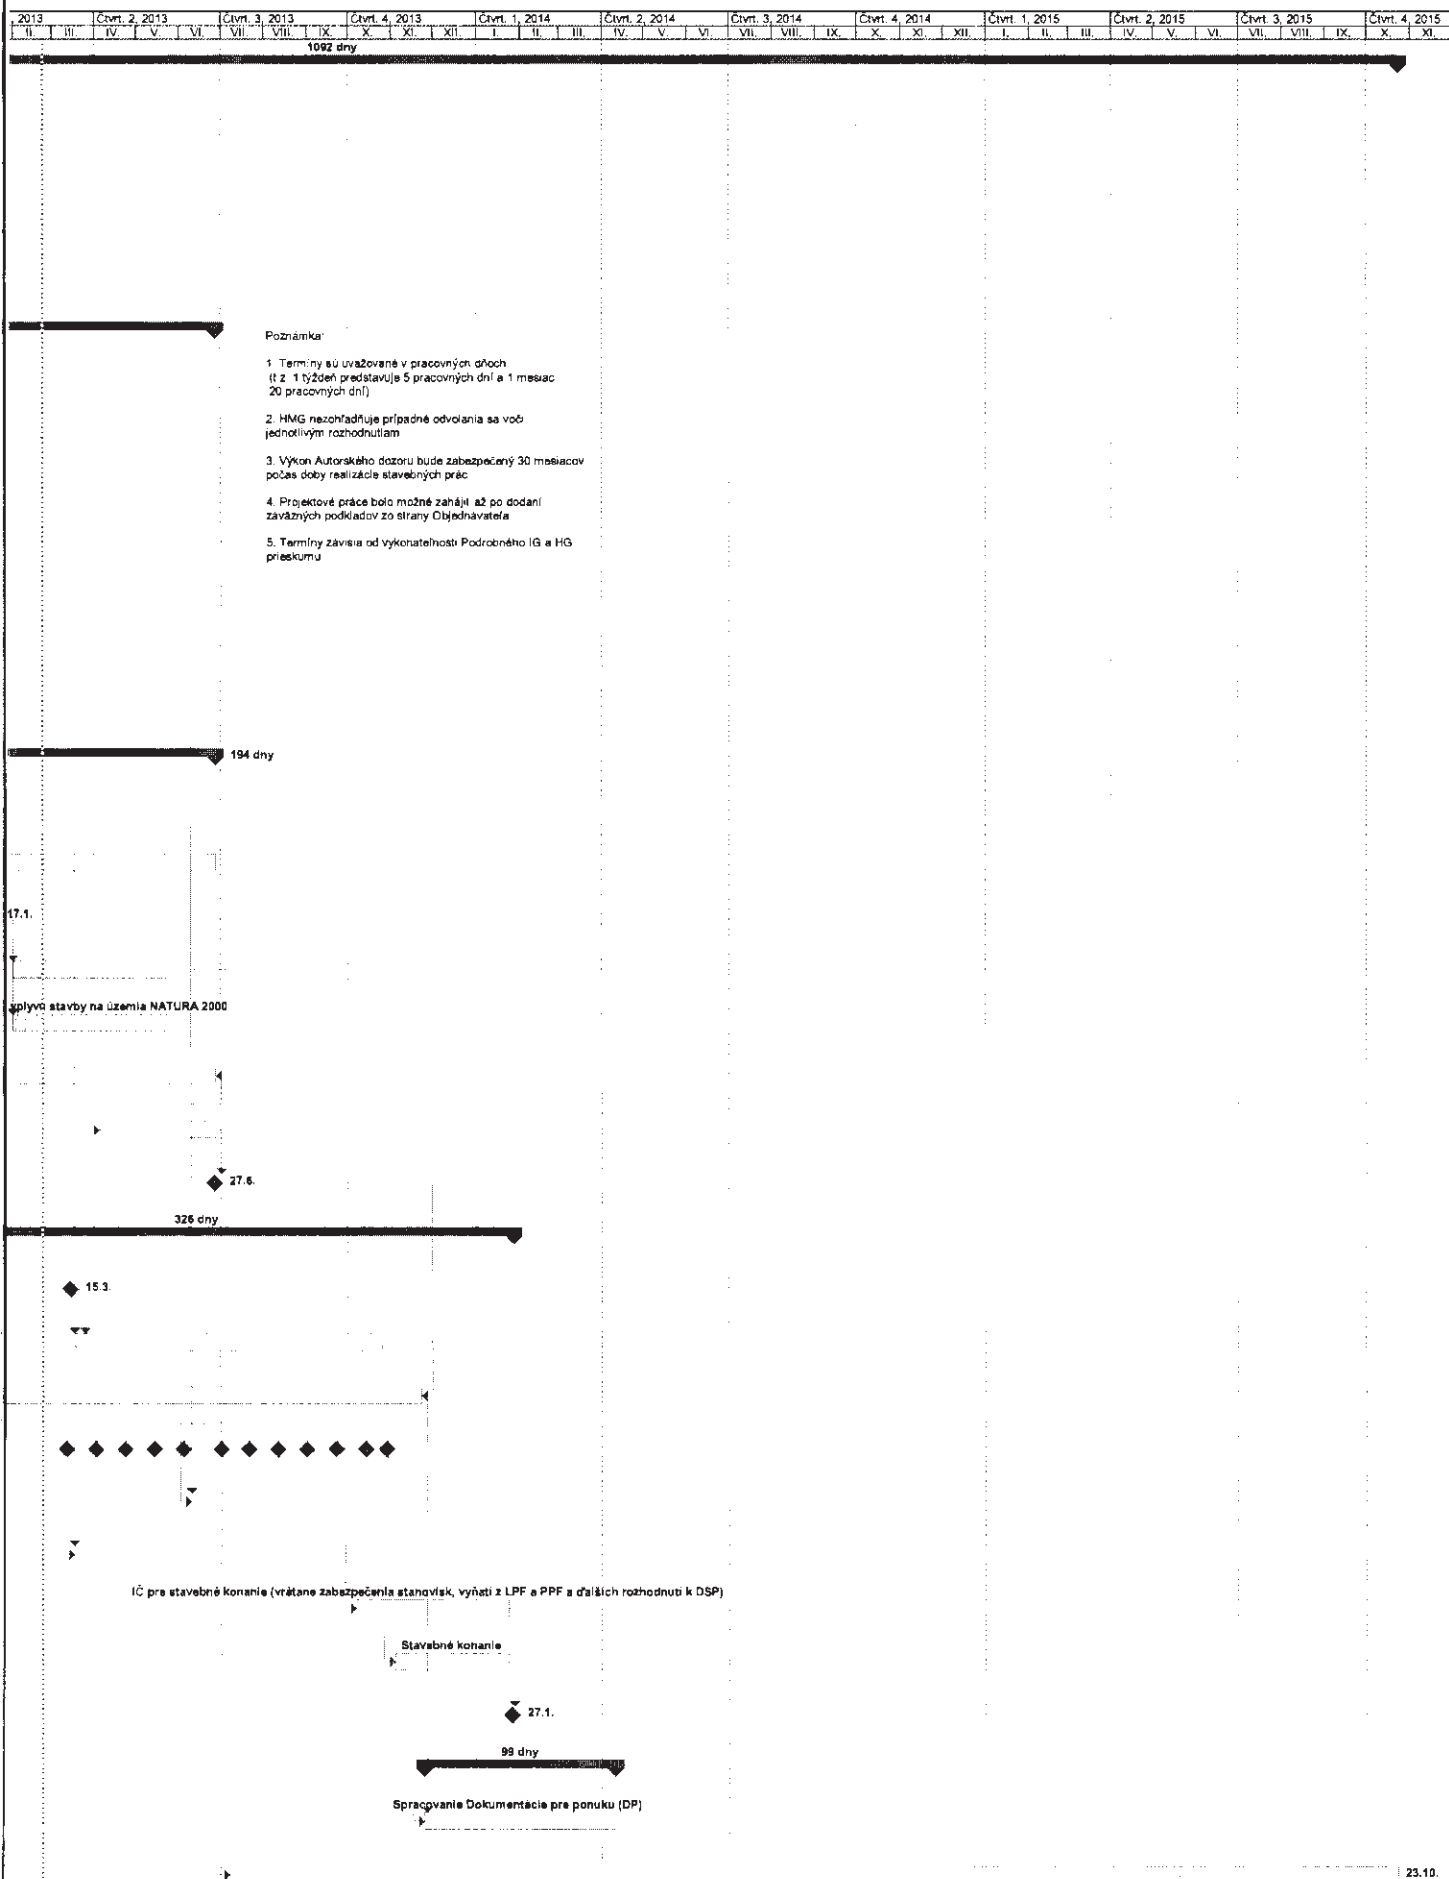





# Harmonogram prác zhotoviteľa na DSZ

## Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná


ID	Názov úkolu	Zahájený	Dokončený	2011																			
				VIII	IX	X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2012			Čtvrt. 2, 2012			Čtvrt. 3, 2012			Čtvrt. 4, 2012					
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	19.8.11	23.10.15																				
2	Vydanie záverečného stanoviska MŽP k Zam-eru (proces EIA ukončený) dňa 9.6.2009	21.8.11	31.8.11																				
3	Načítanie podrobných uzemňovacích	19.8.11	25.9.12																				
4	Podpora ŽPÚ	29.11.11	29.11.11																				
5	Dobrá vzhľadom na bodovú hodnotu podrobnejšieho zjednotenia prírodných útvarov	21.1.12	26.1.12																				
6	Príprava stavby v stupni ÚR (DSZ)	23.1.12	27.6.13																				
7	Grafické a technické kreslenie	23.1.12	27.4.12																				
8	Uznesenie posudku a štátny odborný záver o preskúmaní neškodnosti vyhlásenia	26.3.12	15.6.12																				
9	Stratifikácia dokumentácie DÚR	23.1.12	26.9.12																				
10	Technická správa o vyhodnotení stavby DÚR	15.2.12	12.9.12																				
22	Spracovanie dokumentácie DSZ	24.1.12	26.9.12																				
23	Technická správa o vyhodnotení stavby DÚR	4.4.12	19.9.12																				
33	Stratifikácia štátno-technickej dokumentácie DSZ	20.7.12	21.9.12																				
34	<b>MDVaRR / Štátna expertiza</b>	1.10.12	27.6.13																				
35	Uznesenie štátneho odborného záveru o preskúmaní neškodnosti vyhlásenia	1.10.12	29.11.12																				
36	Uznesenie štátneho odborného záveru o preskúmaní neškodnosti vyhlásenia	29.11.12	27.6.13																				
37	Príprava Územného štúdia na základe záverečného stanoviska MŽP a záverečného stanoviska štátneho odborného záveru o preskúmaní neškodnosti vyhlásenia	17.1.13	17.1.13																				
38	Odhad zmeny normovanej úroveň pri výstavbe - Zákon 24/2006 Z.z. o dopravných stavbách na ŽPÚ	1.2.13	23.5.13																				
39	Príprava Územného štúdia na území NATURA 2000	1.2.13	23.5.13																				
40	Uznesenie štátneho odborného záveru o preskúmaní neškodnosti vyhlásenia	1.11.13	27.6.13																				
41	Uzemňovací plán	1.4.13	27.6.13																				
42	Nalobovať a právoplatnosť územného rozhodnutia	27.6.13	27.6.13																				
43	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	23.10.12	27.1.14																				
44	Príprava Územného štúdia na základe záverečného stanoviska MŽP a záverečného stanoviska štátneho odborného záveru o preskúmaní neškodnosti vyhlásenia	15.9.13	15.9.13																				
45	Uzemňovací plán	15.9.13	25.10.13																				
46	Stratifikácia ÚR	26.10.12	26.11.13																				
47	Technická správa o vyhodnotení stavby DÚR	12.3.13	29.10.13																				
60	Stratifikácia územného štúdia na základe záverečného stanoviska MŽP	1.1.13	29.8.13																				
61	Uzemňovací plán	15.9.13	25.10.13																				
62	Uzemňovací plán (vkládanie železničnej trate do územia vyhláseného z LRF a ÚR a ÚR o preskúmaní neškodnosti vyhlásenia)	1.10.13	24.1.14																				
63	Stratifikácia ÚR	27.10.13	24.1.14																				
64	Vydanie právoplatného stavebného povolenia	27.1.14	27.1.14																				
65	Príprava ÚR	25.1.13	10.4.14																				
66	Stratifikácia ÚR	25.1.13	10.4.14																				
67	Komplexné návetkovoprávne uporiadanie neškodnosti a zabezpečenia vystavenia listov vlastníctva	17.1.13	24.12.13																				

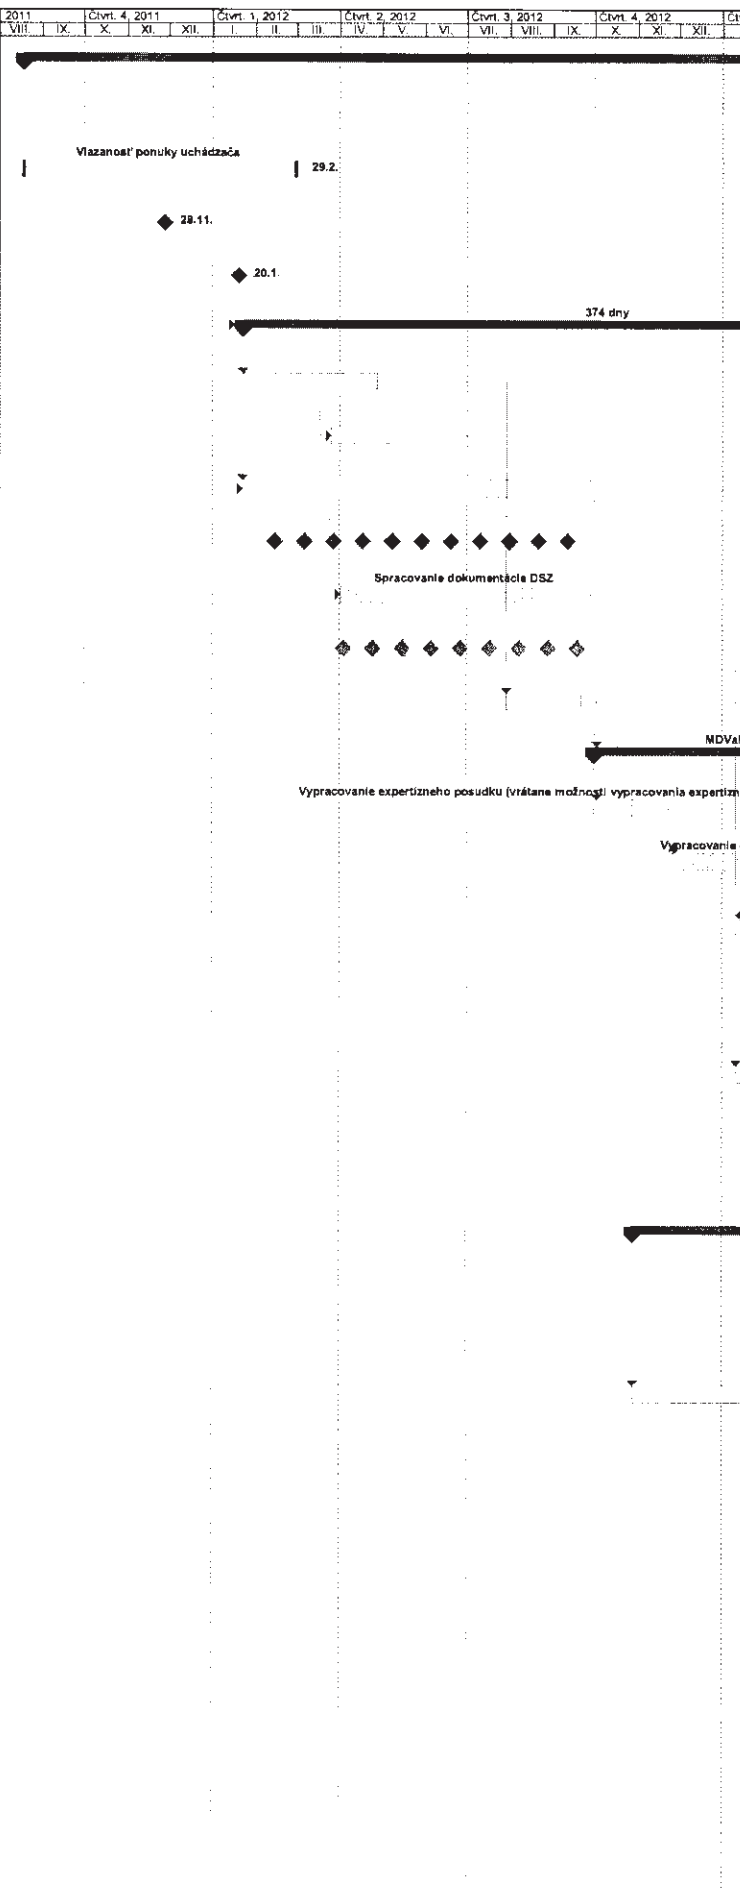

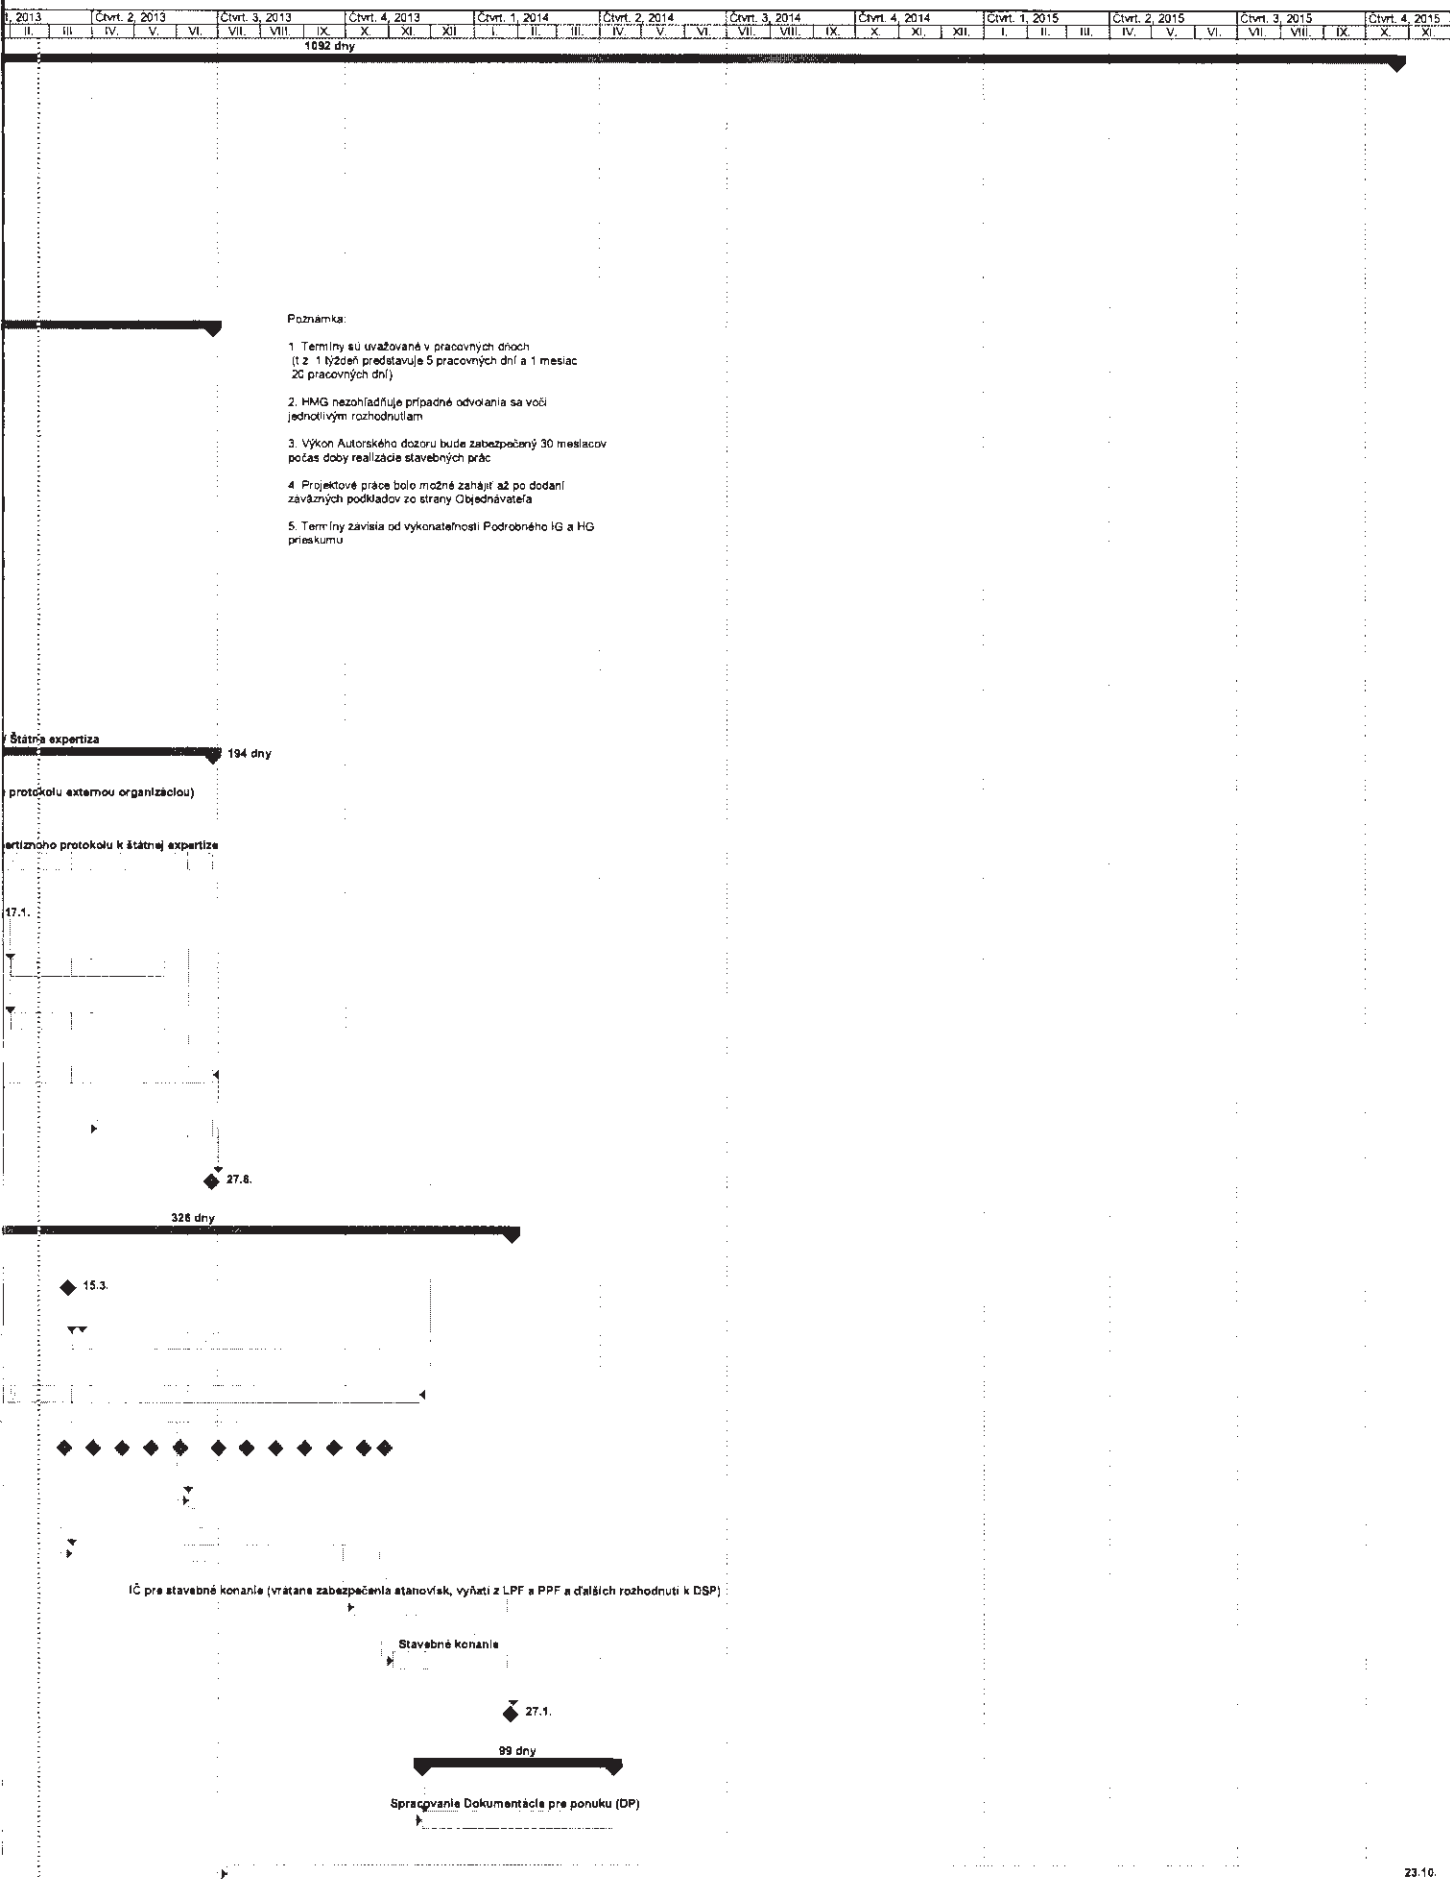


# Harmonogram vydania územného rozhodnutia Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

ID	Názov úkolu	Zahajenie	Dokončenie	2011																						
				VIII	IX	X	XI	XII	Čvt. 1, 2012			Čvt. 2, 2012			Čvt. 3, 2012			Čvt. 4, 2012								
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	19.8.11	23.10.15																							
2	Vydanie záverečnej stanovisko MŽP k Zámery (proces EIA ukončený) dňa 9.6.2009	31.6.11	31.6.11																							
3	Vydanie rozhodnutia uchádzača	19.8.11	29.2.12																							
4	Foedex 200	28.11.11	28.11.11																							
5	Podanie návrhu na podanie návrhu na začatie pojednania v súvislosti s územným rozhodnutím	20.1.12	20.1.12																							
6	Príprava stavby v stupni UR (DSZ)	23.1.12	27.6.13																							
7	Geotechnické štúdie	31.1.12	27.4.12																							
8	Prírodné pamiatky a štúdiá okrem IG a HG prieskumu (nebolo možné vykonať)	29.3.12	10.9.12																							
9	Smernice a dokumentácia DÚR	29.1.12	29.9.12																							
10	Terminy na vykonávanie úkolu DÚR	15.2.12	12.9.12																							
22	Spracovanie dokumentácie DSZ	24.12	29.9.12																							
23	Terminy na vykonávanie úkolu DSZ	4.4.12	19.9.12																							
33	Smernice a štúdie Dokumentačné a bezpečnostné	30.1.12	21.9.12																							
34	MDVaRR - Štátna expertíza	1.10.12	27.6.13																							
35	Výročná správa expertiznej skupiny - štátna expertíza - vypracovanie a expertíza expertiznej protokolu na úseku DSZ	1.10.12	21.11.12																							
36	Výročná správa expertiznej protokolu k štátni expertíze	29.11.12	27.9.13																							
37	Podanie na Ústredný úrad železničnej správy o vypracovaní stanoviska Ústredného úradu železničnej správy k vypracovaniu stanoviska Ústredného úradu železničnej správy	1.11.12	17.1.13																							
38	Činnosť súvisiaci s vypracovaním stanoviska Ústredného úradu železničnej správy k vypracovaniu stanoviska Ústredného úradu železničnej správy	1.2.13	23.3.13																							
39	Podanie na Ústredný úrad železničnej správy o vypracovaní stanoviska Ústredného úradu železničnej správy k vypracovaniu stanoviska Ústredného úradu železničnej správy	1.2.13	23.3.13																							
40	Podanie na Ústredný úrad železničnej správy o vypracovaní stanoviska Ústredného úradu železničnej správy k vypracovaniu stanoviska Ústredného úradu železničnej správy	1.11.13	27.4.14																							
41	Ustanovenie	24.11	27.6.13																							
42	Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia	27.6.13	27.6.13																							
43	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	29.10.12	27.1.14																							
44	Prírodné pamiatky a štúdiá okrem IG a HG prieskumu (nebolo možné vykonať)	10.9.12	19.9.12																							
45	Terminy na vykonávanie úkolu DSP	19.9.12	25.12.12																							
46	Smernice a štúdie DSP	29.11.12	24.11.13																							
47	Terminy na vykonávanie úkolu DSP	12.3.13	29.10.13																							
60	Podanie na Ústredný úrad železničnej správy o vypracovaní stanoviska Ústredného úradu železničnej správy k vypracovaniu stanoviska Ústredného úradu železničnej správy	10.9.12	29.9.13																							
61	Podanie na Ústredný úrad železničnej správy o vypracovaní stanoviska Ústredného úradu železničnej správy k vypracovaniu stanoviska Ústredného úradu železničnej správy	19.9.13	29.10.13																							
62	Podanie na Ústredný úrad železničnej správy o vypracovaní stanoviska Ústredného úradu železničnej správy k vypracovaniu stanoviska Ústredného úradu železničnej správy	1.11.13	24.1.14																							
63	Podanie na Ústredný úrad železničnej správy o vypracovaní stanoviska Ústredného úradu železničnej správy k vypracovaniu stanoviska Ústredného úradu železničnej správy	1.11.13	24.1.14																							
64	Vydanie právoplatného stavbyného povolenia	27.1.14	27.1.14																							
65	Príprava DP	29.11.13	10.4.14																							
66	Podanie na Ústredný úrad železničnej správy o vypracovaní stanoviska Ústredného úradu železničnej správy k vypracovaniu stanoviska Ústredného úradu železničnej správy	29.11.13	10.4.14																							
67	Kompletné majetkové právne usporiadanie nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva	8.7.12	29.10.15																							

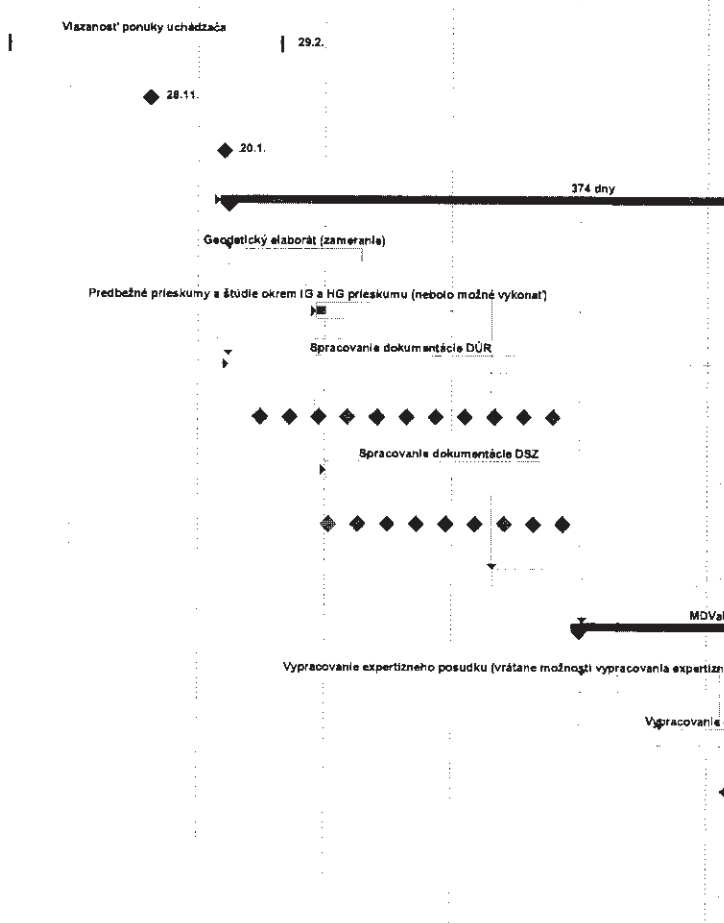


2013			Čtvrť 2, 2013			Čtvrť 3, 2013			Čtvrť 4, 2013			Čtvrť 1, 2014			Čtvrť 2, 2014			Čtvrť 3, 2014			Čtvrť 4, 2014			Čtvrť 1, 2015			Čtvrť 2, 2015			Čtvrť 3, 2015			Čtvrť 4, 2015	
II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	

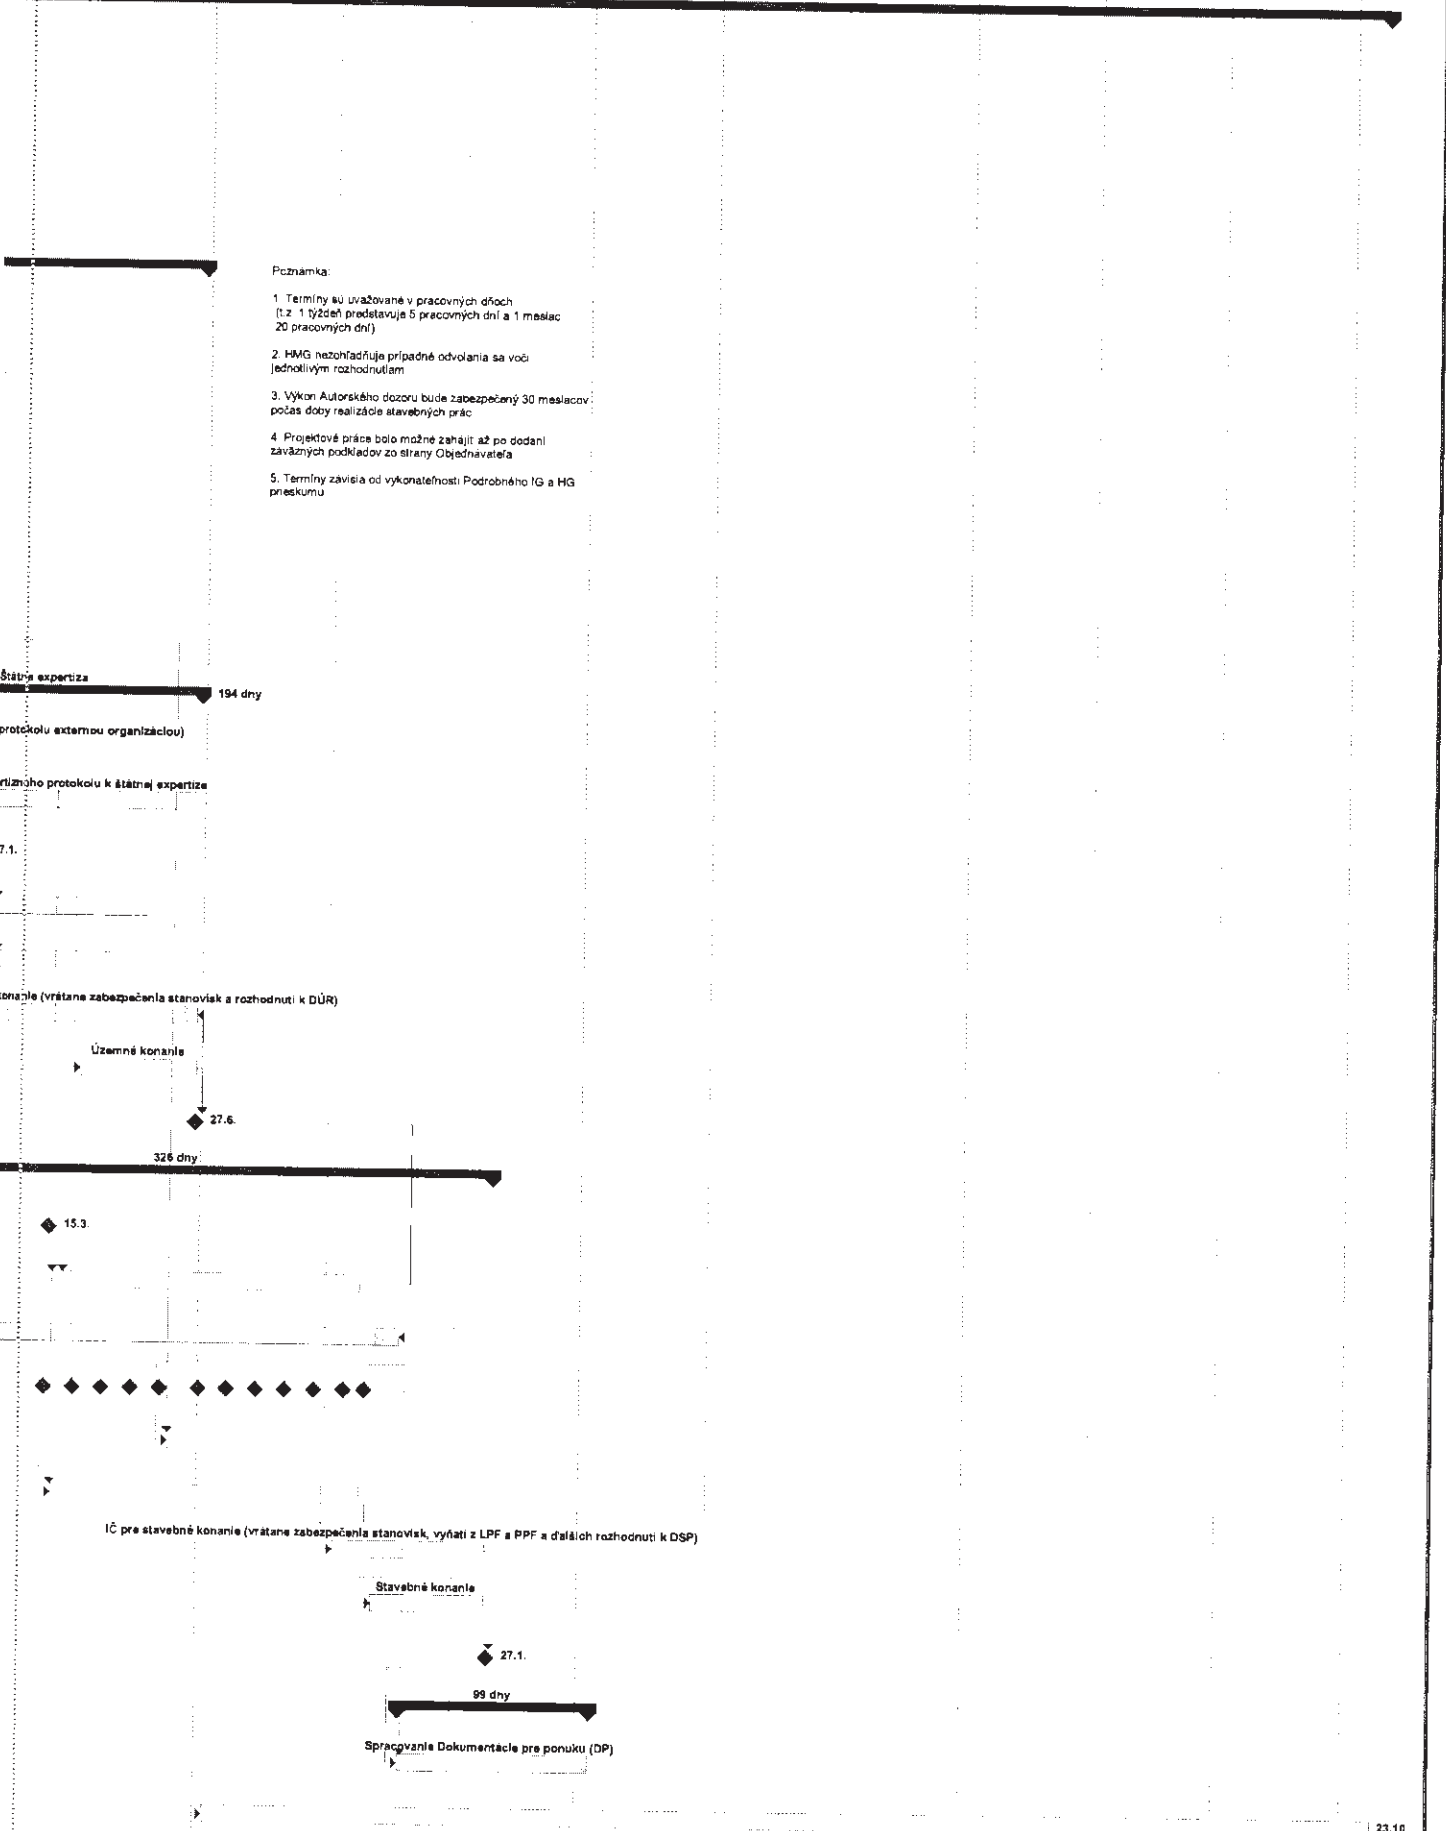

- Poznámka:
1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
  2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
  3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
  4. Projektové práce bolo možné zahájiť až po dodaní záväzných podkladov zo strany Objednávateľa
  5. Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG preskumu

**Harmonogram prác zhotoviteľa na DSP**  
**Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

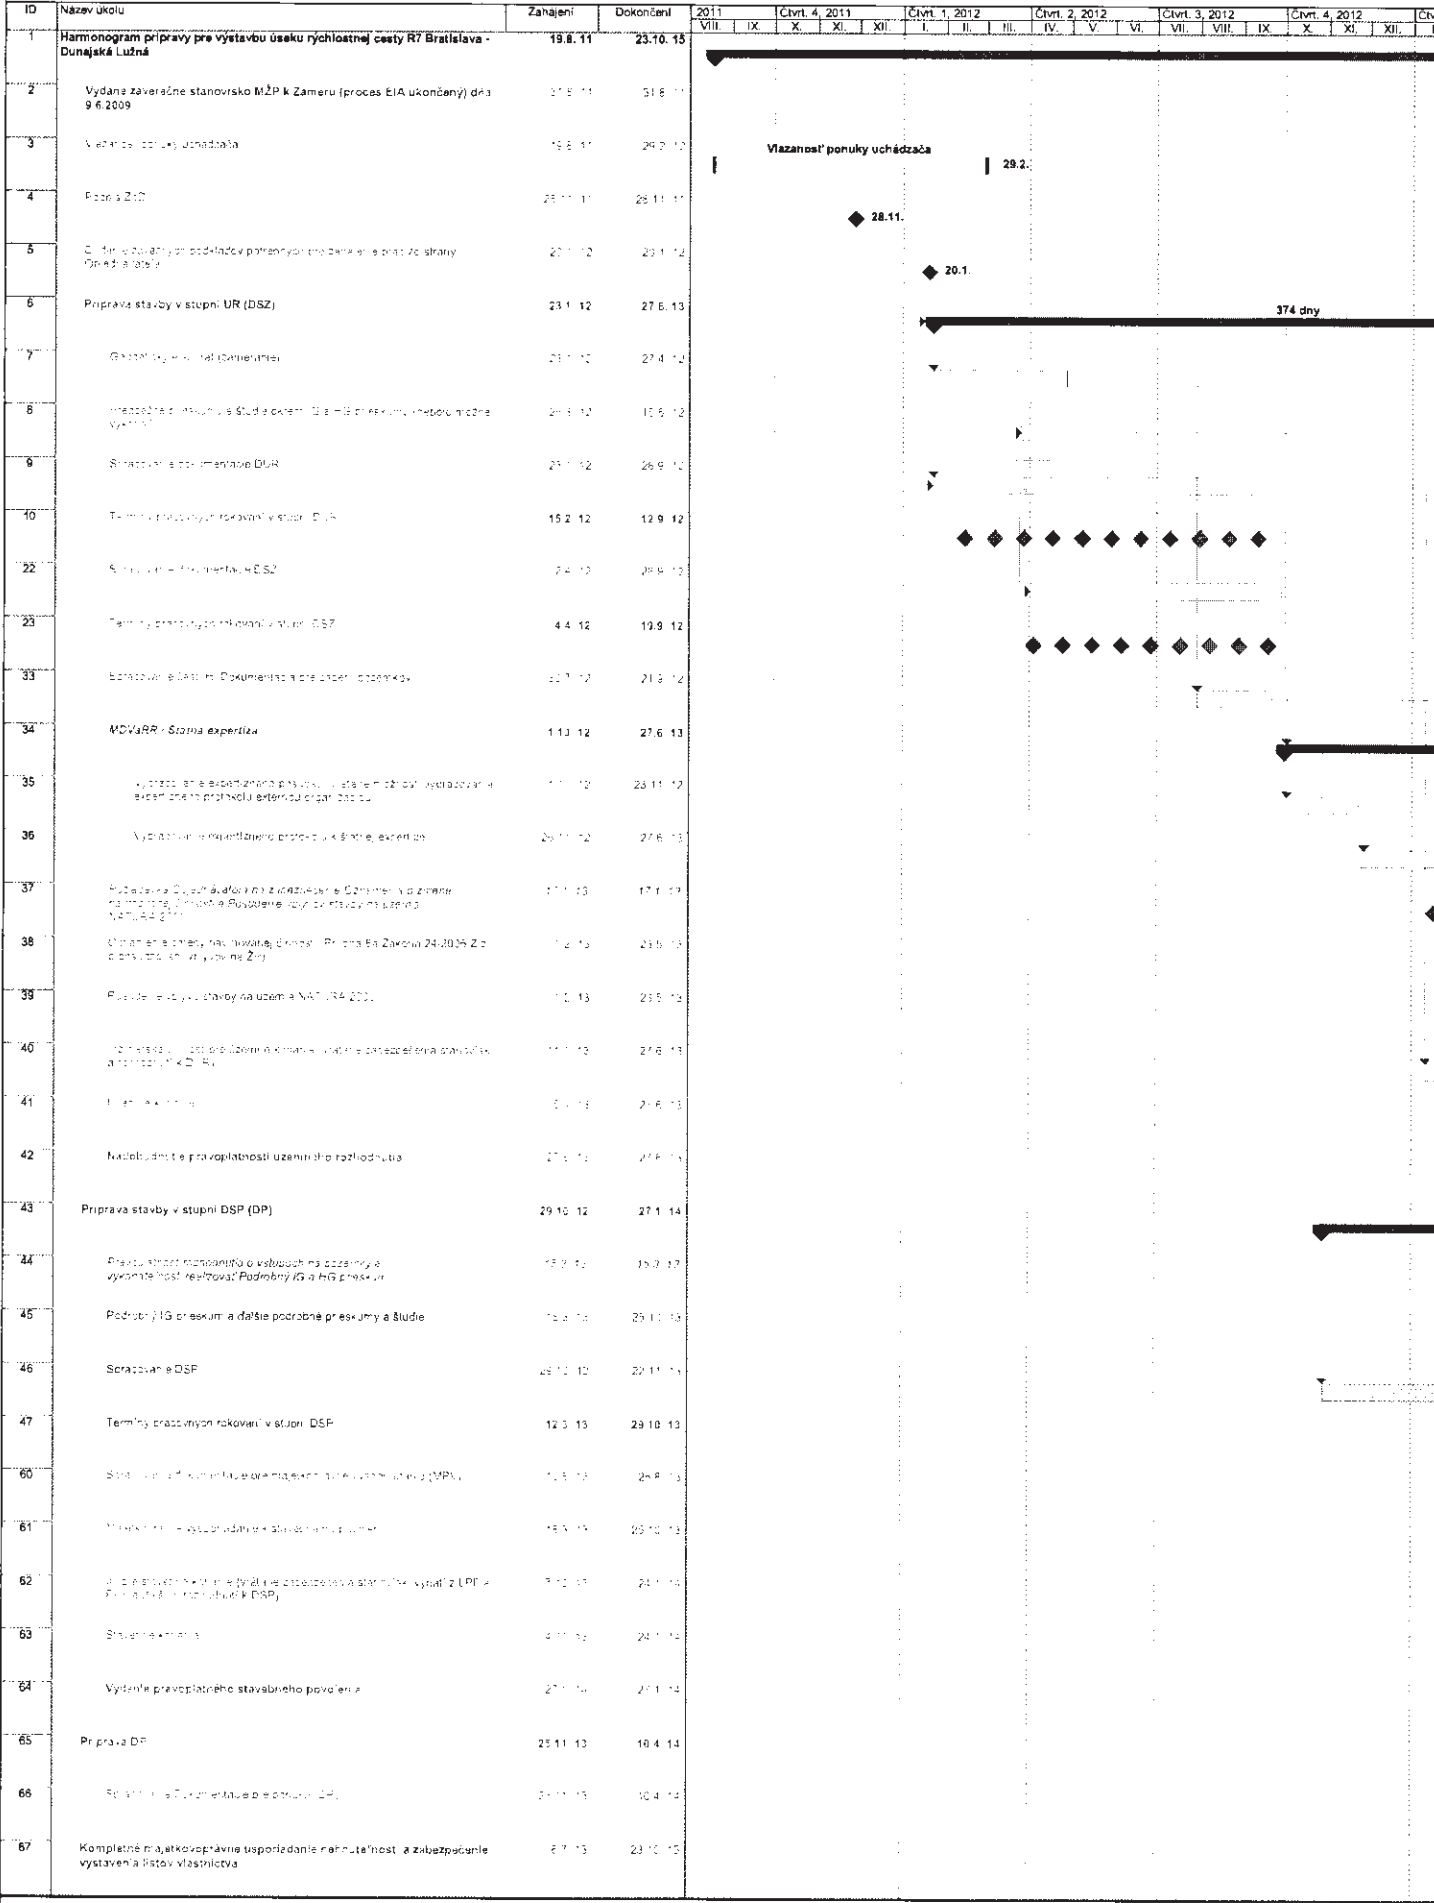

2013			Čtvrť 2, 2013			Čtvrť 3, 2013			Čtvrť 4, 2013			Čtvrť 1, 2014			Čtvrť 2, 2014			Čtvrť 3, 2014			Čtvrť 4, 2014			Čtvrť 1, 2015			Čtvrť 2, 2015			Čtvrť 3, 2015			Čtvrť 4, 2015		
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	

1092 dny

**Poznámka:**

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prac
4. Projektové práce bolo možné zanjiti až po dodaní záväzných podkladov zo strany Objednávateľa
5. Termíny závisia od vykonateľnosti. Podrobného IG a HG preskumu

194 dny

27.6

326 dny

15.3  
Podrobný IG preskum a ďalšie podrobné preskumy a štúdia

Spracovanie DSP



ič pre stavebné konanie (vrátane zabezpečenia stanovísk, vyňatí z LPP a PPF a ďalších rozhodnutí k DSP)

Stavebné konanie

27.1

99 dny

Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)

**Harmonogram vydania stavebného povolenia**  
**Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

ID	Název úkolu	Zahájenie	Dokončenie	2011												2012											
				VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Cvrt. 1, 2012	Cvrt. 2, 2012	Cvrt. 3, 2012	Cvrt. 4, 2012	Cvrt.		
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	19.8.11	23.10.15																								
2	Vydanie záverečného stanoviska MŽP k Zámeru (proces EIA ukončený) dňa 9.6.2009	31.8.11	31.8.11																								
3	Vyhľadanie pozemkov uchádzača	19.8.11	29.9.12																								
4	Podoba ZÚD	26.11.11	28.11.11																								
5	Dodanie požiarnej ochrany v prípade vyhlásenia požiarnej zóny	20.1.12	20.1.12																								
6	Príprava stavby v štádiu ÚR (DSZ)	23.1.12	27.6.13																								
7	Geologický výskum (zameralenie)	20.1.12	27.4.12																								
8	Predbežné preskumy a štúdie okrem IG a HG preskumu (neboľo možné vykonať)	24.1.12	15.6.12																								
9	Spracovanie dokumentácie ÚR	21.1.12	28.9.12																								
10	Technická príprava k návrhu stavby ÚR	15.2.12	12.9.12																								
22	Spracovanie dokumentácie DSZ	2.4.12	26.9.12																								
23	Technická príprava k návrhu stavby ÚR	4.4.12	19.9.12																								
33	Spracovanie štátno-Deklarácia pre zásevy, bezpečnosť	10.1.12	21.3.12																								
34	MDVaRR - Štátna expertíza	1.10.12	27.6.13																								
35	Výpracovanie expertízneho posudku (vrátane možnosti vypracovania expertízneho posudku externou organizáciou)	1.10.12	23.11.12																								
36	Výpracovanie expertízneho posudku v štátno-Expertíza	26.11.12	27.6.13																								
37	Podpora štátno-Expertíza na zabezpečenie dokumentácie úseku	17.1.13	17.1.13																								
38	Uzatvorenie štátno-Expertíza (v rámci štátno-Expertíza)	1.2.13	23.5.13																								
39	Príprava štátno-Expertíza (v rámci štátno-Expertíza)	1.2.13	23.5.13																								
40	Uzatvorenie štátno-Expertíza (v rámci štátno-Expertíza)	1.2.13	27.6.13																								
41	Uzatvorenie štátno-Expertíza (v rámci štátno-Expertíza)	1.2.13	27.6.13																								
42	Návrh štátno-Expertíza (v rámci štátno-Expertíza)	27.6.13	27.6.13																								
43	Príprava stavby v štádiu DSP (DP)	29.10.12	27.1.14																								
44	Príprava štátno-Expertíza (v rámci štátno-Expertíza)	10.2.13	10.2.13																								
45	Príprava štátno-Expertíza (v rámci štátno-Expertíza)	19.3.13	25.11.13																								
46	Spracovanie DSP	20.1.13	22.11.13																								
47	Technická príprava k návrhu stavby DSP	12.2.13	29.10.13																								
60	Príprava štátno-Expertíza (v rámci štátno-Expertíza)	1.6.13	26.9.13																								
61	Príprava štátno-Expertíza (v rámci štátno-Expertíza)	19.8.13	25.10.13																								
62	IČ-Štátno-Expertíza (vrátane záležitostí stanoviská vyhlásených z LPF a PPP a ďalších rozhodnutí k DSP)	1.10.13	26.1.14																								
63	Stavebné konanie	21.1.14	24.1.14																								
64	Vydanie právoplatného stavebného povolenia	27.1.14	27.1.14																								
65	Príprava DP	28.11.13	10.4.14																								
66	Spracovanie DSP (vrátane štátno-Expertíza)	20.1.14	10.4.14																								
67	Kompletné maľetkovoprávne usporiadanie činnosti a zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva	9.7.15	23.10.15																								

2013			Čtvrt. 2, 2013			Čtvrt. 3, 2013			Čtvrt. 4, 2013			Čtvrt. 1, 2014			Čtvrt. 2, 2014			Čtvrt. 3, 2014			Čtvrt. 4, 2014			Čtvrt. 1, 2015			Čtvrt. 2, 2015			Čtvrt. 3, 2015			Čtvrt. 4, 2015	
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.

1092 dny

Poznámka:

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nashľaduje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
4. Projektové práce bolo možné zahájiť až po dodaní záväzných podkladov zo strany Objednávateľa
5. Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG preskúmu

Štátna expertiza 194 dny

protokolu externou organizáciou)

oznámenia protokolu k štátnej expertize

17.1.

27.6.

326 dny

15.3.

IC pre stavebné konanie (vrátane zabezpečenia stanovísk, vyňatí z LPF a PPF a ďalších rozhodnutí k DSP)

Stavebné konanie

27.1.


99 dny

Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)



# Harmonogram prác zhotoviteľa na DP Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

ID	Názov úkolu	Zahajení	Dokončení	2011												2012											
				VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.							
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	19.8.11	23.10.15	[Gantt bar]																							
2	Vydanie zaveraceho stanoviska MŽP k Zameru (proces EIA ukončený) dňa 9.6.2009	21.9.11	31.6.11	[Gantt bar]																							
3	Viacnásobný územný úschováka	19.8.11	26.7.12	[Gantt bar]																							
4	Podoba ZÚO	26.11.11	26.11.11	[Gantt bar]																							
5	Doplnenie návrhu inštalácie požiarnej ochrany a prístupníkov Opatrnostná	20.1.12	20.1.12	[Gantt bar]																							
6	Príprava stavby v stupni ÚR (DSZ)	23.1.12	27.6.13	[Gantt bar]																							
7	Geotekn. a statick. zameranie	23.1.12	27.4.12	[Gantt bar]																							
8	Príprava preskúmania štúdie o číselných podmienkach inštalácie možnej výstavby	26.3.12	15.6.12	[Gantt bar]																							
9	Strukturálna dokumentácia DUR	23.1.12	26.9.12	[Gantt bar]																							
10	Terminy prací na území v stupni DUR	15.2.12	12.9.12	[Gantt bar]																							
22	Spracovanie dokumentácie DSZ	2.4.12	26.9.12	[Gantt bar]																							
23	Terminy prací na území - rozšírenie výstavby DSZ	4.4.12	19.9.12	[Gantt bar]																							
33	Spracovanie dokumentácie Dokumentácia pre zabezpečenie	15.7.12	21.9.12	[Gantt bar]																							
34	MDVaRR - Štátna expertíza	1.10.12	27.6.13	[Gantt bar]																							
35	Výstava a expozíčné protokoly štátnej expertízy vypracovaná expertízou prírodnej oblasti Dunajská Lužná	1.10.12	23.11.12	[Gantt bar]																							
36	Výstava a expozíčné protokoly štátnej expertízy	26.11.12	27.6.13	[Gantt bar]																							
37	Hodnotenie dopadov na zabezpečenie a fungovanie ochrany prírody, prírody a Posledné vojnové stavby na území NATURA 2000	1.11.12	17.1.13	[Gantt bar]																							
38	Otvorená oblasť navrhovanej činnosti - Príloha 6a Zákonu 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov ZÚO	1.2.13	23.5.13	[Gantt bar]																							
39	Posudzovanie vplyvov na území NATURA 2000	1.2.13	23.5.13	[Gantt bar]																							
40	Technické podmienky prírodných pamiatok, ktoré zabezpečujú a slúžia ako základ pre DUR	11.2.13	27.6.13	[Gantt bar]																							
41	Územné rozhodnutie	1.4.13	27.6.13	[Gantt bar]																							
42	Nadebnosť a právoplatnosť územného rozhodnutia	27.6.13	27.6.13	[Gantt bar]																							
43	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	29.10.12	27.1.14	[Gantt bar]																							
44	Posudzovanie dopadov výstavby na území ochrany prírody, prírody a Posledné vojnové stavby na území NATURA 2000	16.2.13	16.9.13	[Gantt bar]																							
45	Podpora štátnej expertízy štátnej expertízy prírodnej oblasti Dunajská Lužná	16.2.13	25.10.13	[Gantt bar]																							
46	Spracovanie DSP	26.11.12	20.11.13	[Gantt bar]																							
47	Terminy prací na území v stupni DSP	12.3.13	29.10.13	[Gantt bar]																							
60	Správa o ochrane prírody a krajiny (OPK) - vyhlásenie (RMPV)	1.6.13	26.9.13	[Gantt bar]																							
61	Majetkové usporiadanie k stavbe na území prírody	16.3.13	26.10.13	[Gantt bar]																							
62	Územné rozhodnutie (vydanie rozhodnutia o stavbe) - vyhlásenie z LPF a DSP a súhlas s územným rozhodnutím DSP	7.12.13	24.1.14	[Gantt bar]																							
63	Stavba stavby	4.11.13	24.1.14	[Gantt bar]																							
64	Výdanie právoplatného stavebného povolenia	27.1.14	27.1.14	[Gantt bar]																							
65	Príprava DP	25.11.13	10.4.14	[Gantt bar]																							
66	Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)	25.11.13	10.4.14	[Gantt bar]																							
67	Kompletné majetkové usporiadanie nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva	6.7.14	23.10.15	[Gantt bar]																							

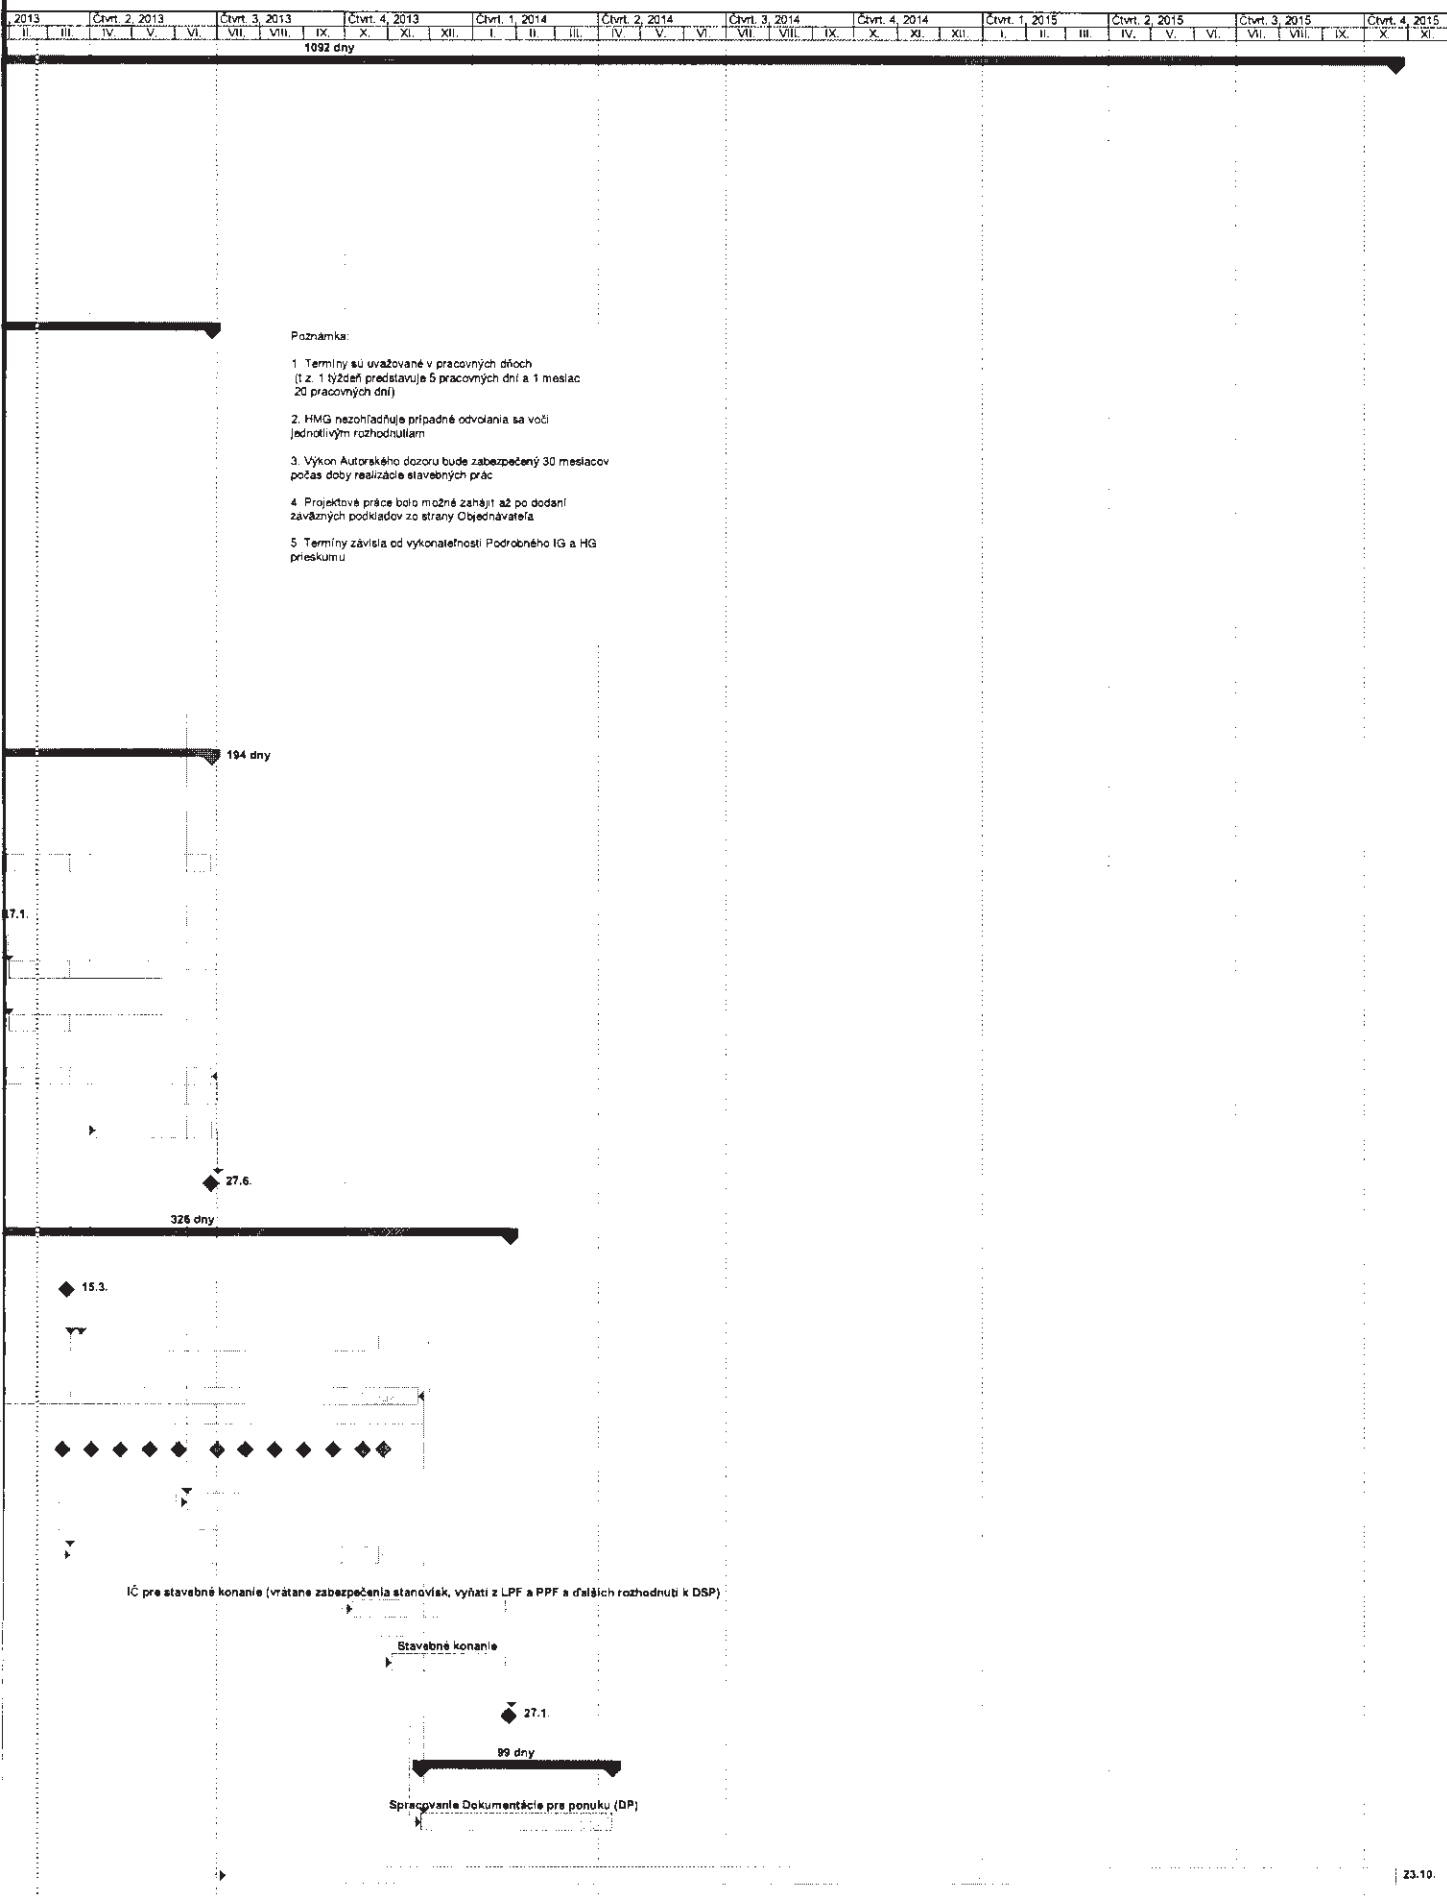

Poznámka:

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác
4. Projektové práce bolo možné zahájiť až po dodaní záväzných podkladov zo strany Objednávateľa
5. Termíny závisia od vykonateľnosti Podrobného IG a HG preskumů

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifická cena prác  
 Dokumentácia stavebného zámeru  
 Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Tabuľka č.1.1

Název časti dokumentácie		Potrebný počet hodín			Cena celkom v €
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
1		36,51	28,21	21,91	
	Projektová časť				
A	Spríevodná správa	12	12	12	1 039,56 €
B	Technická správa	12	23	12	1 349,87 €
B1	Prehľadné tabuľky	5	19	23	1 222,47 €
B2	Výpočet smerového vedľa trasy	5	12	9	718,26 €
C	Ekonomická správa	23	12	12	1 441,17 €
D	Výkresy	117	1 869	981	78 489,87 €
E	Doklady		9	47	1 283,66 €
3	Podklady a prieskumy				
1	Dopravno-inžiniersky prieskum			140	3 067,40 €
2	Pedologický prieskum	23	19		1 375,72 €
3	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného		23	23	1 152,76 €
4	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa		23	23	1 152,76 €
5	Architektonická štúdia	12			338,52 €
6	Hluková štúdia	47			1 325,87 €
7	Exhalačná štúdia	47			1 325,87 €
8	Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum				1 500,00 €
9	Korózný a geoelektrický prieskum	16	26	23	1 821,55 €
10	Seizmický prieskum	23	18		1 347,51 €
11	Archeologický prieskum		18	6	639,24 €
12	Geodetický elaborát	23	561	175	20 499,79 €
4	G Cena verejnej práce		47	23	1 829,80 €
	Navrhovaná cena bez DPH				122 921,65 €
	DPH 20 %				24 584,33 €
	Navrhovaná cena s DPH				147 505,98 €

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác  
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie  
 Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
		<b>36,51</b>	<b>28,21</b>	<b>21,91</b>	Potrebný počet hodín		
1	Projektová časť						
A	Sprievodná správa		12		12		601,44 €
B	Technická správa		12		12		601,44 €
C	Ekonomická správa				12		262,92 €
D	Výkresy		210		210		10 525,20 €
E	Doklady		12		23		842,45 €
3	Podklady a prieskumy						
1	Dopravno-inžiniersky prieskum				9		197,19 €
2	Pedologický prieskum				9		197,19 €
3	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu				9		197,19 €
4	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa				9		197,19 €
5	Architektonická štúdia				9		197,19 €
6	Hluková štúdia				9		197,19 €
7	Exhalačná štúdia				9		197,19 €
8	Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum				0		- €
9	Korózný a geoelektrický prieskum				9		197,19 €
10	Seizmický prieskum				9		197,19 €
11	Archeologický prieskum				9		197,19 €
12	Geodetický elaborát		35		35		1 754,20 €
4	G Cena verejnej práce				9		197,19 €
5	H Záber pozemkov	409			103		25 765,16 €
6	J Vplyv stavby na životné prostredie		47				1 325,87 €
7	K Projekt monitoringu	23			35		2 856,85 €
	Informačný bulletin				47		1 829,80 €
	Navrhovaná cena bez DPH						48 534,42 €
	DPH 20 %						9 706,88 €
	Navrhovaná cena s DPH						58 241,30 €

Název časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91		
Potrebný počet hodín					
<i>Dokumentácia na stavebné povolenie</i>					
A	12	12	47		1 806,41 €
B.1	9	12	23		1 171,04 €
B.2	9	12	23		1 171,04 €
B.3	9	12	23		1 171,04 €
B.4	9	35	23		1 491,28 €
B.5	9	47	23		2 158,39 €
C.1	23	70	23		3 318,36 €
C.2	9	70	47		3 333,06 €
D	35	2 080	3 972		146 981,17 €
E	9	35	23		1 819,87 €
F	251	251	242		21 546,94 €
G	12	47	47		2 793,76 €
H		23	23		1 152,76 €
I					
	6	12			557,58 €
	23	47			2 165,60 €
		18			507,78 €
		18			507,78 €
		6	19		585,55 €
			82		1 796,62 €
			18		394,38 €
			6		131,46 €
					110 164,50 €
J		140	93		5 987,03 €
K		20	19		980,49 €
L	47	47	70		4 575,54 €
M		12			338,52 €
N		47	35		2 092,72 €
O	28	70	58		4 267,76 €
					324 968,43 €
					64 993,69 €
					389 962,12 €

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác  
 Podrobný inžierskogeologický a hydrogeologický prieskum

Časť	Druh prác	m.j.	I. etapa		II. etapa		Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	
			počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH								
	<b>TERENNE PRÁCE</b>												<b>61 240,00 €</b>	
A1	jadrové inžierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m		22,00				930	22,00				20 460,00 €	
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m		55,00				2	55,00				110,00 €	
	presímetrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m		22,00				380	22,00				8 360,00 €	
	presímetrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks		120,00				68	120,00				8 160,00 €	
	horizontálny inžierskogeologický vrt s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m		150,00				2	150,00				300,00 €	
	inklinometrické jadrové IG vrty so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nulového a prvého merania s vyhodnotením	m		70,00				2	70,00				140,00 €	
	inklinometrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nulového a prvého merania s vyhodnotením	m		80,00				2	80,00				160,00 €	
	pozorovacie jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m		60,00				2	60,00				120,00 €	
	pozorovacie jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m		70,00				2	70,00				140,00 €	
	piezometrické jadrové vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy	m		36,00				56	40,00				2 240,00 €	
	hydrodynamická skúška (na 1 vrte)	ks		800,00				2	800,00				1 600,00 €	
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)	ks		300,00				6	300,00				1 800,00 €	
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m		22,00				450	22,00				9 900,00 €	
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m		20,00				200	20,00				4 000,00 €	
kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy, dopravy	m		60,00				50	60,00				3 000,00 €		
dočasná prístupová cesta	m2		2,00				375	2,00				750,00 €		
													<b>7 481,60 €</b>	
A2	metóda SOP - priemerný náklad s vyhodnotením	m		3,75				2	3,75				7,50 €	
	georadarové meranie - priemerný náklad s vyhodnotením	m		8,00				2	8,00				16,00 €	
	vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m		1,80				3600	1,80				6 480,00 €	
	seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením	m		6,00				2	6,00				12,00 €	
	gravimetria - priemerný náklad s vyhodnotením	m		3,00				2	3,00				6,00 €	
	karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením	m		12,00				80	12,00				960,00 €	
													<b>25 328,00 €</b>	
	<b>LABORATORNE PRÁCE – mechanika zemin a skalných hornín</b>													
	zeminy - porušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks		39,00				180	39,00					7 020,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks		50,00				145	50,00					7 250,00 €
zeminy - technologické vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť (PS, ID)	ks		50,00				17	50,00					850,00 €	
zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks		102,00				25	102,00					2 550,00 €	
zeminy - krabicová šmyková skúška (reziduálna šmyková pevnosť)	ks		50,00				25	50,00					1 250,00 €	
zeminy - triaxiálna šmyková skúška	ks		85,00				20	85,00					1 700,00 €	
zeminy - sliaciteľnosť bez rekonsolidácie	ks		26,00				25	26,00					650,00 €	
zeminy - sliaciteľnosť s konsolidáciou	ks		39,00				25	39,00					975,00 €	

B1	zeminy - stanovenie časového sučiniteľa konsolidácie, cv	ks		9,00	- €	15	9,00	135,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (1 valček)	ks		13,00	- €	10	13,00	130,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín	ks		40,00	- €	17	40,00	680,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks		11,00	- €	25	11,00	275,00 €
	zeminy - Proctor standard	ks		43,00	- €	9	43,00	387,00 €
	zeminy - bobtnavosť	ks		14,00	- €	5	14,00	70,00 €
	zeminy - priepustnosť	ks		60,00	- €	7	60,00	420,00 €
	zeminy - presadavosť	ks		14,00	- €	3	14,00	42,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť, mrazuvzdornosť)	ks		52,00	- €	2	52,00	104,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks		90,00	- €	2	90,00	180,00 €
	skalné horniny - pretvárné vlastnosti	ks		200,00	- €	2	200,00	400,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST	ks		20,00	- €	2	20,00	40,00 €
	skalné horniny - deformačný modul, Poissonove číslo, modul pružnosti	ks		110,00	- €	2	110,00	220,00 €
	<b>LABORATORNE PRÁCE – chémia vôd a zemín</b>				- €			<b>3 335,00 €</b>
	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks		57,00	- €	55	57,00	3 135,00 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks		10,00	- €	20	10,00	200,00 €
	<b>MERACSKÉ PRÁCE</b>				- €			<b>2 202,00 €</b>
	vytyčenie vrťov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks		5,00	- €	220	5,00	1 100,00 €
	polohové a výškové zameranie vrťov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks		5,00	- €	220	5,00	1 100,00 €
	polohové a výškové zameranie stabilizných (zosuvných) profilov s vyhodnotením	m		1,00	- €	2	1,00	2,00 €
<b>PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY</b>				<b>1 500,00 €</b>			<b>10 578,00 €</b>	
projekt geologickej úlohy	ks		200,00	- €	4	200,00	800,00 €	
archivácia vrtného jadra (vzorkovnice s krytom + doprava do skladu NDS v Bratislave)	m		5,00	- €	80	5,00	400,00 €	
vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks		2,00	- €	200	2,00	400,00 €	
vzorkovanie - neponušené vzorky	ks		2,00	- €	135	2,00	270,00 €	
vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks		2,00	- €	19	2,00	38,00 €	
vzorkovanie - voda	ks		2,00	- €	55	2,00	110,00 €	
kontrolné inklinometrické meranie	m		10,00	- €	2	10,00	20,00 €	
kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks		5,00	- €	8	5,00	40,00 €	
záverečné spracovanie:								
I. etapa: z archivných materiálov								
II. etapa: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archivných i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilizné výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením, ) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrťov, šachtíc - archivných i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratorných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilizné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel , geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopirovaniu) + reprografické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2	subor	1	1 500,00	1 500,00 €	1	8 500,00	8 500,00 €	
<b>Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)</b>				<b>1 500,00 €</b>			<b>110 164,50 €</b>	
<b>DPH 20 %</b>				<b>300,00 €</b>			<b>22 032,90 €</b>	
<b>Navrhovaná cena s DPH</b>				<b>1 800,00 €</b>			<b>132 197,40 €</b>	

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny  
 Majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby

	Predmet	m.j.	počet m.j. *	Gena za m.j. bez DPH v €	Celková cena bez DPH v €
A	Zabezpečenie LV a PK vložky (výpisu) zo železničnej knihy (resp. dedičského rozhodnutia)	ks	335	2,00	670,00 €
		ks	335	2,00	670,00 €
B	Lustrácia LV, Pk vložky alebo vložky zo železničnej knihy Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť výstavbou priamo dotknuté	ks	335	40,00	13 400,00 €
		ks	335	2,00	670,00 €
C	Vypracovanie a doručenie návrhu zmluvy a výzvy doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým a právnickým osobám+tabuľka v MS Excel  Zabezpečenie uzavretia zmluvy , pri neuzavretej zmluve dodanie právoplatného vyvlastňovacieho rozhodnutia, obmedzeniavlastníckeho práva, alebo právoplatného súdneho rozhodnutia	ks	335	95,00	31 825,00 €
		ks	335	2,00	670,00 €
E	Podanie návrhu na zápis zmluvy do katastra nehnuteľnosti a zabezpečenie vystavenia LV na nadobúdateľa  Zastupovanie pred súdmi v rámci celého konania alebo zabezpečenie celého konania o súdnej úschove	ks	15	2,00	30,00 €
		<b>Navrhovaná cena bez DPH</b>			
<b>DPH 20 %</b>					<b>9 587,00 €</b>
<b>Navrhovaná cena s DPH</b>					<b>57 522,00 €</b>

K plneniu uvedených položiek je potrebné vypracovať prehľadnú tabuľku o stave MPV v MS Excel.  
 Vo výslednej cene nie sú obsiahnuté súdne a správne poplatky a pod., ktoré bude potrebné v zmysle platných právnych predpisov zaplatiť.

Pozn. \* uvedený počet m.j. slúži len pre účely vyhodnotenia súťaže



Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác  
 Inžinierska činnosť k územnému a k stavebnému konaniu

Tabuľka č.1.6

Predmet	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91	Potrebný počet hodín		
IČ za zabezpečenie Protokolu o vykonaní štátnej expertízy	50	200				7 467,50 €
IČ za zabezpečenie stanovisk k DUR	120	250	80			13 186,50 €
IČ za zabezpečenie právoplatného ÚR	100					3 651,00 €
IČ za zabezpečenie stanovisk k DSP	120	200	100			12 214,20 €
IČ za zabezpečenie rozhodnutia o vyňatí z PPF		50				1 410,50 €
IČ za zabezpečenie rozhodnutia o vyňatí z LPF		50				1 410,50 €
IČ za zabezpečenie právoplatného SP	300					10 953,00 €
Navrhovaná cena bez DPH						50 293,20 €
DPH 20 %						10 058,64 €
Navrhovaná cena s DPH						60 351,84 €



Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác  
 Zmena navrhovanej činnosti a netechnické zhrnutie  
 Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Tabuľka č. 1.8

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91		
	Potrebný počet hodín				
1	80	140	70		8 403,90 €
2	30	60			2 787,90 €
					- €
					- €
Navrhovaná cena bez DPH					11 191,80 €
DPH 20 %					2 238,36 €
Navrhovaná cena s DPH					13 430,16 €

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác  
 Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000  
 Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Tabuľka č. 1.9

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91		
	Potrebný počet hodín				
1	140	90	80		9 403,10 €
Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000					
Navrhovaná cena bez DPH					9 403,10 €
DPH 20 %					1 880,62 €
Navrhovaná cena s DPH					11 283,72 €

**Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná**  
**Špecifikácia ceny prác spolu**

Tabuľka č. 1.10

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia stavebného zámeru	122 921,65 €	24 584,33 €	147 505,98 €
Dokumentácia pre územné rozhodnutie	48 534,42 €	9 706,88 €	58 241,30 €
Zmena navrhovanej činnosti a natechnické zhrnutie	11 191,80 €	2 238,36 €	13 430,16 €
Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000	9 403,10 €	1 880,62 €	11 283,72 €
Dokumentácia na stavebné povolenie	324 968,43 €	64 993,69 €	389 962,12 €
Inžinierska činnosť k územnému a k stavebnému konaniu	50 293,20 €	10 058,64 €	60 351,84 €
Dokumentácia pre ponuku a výkon autorského dozoru	172 596,05 €	34 519,21 €	207 115,26 €
<b>Spolu</b>	<b>739 908,65 €</b>	<b>147 981,73 €</b>	<b>887 890,38 €</b>
Majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie	47 935,00 €	9 587,00 €	57 522,00 €
<b>Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže - kritérium)</b>	<b>787 843,65 €</b>	<b>157 568,73 €</b>	<b>945 412,38 €</b>

**DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava**

---



# CENOVÁ PONUKA

k zmluve č. ZM/2011/0423 resp. 7732-00

na dopracovanie častí dokumentácie

„Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“

Objednávateľ:



**NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ**

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava*

Cenová ponuka je spracovaná na základe dohody zmluvných strán.

---

**V Bratislave, december 2012**

## Identifikačné údaje zhotoviteľa



### Zhotoviteľ

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Sídlo: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť,  
Zápis v obchodnom registri: zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
v zastúpení: Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Bartolomej Šechný,  
podpredseda predstavenstva  
Ing. Igor Jakubík,  
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 31 322 000

DIČ: 202054770

Tel./Fax:



## Predmet cenovej ponuky

DOPRAVOPROJEKT, a.s. ako zhotoviteľ na základe dohody zmluvných strán predkladá cenovú ponuku k zmluve č. ZM/2011/0423 resp. 7732-00

### na dopracovanie častí dokumentácie „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“:

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a, vrátane netechnického zhrnutia,
- primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000 v zmysle článku 6.3 (samostatná časť).

## Rozsah a obsah predmetu cenovej ponuky

### Zmena navrhovanej činnosti stavby

Materiál bude vypracovaný v zmysle prílohy č. 8a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a týka sa porovnania technického riešenia stavby rýchlostnej cesty v procese EIA odsúhlaseného vydaným záverečným stanoviskom a technického riešenia v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

### Netechnické zhrnutie

Materiál bude vypracovaný v nasledujúcej štruktúre:

- Účel projektu,
- Stručný popis technického riešenia,
- Charakteristika ovplyvnenej oblasti,
- Základné charakteristiky environmentálneho prostredia (biota): krajina, klíma, voda, pôda, fauna, flóra, vegetácia, chránené územia, obyvateľstvo, atď. + dopady a zmierňujúce opatrenia,
- Hodnotenie očakávaného vývoja, za predpokladu neimplementovania investícií,
- Dodržiavanie činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou,
- Pravdepodobný dopad na územia,
- Kompenzačné opatrenia,
- Porovnanie variantov riešenia.

Súčasťou materiálu bude grafická časť s farebným odlišením zmien technického riešenia trasy rýchlostnej cesty na rastrovej mape a ortofotomape (M 1:10 000).

### Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000

Vypracuje sa hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3. Smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. appropriate assesment. Súčasťou elaborátu bude v prípade existujúcich negatívnych dopadov, hodnotenie potenciálnych možností ich zmiernenia.

## Termín plnenia

Jednotlivé termíny plnenia budú dohodnuté dohodou zmluvných strán dodatkom k zmluve.

## Cena

Cena za predmet zákazky je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

<b>Cena spolu bez DPH:</b>	<b>20 594,90 €</b>
<b>DPH 20 %:</b>	<b>4 118,98 €</b>
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>24 713,88 €</b>

**Slovom s DPH: dvadsaťštyritisíc sedemstotrinásť celých a osemdesiatosem stotín eura**

Špecifikácia ceny tvorí prílohu tejto cenovej ponuky.



## Iné podmienky

časť Zmena navrhovanej činnosti vrátane netechnického zhrnutia a časť Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000

- počet vyhotovení **7 ks v tlačenej forme,  
1x CD.**

Prípadné navyše vyhotovenia materiálu na požiadanie objednávateľa budú ocenené podľa aktuálneho cenníka reprografických prác a služieb DOPRAVOPROJEKT, a.s., ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto cenovej ponuky.

Závazok podľa tejto cenovej ponuky zaniká, ak sa okolnosti, z ktorých sa vychádzalo pri jej spracovaní zmenili tak, že od zhotoviteľa, resp. objednávateľa nemožno rozumne požadovať, aby uzatvoril dodatok k zmluve na základe tejto cenovej ponuky. K tomuto zániku však dochádza, len ak jedna strana tohto záväzku (zhotoviteľ, resp. objednávateľ) túto závažnú zmenu okolností bez zbytočného odkladu oznámi druhej strane tohto záväzku.

Prílohy: č.1 Špecifikácia ceny  
č.2 Cenník reprografických prác a služieb

V Bratislave dňa 17.12.2012

Túto cenovú ponuku preskúmali a overili:

za zhotoviteľa:

**Ing. Bartolomej Sechný**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Igor Jakubík**  
člen predstavenstva a  
výrobný riaditeľ a.s.

Príloha č.1 Špecifikácia ceny

		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
	Názov časti dokumentácie	36,51	28,21	21,91	
1	Zmena navrhovanej činnosti stavby	80,00	140,00	70,00	20 594,90 €
2	Netechnické zhrnutie	30,00	60,00		8 403,90 €
3	Primerané posúdenie vplyvu územia NATURA 2000	140,00	90,00	80,00	2 787,90 €
					9 403,10 €
	Navrhovaná cena bez DPH				20 594,90 €
	DPH 20 %				4 118,98 €
	Navrhovaná cena				24 713,88 €

Príloha č.2 Cenník reprografických prác a služieb (bez DPH)

Por.č.	Druh činnosti	m.j.	Cena v €	
1	<b>Kopírovanie písomností</b>	A4		
	ČB-jednostranne	A4	0.04	
	-obojsstranne	A4	0.08	
	-na pauzák	A4	0.10	
	- na fóliu	A4	0.37	
	-na papier	A4	0.06	
	- z knihy	jednostranne	A4	0.05
		obojsstranne	A4	0.11
		jednostranne	A3	0.12
	obojsstranne	A3	0.23	
2	<b>Kopírovanie písomností</b>			
	farebné -jednostr.	A4	0.56	
	-obojsstranné	A4		
	-jednostr.	A3	1.13	
	-obojsstranné	A3		
	-na fóliu	A4	0.83	
	-fólia	A4	1.33	
3	<b>Xerografie výkresov</b>			
	-na papier	A4	0.23	
	-na fareb. papier	A4		
	-zväčšenie	A4	0.23	
4	<b>Scanovanie</b>			
	ČB-do A3		0.50	
	ČB- do A0		0.50	
5	<b>Ploter</b>			
	Farba- čiarová	A4	0.33	
	- plošná		1.33	
	Ortofotomapa	A4	1.66	
6	<b>Knihárske práce</b>			
	Väzba spinky+ fólia	A4	0.50	
		A3	0.60	
	Väzba-spinková	A4	0.02	
		A3	0.02	
	Obal s poťahom	A4	1.33	
	Krabica v- 10 cm	A4	4.15	
		A3	6.64	
	Hrebeňová väzba	A4	1.19	
		A3	1.56	
	Unibind		1.29	
	Knížná väzba		13.28	
	Zlatenie	r.	0.23	
	Lepenie 1ks		0.13	
	Rez strojom		0.20	
	Rozobranie		0.07	
	Vkladanie		0.07	
	Elektr. spinky	sp.	0.02	
	7	<b>Ostatné práce</b>		
Ručné strihanie		A4	0.03	
Skladanie			0.03	
8	<b>Kompletizácia</b>			
	Jednoduchý obal	ks	0.20	
	Záložkový obal	ks	0.43	
	Šnúrkový obal	ks	0.83	
