

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ : **Rozhlas a televízia Slovenska,**
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Štatutárny orgán: Václav Mika, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Bankové spojenie: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vložka
č.:1922/B
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **VV partners s.r.o**
Puškinova 58, 900 01 Modra
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Grošaft, konateľ
IČO: 46669931
DIČ: 2023538374
IČ DPH: SK2023538374
Bankové spojenie: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro .Vložka
číslo:81696/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

ČLÁNOK 2 Preambula

Túto zmluvu o dielo (ďalej len „ zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok realizácie verejného obstarávania na dodanie predmetu zákazky: “Rekonštrukcia priestorov telefónnej ústredne v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava“

ČLÁNOK 3 Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie dodania predmetu zákazky. “Rekonštrukcia priestorov telefónnej ústredne v budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava“ v rozsahu a obsahu projektovej dokumentácie spracovanú Ing. M.Sahuľom v 06/2013

Obsah projektovej dokumentácie:

- A- Sprievodná správa
- B- Súhrnná technická správa
- C- Situácia širších vzťahov
- E- Požiarne zabezpečenie objektu
- F- Statický posudok
- G- Architektúra
- H- Zdravotechnika
- I- Elektroinštalácie
- J- Vykurovanie
- K- Vzduchotechnika a chladenie

L- Meranie a regulácia
M- Elektronická požiarová signalizácia

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa riadne a včas dodá všetky požadované práce v rozsahu a podľa podmienok stanovených touto zmluvou a špecifikovaných v projektovej dokumentácii, a to v lehote do 60 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
- 3.3 Súčasťou vykonania Diela je aj:
3.1.1. vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní,
3.1.2. zaškolenie obsluhy na prevádzku dodaných zariadení a technológií,
3.1.3. odovzdanie všetkých príslušných dokladov prináležiacich k Dielu v zmysle článku 9. tejto Zmluvy.
- 3.4 Za riadne zhotovené Dielo sa pre účely tejto Zmluvy považuje Dielo, ktoré je vykonané podľa podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, platných právnych predpisov a príslušných STN, je v plne funkčnom a prevádzky schopnom stave, spĺňa podmienky BOZP a ochrany životného prostredia, a boli na ňom odstránené vady a nedorobky.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo podľa:
3.5.1 spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie,
3.5.2 neskorších vzájomne Zmluvnými stranami písomne odsúhlasených zmien Projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK 4 **Termíny a miesto vykonania Diela**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovovania Diela (ďalej len ako: „Termíny“):
4.1.1 prevzatie staveniska: do 5 dní od účinnosti Zmluvy
4.1.2 zahájenie prác na Diele: do 5 dní od účinnosti Zmluvy
4.1.3 realizácia Diela v Termínoch: vymedzených v Harmonograme (Príloha č. 2)
4.1.4 odovzdanie dokončeného Diela do: 60 dní od účinnosti Zmluvy
- 4.2 Miestom vykonania Diela: Budova RTVS Bratislava, Mlynská dolina, Bratislava
- 4.3 Termíny zhotovovania Diela sa predlžujú o dobu trvania prekážok nezávislých od vôle Zhotoviteľa, ktoré mu bránia vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ tieto prekážky alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo tieto prekážky mohol predvídať.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný okamžite písomne informovať Objednávateľa o vzniku prekážok (ich povahe, začiatku a konci) podľa predchádzajúceho bodu, resp. akejkolvek inej skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s dôsledkom nedodržania stanovených Termínov plnenia. Zhotoviteľ počas doby trvania prekážok nie je v omeškaní. Zodpovednosť Zhotoviteľa však nie je vylúčená a Termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť bezodkladne informovať Objednávateľa o vzniku prekážok.
- 4.5 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 4.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vyhotoviť aktualizovaný Harmonogram zohľadňujúci predĺženie stanovených Termínov zhotovovania Diela a tento doručiť Objednávateľovi.

ČLÁNOK 5 **Cena**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež v súlade s výsledkom verejného obstarávania na cene predmetu zmluvy v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá je súčasťou zmluvy (príloha č.1) vo výške :

Cena Diela bez DPH	180 742,89.-	€
DPH 20 %	36 148,58.-	€
Cena celkom :	216 891,47.-	€

slovom : dvestošestnásťtisíosemstodevät'desiatjedna euro,47.-cent

- 5.2 Cena Diela je stanovená na základe predloženej projektovej dokumentácie spolu s výkazom výmer a obhliadky miesta realizácie Diela. K zmene ceny Diela môže dôjsť pri:
- zmene alebo doplnení nových konštrukcií podľa požiadaviek Objednávateľa,
 - realizácii ďalších stavebných prác a dodávok nad rámec výkazu výmer
- 5.3 Cena Diela zahŕňa celý predmet Diela a pokrýva celý zmluvný záväzok spolu so všetkými náležitosťami nevyhnutnými na riadne vykonanie a odovzdanie Diela.
- 5.4 Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v rozsahu Cenovej ponuky, budú odpočítané z ceny Diela uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy.
- 5.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že RTVS použila na predmet tejto zmluvy finančné prostriedky na základe Zmluvy so štátom, Zmluva č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017 a jej príslušného Dodatku pre rok 2015.

ČLÁNOK 6

Práce navyč

- 6.1 Práce navyč podľa čl.5.2 musia byť zapísané do stavebného denníka po predchádzajúcom odsúhlasení zástupcom Objednávateľa pre veci technické podľa tejto zmluvy.
- 6.2 Cena navyč prác bude určená na základe jednotkových cien uvedených v Cenovej ponuke Zhotoviteľa, ak je cenu týchto častí Diela možné takto určiť, alebo bude cena určená na základe aktuálneho cenníka stavebných prác CENEKON platného pre príslušné obdobie znížená o zľavu 25 %, podľa toho, ktorá z uvedených cien bude nižšia .

ČLÁNOK 7

Platobné podmienky

- 7.1 Po ukončení prác celého Diela Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru, prílohou ktorej bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený Zhotoviteľom a zástupcom Objednávateľa pre veci technické podľa tejto zmluvy a Preberací protokol.
- 7.2 Nárok na odmenu vzniká odsúhlasením realizovaných prác zo strany Objednávateľa. Čiastková fakturácia je možná za práce skutočne realizované a odsúhlasené Objednávateľom.
- 7.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom faktúra bude uhradená výhradne prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v hlavičke tejto zmluvy.
- 7.4 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že tomu tak nebude, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 7.5 Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má Zhotoviteľ právo požadovať z dlžnej sumy za každý deň omeškania zákonný úrok z omeškania.
- 7.6 V prípade zistenia vád a nedorobkov pri preberaní Diela, ktorých hodnota nerevyšuje 10 % z faktúrovanej sumy a ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ zadrží 10% zábezpeku z fakturovanej sumy Zhotoviteľom. Zábezpeka bude Zhotoviteľovi uvoľnená po odstránení vád a nedorobkov na základe zápisnice o ich odstránení.

ČLÁNOK 8

Podmienky a zhotovenie Diela

- 8.1 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa:

- 8.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v deň nástupu na vykonávanie Diela, t.j. určí miesta napojenia na vodu a el. energiu nevyhnutnú na realizáciu Diela. Objednávateľ poskytne vodu a el. energiu na vykonanie Diela bezplatne.
- 8.1.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi 1 x projektovú dokumentáciu, čo zhotoviteľ potvrdí v stavebnom denníku.
- 8.1.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov pre veci technické: Ing.Pavel Malo – tel: XXXXXX a Ing.Zuzana Bujalková – tel: XXXXXX a prostredníctvom osoby vykonávajúcej stavebný dozor kontrolovať Dielo na každom stupni jeho zhotovenia.
- 8.1.4 Zástupcovia Objednávateľa podľa bodu 8.1.3 budú riadne vykonávané práce odsúhlasovať svojím podpisom v stavebnom denníku.
- 8.1.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.2 Povinnosti Zhotoviteľa:
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr 2 dni pred začatím prác, odovzdať Objednávateľovi menný zoznam zamestnancov, ktorí budú Dielo vykonávať, za účelom zabezpečenia ich vstupu do objektu Objednávateľa.
- 8.2.2 Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, v súlade s Projektom vrátane jeho zmien a v súlade s harmonogramom a cenovou ponukou Zhotoviteľa, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR najmä: stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o požiarnej ochrane. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu počas výkonu prác za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj osobitných predpisov v oblasti BOZP a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá počas priebehu prác v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov. Zhotoviteľ a jeho poverené osoby sú povinné riadiť sa a dodržiavať aj interné predpisy Objednávateľa – bezpečnostné pokyny v priestoroch RTVS, s ktorými budú preukázateľne oboznámení pred výkonom prác. Zhotoviteľ je povinný ohlásiť bezodkladne Objednávateľovi akékoľvek nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré vznikne v priebehu prác a má vplyv na prevádzku RTVS a zamestnancov RTVS. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok počas realizácie prác.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov len v mieste realizácie Diela a po určenej komunikácii k nemu, ktorú určí zástupca Objednávateľa. Následky porušenia tejto povinnosti znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 8.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoškodí majetok Objednávateľa. Ak by došlo k poškodeniu majetku Objednávateľa, táto skutočnosť sa bude riešiť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a subsidiárne z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác aj udržiavanie (primeraná čistota, zamedzenie prašnosti, ochranné zakrývanie a prekrytie plôch) na určených a dohodnutých prístupových komunikáciách do priestorov Telefónnej ústredne a Digitalizačného pracoviska.
- 8.2.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím dôkladne pri vynaložení odbornej starostlivosti preskúmal Projekt ako aj všetky ostatné dokumenty tvoriace prílohy tejto Zmluvy, a že tieto neobsahujú žiadne prekážky vykonania Diela, sú na zhotovovanie Diela vhodné a je schopný podľa nich Dielo zhotoviť. V prípade, že sa v priebehu vykonávania Diela zistia nedostatky Projektu alebo iného dokumentu tvoriaceho prílohu tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ

povinný na ne Objednávateľa bezodkladne písomne upozorniť, v opačnom prípade zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.

- 8.2.6 V priebehu vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje okamžite písomne upozorniť Objednávateľa na časti Projektu alebo dielenskej dokumentácie, ktoré sa zdajú byť zbytočné, alebo upozorniť na rozsah práce, ktorá sa zdá byť nákladná a na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ schopný zaistiť lacnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kritérií požadovaných v Projekte.
- 8.2.7 Použitie zariadení a materiálov, ktoré môžu mať vplyv na vzhľad Diela, podlieha predchádzajúcemu schváleniu vzorky takýchto zariadení a materiálov Objednávateľom. Bez takéhoto schválenia nie je Zhotoviteľ oprávnený zariadenia a materiály podľa predchádzajúcej vety pri vykonávaní Diela použiť.
- 8.2.8 Až po písomné odovzdanie a prevzatie zhotoveného Diela nesie zodpovednosť za Dielo v plnom rozsahu Zhotoviteľ. V prípade zistenia väd (napr. priamo od výrobcu), poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich odovzdaním a prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí zhotoveného Diela bez väd a nedorobkov.
- 8.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude počas celého priebehu realizácie Diela vykonávať všetky predpísané skúšky v zmysle platných právnych predpisov, alebo príslušných STN a zabezpečí vydanie protokolov o týchto skúškach. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred Termín konania každej skúšky. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie výsledky všetkých uskutočnených skúšok. Protokoly o skúškach budú podpísané oboma zmluvnými stranami, pričom Objednávateľ dostane jedno vyhotovenie od Zhotoviteľa najneskôr do 3 dní od konania skúšky.
- 8.2.10V prípade vyskytnutia sa vady je Zhotoviteľ povinný materiály, stavebné časti, alebo zariadenia, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam nahradiť, a v prípade potreby opakovať neúspešné skúšky.
- 8.2.11Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť oznámiť Objednávateľovi Termín konania skúšky, je povinný skúšku uskutočniť opätovne za účasti Objednávateľa, alebo umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly, a znášať náklady s tým spojené.
- 8.2.12Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce budú vykonávané za plnej prevádzky Objednávateľa a bude môcť hlučné práce vykonávať v takom čase, aby stavebným ruchom nebola narušená prevádzka vysielania a nahrávania. Termín hlučných prác je potrebné vopred konzultovať so zástupcom Objednávateľa pre veci technické Ing. Zuzana Bujalková – tel.: XXXXXXX , Ing. Pavel Malo – tel.: XXXXXX.
- 8.2.13Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie prác bude denne prítomný na stavbe stavbyvedúci, ktorý bude plne zodpovedný za organizáciu a riadenie prác. Zhotoviteľ poveruje svojim zastupovaním na stavbe: Ing.Vladimír Liššák - tel.: XXXXXX.

- 8.3 Obe strany sú povinné bezodkladne poskytovať druhej Zmluvnej strane žiadanú súčinnosť v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, a to na základe písomnej výzvy s presným vymedzením žiadanej súčinnosti.

ČLÁNOK 9

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v požadovanej kvalite podľa platných STN a projektovej dokumentácie.
- 9.2 Zhotoviteľ po ukončení prác odovzdá Dielo Objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu“, v ktorom bude písomne zachytený skutkový stav Diela pri odovzdávaní, spísané prípadné zistené vady a termín ich odstránenia.

- 9.3 Prevzatie Diela na základe Preberacieho protokolu nie je potvrdením zhotovenia Diela bez väd. Objednávateľ do 30 dní od podpisu Preberacieho protokolu Dielo prehliadne.
- 9.4 Zhotoviteľ k odovzdaniu Diela pripraví a Objednávateľovi odovzdá dokladovú dokumentáciu:
- jedno potvrdené vyhotovenie dokumentácie so zakreslenými zmenami vzniknutými počas realizácie oproti pôvodnej dokumentácii, vrátane všetkých profesií,
 - protokoly o vykonaných predpísaných revíziách a funkčných skúškach technických a technologických zariadení,
 - osvedčenia, atesty, certifikáty a prehlásenia zhody od všetkých použitých materiálov, technických a technologických prvkov,
 - záručné listy na všetky použité materiály a technologické zariadenia,
 - návody na obsluhu jednotlivých technických a technologických zariadení v slovenskom jazyku,
 - zoznam subjektov oprávnených vykonávať servis nainštalovaných technických a technologických zariadení,
 - súpis skutočne vykonaných prác,
 - stavebný denník,
 - doklad o likvidácii odpadu,
 - resp. iné doklady, ktoré sú potrebné pre riadne zhotovenie a užívanie Diela.
- 9.5 Po odstránení väd Zhotoviteľom podpíše Zmluvné strany Protokol o odstránení väd a nedorobkov.
- 9.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Dielo v termíne podľa bodu 4.1.4 tejto zmluvy, mieste a dohodnutým spôsobom, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z hodnoty Diela za každý deň omeškania.

ČLÁNOK 10

Záručná doba, vady Diela a sankcie

- 10.1 Zhotoviteľ poskytuje na vykonané Dielo záruku:
- na vykonané práce - dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Diela
- Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré neboli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.2 Pre vady a nedorobky zistené pri preberaní Diela začína záručná lehota plynúť odo dňa podpisu Protokolu o odstránení väd a nedorobkov. Pre skryté vady začína záručná lehota plynúť odo dňa ich odstránenia Zhotoviteľom. Záručná doba sa počas odstraňovania väd predlžuje o čas potrebný na odstránenie väd.
- 10.3 Reklamáciu vady Objednávateľ písomne uplatní u Zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po zistení vady.
- 10.4 Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, tzv. havarijných stavoch (následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad), je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu a jej následky, alebo zabezpečiť vykonanie provizórneho opatrenia za účelom odvrátenia hroziaceho nebezpečenstva škôd najneskôr do 12 hodín od obdržania reklamácie. Objednávateľ je oprávnený v takýchto výnimočných prípadoch zabezpečiť provizórne opatrenie sám a Zhotoviteľ je povinný nahradiť mu náklady, ktoré na opatrenie účelne vynaložil.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť v záručnej dobe písomne reklamované vady Diela bezplatne. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamované vady neodkladne, najneskôr však do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase podľa dohody zmluvných strán. V prípade potreby objednania materiálu sa uvedená lehota predlžuje o dodáciu lehotu materiálu za podmienky, že Zhotoviteľ o dĺžke dodacej lehoty Objednávateľa bezodkladne po doručení reklamácie písomne informuje. Zhotoviteľ je povinný po odstránení vady predložiť Objednávateľovi na podpis Preberací protokol, pokiaľ tak neuskutoční, vada sa nepovažuje za odstránenú.

- 10.6 Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovanie vady podľa bodu 10.5. tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.7 V prípade, že Zhotoviteľ nezačne v uvedenom termíne s odstraňovaním vady, je Objednávateľ oprávnený zadať odstránenie vady tretej osobe a Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaplatiť Objednávateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s odstránením vady. Objednávateľ bude Zhotoviteľovi vynaložené náklady refakturovať samostatnou faktúrou so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia pre každú vadu samostatne.
- 10.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu na základe samostatnej faktúry Objednávateľa, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.
- 10.10 Uplatnením, alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý Objednávateľov nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK 11. **Platnosť a účinnosť zmluvy**

- 11.1 Táto Zmluva zaniká jej splnením, ukončením dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy oprávnenou zmluvnou stranou.
- 11.2 Platnosť zmluvy môže skončiť: dohodou
odstúpením.
- 11.3 Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností.
Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje:
a) zo strany Zhotoviteľa:
- nedodržanie termínu začatia prác podľa bodu 4.1.2 tejto zmluvy,
- omeškanie s odovzdaním Diela z viny na strane Zhotoviteľa o viac ako 5 dní oproti termínu podľa bodu 4.1.4 tejto zmluvy,
b) zo strany Objednávateľa:
- neumožnenie realizácie Diela podľa tejto zmluvy,
- neposkytnutie súčinnosti, potrebnej k realizácii Diela.
- 11.4 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že si nebudú vracaať už poskytnuté plnenia a najneskôr do 10. dní od odstúpenia od zmluvy sa dohodnú na finančnom vyrovnaní. Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla porušením zmluvnej povinnosti.
- 11.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

ČLÁNOK 12. **Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
- 12.2 Zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

- 12.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sa podrobne oboznámili s predmetom zmluvy, s jej obsahom a obsahom jej príloh a nemajú voči nim žiadne výhrady ani návrhy na doplnenie.
- 12.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 12.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1: Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 10.10.2014, súčasťou ktorej je Rozpočet
Príloha č.2: Časový harmonogram realizácie Diela
- 12.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Bratislave,

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odjednávatel' : Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava
Zhotoviteľ : Consulting spoločnosť s ručením obmedzeným, Súkennícka 13, Bratislava
Spracovateľ : Ing. Viktor Bujnovský

Stavba : RTVS - priestory telefónnej ústredne

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavebné práce - Telefónna ústredňa - I. etapa	54 646,39	10 929,28	65 575,66
Stavebné práce - Telefónna ústredňa - II. etapa	11 601,50	2 320,30	13 921,80
Zdravotechnika - Telefónna ústredňa - I. etapa	2 029,17	405,83	2 435,00
Vykurovanie - Telefónna ústredňa - I. etapa	5 037,27	1 007,45	6 044,72
Vykurovanie - Telefónna ústredňa - II. etapa	756,53	151,31	907,84
Elektroinštalácia - Telefónna ústredňa - I. etapa	20 181,41	4 036,28	24 217,69
Elektroinštalácia - Telefónna ústredňa - II. etapa	4 542,69	908,54	5 451,23
Vzduchotechnika - Telefónna ústredňa - I. etapa	49 518,32	9 903,66	59 421,98
Vzduchotechnika - Telefónna ústredňa - II. etapa	4 593,83	918,77	5 512,60
EPS - Telefónna ústredňa - I. etapa	3 892,23	778,45	4 670,68
EPS - Telefónna ústredňa - II. etapa	624,69	124,94	749,63
Meranie a regulácia - Telefónna ústredňa - I. etapa	14 180,53	2 836,11	17 016,64
Meranie a regulácia - Telefónna ústredňa - I. etapa (Dispečerské pracovisko)	8 306,00	1 661,20	9 967,20
Meranie a regulácia - Telefónna ústredňa - II. etapa	832,34	166,47	998,81
Stavba spolu :	180 742,89	36 148,58	216 891,47

Harmonogram stavby "RTVS"

Rekonštrukcia priestorov v telefónnej ústredni v budove RTVS,

Kód položky	Mesiac					Február 2						
	Týždeň					8. T						
	Deň					16	17	18	19	20	21	22
	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania							
035OK	RTVS		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
001	PRÁCE A DODÁVKY HSV		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		23. 02. 2015	12. 03. 2015	18,00							
31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m ² páč. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m ³	23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00							
31023-9411	Vyspravenie otvorov pri prierezoch pre rozvody - odhad	kpl	02. 03. 2015	12. 03. 2015	11,00							
M001	Vyspravenie a domurovanie otvorov po VZT a EL	kpl	23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00							
6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
63247-7001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konstr.hr.25mm	m ²	23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00							
64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m ²	kus	23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00							
553 319810	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm	kus	23. 02. 2015	26. 02. 2015	4,00							
6124-71512	Hlbkova penetrácia, prestierkovanie flexcleber	m ²	16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
613473115	Príplatok za zabudovanie rohovníky	m	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m ²	16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m ²	16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
96205-2211	Búranie otvorov v konštrukciách pre rozvody - odhad	kpl	23. 02. 2015	26. 02. 2015	4,00							
978011191.1	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu 100%	m ²	16. 03. 2015	19. 03. 2015	4,00							
97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	23. 03. 2015	02. 04. 2015	11,00							
002	PRÁCE A DODÁVKY PSV		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
725	725 - Zariaďovacie predmety		23. 02. 2015	09. 04. 2015	46,00							
72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	23. 02. 2015	26. 02. 2015	4,00							
72512-2813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	súbor	23. 02. 2015	26. 02. 2015	4,00							
72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	23. 02. 2015	26. 02. 2015	4,00							
72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	23. 02. 2015	26. 02. 2015	4,00							
725000001	Hasiaci prístroj práškový 6kg	ks	23. 02. 2015	26. 02. 2015	4,00							
725000002	Hasiaci prístroj vodný 9kg	ks	06. 04. 2015	09. 04. 2015	4,00							

763	763 - Konštrukcie - drevostavby		23. 02. 2015	02. 04. 2015	39,00								
76313-7090	Dodávka a montáž kazetového podhľadu	m2	23. 02. 2015	02. 04. 2015	39,00								
766	766 - Konštrukcie stolárske		23. 03. 2015	26. 03. 2015	4,00								
76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	kus	23. 03. 2015	26. 03. 2015	4,00								
611 601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	kus	23. 03. 2015	26. 03. 2015	4,00								
99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	23. 03. 2015	26. 03. 2015	4,00								
767	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00								
76764-1120	Dodávka a montáž AL dverí, prípr. pre elektrozáмок, PO 30A+C 1800x2100mm (D1)	kus	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00								
76764-1121	Dodávka a montáž AL dverí, záмок, 2100x2100mm (D2)	kus	16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00								
76764-1122	Dodávka a montáž AL dverí, prípr. pre elektrozáмок, 1000x2100mm (D3)	kus	16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00								
76764-1123	Dodávka a montáž AL dverí, prípr. pre elektrozáмок, plné, 1800x2100mm (D4)	kus	16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00								
76764-1127	Dodávka a montáž AL dverí, záмок, plné, 700x2100mm (D8)	kus	16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00								
99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00								
771	771 - Podlahy z dlaždíc keramických		23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00								
77147-3112	Montáž soklov keramických	m	23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00								
597 649980	Keramické sokle	m2	23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00								
77157-1110	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00								
597 670800	Keramická dlažba	m2	23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00								
99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	23. 02. 2015	05. 03. 2015	11,00								
776	776 - Podlahy povlakové		30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00								
77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäččených plastov	m	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
284 1A9001	Sokel PVC	m	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových	m2	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
284 129150	Podlahovina Tarkett....	m2	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
77652-1230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostatických	m2	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
284 122850	Podlahovina antistatická	m2	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
697 410020	Textilný koberec	m2	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00								
781	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek		09. 03. 2015	26. 03. 2015	18,00								
78144-1017	Montáž obkladov vnútorných keramických	m2	09. 03. 2015	26. 03. 2015	18,00								
597 811000	Keramický obklad	m2	09. 03. 2015	26. 03. 2015	18,00								
99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	09. 03. 2015	26. 03. 2015	18,00								
784	784 - Maľby		02. 03. 2015	02. 04. 2015	32,00								
784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presádrovaním v miest. do 3,8m	m2	16. 03. 2015	02. 04. 2015	18,00								
78442-4272	Bezprašný náter stien a stropov	m2	09. 03. 2015	02. 04. 2015	25,00								

78445-2271	Maľba stien a stropov zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	02. 03. 2015	02. 04. 2015	32,00							
78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	m2	02. 03. 2015	02. 04. 2015	32,00							
786	786 - Čalunnicke úpravy		30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00							
78661-2200	Montáž vertikálnych žalúzií	m2	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00							
697 100000	Vertikálna textilná žalúzia	m2	30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00							
003	PRÁCE A DODÁVKY HSV- TU2		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
3	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
31023-9211.1	Oprava dilatácie - podľa statického posudku	kpl	16. 02. 2015	19. 02. 2015	4,00							
31023-9411.1	Vyspravenie otvorov pri prierezoch pre rozvody - odhad	kpl	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
63131-2711	Poter pieskocepmnt. 400kg cem./m3 ocel. hladeny hr. do 5 cm	m2	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
63247-7001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konstr.hr.25mm	m2	23. 02. 2015	12. 03. 2015	18,00							
004	PRÁCE A DODÁVKY PSV		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	13. 04. 2015	16. 04. 2015	4,00							
96205-2211	Búranie otvorov v konštrukciách pre rozvody - odhad	kpl	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
763	763 - Konštrukcie - drevostavby		23. 02. 2015	26. 03. 2015	32,00							
76313-7090	Dodávka a montáž kazetového podhľadu	m2	23. 02. 2015	26. 03. 2015	32,00							
776	776 - Podlahy povlakové		06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00							
77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00							
697 410020	Textilný koberec	m2	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00							
784	784 - Maľby		16. 02. 2015	26. 03. 2015	39,00							
784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presádrovaním v miest. do 3,8m	m2	16. 03. 2015	26. 03. 2015	11,00							
78445-2271	Maľba stien a stropov zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	02. 03. 2015	19. 03. 2015	18,00							
78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	m2	16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00							
005	zdravotechnika - TU1		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
721	721 Vnútná kanalizácia		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
72119	Vyved.a upev vypustiek kanal.	ks	23. 02. 2015	12. 03. 2015	18,00							
967	Oprava kanal.prepoj.	ks	16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00							
722	722 Vnútný vodovod		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
914	Oprava z potr. Plast	ks	16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00							
K005	Dezinfekcia potrubia	m	02. 03. 2015	12. 03. 2015	11,00							
713	713 Izolácia potrubia		09. 03. 2015	12. 03. 2015	4,00							
K006	Montáž tepelnej izolácie	m	09. 03. 2015	12. 03. 2015	4,00							

K007	Izolácia tepelná	m	09. 03. 2015	12. 03. 2015	4,00							
725.1	725 Zariadenie predmety		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
DM	Dodávka materiálu	kpl	16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
006	vykurovanie - TU1		16. 02. 2015	26. 03. 2015	39,00							
DM	Dodávka materiálu	m	16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00							
006.2	Vykurovacie telesá :		02. 03. 2015	19. 03. 2015	18,00							
DM	Dodávka materiálu	ks	02. 03. 2015	12. 03. 2015	11,00							
K023	Montáž obehových čerpadiel – do potrubia	ks	09. 03. 2015	19. 03. 2015	11,00							
K026	Montáž VODT KORAD	ks	09. 03. 2015	19. 03. 2015	11,00							
006.3	Nadpodlahové konvektory fy.: BOKI , ON FLOOR typ: 14		02. 03. 2015	26. 03. 2015	25,00							
DM	Dodávka materiálu	ks	02. 03. 2015	12. 03. 2015	11,00							
K030	Montáž nadpodlahových konvektorov	ks	02. 03. 2015	19. 03. 2015	18,00							
K032	Montáž kúpeľňových trubkových registrov	ks	02. 03. 2015	26. 03. 2015	25,00							
K033	Pripojenie jednotiek VZT vrátane montáže zmiešavacích uzlov – DN 20	ks	09. 03. 2015	26. 03. 2015	18,00							
007	vykurovanie -TU2		16. 02. 2015	26. 03. 2015	39,00							
007.1	Rozvodné potrubie :		16. 02. 2015	19. 03. 2015	32,00							
DM	Dodávka materiálu	m	16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00							
K001	tlakové skúšky potrubia	m	16. 03. 2015	19. 03. 2015	4,00							
007.2	Armatúry :		16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
DM	Dodávka materiálu	ks	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
007.4	Kúpeľňové trubkové registre.		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
DM	Dodávka materiálu	ks	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00							
K026	Montáž VODT KORAD	ks	23. 02. 2015	12. 03. 2015	18,00							
007.5	Nadpodlahové konvektory fy.: BOKI , ON FLOOR typ: 14		02. 03. 2015	26. 03. 2015	25,00							
DM	Dodávka materiálu	ks	02. 03. 2015	12. 03. 2015	11,00							
K030	Montáž nadpodlahových konvektorov	ks	16. 03. 2015	26. 03. 2015	11,00							
007.6	Nátery:		16. 03. 2015	26. 03. 2015	11,00							
K008	Základný	m	16. 03. 2015	26. 03. 2015	11,00							
K009	Dvojnásobný s 1 x emailovaním	m	16. 03. 2015	26. 03. 2015	11,00							
008	EI-TU1		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
008.0	Elektromontáže		16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00							
DM	Dodávka materiálu		16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00							
008.4	Špecifikácia dodávkyÚprava RH-NN		16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
M063	Odpojenie a pripojenie RS s úpravou napájacej skrine a príp. výmenou poistkových patrón	ks	16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
008.6	Montážny materiál a práce		16. 02. 2015	02. 04. 2015	46,00							
K067	do 2,5 mm2	ks	16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							

K068	6 mm2	ks	16. 02. 2015	12. 03. 2015	25,00							
K069	16 mm2	ks	16. 02. 2015	19. 03. 2015	32,00							
K070	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu		09. 03. 2015	02. 04. 2015	25,00							
K071	do 2,5 mm2	ks	16. 02. 2015	19. 03. 2015	32,00							
008.7	zásuvky		09. 03. 2015	19. 03. 2015	11,00							
DM	Dodávka materiálu	m	09. 03. 2015	19. 03. 2015	11,00							
008.8	osvetlenie		02. 03. 2015	19. 03. 2015	18,00							
DM	Dodávka materiálu	m	02. 03. 2015	19. 03. 2015	18,00							
008.9	Spínače a zásuvky		23. 02. 2015	19. 03. 2015	25,00							
DM	Dodávka materiálu	ks	23. 02. 2015	19. 03. 2015	25,00							
008.10	Svietidlá		20. 03. 2015	08. 04. 2015	20,00							
DM	Dodávka materiálu		20. 03. 2015	08. 04. 2015	20,00							
008.11	Interierová svítidla prisadené - stropné		18. 03. 2015	06. 04. 2015	20,00							
DM	Dodávka materiálu	ks	18. 03. 2015	06. 04. 2015	20,00							
008.12	Svetelné zdroje		16. 03. 2015	02. 04. 2015	18,00							
DM	Dodávka materiálu	ks	16. 03. 2015	02. 04. 2015	18,00							
008.14	SVORKOVNICE KRABICOVÁ		02. 03. 2015	19. 03. 2015	18,00							
DM	Dodávka materiálu		02. 03. 2015	19. 03. 2015	18,00							
008.15	Pododstavec 3 SLP+ DAT		02. 03. 2015	16. 04. 2015	46,00							
DM	Dodávka materiálu		02. 03. 2015	19. 03. 2015	18,00							
M159	Označenie, meranie a vystavenie protokolu pre Dat zásuvky	ks	30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00							
008.16	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pr		30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00							
M160	přes 500 do 1000 tis.Kč	ks	30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00							
009	EI - TU2		23. 02. 2015	02. 04. 2015	39,00							
009.1	Pododstavec 2 NN Elektroinštalácia		09. 03. 2015	02. 04. 2015	25,00							
DM	Dodávka materiálu		09. 03. 2015	02. 04. 2015	25,00							
009.2	Svietidlá		09. 03. 2015	19. 03. 2015	11,00							
DM	Dodávka materiálu		09. 03. 2015	19. 03. 2015	11,00							
009.3	Pododstavec 3 SLP+ DAT		23. 02. 2015	26. 03. 2015	32,00							
DM	Dodávka materiálu		02. 03. 2015	26. 03. 2015	25,00							
M159	Označenie, meranie a vystavenie protokolu pre Dat zásuvky	ks	23. 02. 2015	26. 03. 2015	32,00							
010	VZT - TU1		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00							
010.0	VZT		30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00							
DM	Dodávka materiálu		30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00							
010.1	Zariadenie č.2: Vetranie sociálnych zariadení		23. 02. 2015	02. 04. 2015	39,00							
DM	Dodávka materiálu		23. 02. 2015	02. 04. 2015	39,00							


010.2	Zariadenie č.3: Klimatizácia priestorov telefónnej ústredne		16. 03. 2015	02. 04. 2015	18,00								
DM	Dodávka materiálu		16. 03. 2015	02. 04. 2015	18,00								
010.3	Zariadenie č.4: Klimatizácia servera		30. 03. 2015	09. 04. 2015	11,00								
DM	Dodávka materiálu		30. 03. 2015	09. 04. 2015	11,00								
010.4	Zariadenie č.5: Príprava pre sterilizáciu		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00								
DM	Dodávka materiálu		16. 03. 2015	09. 04. 2015	25,00								
M260	Demontáž potrubia VZT do obvodu 1800mm (30% tv.)	bm	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00								
M262	Skúšky a zaregulovanie	kpl	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
011	VZT - TU2		23. 03. 2015	16. 04. 2015	25,00								
011.1	Zariadenie č.1. Ventrane priestorov telefónnej ústredne - doplnenie miestnosti 150		23. 03. 2015	16. 04. 2015	25,00								
DM	Dodávka materiálu		06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00								
M277	Skúšky a zaregulovanie	kpl	23. 03. 2015	16. 04. 2015	25,00								
012	EPS - TU1		16. 02. 2015	09. 04. 2015	53,00								
012.1	Montáž dodávok		23. 03. 2015	09. 04. 2015	18,00								
M278	Ústredň el. požiarnej signalizácie komplet	ks	23. 03. 2015	09. 04. 2015	18,00								
M279	Tlačidlový hlásič na omietku	ks	23. 03. 2015	09. 04. 2015	18,00								
M280	Hlásič optico-dymový (komplet) v nevýbuš. prostredí	ks	23. 03. 2015	09. 04. 2015	18,00								
M281	Vstupný resp. výstupný modulu	ks	23. 03. 2015	09. 04. 2015	18,00								
M282	Výstražná poplachová siréna	ks	23. 03. 2015	09. 04. 2015	18,00								
M283	Zak. odporov na monitorované vstupy resp. výstupy	ks	23. 03. 2015	09. 04. 2015	18,00								
012.2	Montážny materiál		16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00								
DM	Dodávka materiálu		16. 02. 2015	05. 03. 2015	18,00								
012.3	Murárska výpomoc a drobné stav. práce		16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00								
M306	Vysekanie rýhy v tehlovom murive do 3 x 3cm	m	16. 02. 2015	26. 02. 2015	11,00								
013	EPS -TU2		02. 03. 2015	16. 04. 2015	46,00								
013.1	Montáž dodávok		02. 03. 2015	16. 04. 2015	46,00								
DM	Dodávka materiálu	ks	02. 03. 2015	16. 04. 2015	46,00								
013.2	Montážny materiál		02. 03. 2015	16. 04. 2015	46,00								
DM	Dodávka materiálu		02. 03. 2015	16. 04. 2015	46,00								
M309	Uvedenie systému do prevádzky, tvorba SW, revízia a vypracovanie rev. správy, zaškolenie obsluhy (realizuje dodávateľ EPS)	sub	30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00								
014	MAR - TU1		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00								
014.0	MAR		16. 02. 2015	16. 04. 2015	60,00								
DM	Dodávka materiálu		16. 02. 2015	02. 04. 2015	46,00								
M343	Kabeláž, uloženie káblov, zakončenie káblov v zariadeniach, drážkovanie	sub.	16. 02. 2015	09. 04. 2015	53,00								
M344	Montážne práce	hod.	16. 02. 2015	09. 04. 2015	53,00								
M345	Účasť na komplexných skúškach	sub.	13. 04. 2015	16. 04. 2015	4,00								


M346	Oživenie zariadenia	hod.	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00							
M347	Zaškolenie personálu, obslužná dokumentácia	hod.	13. 04. 2015	16. 04. 2015	4,00							
M348	Revízia rozvádzača	sub.	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00							
M349	Projekt skutočného stavu	sub.	13. 04. 2015	16. 04. 2015	4,00							
015	MAR - TU1dp		23. 02. 2015	16. 04. 2015	53,00							
DM	Dodávka materiálu		23. 02. 2015	16. 04. 2015	53,00							
M359	Oživenie a uvedenie do prevádzky	hod.	30. 03. 2015	16. 04. 2015	18,00							
016	MAR-TU2		23. 02. 2015	16. 04. 2015	53,00							
DM	Dodávka materiálu		23. 02. 2015	16. 04. 2015	53,00							
M361	Uloženie káblov, zakončenie káblov v zariadeniach	sub.	09. 03. 2015	16. 04. 2015	39,00							
M344	Montážne práce	hod.	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00							
M362	Oživenie zariadenia	hod.	06. 04. 2015	16. 04. 2015	11,00							
M363	Zaškolenie personálu, obslužná dokumentácia	hod.	13. 04. 2015	16. 04. 2015	4,00							


015


	Marec 2015
--	------------


[illegible]

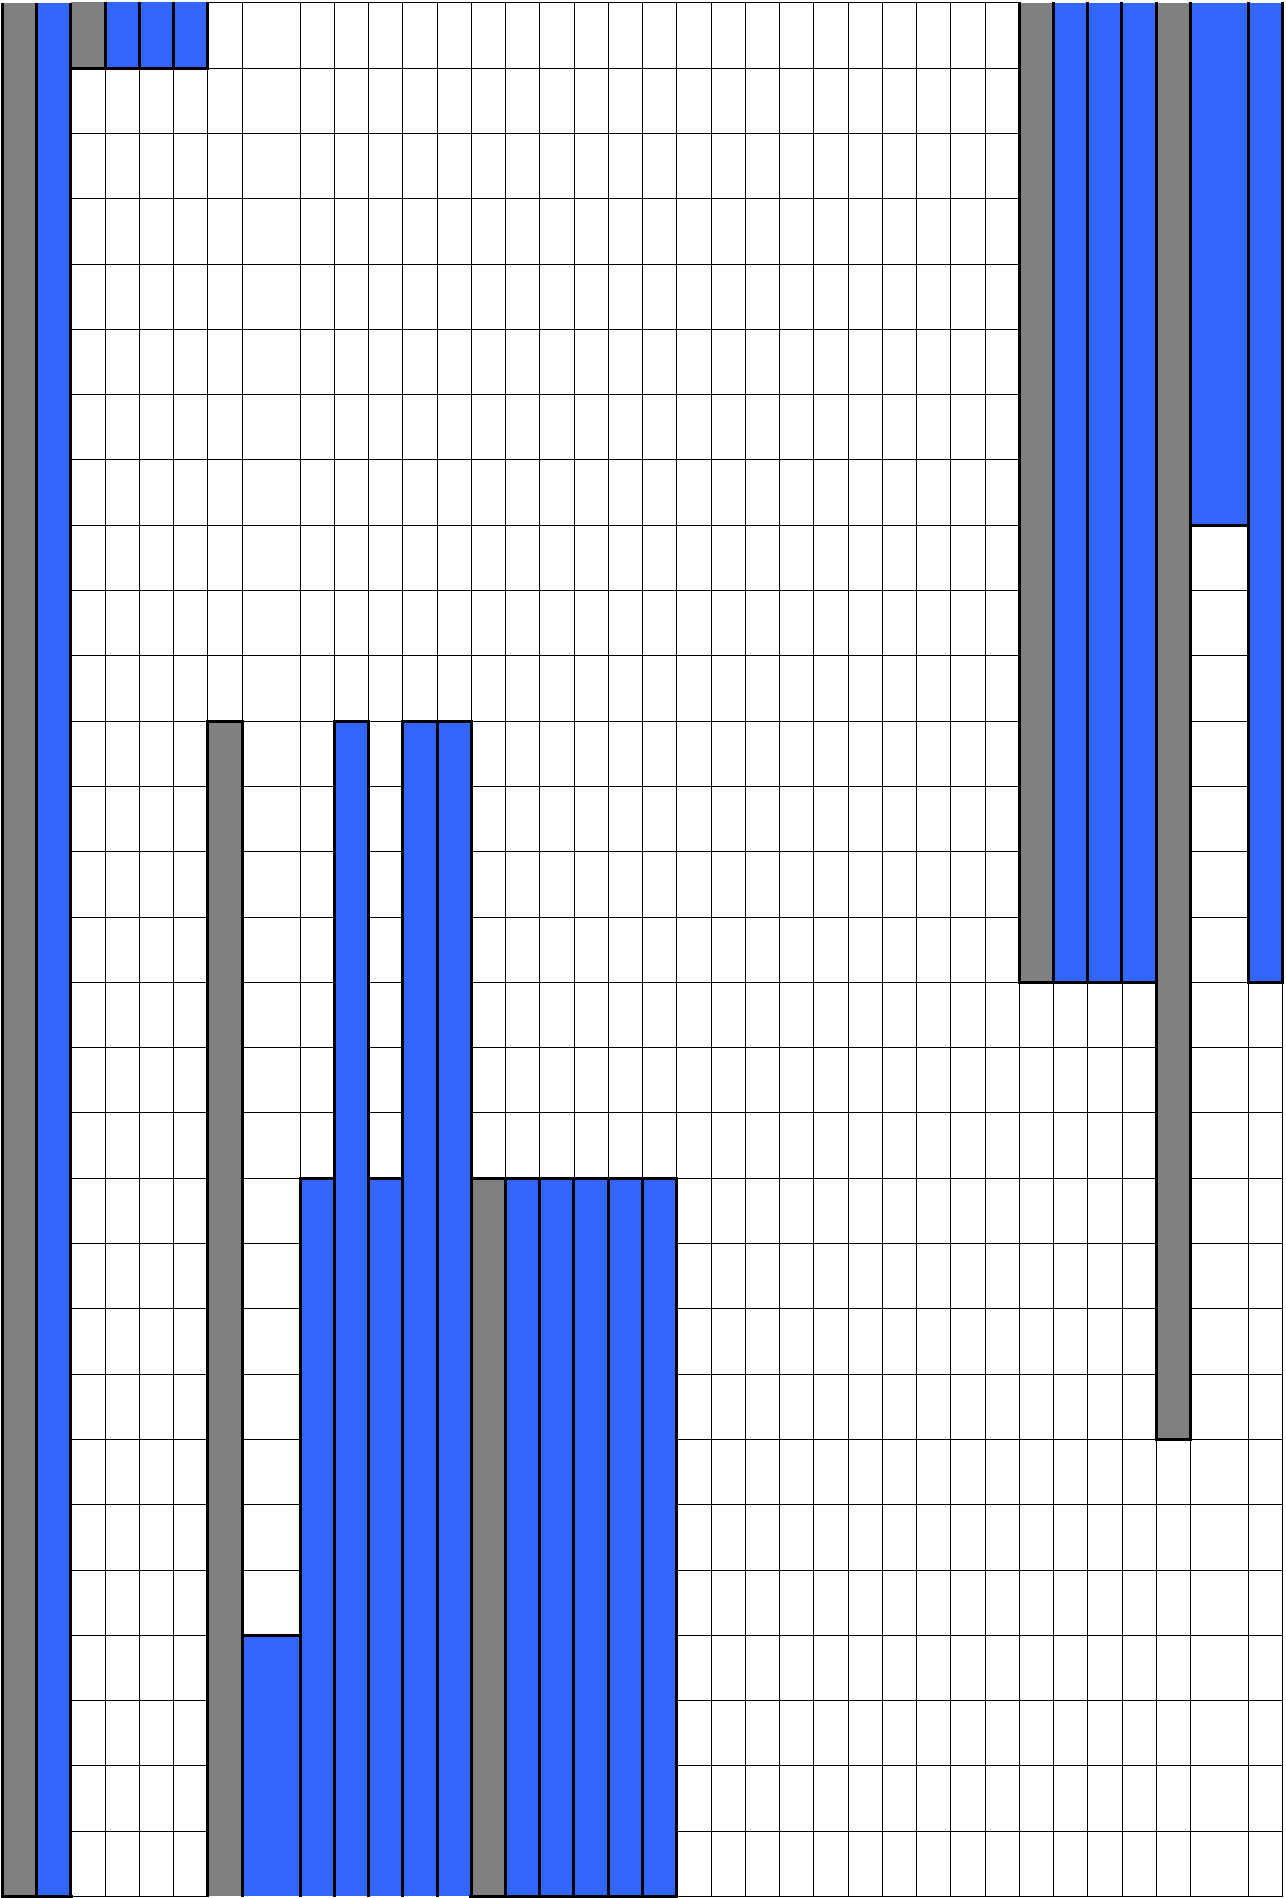


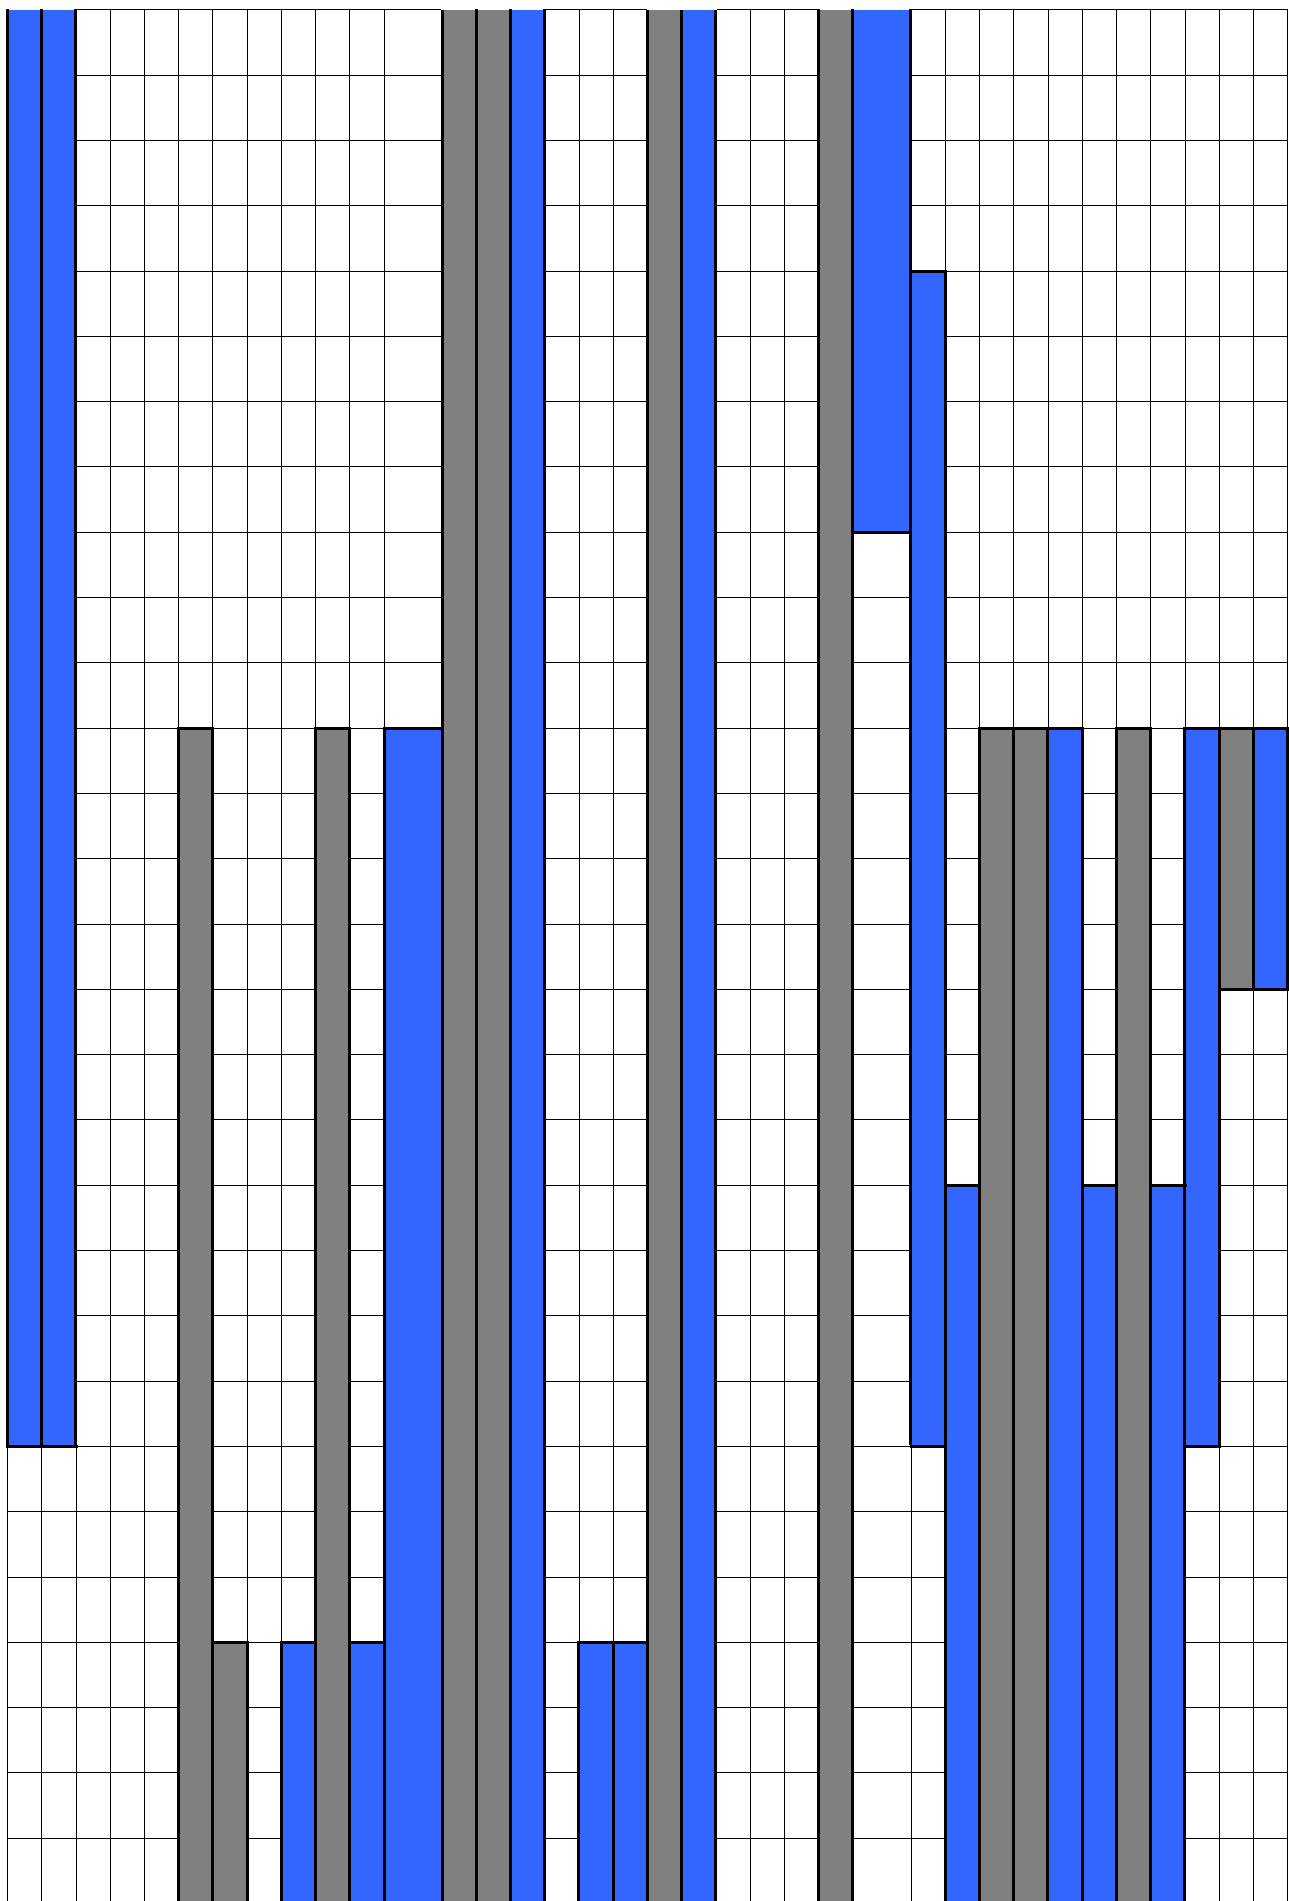

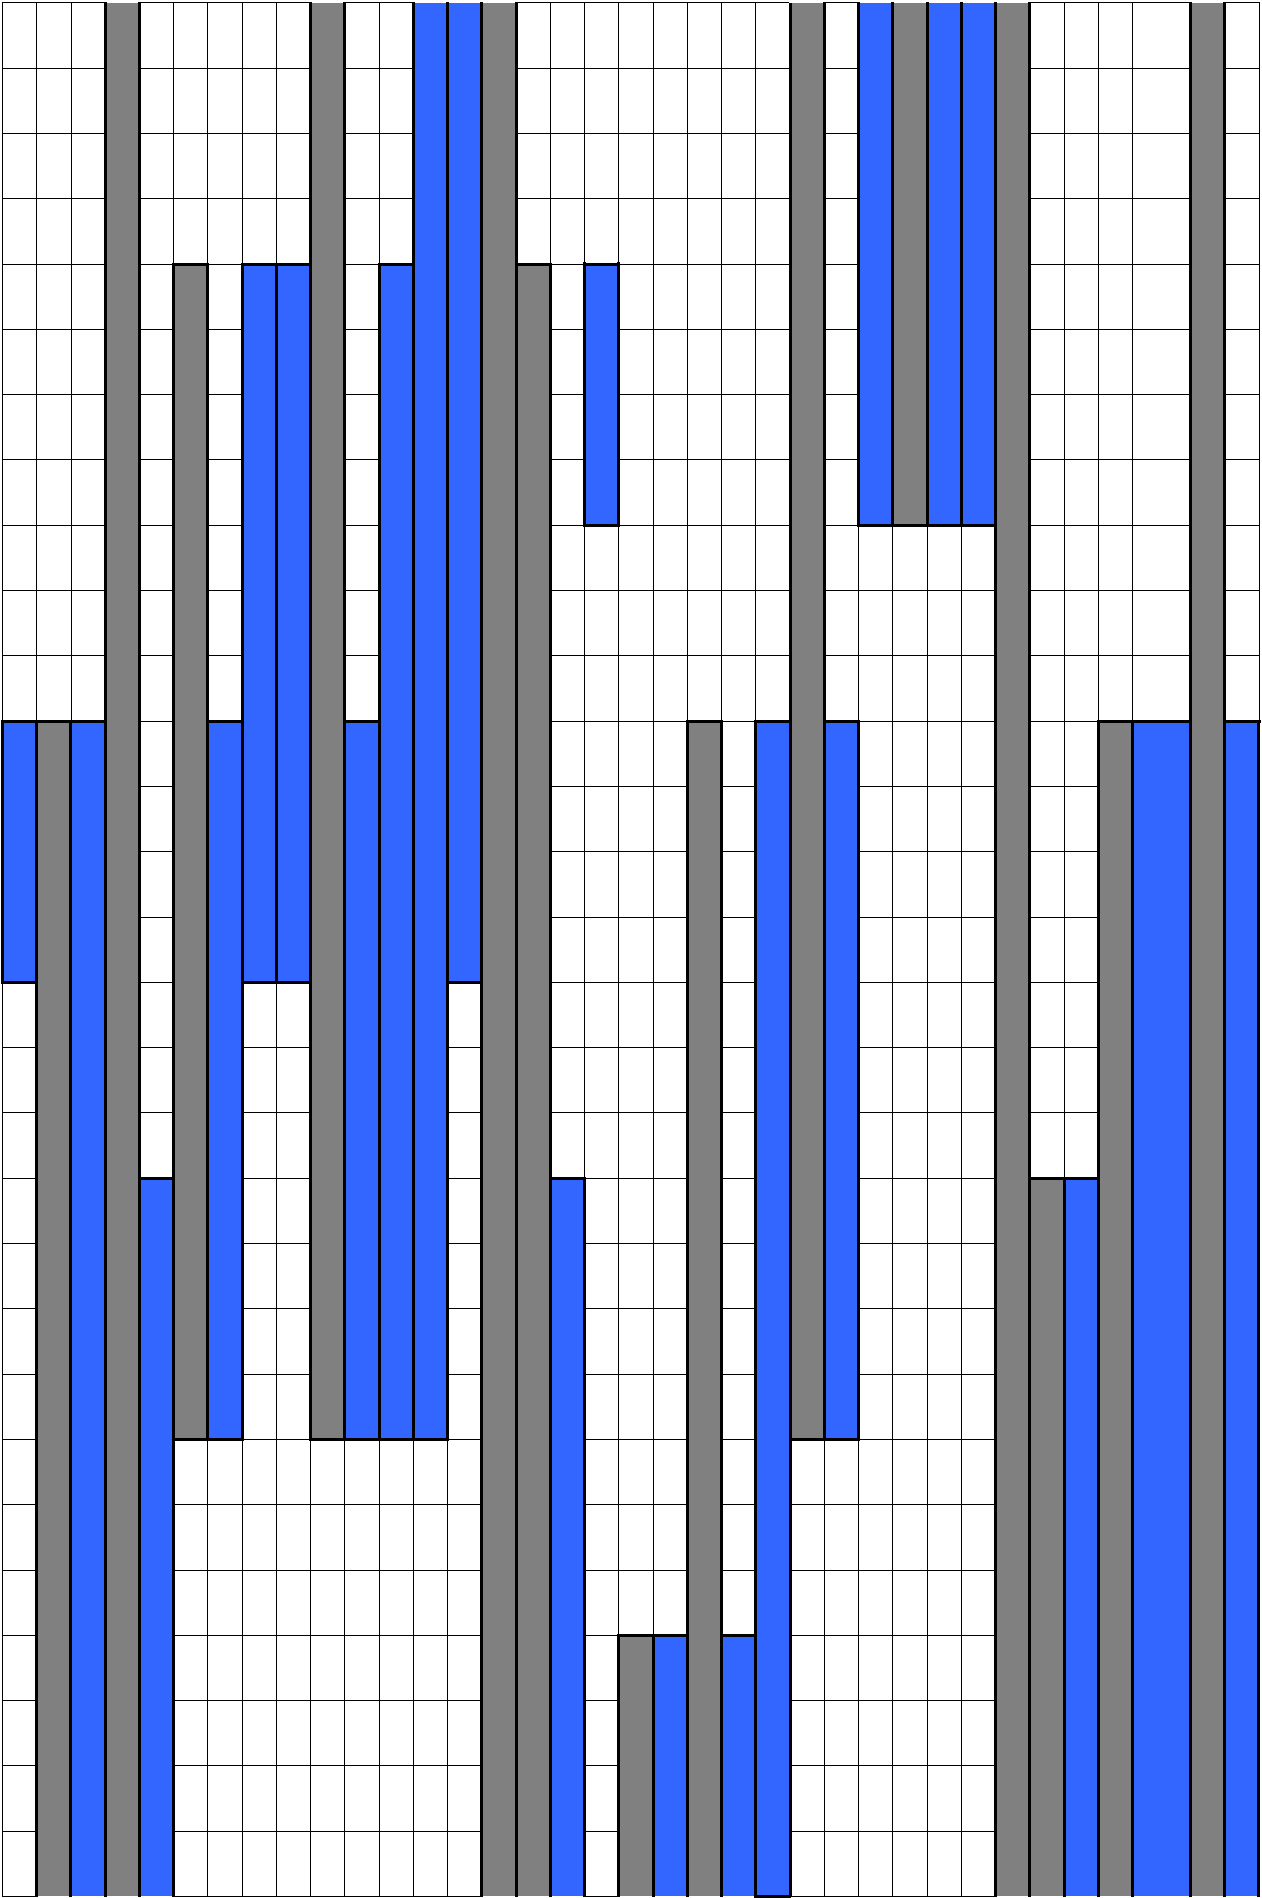

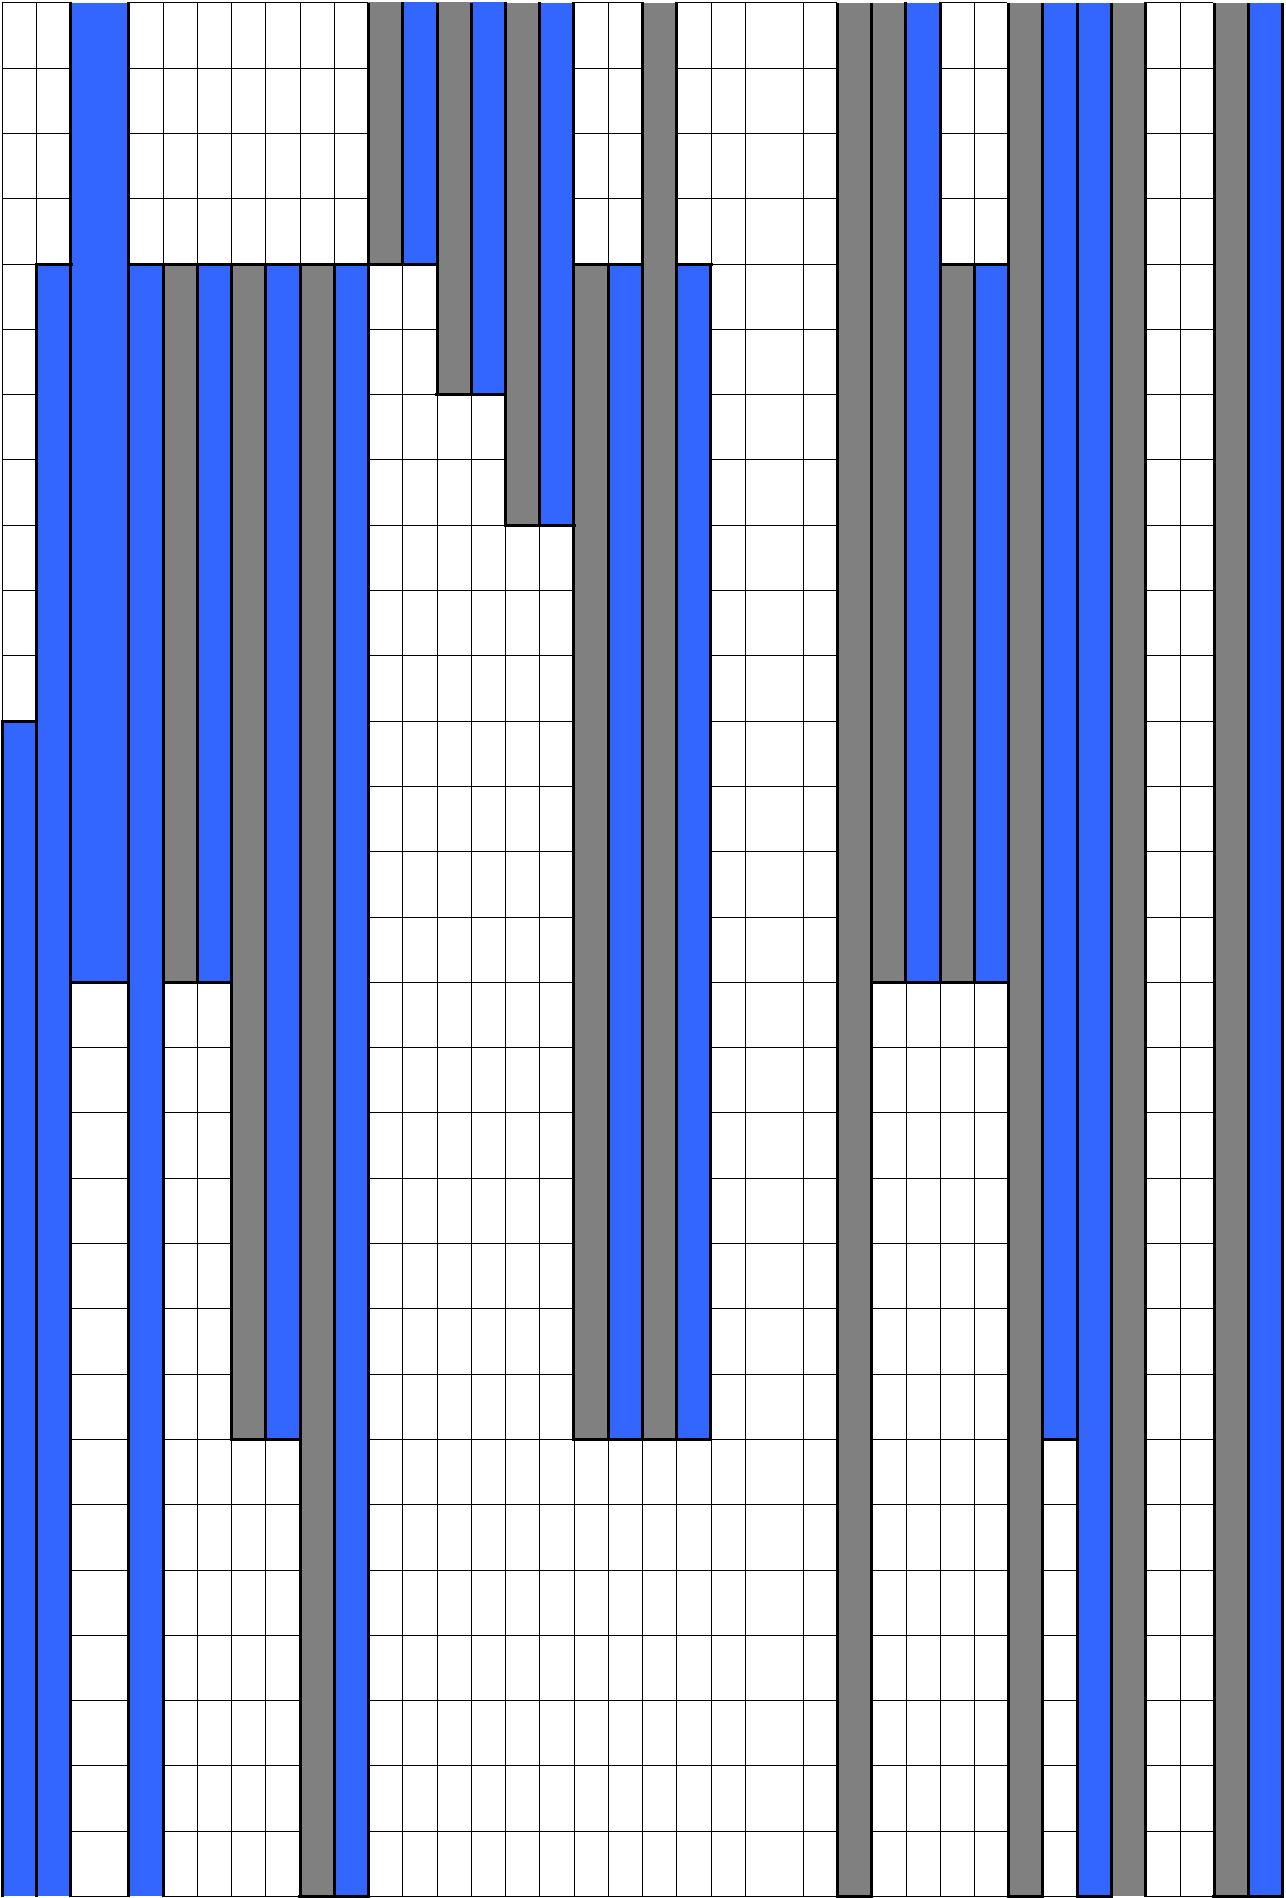

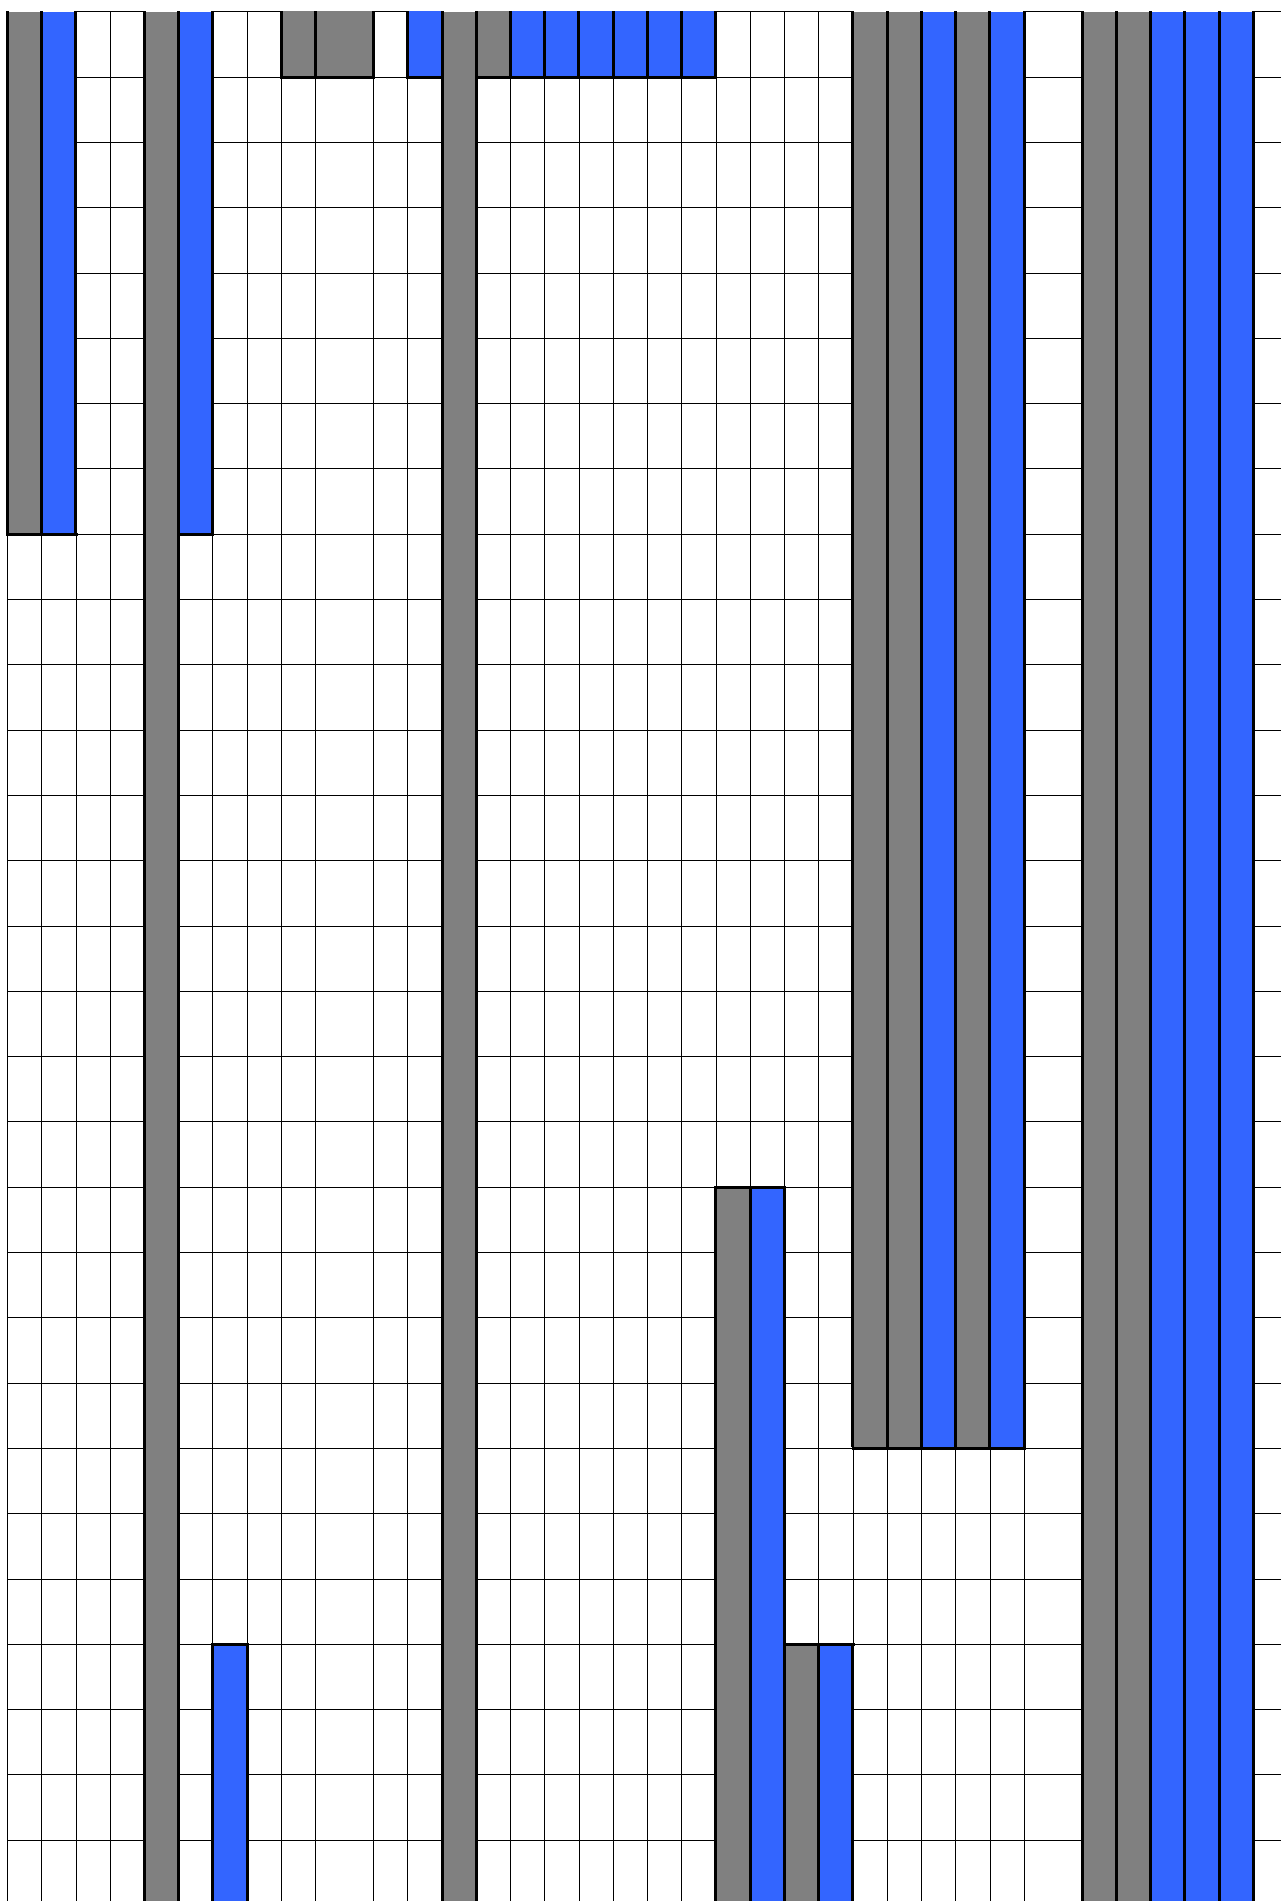

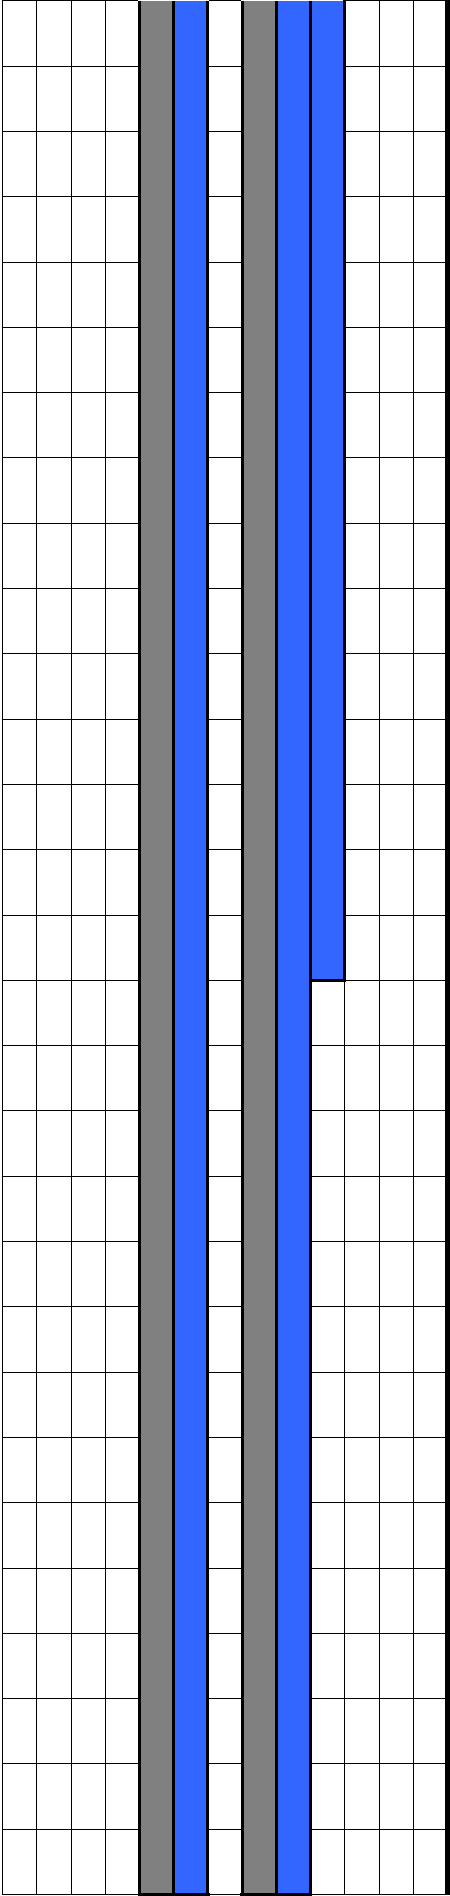

[illegible]

