



Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Doplnku stavebného zámeru (dSZ) pre stavby:

**Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever
Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave**

Číslo objednávateľa: *14/2015/0127*

Číslo zhotoviteľa: 7778-00

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma:

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK2021937775

Tel./Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sídlo:

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Právna forma

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

Štatutárny orgán

predstavenstvo

v zastúpení:

Ing. arch. Gabriel Koczkáš

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ

Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

a.s.

- vo veciach technických:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie

Číslo účtu:

IČO: 31 322 000
DIČ: 202054770
IČ DPH: SK2020524770

Tel./Fax:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

- **Časť 1**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever (ďalej len „stavba 1“)
- **Časť 2**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača (ďalej len „stavba 2“)
- **Časť 3**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre stavbu Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice“ (ďalej len „stavba 3“)
- **Časť 4**, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre stavbu „Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave“ (ďalej len „stavba 4“)
- **Časť 5**, predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto zmluvy.

ČASŤ 1 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 1

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.1a, dielo č.1b a dielo č.1c uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.1a“, „dielo č.1b“, „dielo č.1c“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 1a, diela č.1b a diela č.1c cenu uvedenú v čl. 6 tejto časti zmluvy.

Čl.2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č.1a, 1b a 1c

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č.1a - Dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „**DSP**“),
dielo č.1b - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (ďalej aj „**Oznámenie 8a**“)
dielo č.1c - Doplnok stavebného zámeru (ďalej aj „**Doplnok SZ**“)
v počte výtlačkov jednotlivých častí DSP, Oznámenia 8a a Doplnku DZ podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č. 1.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.1a, dielo č.1b a dielo č.1c prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.1a, diela č.1b a diela č.1c podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č.236/2014-03.12.2014 pod ozn. 29140-MSS.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č.1a

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.1a (DSP) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Počas vykonávania diela č.1a je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.7 tohto článku zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1.1b časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.10 alebo 3.11 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pre ich ukončením.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **návrh Záverečnej správy inžinierskogeologickeho prieskumu** (ďalej aj len „Záverečná správa IGP“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.1.1b časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať najneskôr do termínu záverečného prerokovania diela č.1a podľa bodu 1.3 čl.1 časti 5 zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 5 zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 80 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa **návrh vytyčovacej siete stavby** (ďalej len „návrh VS“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.1.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 200 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.8. Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.5 a 3.6 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku alebo návrhu VS podľa bodu 3.7 tohto článku objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 a 3.7 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.9 a 3.10 tohto článku.
- 3.9. Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo návrhom VS a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 3.10. Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** odo dňa doručenia zápisu doručiť objednávateľovi koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 3 dní od doručenia so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.
- 3.11. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.10 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom

odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.5, 3.6 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku a/alebo návrh VS podľa bodu 3.7 tohto článku.

- 3.12. Zhotoviteľ je povinný vybudovať vytyčovaciu sieť stavby v teréne (t.j. ukončiť a odovzdať vytyčovaciu sieť objednávateľovi) do termínu uvedeného v bode 3.1 tohto článku. Odovzdanie vytyčovacej siete stavby zmluvné strany potvrdia preberacím protokolom. Na účely tejto zmluvy sa preberací protokol podľa predchádzajúcej vety považuje za súčasť DSP.

Čl. 4

ČAS PLNENIA DIELA č. 1b

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.1b (Oznámenie 8a) bez väd tj. **spolu s kladnými stanoviskami orgánu územného plánovania a orgánov ochrany životného prostredia** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **250 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

Čl. 5

ČAS PLNENIA DIELA č. 1c

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.1c (Doplnok SZ) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

Čl.6

CENA DIELA č. 1a, DIELA č. 1b a DIELA č. 1c , PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.1a, diela č.1b, diela č. 1c.
- 6.2. a) **Cena diela č. 1a (DSP) bez DPH v EUR: 3 424 082,48**
Sadzba DPH 20% v EUR: 684 816,50
Cena DSP vrátane DPH v EUR: 4 108 898,98
(slovom: štyr milióny stoosem tisícosemstodevät' desiatosem EUR a deväťdesiatosem centov vrátane DPH)
- b) **Cena diela č. 1b (Oznámenia 8a) bez DPH v EUR: 7 687,24**
Sadzba DPH 20% v EUR: 1 537,45
Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: 9 224,69
(slovom: deväť tisíc dvesto dvadsať štyri EUR a šesťdesiatdeväť centov vrátane DPH)
- c) **Cena diela č. 1c (Doplnku SZ) bez DPH v EUR: 13 242,00**
Sadzba DPH 20% v EUR: 2 648,40
Cena Doplnku SZ vrátane DPH v EUR: 15 890,40
(slovom: pätnásť tisícosemstodevät' desiat EUR a štyridsať centov vrátane DPH)
- 6.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 tohto článku za DSP, Oznámenie 8a a Doplnok SZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DSP, Oznámenie 8a a Doplnok SZ do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.

Čl. 7

SANKCIE

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSP** (diela č.1a) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DSP bez DPH uvedenej v čl. 6 bod 6.2 a) tejto časti zmluvy za každý deň

- omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania DSP bez väd.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výskového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so **začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.3 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 7.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením návrhu **Záverečnej správy IGP na pripomienkovanie** v súlade s bodom 3.4 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 7.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.5 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.7 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.6 resp. 3.11 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 7.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **návrhu vytyčovacej siete** v súlade s bodom 3.7 čl. resp. 3.11 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.7 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 7.9 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Oznámenia 8a** (diela č. 1b) v súlade s čl. 4 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Oznámenia 8a bez DPH uvedenej v čl. 6 bod 6.2 b) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 4.1 čl. 4 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania Oznámenia 8a bez väd.
- 7.10 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Doplňku SZ** (diela č. 1c) v súlade s čl. 5 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Doplnku SZ bez DPH uvedenej v čl. 6 bodu 6.2 c) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 5.1 čl. 5 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania Doplnku SZ bez väd.

ČASŤ 2 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 2

ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.2a, dielo č.2b a dielo č.2c uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.2a“, „dielo č.2b“, „dielo č.2c“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 2a, diela č.2b a diela č.2c cenu uvedenú v čl. 6 tejto časti zmluvy.

ČI.2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 2a, 2b a 2c

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č.2a - Dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „**DSP**“),
dielo č.2b - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (ďalej aj „**Oznámenie 8a**“)
dielo č.2c - Doplnok stavebného zámeru (ďalej aj „**Doplnok SZ**“)
v počte výtlačkov jednotlivých častí DSP, Oznámenia 8a a Doplnku DZ podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č. 2.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.2a, dielo č.2b a dielo č.2c prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.2a, diela č.2b a diela č.2c podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č.236/2014-03.12.2014 pod ozn. 29140-MSS.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č. 2a

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2a (DSP) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Počas vykonávania diela č.2a je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.7 tohto článku zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.2.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.2.1b časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.10 alebo 3.11 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pre ich ukončením.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **návrh Záverečnej správy inžinierskogeologickeho prieskumu** (ďalej aj len „Záverečná správa IGP“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.2.1b časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať najneskôr do termínu záverečného prerokovania diela č.2a podľa bodu 1.3 čl.1 časti 5 zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 5 zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č.2.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 80 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č.2.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa **návrh vytyčovacej siete stavby** (ďalej len „návrh VS“) vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 200 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.8. Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.5 a 3.6 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku alebo návrhu VS podľa bodu 3.7 tohto článku objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 a 3.7 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.9 a 3.10 tohto článku.

- 3.9. Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo návrhom VS a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 3.10. Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo návrhu VS a /alebo Projektu geologickej úlohy zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** odo dňa doručenia zápisu doručiť objednávateľovi koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 3 dní od doručenia so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.
- 3.11. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.10 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.5, 3.6 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku a/alebo návrh VS podľa bodu 3.7 tohto článku.
- 3.12. Zhotoviteľ je povinný vybudovať vytyčovaciu sieť stavby v teréne (t.j. ukončiť a odovzdať vytyčovaciu sieť objednávateľovi) do termínu uvedeného v bode 3.1 tohto článku. Odovzdanie vytyčovacej siete stavby zmluvné strany potvrdia preberacím protokolom. Na účely tejto zmluvy sa preberací protokol podľa predchádzajúcej vety považuje za súčasť DSP.

Čl. 4 ČAS PLNENIA DIELA č. 2b

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2b (Oznámenie 8a) bez väd t.j. **spolu s kladnými stanoviskami orgánu územného plánovania a orgánov ochrany životného prostredia** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **250 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

Čl. 5 ČAS PLNENIA DIELA č. 2c

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2c (Doplnok SZ) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

Čl.6 CENA DIELA č. 2a, DIELA č. 2b a DIELA č. 2c, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.2a, diela č.2b, diela č.2c.
- 6.2. a) **Cena diela 2a (DSP) bez DPH v EUR: 771 794,60**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 154 358,92
 Cena DSP vrátane DPH v EUR: 926 153,52
 (slovom: deväťstodvadsaťšesťtisícstopäťdesiattri EUR a päťdesiatdva centov vrátane DPH)
- b) **Cena diela 2b (Oznámenia 8a) bez DPH v EUR: 5 313,48**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 1 062,70
 Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: 6 376,18
 (slovom: šesťtisíctriosedemdesiatšesť EUR a osemnásť centov vrátane DPH)
- c) **Cena diela 2c (Doplnku SZ) bez DPH v EUR: 9 571,50**

Sadzba DPH 20% v EUR: 1 914,30

Cena Doplnku SZ vrátane DPH v EUR: 11 485,80

(slovom: jedenásťtisícštyristoosemdesiatpäť EUR a osemdesiat centov vrátane DPH)

- 6.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 tohto článku za DSP, Oznámenie 8a a Doplnok SZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DSP, Oznámenie 8a a Doplnok SZ do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.

Čl. 7 SANKCIE

- 7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSP** (diela č. 2a) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DSP bez DPH uvedenej v čl. 6 bod 6.2 a) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania DSP bez väd.
- 7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výskového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so **začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.3 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 7.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením návrhu **Záverečnej správy IGP na pripomienkovanie** v súlade s bodom 3.4 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 7.6. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.5 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.7. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.6 resp. 3.11 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 7.8. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **návrhu vytyčovacej siete** v súlade s bodom 3.7 čl. resp. 3.11 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.7 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 7.9. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Oznámenia 8a** (diela č. 2b) v súlade s čl. 4 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Oznámenia 8a bez DPH uvedenej v čl. 6 bod 6.2 b) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 4.1 čl. 4 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania Oznámenia 8a bez zjavných väd.
- 7.10. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Doplnku SZ** (diela č. 2c) v súlade s čl. 5 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Doplnku SZ bez DPH uvedenej v čl. 6 bodu 6.2 c) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 5.1 čl. 5 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania Doplnku SZ bez väd.

ČASŤ 3
ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 3

Čl. 1
PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.3a, dielo č.3b a dielo č.3c uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.3a“, „dielo č.3b“, „dielo č.3c“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 3a, diela č.3b a diela č.3c cenu uvedenú v čl. 6 tejto časti zmluvy.

Čl.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 3a, 3b a 3c

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č.3a - Dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „**DSP**“),
dielo č.3b - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (ďalej aj „**Oznámenie 8a**“)
dielo č.3c - Doplnok stavebného zámeru (ďalej aj „**Doplnok SZ**“)
v počte výtlačkov jednotlivých častí DSP, Oznámenia 8a a Doplnku DZ podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č. 3.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.3a, dielo č.3b a dielo č.3c prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.3a, diela č.3b a diela č.3c podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č.236/2014-03.12.2014 pod ozn. 29140-MSS.

Čl. 3
ČAS PLNENIA DIELA č. 3a

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.3a (DSP) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Počas vykonávania diela č.3a je zhotoviteľ povinný dodržať časové mílniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.6 tohto článku zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.3.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.3.1b časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.9 alebo 3.10 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pre ich ukončením.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **návrh Záverečnej správy inžinierskogeologickeho prieskumu** (ďalej aj len „Záverečná správa IGP“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.3.1b časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať najneskôr do termínu záverečného prerokovania diela č.3a podľa bodu 1.3 čl.1 časti 5 zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 5 zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č.3.1a

- časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa **návrh vytyčovacej siete stavby** (ďalej len „návrh VS“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.3.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 200 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
 - 3.7. Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.5 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku alebo návrhu VS podľa bodu 3.6 tohto článku objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, a 3.6 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.8 a 3.9 tohto článku.
 - 3.8. Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo návrhom VS a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
 - 3.9. Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo návrhu VS a /alebo Projektu geologickej úlohy zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** odo dňa doručenia zápisu doručiť objednávateľovi koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 3 dní od doručenia so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.
 - 3.10. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.9 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2 a 3.5 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku a/alebo návrh VS podľa bodu 3.6 tohto článku.
 - 3.11. Zhotoviteľ je povinný vybudovať vytyčovaciu sieť stavby v teréne (t.j. ukončiť a odovzdať vytyčovaciu sieť objednávateľovi) do termínu uvedeného v bode 3.1 tohto článku. Odovzdanie vytyčovacej siete stavby zmluvné strany potvrdia preberacím protokolom. Na účely tejto zmluvy sa preberací protokol podľa predchádzajúcej vety považuje za súčasť DSP.

Čl. 4 ČAS PLNENIA DIELA č. 3b

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.3b (Oznámenie 8a) bez väd t.j. **spolu s kladnými stanoviskami orgánu územného plánovania a orgánov ochrany životného prostredia** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **250 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

Čl. 5 ČAS PLNENIA DIELA č.3c

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.3c (Doplňok SZ) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

Čl.6 CENA DIELA č. 3a, DIELA č. 3b a DIELA č. 3c, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

- o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.3a, diela č.3b a diela č.3c.
- 6.2. a) **Cena diela č. 3a (DSP) bez DPH v EUR:** **148 132,52**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 29 626,50
 Cena DSP vrátane DPH v EUR: 177 759,02
 (slovom: jednotosedemdesiatšesťtisícšesťdesiatdeväť EUR a dva centy vrátane DPH)
- b) **Cena diela č. 3b (Oznámenia 8a) bez DPH v EUR:** **4 646,80**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 929,36
 Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: 5 576,16
 (slovom: päťtisícpäťstosedemdesiatšesť EUR a šesťnásť centov vrátane DPH)
- c) **Cena diela č. 3c (Doplnku SZ) bez DPH v EUR:** **3 612,60**
 Sadzba DPH 20% v EUR: 722,52
 Cena Doplnku SZ vrátane DPH v EUR: 4 335,12
 (slovom: štyritisícristotridsaťpäť EUR a dvanásť centov vrátane DPH)
- 6.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 tohto článku za DSP, Oznámenie 8a a Doplnok SZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DSP, Oznámenie 8a a Doplnok SZ do 15 dní odo dňa podpisania preberacieho protokolu.

Čl. 7 SANKCIE

- 7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSP** (diela č. 3a) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DSP bez DPH uvedenej v čl. 6 bod 6.2 a) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania DSP bez väd.
- 7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výskového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2 resp. 3.10 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3 resp. 3.10 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so **začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.3 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 7.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením návrhu **Záverečnej správy IGP na pripomienkovanie** v súlade s bodom 3.4 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 7.6. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.5 resp. 3.10 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 7.7. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **návrhu vytyčovacej siete** v súlade s bodom 3.6 čl. resp. 3.10 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 7.8. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Oznámenia 8a** (diela č. 3b) v súlade s čl. 4 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Oznámenia 8a bez DPH uvedenej v čl. 6 bod 6.2 b) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 4.1 čl. 4 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania Oznámenia 8a bez väd.

- 7.9 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Doplnku SZ** (diela č. 3c) v súlade s čl. 5 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Doplnku SZ bez DPH uvedenej v čl. 6 bodu 6.2 c) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 5.1 čl. 5 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania Doplnku SZ bez väd.

ČASŤ 4 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE PRE STAVBU 4

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo č.4a, dielo č.4b a dielo č.4c uvedené v čl. 2 tejto časti zmluvy (ďalej len „dielo č.4a“, „dielo č.4b“, „dielo č.4c“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela č. 4a, diela č.4b a diela č.4c cenu uvedenú v čl. 6 tejto časti zmluvy.

Čl.2 PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA č. 4a, 4b a 4c

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch vykoná a doručí objednávateľovi:
dielo č.4a - Dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej aj „**DSP**“),
dielo č.4b - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (ďalej aj „**Oznámenie 8a**“)
dielo č.4c - Doplnok stavebného zámeru (ďalej aj „**Doplnok SZ**“)
v počte výtlačkov jednotlivých častí DSP, Oznámenia 8a a Doplnku DZ podľa bodu 4.6 a vo formáte podľa bodu 4.5 Prílohy č.4.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas dokončené dielo č.4a, dielo č.4b a dielo č.4c prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č.4a, diela č.4b a diela č.4c podľa čl. 2 tejto časti zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č.236/2014-03.12.2014 pod ozn. 29140-MSS.

Čl. 3 ČAS PLNENIA DIELA č. 4a

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.4a (DSP) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Počas vykonávania diela č.4a je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.7 tohto článku zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept smerového a výškového vedenia trasy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.4.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa najneskôr **do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** objednávateľom odsúhlasený **Projekt geologickej úlohy** vypracovaný v súlade s Prílohou č.4.1b časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný **začať s realizáciou terénnych vrtných prác najneskôr do 7 dní** po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.10 alebo 3.11 tohto článku. Ukončenie terénnych vrtných prác je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi deň pre ich ukončením.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **návrh Záverečnej správy inžinierskogeologickeho prieskumu** (ďalej aj len „Záverečná správa IGP“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.4.1b časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky

- najneskôr **do 160 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať najneskôr do termínu záverečného prerokovania diela č.4a podľa bodu 1.3 čl.1 časti 5 zmluvy. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 5 zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č.4.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 80 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
 - 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č.4.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
 - 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa **návrh vytyčovacej siete stavby** (ďalej len „návrh VS“) vypracovaný v súlade s Prílohou č.4.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky najneskôr **do 200 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
 - 3.8. Za účelom odsúhlasenia konceptu podľa bodu 3.2, 3.5 a 3.6 tohto článku (ďalej každý samostatne len „koncept“) alebo Projektu geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku alebo návrhu VS podľa bodu 3.7 tohto článku objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje zvolať pracovné rokovanie, a to v dostatočnom časovom predstihu pred termínom doručenia uvedeným v bode 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 a 3.7 tohto článku a tak, aby bol dodržaný postup a lehoty podľa bodu 3.9 a 3.10 tohto článku.
 - 3.9. Pozvánku na pracovné rokovanie spolu s návrhom konceptu a/alebo návrhom VS a/alebo Projektom geologickej úlohy sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín navrhovaného pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
 - 3.10. Z pracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia konceptu a/alebo návrhu VS a /alebo Projektu geologickej úlohy zmluvné strany vyhotovia na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej len „zápis“), pričom v zápise bude uvedené, že objednávateľ koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy odsúhlasuje alebo v ňom budú uvedené pripomienky, ktoré je zhotoviteľ povinný zapracovať a v lehote **3 dní** odo dňa doručenia zápisu doručiť objednávateľovi koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote 3 dní od doručenia so zapracovanými pripomienkami objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi, že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že koncept a/alebo návrh VS a/alebo Projekt geologickej úlohy je objednávateľom odsúhlasený.
 - 3.11. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odsúhlasenie konceptu a/alebo návrhu VS a/alebo Projektu geologickej úlohy na pracovnom rokovaní podľa bodu 3.10 tohto článku sa považuje za splnenie povinnosti zhotoviteľa doručiť objednávateľovi objednávateľom odsúhlasený koncept podľa bodu 3.2, 3.5, 3.6 tohto článku a/alebo Projekt geologickej úlohy podľa bodu 3.3 tohto článku a/alebo návrh VS podľa bodu 3.7 tohto článku.
 - 3.12. Zhotoviteľ je povinný vybudovať vytyčovaciu sieť stavby v teréne (t.j. ukončiť a odovzdať vytyčovaciu sieť objednávateľovi) do termínu uvedeného v bode 3.1 tohto článku. Odovzdanie vytyčovacej siete stavby zmluvné strany potvrdia preberacím protokolom. Na účely tejto zmluvy sa preberací protokol podľa predchádzajúcej vety považuje za súčasť DSP.

Čl. 4 ČAS PLNENIA DIELA č. 4b

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.4b (Oznámenie 8a) bez väd tj. **spolu s kladnými stanoviskami orgánu územného plánovania a orgánov ochrany životného prostredia** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **250 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

Čl. 5 ČAS PLNENIA DIELA č. 4c

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.4c (Doplnok SZ) bez väd po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na

CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa do **210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

Čl.6

CENA DIELA č. 4a, DIELA č. 4b a DIELA č. 4c, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č.4a, diela č.4b a diela č.4c.
- 6.2. a) **Cena diela č. 4a (DSP) bez DPH v EUR: 292 879,22**
Sadzba DPH 20% v EUR: 58 575,84
Cena DSP vrátane DPH v EUR: 351 455,06
(slovom: tristo päťdesiatjedentisícštyristo päťdesiatpäť EUR a šesť centov vrátane DPH)
- b) **Cena diela č. 4b (Oznámenia 8a) bez DPH v EUR: 4 646,80**
Sadzba DPH 20% v EUR: 929,36
Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: 5 576,16
(slovom: päťtisíc päťstosedemdesiatšesť EUR a šesťnásť centov vrátane DPH)
- c) **Cena diela č. 4c (Doplnku SZ) bez DPH v EUR: 4 994,70**
Sadzba DPH 20% v EUR: 998,94
Cena Doplnku SZ vrátane DPH v EUR: 5 993,64
(slovom: päťtisícdeväťstodevädessiattri EUR a šesťdesiatštyri centov vrátane DPH)
- 6.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 tohto článku za DSP, Oznámenie 8a a Doplnok SZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl.2, bod 2.1 až 2.11 časti 5 tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DSP, Oznámenie 8a a Doplnok SZ do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.

Čl. 7

SANKCIE

- 7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **DSP** (diela č. 4a) v súlade s čl. 3 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny DSP bez DPH uvedenej v čl. 6 bod 6.2 a) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1 čl. 3 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania DSP bez väd.
- 7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu smerového a výškového vedenia trasy** v súlade s bodom 3.2 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.2 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **Projektu geologickej úlohy** v súlade s bodom 3.3 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.3 čl.3 tejto časti zmluvy.
- 7.4. V prípade omeškania zhotoviteľa so **začatím terénnych vrtných prác** v súlade s bodom 3.3 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 7.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením návrhu **Záverečnej správy IGP na pripomienkovanie** v súlade s bodom 3.4 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania.
- 7.6. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu technického riešenia mostov a križovatiek** v súlade s bodom 3.5 resp. 3.11 čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.5 čl.3 tejto časti zmluvy.

- 7.7. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **konceptu majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** v súlade s bodom 3.6 resp. 3.11 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.6 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 7.8. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením odsúhlaseného **návrhu vytyčovacej siete** v súlade s bodom 3.7 čl. resp. 3.11 čl.3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.7 čl. 3 tejto časti zmluvy.
- 7.9. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Oznámenia 8a** (dielo č. 4b) v súlade s čl. 4 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Oznámenia 8a bez DPH uvedenej v čl. 6 bod 6.2 b) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 4.1 čl. 4 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania Oznámenia 8a bez väd.
- 7.10. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením **Doplňku SZ** (dielo č. 4c) v súlade s čl. 5 tejto časti a čl. 2 časti 5 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny Doplnku SZ bez DPH uvedenej v čl. 6 bodu 6.2 c) tejto časti zmluvy za každý deň omeškania, ktorý sa počíta od termínu uvedeného v bode 5.1 čl. 5 tejto časti zmluvy, a to až do odovzdania Doplnku SZ bez väd.

ČASŤ 5 SPOLOČNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

PREAMBULA

Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 5 zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním ktoréhokolvek diela definovaného v jednotlivých častiach zmluvy (t.j. diela č.1a, diela č.1b, diela č.1c, diela č. 2a, diela č. 2b, diela č. 2c, diela č.3a, diela č.3b, diela č.3c, diela č.4a, diela č.4b, diela č.4c) a pojem „dielo“ používaný v časti 5 zmluvy predstavuje ktoréhokolvek dielo č.1a, dielo č.1b, dielo č.1c až dielo č.4a, dielo č.4b, dielo č.4c podľa časti 1 až časti 4 zmluvy a pojem „stavba“ používaný v časti 5 zmluvy predstavuje ktoréhokolvek stavbu č.1 až 4. Všeobecné ustanovenia čl.5 Sankcie (body 5.4 až 5.6 článku 5 tejto časti zmluvy) sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zmluvné pokuty uvedené v príslušných článkoch jednotlivých častí zmluvy.

Čl.1

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA

- 1.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady:

Stavba 1 - pre dielo 1a, 1b a 1c:

- Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, DÚR, 03/2014
- Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, DSZ, 03/2014
- Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z., 05/2014
- Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia, 03/2014

Stavba 2 - pre dielo 2a, 2b a 2c:

- Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, DÚR, 03/2014
- Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, DSZ, 03/2014
- Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z., 05/2014
- Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Primerané posúdenie vplyvu zámeru na územia európskeho významu a chránené vtáčie územia, 03/2014

Stavba 3 - pre dielo 3a, 3b a 3c:

- Preložka cesty II/572, v predĺžení Galvaniho ulice, DÚR
- Preložka cesty II/572, v predĺžení Galvaniho ulice, DSZ

Stavba 4 - pre dielo 4a, 4b a 4c:

- Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave, DUR
 - Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave, DSZ
- 1.2. V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 1.2.1. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť na pracovnom rokovaní účasť osôb podľa bodu 1.7 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín pracovného rokovania posunúť najviac o 5 dní.
- 1.2.2. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy.
- 1.2.3. Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.6 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objednávateľ je následne oprávnený do 3 dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania.
- 1.2.4. Ustanovenia bodov 1.2.1 až 1.2.3 sa neuplatnia pri pracovných rokovaníach konaných za účelom odsúhlasenia konceptu a Projektu geologickej úlohy a návrhu VS stavby podľa čl. 3 časti 1 až 4 zmluvy.
- 1.3. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na záverečné prerokovanie spolu s dielom, ktoré má byť prerokované, a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa záverečné prerokovanie uskutočnilo najneskôr 3 týždne **pred termínom doručenia diela bez vád** uvedenom v bode 3.1, 4.1 a 5.1 v časti 1, v bode 3.1, 4.1 a 5.1 v časti 2, v bode 3.1, 4.1 a 5.1 v časti 3 a v bode 3.1, 4.1 a 5.1 v časti 4. Objednávateľ je oprávnený navrhovaný termín záverečného prerokovania posunúť najviac o 5 dní, tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa doručiť pozvánku v dostatočnom časovom predstihu podľa predchádzajúcej vety. Vo veci zápisu platia obdobne ustanovenia bodu 1.2.3 tohto čl. 1 tejto časti zmluvy.
- 1.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplnujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou.
- 1.5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 1.4 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.
- 1.6. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní, pripomienkami zo záverečného prerokovania ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.
- 1.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonávanie činnosti hlavného inžiniera projektu /ďalej aj len „HIP“/ osobou, ktorú uviedol vo svojej ponuke a prípadne aktualizoval v rámci poskytnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania pred podpisom tejto zmluvy, ako člena pracovnej skupiny na pozícii HIP. HIP je povinný najmä: koordinovať a riadiť proces vyhotovenia diela podľa ustanovení tejto zmluvy v mene zhotoviteľa; zastupovať zhotoviteľa a zúčastňovať sa na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom prerokovaní. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje písomne najneskôr jeden deň vopred pred rokovaním oznámiť objednávateľovi dočasnú neprítomnosť hlavného inžiniera projektu a zabezpečiť, aby v prípade tejto neprítomnosti zastupoval hlavného inžiniera projektu člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť.
- 1.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby člen pracovnej skupiny v pozícii hlavného inžiniera projektu nevykonával v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dielu v zmysle zmluvy činnosti rovnaké alebo obdobné, aké sú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení tejto zmluvy), na akomkoľvek inom diele/projekte, t.j. aby uvedeným spôsobom nespolupracoval pri vyhotovení iného diela, resp. dokumentácií, aké sú predmetom tejto zmluvy.

- 1.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť nevykonával v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dielu v zmysle zmluvy, činnosti rovnakej alebo obdobnej, aké sú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení tejto zmluvy, s výnimkou vykonávania rovnakej alebo obdobnej činnosti maximálne na jednom inom diele/projekte.
- 1.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zodpovedný projektant za cestnú časť, za mostnú časť, pre geologickú časť, pre životné prostredie, za BOZP zodpovedá za príslušnú časť dokumentácie v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi.

Čl. 2 PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

- 2.1. Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch uvedených v tejto zmluve objednávateľovi dielo bez väd. Pojem „dielo bez väd“ pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované pripomienky objednávateľa zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti zmluvy.
- 2.2. Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Počas preberacieho konania je objednávateľ povinný skontrolovať dielo a je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi skutočnosť, že dielo má zjavné vady.
- 2.3. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej časti vety bodu 2.7 tohto článku.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 2 mesiacov odo dňa doručenia diela objednávateľovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 2.5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Preberací protokol sa vyhotoví pre každú dokumentáciu zvlášť.
- 2.5. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 2.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu písomne predĺžiť.
- 2.6. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 2.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady objednávateľ bude postupovať v zmysle bodu 2.5 a 2.6 prvej vety tohto článku a to aj opakovane, až pokiaľ nenastane skutočnosť, že dielo nebude mať zjavné vady.
- 2.7. Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 2.3 tohto článku.
- 2.8. V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 2.9. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.
- 2.10. Na základe dohody zmluvných strán za okolností vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa sa nepovažuje omeškanie zhotoviteľa s vyhotovením diela podľa ustanovení tejto zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými

subjektmi s výnimkou, ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.

- 2.11. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akékoľvek dielo podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa dodať akékoľvek iné dielo podľa tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.

ČI. 3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA O CENE PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 3.1. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela..
- 3.2. Cena za celý predmet zmluvy:
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) Cena za časť 1 bez DPH v EUR: | 3 445 011,72 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 689 002,34 |
| Cena časť 2 vrátane DPH v EUR: | 4 134 014,06 |
| (slovom: štyr milióny štyridsaťštyritisíc trnásť EUR a šesť centov vrátane DPH) | |
| b) Cena za časť 2 DPH v EUR: | 786 679,58 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 157 335,92 |
| Cena časť 2 vrátane DPH v EUR: | 944 015,50 |
| (slovom: deväťstoštyridsaťštyritisíc pätnásť EUR a päťdesiat centov vrátane DPH) | |
| c) Cena za časť 3 DPH v EUR: | 156 391,92 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 31 278,38 |
| Cena časť 3 vrátane DPH v EUR: | 187 670,30 |
| (slovom: jedno stoosemdesiat sedem tisíc šesťsto sedemdesiat EUR a tridsať centov vrátane DPH) | |
| d) Cena za časť 4 DPH v EUR: | 302 520,72 |
| Sadzba DPH 20% v EUR: | 60 504,15 |
| Cena časť 4 vrátane DPH v EUR: | 363 024,86 |
| (slovom: tristošesťdesiat tritisíc dvadsaťštyri EUR a osemdesiatšesť centov vrátane DPH) | |
| e) Cena celkom (časť 1 až časť 4) bez DPH v EUR: | 4 690 603,94 |
| Sadzba DPH 20%: | 938 120,79 |
| Cena celkom vrátane DPH celkom (ďalej len „cena celkom“) v EUR: | 5 628 724,73 |
| (slovom: päť miliónov šesťsto dvadsaťosem tisíc sedemsto dvadsaťštyri EUR a sedemdesiat tri centov vrátane DPH) | |
- Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb alebo jednotkových cien a počtu merných jednotiek podľa náročnosti poskytovaných služieb a prác. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 – Špecifikácia ceny prác (spôsob určenia ceny).
- Prijaté hodinové sadzby a jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 zmluvy sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou zhotoviteľa a pevné počas trvania zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť samostatné faktúry a to zvlášť pre DSP, zvlášť pre Oznámenie 8a, zvlášť pre Doplnok SZ každej časti v súlade s týmto článkom zmluvy ako aj v súlade s článkami č. 6 v jednotlivých častiach zmluvy.
- 3.4. Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto článku tejto časti zmluvy ako aj povinnosti uvedené v článkoch č. 6 jednotlivých častí zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 3.6 tohto článku.
- 3.5. Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 3.6. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byť k nej priložené prílohy uvedené v článkoch č.6 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 časti 1, alebo časti 2, alebo časti 3 alebo časti 4. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby – pre diela uvedené v časti 1 a v časti 2 č. stavby 1175, pre diela uvedené v časti 3 a v časti 4 – č. stavby 1781. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru

- vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 3.7. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
 - 3.8. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej prác. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
 - 3.9. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 3.8 tohto článku budú ocenené podľa hodinových sadzieb alebo jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.
 - 3.10. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 3.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác/menej prác podľa bodu 3.9 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.
 - 3.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi uvedenými v tejto zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Čl. 4

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA

- 4.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 2 tejto časti zmluvy alebo podľa bodu 7.10 čl.7 tejto časti zmluvy.
- 4.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle čl.2 tejto časti zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl.7 tejto časti zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zákona (vrátane použitia diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom), tak aby objednávateľ dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela v zmysle čl. 2 tejto časti zmluvy alebo v zmysle bodu 7.10 čl.7 tejto časti zmluvy objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite diela (sublicenciu) v rozsahu udelennej licencie.

Čl. 5

SANKCIE

- 5.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. 3 tejto časti zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

- 5.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v čl. 7 časti 1 až 4 tejto zmluvy, bodu 8.1 čl. 8 tejto časti zmluvy, , bodu 6.5 čl. 6 tejto časti zmluvy alebo ak poruší zmluvu inak ako je uvedené v bode 5.3 tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne a to aj za opakované porušenie povinnosti.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu aj za :
- a) porušenie povinnosti zhotoviteľa (bod 1.7 čl. 1 tejto časti zmluvy) zabezpečiť, aby sa HIP alebo jeho zástupca, ktorým je zodpovedný projektant pre cestnú časť v mene zhotoviteľa zúčastňoval na všetkých pracovných rokovaníach s objednávateľom vrátane účasti na záverečnom prerokovaní, a to zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé porušenie povinnosti, t.j. za každú neúčast' na pracovnom rokovaní a záverečnom prerokovaní,
 - b) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 1.8 čl. 1 tejto časti zmluvy zabezpečiť, aby člen pracovnej skupiny v pozícii hlavného inžiniera projektu nevykonával v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dokumentácii v zmysle zmluvy, činnosti rovnaké alebo obdobné, aké sú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení tejto zmluvy na akomkoľvek inom diele/projekte, t.j. aby uvedeným spôsobom nespolupracoval pri vyhotovení iného diela, resp. dokumentácií, aké sú predmetom tejto zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti,
 - c) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 1.9 čl. 1 tejto časti zmluvy zabezpečiť, aby člen pracovnej skupiny v pozícii zodpovedného projektanta pre cestnú časť nevykonával v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy až do podpisu posledného preberacieho protokolu k dokumentácii v zmysle zmluvy, činnosti rovnaké alebo obdobné, aké sú predmetom výkonu jeho funkcie podľa ustanovení tejto zmluvy, s výnimkou vykonávania rovnakej alebo obdobnej činnosti maximálne na jednom inom diele/projekte, a to zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti,
 - d) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.12 čl. 8 tejto časti zmluvy zabezpečiť vykonať dielo prostredníctvom členov pracovnej skupiny a nemeniť členov pracovnej skupiny bez písomného súhlasu objednávateľa, a to zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti,
 - e) za porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 1.2 čl. 1 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur), a to za každé porušenie povinnosti,
 - f) za porušenie povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl.1 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 1.3 čl.1 tejto časti zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti,
 - g) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.13 čl. 8 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti uvedenej v bode 8.13 čl.8 tejto časti zmluvy, a to za každé porušenie povinnosti,
 - h) porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.9 čl. 8 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti,
 - i) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 8.10 čl. 8 tejto časti zmluvy zabezpečiť vykonať a realizovať vlastnými kapacitami časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy uvedené v bode 8.10 čl.8 tejto časti zmluvy, a to zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur), a to za každé porušenie povinnosti.
- 5.4 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvné pokuty uhradiť objednávateľovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvné pokuty v zmysle tohto článku je objednávateľ oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakované. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
- 5.5 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávateľom voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t.j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty objednávateľom nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy.

- 5.6 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami §358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 6.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápismi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania (bod 1.2 a 1.3 čl. 1 tejto časti zmluvy).
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 2 tejto časti zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu.
- 6.5 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 10 dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „lehota na odstránenie vady“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny príslušného diela bez DPH. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

ČI. 7 ZÁNİK ZMLUVY

- 7.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 7.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 7.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom.
Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v čl. 2, bod 2.5, druhá veta tejto časti zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 8, bod 8.1 tejto časti zmluvy,
 - c) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- d) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - e) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne,
 - f) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Prílohe č. 1.1a, 2.1a, 3.1a a 4.1a časti B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky,
 - g) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.3 čl. 9 tejto časti zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 1.8 čl. 1 tejto časti zmluvy,
 - ch) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 1.9 čl. 1 tejto časti zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.9 a/alebo 8.10 a/alebo a/alebo 8.12 a/alebo 8.13 čl. 8 tejto časti zmluvy.
- 7.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenia konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 7.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 7.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných postupov:
- 7.8.1 zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 7.10 tohto článku
 - 7.8.2 požadovať vrátenie už dodaných plnení
- 7.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 7.10 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti nie je odstúpením od zmluvy dotknutý.
- 7.11 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 7.9 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl. 3 tejto časti zmluvy.

Čl. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poisťnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti (profesijná zodpovednosť) na **poistnú sumu 870 000,- EUR, slovom osemstosedemdesiat tisíc EUR** (ďalej len „poistná zmluva“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poisťnej zmluvy po celú dobu trvania zmluvy a to až do skončenia záručnej doby v zmysle tejto zmluvy, ktorá končí uplynutím piatich rokov odo dňa v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu, a to za pôvodne dojednaných poisťných podmienok. V tejto súvislosti sa zhotoviteľ zaväzuje v prípade poisťnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu, predložiť

objednávateľovi novú poisťnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poisťnej zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa tohto článku zmluvy zabezpečiť platnosť a účinnosť poisťnej zmluvy po celú dobu trvania tejto zmluvy (t.j. do skončenia záručnej doby v zmysle tejto zmluvy, ktorá končí uplynutím piatich rokov odo dňa v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu) vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.

- 8.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníckymi poskytnutím príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky tretích osôb s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania a na základe písomnej výzvy objednávateľa aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 2 tejto časti zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela ustanovenie § 34 ods.9 ZVO a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 ZVO pre výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy objednávateľa poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri zostavovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti stavebnotechnického dozoru na stavbu. Zhotoviteľ je povinný vypracovať pre objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky“ (časť B.1 súťažných podkladov) týkajúce sa opisu projektu, v rozsahu a v zmysle požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 ZVO. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.
- 8.9 Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi (s výnimkou predmetu plnenia uvedenom v bode 8.10 tohto článku zmluvy) uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v rámci poskytnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 ZVO. Súhlas objednávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 8.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený odovzdať svojmu subdodávateľovi na vykonanie časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy uvedenú v tomto bode. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a bude realizovať vlastnými kapacitami nasledovné časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy:
- Dopravné stavby
1. Na diele č.1a a diele č.1c objekty č. 101-01, 101-02, 101-03, 108
 2. Na diele č. 2a a diele č. 2c objekty č. 101, 102, 03
- Mosty a inžinierske konštrukcie
1. Na diele 1a a diele č. 1c objekty č. 200, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210-01, 210-02, 211-01, 211-02, 228, 234, 237-01, 237-02, 237-03, 238, 239, 240, 241, 242
 2. Na diele č. 2a a diele č. 2c objekty č. 201, 207, 208, 209
- 8.11 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne

- vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa §26 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 8.9 tohto článku.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 ZVO vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy (ďalej len „člen alebo členovia pracovnej skupiny“). Zmeniť člena pracovnej skupiny počas trvania zmluvy je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa vo forme dodatku. Nový člen pracovnej skupiny musí spĺňať totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny. Zoznam členov pracovnej skupiny tvorí Prílohu č.3 tejto zmluvy.
- 8.13 V prípade vzniku udalosti, že zhotoviteľ nebude môcť vykonať dielo niektorým z členov pracovnej skupiny zhotoviteľa, a to z náhlych objektívnych dôvodov (napr. smrť, úraz člena pracovnej skupiny) je zhotoviteľ povinný v lehote do 7 pracovných dní zabezpečiť na danú konkrétnu pozíciu absentujúceho člena pracovnej skupiny náhradníka, ktorý musí spĺňať totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny. V lehote uvedenej v predchádzajúcej vete je zhotoviteľ zároveň povinný doručiť objednávateľovi písomný návrh dodatku k zmluve s uvedením mena náhradníka ako nového člena pracovnej skupiny a pripojením dokladov preukazujúcich, že nový člen pracovnej skupiny spĺňa totožné podmienky účasti ako pôvodný člen pracovnej skupiny.
- 8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 8.15 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevzme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

ČI. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 9.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ust. § 10a ZVO. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť objednávateľovi návrh dodatku k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu 3.1, 4.1 a 5.1 časti 1, bodu 3.1, 4.1 a 5.1 časti 2, bodu 3.1, 4.1 a 5.1 časti 3 a bodu 3.1, 4.1 a 5.1 časti 4 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený.
- 9.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 9.4 V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

- 9.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
- 9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 9.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
Príloha č.1 – Špecifikácia ceny prác
Príloha č.2 – Harmonogram postupu prác
Príloha č.3 – Zoznam členov pracovnej skupiny
Príloha č.4 – Časť B1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky – na priloženom CD
- 9.10 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ich prílohy, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor Kubík
podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Mária Sutka
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Príloha č. 1
Špecifikácia ceny prác

Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Doplnku stavebného zámeru (dSZ) pre stavby:
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice, Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave
číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa: 7778-00

- Tabuľka č. 1 Špecifikácia ceny prác, Dokumentácia pre stavebné povolenie, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Tabuľka č. 2 Špecifikácia ceny prác, Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum – predpokladaný rozsah prác, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Tabuľka č. 3 Špecifikácia ceny prác, Geologický elaborát – účelová mapa a Dokumentácia pre majetkoprávne vyrovnanie, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Tabuľka č. 4 Špecifikácia ceny prác, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Tabuľka č. 5 Špecifikácia ceny prác, Dodatok stavebného zámeru, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Tabuľka č. 6 Špecifikácia ceny prác, Dokumentácia na stavebné povolenie, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
- Tabuľka č. 7 Špecifikácia ceny prác, Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum – predpokladaný rozsah prác, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
- Tabuľka č. 8 Špecifikácia ceny prác, Geologický elaborát – účelová mapa a Dokumentácia pre majetkoprávne vyrovnanie, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
- Tabuľka č. 9 Špecifikácia ceny prác, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
- Tabuľka č. 10 Špecifikácia ceny prác, Dodatok stavebného zámeru, Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
- Tabuľka č. 11 Špecifikácia ceny prác, Dokumentácia na stavebné povolenie, Stavba: Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
- Tabuľka č. 12 Špecifikácia ceny predpokladaných geologických prác – Podrobný inžiniersko-geologický prieskum, Stavba: Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
- Tabuľka č. 13 Špecifikácia ceny prác, Geologický elaborát – účelová mapa a Dokumentácia pre majetkoprávne vyrovnanie, Stavba: Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
- Tabuľka č. 14 Špecifikácia ceny prác, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006, Stavba: Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
- Tabuľka č. 15 Špecifikácia ceny prác, Dodatok stavebného zámeru, Stavba: Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
- Tabuľka č. 16 Špecifikácia ceny prác, Dokumentácia na stavebné povolenie, Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave
- Tabuľka č. 17 Špecifikácia ceny predpokladaných geologických prác – Podrobný inžiniersko-geologický prieskum, Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave

- Tabuľka č. 18 Špecifikácia ceny prác, Geologický elaborát – účelová mapa a Dokumentácia pre majetkoprávne vyrovnanie, Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave
- Tabuľka č. 19 Špecifikácia ceny prác, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006, Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave
- Tabuľka č. 20 Špecifikácia ceny prác, Dodatok stavebného zámeru, Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave
- Tabuľka č. 21 Špecifikácia ceny prác spolu

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 1

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Stavba : Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivancka sever

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

A.1	Sprevedobná správa	Názov časti dokumentácie	Potrebný počet hodín				Cena celkom v €
			sadzba €/h 45,34	sadzba €/h 36,00	sadzba €/h 30,21	sadzba €/h 22,05	
A.2	Netechnické zhrnutie		320	300	120	28 934,00 €	
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000			120	20	4 924,20 €	
B.2	Celková situácia M 1:10 000			40	20	2 044,20 €	
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000 / 1000			140	120	8 665,20 €	
B.4	Ortofoto M 1:10 000			80	60	5 045,40 €	
B.5	Ortofoto M 1:2 000			80	180	8 670,60 €	
B.6	Vizualizácie		100	160	270	14 269,50 €	
C.1	Koordináčny výkres M 1:1 000, M 1:2 000		16	300	32	16 300,72 €	
C.2	Dopravné značenie celej stavby			190	200	13 607,44 €	
D	Pisomnosti a výkresy objektov			160	660	32 093,10 €	
	Demolácie			-	-	2 306 605,66 €	
001	Demolácia záhradného domčeka v km 10,760 D4			-	-	1 819,02 €	
002	Demolácia mosta v km 21,600 D4 nad Šúrslym kanálom, ev.č. 61-006			2	8	357,78 €	
	Príprava územia			18	24	1 461,24 €	
011	Úprava plôch pre zariadenie staveniska v km 0,000 - 6,500 D4			8	16	859,56 €	
012	Úprava plôch pre zariadenie staveniska v km 11,000 - 22,590 D4			8	24	1 101,24 €	
	Rekultivácie			-	-	11 921,94 €	
020	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ružinov			6	4	269,46 €	
021	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Jarovce			8	16	859,56 €	
022	Spätná rekultivácia dočasných záberov, úsek km 4,068 - 6,500 v k.ú. Podunajské Biskupice			8	8	329,88 €	
023	Spätná rekultivácia dočasných záberov, úsek km 6,500 - 11,000 v k.ú. Podunajské Biskupice			8	8	418,08 €	
024	Spätná rekultivácia dočasných záberov, úsek km 11,000 - 15,144 v k.ú. Podunajské Biskupice			18	24	1 549,44 €	
025	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Most pri Bratislave			8	24	1 101,24 €	
026	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Farná			8	16	859,56 €	
027	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ivancka pri Dunaji			6	4	269,46 €	
028	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Vajnory			6	4	269,46 €	
029	Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF, úsek km 4,068 - 6,500 v k.ú. Podunajské Biskupice			18	24	1 549,44 €	
030	Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Most pri Bratislave			6	4	269,46 €	
031	Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Farná			6	4	269,46 €	
032	Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Jarovce			6	4	269,46 €	
041	Rekultivácia opusteného úseku vety v križovatke "Jarovce"			8	4	329,88 €	
042	Rekultivácia opusteného úseku privádzaca k c.III/2046 v km 0,650 D4			8	24	1 101,24 €	
043	Rekultivácia opusteného úseku cesty I/2 v križovatke "Rusovce"			8	24	1 101,24 €	
044	Rekultivácia opusteného úseku cesty I/63 v križovatke "Rovinka"			8	8	418,08 €	
045	Rekultivácia opusteného úseku c.III/06359 v km 15,500 D4			8	8	418,08 €	
046	Rekultivácia opusteného úseku poľnej cesty k mohyle M.R.Štefánika v km 20,240 D4			6	4	269,46 €	
	Vegetačné úpravy			-	-	11 217,96 €	
051	Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 0,000 - 6,500			16	32	1 807,32 €	

052	Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 6,500 - 11,000		16	24	12	1 565,64 €
053	Vegetačné úpravy diaľnice D4, úsek km 11,000 - 22,590		24	48	12	2 578,68 €
054	Vegetačné úpravy poľnej cesty v km 6,220 D4		2	16	8	731,76 €
055	Vegetačné úpravy na prístupovej ceste k horárni Topolové v km 7,963 D4		2	16	8	731,76 €
056	Navádzacia zeleň v km 9,000 D4		2	16	8	731,76 €
057	Vegetačné úpravy na ceste I/63 v križovatke "Rovinka"		6	16	8	875,76 €
058	Vegetačné úpravy na preložke Vinohradníckej ulice v km 12,689 D4		2	16	8	731,76 €
059	Vegetačné úpravy na ceste II/572 v km 15,512 D4		2	16	8	731,76 €
060	Vegetačné úpravy na poľnej ceste k molye M.R.Štefánika v km 20,240 D4		2	16	8	731,76 €
Cestné objekty						
101-01	Diaľnica D4, úsek km 0,000 - 6,500		400	600	800	414 510,57 €
101-02	Diaľnica D4, úsek km 6,500 - 11,000		200	600	600	50 166,00 €
101-03	Diaľnica D4, úsek km 11,000 - 22,590		600	900	1 100	38 556,00 €
102	Križovatka "Jarovce"		40	200	180	73 044,00 €
103	Križovatka "Rusovce"		40	450	200	11 451,00 €
104-01	Križovatka "Ketelec", vetvy PS, SP		40	230	220	19 444,50 €
104-02	Križovatka "Ketelec", vetvy IS, BI, PB, IB, SI		50	260	250	13 239,30 €
105-01	Križovatka "Rovinka", vetvy GP, RP, PR, PG, GI		40	190	180	15 167,10 €
105-02	Križovatka "Rovinka", vetvy IR, IG, RI		30	160	140	11 148,90 €
107	Križovatka "Ivanka-západ"		40	300	360	9 000,60 €
108	Križovatka "Ivanka-sever"		200	450	350	18 441,00 €
121	Preložka cesty I/2 v km 2,396 D4 v križovatke "Rusovce"		20	180	240	28 512,00 €
122	Preložka cesty I/63 v km 10,856 D4 v križovatke "Rovinka"		20	220	260	11 449,80 €
123	Preložka cesty I/61 v km 21,600 D4 v križovatke "Ivanka-západ"		30	160	140	13 099,20 €
131	Úprava cesty III/2046 v km 1,512 D4		66	38	30	9 000,60 €
132	Cyklistická cestička v km 2,640 D4 z mosta na hrádzu		78	78	30	2 655,36 €
133	Cyklistická cestička v km 4,500 - 5,500 D4 z mosta na hrádzu		32	32	30	1 147,98 €
134	Úprava poľnej cesty v km 5,313 D4		98	98	60	3 017,88 €
135	Úprava poľnej cesty v km 6,220 D4		32	32	60	966,72 €
136	Úprava účelovej komunikácie v km 2,575 D4		92	92	34	4 283,58 €
140	Polná cesta v km 7,500 D4 vpravo		80	80	32	966,72 €
141	Miestna komunikácia v km 7,900 D4 vľavo		136	136	54	3 529,02 €
142	Pristupová cesta k horárni Topolové v km 7,963 D4		45	45	52	3 122,40 €
143	Hospodársky zjazd na starej hrádzi v km 10,210 D4		98	98	52	5 299,26 €
144-01	Pristupová cesta k Strabagu v km 10,856 D4		40	40	80	1 359,45 €
144-02	Úprava Hydlínskej ulice v km 10,856 D4		20	160	80	4 107,18 €
145	Preložka Vinohradníckej ulice v km 12,689 D4		10	80	40	1 208,40 €
146	Preložka cesty III/06359 v križovatke "Most pri Bratislave"		20	180	90	7 317,60 €
147	Preložka cesty III/572 v km 15,512 D4		40	40	40	3 658,80 €
148	Chodník pri ceste III/572 v km 15,512 D4 v obci Most pri Bratislave		40	40	40	8 142,30 €
149	Preložka poľnej cesty pri Malom Dunaji vpravo v km 16,675 D4		40	40	60	1 208,40 €
150	Preložka poľnej cesty pri Malom Dunaji vľavo v km 16,725 D4		40	40	60	1 208,40 €
151	Polná cesta v km 16,725 - 16,900 D4 vpravo		20	160	50	5 552,40 €
152	Preložka poľnej cesty k molye M.R.Štefánika v km 20,240 D4		60	60	50	1 812,60 €
153	Preložka poľnej cesty v km 20,600 - 21,075 D4 vľavo		20	160	50	6 656,10 €
154	Obchádzka na Vinohradníckej ulici v km 12,689 D4		20	180	50	7 260,30 €
155	Obchádzka na ceste III/572 v km 15,512 D4		80	80	30	3 078,30 €
156	Obchádzka na ceste III/06359 v km 15,311 - 15,594 D4		100	100	60	4 344,00 €
157	Úprava ciest I. triedy (po ukončení výstavby)		80	80	40	3 298,80 €
158	Úprava ciest II. a III. triedy (po ukončení výstavby)		100	100	40	3 903,00 €
159	Úprava miestnych a účelových komunikácií (po ukončení výstavby)					

160	Polná cesta v km 22.213 D4	-	-	42	-	1 268,82 €
Mosty						
200	Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj	320	1 260	-	1 260	1 209 080,14 €
201	Most na D4 v km 0,075 nad diaľnicou D2 v križovatke "Jarovce"	90	350	3 820	1 260	203 054,00 €
202	Most na D4 v km 1,512 nad cestou III/2046	170	520	100	85	15 687,75 €
203	Most na D4 v km 2,069 nad traťou ŽSR Bratislava - Rusovce v žkm 115,461	170	520	100	100	24 034,20 €
203-01	Most na vetve R U8 MUK "Rusovce" nad traťou ŽSR Bratislava - Rusovce v žkm 115,502	140	380	85	85	18 394,05 €
204	Most na D4 v km 2,244 - 2,752 nad preložkou cesty I/2 v križovatke "Rusovce"	820	1 620	442	442	90 019,90 €
204-01	Most na vetve R U4 MUK "Rusovce" nad preložkou cesty I/2	170	520	100	100	24 034,20 €
205	Most na D4 v km 2,757 - 3,357 nad Jarovským ramenom	1 000	1 620	442	442	100 127,10 €
206	Most na D4 v km 4,259 - 4,719 nad Biskupickým ramenom	820	1 620	442	442	90 019,90 €
207	Most na D4 v km 4,724 - 5,507	120	1 060	1 620	442	100 127,10 €
208	Most na polnej ceste nad diaľnicou D4 v km 6,220	90	180	44	44	9 648,00 €
209	Most na vetve R U1 MUK "Rusovce" nad preložkou cesty I/2	120	280	40	40	13 056,60 €
210-01	Rampa pre peších v km 2,618 D4	100	204	42	42	10 688,94 €
210-02	Rampa pre cyklistov v km 2,618 D4	100	204	42	42	10 688,94 €
211-01	Rampa pre peších v km 5,500 D4	60	153	26	26	7 355,43 €
211-02	Rampa pre cyklistov v km 5,500 D4	60	153	26	26	7 355,43 €
212	Most pre peších a cyklistov nad ľavostranným priesakovým kanálom rieky Dunaj	54	153	26	26	7 139,43 €
213	Most pre peších a cyklistov nad ľavostranným priesakovým kanálom rieky Dunaj	54	153	26	26	7 139,43 €
220	Most na vetve "PB" v km 6,875 nad R7 a D4 v križovatke "Ketelec"	170	520	100	100	24 034,20 €
221	Most na prístupovej ceste k horám Topolové v km 7,963 nad diaľnicou D4	50	350	46	46	13 387,80 €
222	Most na D4 v km 10,210 nad starou dunajskou hrádzou	140	420	85	85	19 602,45 €
223	Most na D4 v km 10,424 nad produktovom Slovnaftu	20	90	26	26	4 012,20 €
224	Most na D4 v km 10,462 nad produktovom Slovnaftu	20	90	26	26	4 012,20 €
225	Most na D4 v km 10,490 nad ropovodom Transpetrolu	20	90	26	26	4 012,20 €
226	Most na ceste I/63 v km 10,835 D4 nad ropovodom Transpetrolu	170	520	100	100	24 034,20 €
227	Most na ceste I/63 v km 10,855 nad diaľnicou D4 v križovatke "Rovinka"	100	420	85	85	18 162,45 €
228	Most na D4 v km 12,207 nad traťou ŽSR Bratislava - Dunajská Streda v žkm 12,778	50	350	46	46	13 387,80 €
229	Most nad diaľnicou D4 v km 12,689 na Vínhradnickej ulici	120	180	44	44	10 728,00 €
230	Most na D4 v km 14,060 pre zver	70	350	46	46	14 107,80 €
231	Most nad diaľnicou D4 v km 15,512 na c.II/572	255	510	85	85	26 461,35 €
232	Most na D4 v km 16,700 nad Malým Dunajom	50	350	46	46	13 387,80 €
233	Most na polnej ceste v km 20,186 nad diaľnicou D4	357	714	119	119	37 045,89 €
234	Tesniaca vaňa na D4 v km 20,325 - 20,925	70	350	46	46	14 107,80 €
235-01	Most na D4 - kolektore v km 21,600 vľavo nad c.I/61 v križovatke "Ivanka-západ"	170	520	100	100	24 034,20 €
235-02	Most na D4 v km 21,600 nad c.I/61 v križovatke "Ivanka-západ"	70	350	46	46	14 107,80 €
235-03	Most na D4 - kolektore v km 21,600 vpravo nad c.I/61 v križovatke "Ivanka-západ"	70	350	46	46	14 107,80 €
236	Most na ceste I/61 v km 21,600 D4 nad Surským kanálom	120	350	46	46	15 907,80 €
237-01	Most na D4 - kolektore v km 22,250 vľavo nad traťou ŽSR Bratislava - Galanta v žkm 65,935	170	520	100	100	24 034,20 €
237-02	Most na D4 v km 22,250 nad traťou ŽSR Bratislava - Galanta v žkm 65,963	100	420	85	85	18 162,45 €
237-03	Most na D4 - kolektore a vetve "Jarovce - IT" v km 22,250 vpravo nad traťou ŽSR Bratislava - Galanta v žkm 65,911	140	520	85	85	22 623,45 €
238	Most na vetve "BA-Jarovce" v km 22,250 nad vetvami "Stupava-TT" a "BA-Stupava" v križovatke "Ivanka - sever"	140	520	85	85	22 623,45 €
239	Most na D4 v km 22,356 nad vetvami "Stupava-TT" a "BA-Stupava" a D4 v križovatke "Ivanka - sever"	70	350	46	46	14 107,80 €
240	Most na vetve "IT-Jarovce" v km 0,217 D4 nad vetvou "BA - Stupava" a D4 v križovatke "Ivanka - sever"	70	350	46	46	14 107,80 €
241	Most na vetve "IT-Jarovce" v km 22,355 D4 nad vetvami "BA-Stupava" a "Stupava-TT" v križovatke "Ivanka - Sever"	100	420	85	85	18 162,45 €
242	Most na vetve "Jarovce-BA" v km 0,180 D4 nad vetvou "BA-Stupava" a D4 v križovatke "Ivanka - sever"	-	-	-	-	8 576,64 €
Múry		-	-	-	-	4 771,68 €
251	Oporný múr na D4 v km 11,775 - 12,190 vľavo	44	88	24	24	3 804,96 €
252	Oporný múr v km 0,293 - 0,363 na vetve "BA-Jarovce" vpravo v križovatke "Ivanka-sever"	44	88	24	24	3 804,96 €
Profilukové opatrenia						
		-	-	-	-	129 243,72 €

261	Protihluková stena v km 0,010 – 0,295 D4 vpravo	20	96	24	4 149,36 €
262	Protihluková stena v km 0,417 – 2,025 D4 vpravo	40	192	24	7 769,52 €
263	Protihluková stena v km 0,000 – 0,265 vetvy "JA 2" vpravo, v križovatke "Jarovce"	20	96	24	4 149,36 €
264-01	Zábrany proti víakom v km 2,609 – 5,516 D4 vľavo	40	180	24	7 407,00 €
264-02	Zábrany proti víakom v km 2,609 – 5,516 D4 vpravo	40	180	24	7 407,00 €
265	Protihluková stena v km 9,500 – 10,565 D4 vpravo	40	90	24	4 688,10 €
266	Protihluková stena v km 0,000 – 0,270 vetvy "PR" vpravo, v križovatke "Rovinka	40	40	24	3 177,60 €
267	Protihluková stena v km 10,660 – 10,760 D4 vpravo	40	40	24	3 177,60 €
268	Protihluková stena v km 10,745 – 10,848 D4 na kolektore vpravo	40	40	24	3 177,60 €
269-01	Protihluková stena v km 10,871 – 11,000 D4 na kolektore vpravo	40	40	24	3 177,60 €
269-02	Protihluková stena v km 11,000 – 11,050 D4 na kolektore vpravo	32	40	24	2 889,60 €
270	Protihluková stena v km 0,575 – 0,780 cesty I/63 vľavo	40	56	24	3 660,96 €
271	Protihluková stena v km 0,032 – 0,349 vetvy "RI" vpravo, v križovatke "Rovinka"	40	88	24	4 627,68 €
272	Protihluková stena v km 11,133 – 11,339 D4 vpravo	40	56	24	3 660,96 €
273	Protihluková stena v km 11,306 – 11,975 D4 vpravo	60	96	24	5 589,36 €
274	Protihluková stena v km 14,700 – 16,380 D4 vpravo	60	180	24	8 127,00 €
275	Protihluková stena v km 16,740 – 21,251 D4 vpravo	60	180	24	8 127,00 €
276	Protihluková stena v km 0,187 – 0,386 na kolektore vpravo, v križovatke "Ivanka - západ"	40	56	24	3 660,96 €
277	Protihluková stena v km 0,000 – 0,200 vetvy "Jarovce - Senec", v križovatke "Ivanka - západ"	40	56	24	3 660,96 €
278	Protihluková stena v km 0,457 – 0,695 na kolektore vpravo, v križovatke "Ivanka - západ"	40	56	24	3 660,96 €
279	Protihluková stena v km 0,345 – 0,740 vetvy "Jarovce - BA", v križovatke "Ivanka - sever"	40	88	24	4 627,68 €
280	Protihluková stena v km 0,063 – 0,198 vetvy "TT - Jarovce", v križovatke "Ivanka - sever"	40	56	24	3 660,96 €
281	Protihluková stena v km 0,000 – 0,378 vetvy "TT - Stupava", v križovatke "Ivanka - sever"	40	122	24	5 654,82 €
282	Protihluková stena v km 0,280 – 0,680 vetvy "TT - Jarovce", v križovatke "Ivanka - sever"	40	122	24	5 654,82 €
283	Protihluková stena v km 0,000 – 0,668 vetvy "Stupava - BA", v križovatke "Ivanka - sever"	50	96	24	5 229,36 €
286	Fasádne úpravy v Jarovciach, v km 0,200 – 1,700 D4 vpravo	40	75	24	4 234,95 €
287	Fasádne úpravy v Rovinke, v km 10,855 D4 vpravo	40	75	24	4 234,95 €
Oplotenia					
301-01	Oplotenie diaľnice D4, úsek km 0,000 - 6,500	-	-	-	8 702,22 €
301-02	Oplotenie diaľnice D4, úsek km 6,500 - 11,000	60	60	6	1 944,90 €
301-03	Oplotenie diaľnice D4, úsek km 11,000 - 22,590	120	120	8	1 989,00 €
302	Oplotenie areálu v km 4,800 D4	16	16		3 801,60 €
304	Oplotenie poľnohospodárskeho areálu v križovatke ciest II/572 a IIII/06359	16	16		483,36 €
Veľké odpočívadlo „Rovinka“ vľavo					
310-01	Sadovnicke úpravy, odpočívadlo Rovinka vľavo	8	48	24	58 831,44 €
310-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Rovinka vľavo	70	240	150	2 267,28 €
310-12	Komunikácie a spevnené plochy PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo	80	270	200	13 077,90 €
310-31	Drobná architektúra, odpočívadlo Rovinka vľavo	8	24	8	15 446,70 €
310-32	Váha - stavebná časť, odpočívadlo Rovinka vľavo	4	20	8	1 189,44 €
310-33	Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo	8	64	24	924,60 €
310-34	Objekt kontroly a správy PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo	8	20	12	2 750,64 €
310-35	Oplotenie PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo	4	12	4	1 156,80 €
310-36	Vybavenie PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo	4	20	8	594,72 €
310-51	Dažďová kanalizácia a ORL, odpočívadlo Rovinka vľavo	16	32	16	924,60 €
310-52	Dažďová kanalizácia PNV a ORL, odpočívadlo Rovinka vľavo	16	32	16	1 895,52 €
310-53	Splásková kanalizácia, odpočívadlo Rovinka vľavo	16	24	16	1 895,52 €
310-54	Vonkajší vodovod pitný, odpočívadlo Rovinka vľavo	8	24	8	1 653,84 €
310-55	Zdroj požiariarnej a užitkovej vody, požiarňa nadrž, odpočívadlo Rovinka vľavo	8	24	8	1 189,44 €
310-56	Vodovodná prípojka pre odpočívadlo	8	32	16	1 189,44 €
310-57	Rozvod užitkovej vody po odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vľavo	8	24	8	1 607,52 €
310-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Rovinka vľavo	8	44	16	1 189,44 €
					1 970,04 €

310-62	Vonkajšie osvetlenie PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo		8	28	8	1 310,28 €
310-63	Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Rovinka vľavo		8	16	4	859,56 €
310-64	Vonkajšie silnoprúdové rozvody PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo		8	16	4	859,56 €
310-65	Kiosková trafostanica TS5, odpočívadlo Rovinka vľavo		8	24	12	1 277,64 €
310-71	Kamerový systém na odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vľavo		8	28	8	1 310,28 €
310-72	Informačný systém PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo		8	16	4	859,56 €
310-73	Kamerový systém PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo		8	32	8	1 431,12 €
	Veľké odpočívadlo „Rovinka“ vpravo		-	-	-	53 860,02 €
320-01	Sadovnicke úpravy, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	48	24	2 267,28 €
320-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Rovinka vpravo		60	220	170	12 554,70 €
320-12	Komunikácie a spevnené plochy PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		50	180	140	10 324,80 €
320-31	Drobná architektúra, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	24	8	1 189,44 €
320-32	Váha - stavebná časť, odpočívadlo Rovinka vpravo		4	20	8	924,60 €
320-33	Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	64	24	2 750,64 €
320-34	Objekt kontroly a správy PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	20	12	1 156,80 €
320-35	Oplotenie PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		4	12	4	594,72 €
320-36	Výbavenie PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		4	20	8	924,60 €
320-51	Dažďová kanalizácia a ORL, odpočívadlo Rovinka vpravo		16	32	16	1 895,52 €
320-52	Dažďová kanalizácia PNV a ORL, odpočívadlo Rovinka vpravo		16	32	16	1 895,52 €
320-53	Splašková kanalizácia, odpočívadlo Rovinka vpravo		16	24	16	1 653,84 €
320-54	Vonkajší vodovod pitný, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	24	8	1 189,44 €
320-55	Zdroj požiarnej a úžitkovej vody, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	24	8	1 189,44 €
320-56	Rozvod úžitkovej vody po odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vpravo		16	32	16	1 895,52 €
320-57	Prípojka splaškovej kanalizácie, prečerpávacía stanica splaškových vôd		8	32	8	1 431,12 €
320-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	44	16	1 970,04 €
320-62	Vonkajšie osvetlenie PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	28	8	1 310,28 €
320-63	Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	16	4	859,56 €
320-64	Vonkajšie silnoprúdové rozvody PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	16	4	859,56 €
320-65	Kiosková trafostanica TS6, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	24	12	1 277,64 €
320-71	Kamerový systém na odpočívadle, odpočívadlo Rovinka vpravo		12	28	8	1 454,28 €
320-72	Kamerový systém PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	32	8	1 431,12 €
320-73	Informačný systém PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		8	16	4	859,56 €
	Kanalizácie, vodovody a závlahy		-	-	-	59 147,04 €
501-01	Kanalizácia diaľnice D4, km 0,000 – 5,500		20	180	120	8 803,80 €
501-02	Odvodnenie diaľnice D4, km 2,300 – 6,500		24	48	8	2 490,48 €
501-03	Odvodnenie diaľnice D4, km 6,500 – 11,000		24	48	8	2 490,48 €
501-04	Odvodnenie diaľnice D4, úsek km 11,000 – 22,590		24	48	8	2 490,48 €
501-10	Kanalizácia vetiev križovatky "Jarovce"		12	28	8	1 454,28 €
501-11	Kanalizácia vetiev križovatky "Rusovce"		16	36	8	1 839,96 €
502	Preložka výtlačnej kanalizácie diaľnice DN 600 v km 0,000 – 0,750 D4		16	32	16	1 895,52 €
503	Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4		32	32	16	1 319,52 €
504	Preložka výtlačnej kanalizácie DN 200 v km 1,430 D4		32	32	16	1 319,52 €
505	Preložka kanalizácie DN 800 v km 2,110 D4		32	32	16	1 319,52 €
506	Výtlačná kanalizácia diaľnice D4 DN 600 v km 0,200 - 0,475		32	32	16	1 319,52 €
507	Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN 600 v km 18,760 D4		32	32	16	1 319,52 €
509	Ochrana výtlačného kanalizačného potrubia DN 400 v km 21,575 D4		32	32	16	1 319,52 €
510	Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN 600 popod c II/61 v križovatke Ivanka - západ"		28	28	8	1 022,28 €
510	Preložka výtlačného kanalizačného potrubia DN 125 popod c II/61 v križovatke "Ivanka - západ"		28	28	8	1 022,28 €
511	Výtlačné potrubie DN 500 v km 20,150 - 20,625 D4		16	32	16	1 895,52 €
520	Preložka vodovodu ROL-1 DN 1400 v km 2,325 D4		24	64	8	2 973,84 €
521	Preložka vodovodu ROL-2 DN 1400 v km 2,325 D4		28	28	8	1 022,28 €

522	Prelodka zasobovacieho vodovodu DN800 v km 7.994 D4	24	64	8	2 973,84 €
523	Prelodka vodovodu DN200 v križovatke "Rovinka"	24	64	8	2 973,84 €
524	Prelodka vodovodu DN 1000 v km 12,660 D4	24	64	8	2 973,84 €
525	Úprava vodovodu DN 1000 v km 14,260 D4		24	4	813,24 €
526	Prelodka vodovodu DN 500 v km 14,263 D4		32	16	1 319,52 €
540	Prelodka zvlahových potrubí v km 12,453 - 16,096 D4	36	64	24	3 758,64 €
541	Prelodka zvlahových potrubí „Závlaha pozemkov pod Bratislavou“ v km 16,500 – 20,230 D4		32	16	1 319,52 €
542	Prelodka zvlahových potrubí „Závlaha pozemkov Vajnory III“ v km 22,175 D4	36	56	16	3 340,56 €
551-01	Cerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, stavebná časť	12	24	8	901,44 €
553-01	Cerpacia stanica v km 20,625 D4, stavebná časť		28	8	1 454,28 €
	Objekty elektrických vedení VN, NN, VO				131 609,22 €
601	Prelodka vzdušného vedenia VVN 110 kV I.č. 8898 v km 2,440 D4	32	56	8	3 020,16 €
602	Prelodka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV I.č. 8204, 8899 v km 12,861 D4	24	56	8	2 732,16 €
603	Prelodka vzdušného vedenia VVN 110 kV I. č. 8774 v km 12,894 D4	24	56	8	2 732,16 €
610	Prelodka kábelového vedenia VN 22 kV I.č. 464 v km 0,140 D4	8	24	4	1 101,24 €
611	Prelodka vzdušného vedenia VN 22 kV I.č. 161 v km 1,700 D4	18	48	8	2 274,48 €
612	Prelodka vzdušného vedenia VN 22 kV I.č. 144 v km 2,400 D4	44	54	16	3 568,14 €
613	Prelodka prípojky VN 22 kV z I.č. 144 pre jestv. TS 0028 ČOV v km 2,350 D4	8	20	4	980,40 €
614	Prelodka vzdušného vedenia NN v km 5,950 D4	2	8	2	357,78 €
615	Prelodka vzdušného vedenia VN 22kV v km 9,000 - 9,153 D4	8	24	4	1 101,24 €
616	Prelodka vzdušného vedenia VN 22 kV v km 9,850 – 10,173 D4	80	180	16	8 670,60 €
617	Prelodka vzdušného vedenia VN 22kV v km 10,728 D4	60	160	16	7 346,40 €
618	Prelodka vzdušného vedenia 2xVN 22kV v km 11,806 D4	16	40	12	2 049,00 €
619	Prelodka podzemného vedenia NN v km 12,158 D4	2	8	2	357,78 €
620	Prelodka vzdušného vedenia VN 22 kV I.č. 437 v km 12,814 - 12,962 D4	16	32	12	1 807,32 €
621	Prelodka vzdušného vedenia VN 2x22 kV I.č. 437, 221 v km 12,942 D4	8	24	8	1 189,44 €
622	Prelodka vzdušného vedenia VN 2x22 kV I.č. 435, 414 v km 12,955 D4	8	24	8	1 189,44 €
623	Prelodka vzdušného vedenia VN 22 kV I.č. 436 v km 13,316 D4	8	24	8	1 189,44 €
624	Prelodka vzdušnej prípojky VN 22 kV I.č. 436 v km 0,346 cesty II/572	12	32	8	1 575,12 €
625	Prelodka vzdušnej prípojky VN 22 kV I.č. 436 v km 0,680 cesty II/572	8	24	8	1 189,44 €
626	Prelodka NN kábľa pre zaviazovač v km 0,650 preložky cesty II/572 - KÚ	2	8	2	357,78 €
627	Prelodka kábelového vedenia NN z TS 007 v km 0,700-0,900 cesty II/572	2	8	2	357,78 €
628	Prípojka NN pre VO chodníka cesty II/572 v obci Most pri Bratislave	2	8	2	357,78 €
629	Prelodka kábelového vedenia, hydromeliorácií v km 16,645 D4	2	8	2	357,78 €
630	Prelodka vzdušného vedenia 2xVN 22kV I. č. 263-414 v km 19,750 - 19,432 D4	8	24	4	1 101,24 €
631	Prelodka vzdušného vedenia VN 22kV I. č. 1106 v km 0,387 D4	8	24	4	1 101,24 €
640-01	Kábelové vedenie VN 22 kV pre TS1 v križovatke "Jarovce" až TS4 v križovatke "Ketelec"	20	120	16	4 698,00 €
640-02	Kábelové vedenie VN 22 kV pre TS4 v križovatke "Ketelec" až TS7 v križovatke "Rovinka"	20	120	16	4 698,00 €
641	Rozvody NN pre VO križovatky "Jarovce"	20	56	16	2 764,56 €
642	Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO križovatky "Rusovce"	4	12	8	682,92 €
643	Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO cesty I/2 v križovatke "Rusovce"	4	8	6	517,98 €
644	Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre výstražné osvetlenie mosta cez Dunaj	16	32	12	1 807,32 €
645	Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre lodnú signalizáciu na neke Dunaj	8	28	8	1 310,28 €
646	Prípojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre osvetlenie komorok mosta cez Dunaj	8	28	8	1 310,28 €
647	Kiosková trafostanica TS1 v km 0,150 D4, v križovatke "Jarovce"	6	12	8	754,92 €
648	Kiosková trafostanica TS2 pre ČS1 v km 0,500 D4	4	12	6	638,82 €
649	Kiosková trafostanica TS3 v km 2,400 D4, v križovatke "Rusovce"	4	12	6	638,82 €
651	Prípojka NN pre VO v km 6,500 D4	8	16	4	859,56 €
652	Prípojka NN pre VO v km 6,750 D4	4	12	4	594,72 €
653	Prípojka NN pre VO rýchlostnej komunikácie R7 v km 6,500 D4	4	12	4	594,72 €
654	Prípojka NN pre ČS ORL2 v km 0,700 R7	8	20	4	980,40 €

655	Pripojka NN pre VO v km 6,705 D4		4	12	4	594,72 €
656	Pripojka NN pre VO v km 6,925 D4		2	8	2	357,78 €
657	Kiosková trafostanica TS4 v km 6,930 D4		8	20	4	980,40 €
658	Kiosková trafostanica TS7 v km 10,750 D4		8	20	4	980,40 €
659	Pripojka VN 22 kV z l. č. 436 pre TS8 v km 15,450 D4		4	8	2	429,78 €
660	Kiosková trafostanica TS8 v km 15,450 D4		8	16	4	859,56 €
661	Pripojka VN 22 kV z l. č. 263 pre TS9 v km 20,323 D4		54	64	16	4 230,24 €
662	Kiosková trafostanica TS9 v km 20,323 D4		8	20	4	980,40 €
663	Pripojka NN pre ČS v km 20,625 D4		8	24	4	1 101,24 €
664	Pripojka NN pre VO v km 0,050 D4 v križovatke "Ivanka - sever"		8	20	4	980,40 €
665	Pripojka NN pre VO v km 0,150 D4 v križovatke "Ivanka - sever"		8	20	4	980,40 €
666	Pripojka NN pre VO v km 22,450 D4 v križovatke "Ivanka - sever"		4	12	4	594,72 €
667	Pripojka NN pre VO v km 10,700 D4 v križovatke "Rovinka"		4	12	4	594,72 €
668	Pripojka NN pre VO v km 10,975 D4 v križovatke "Rovinka"		4	12	4	594,72 €
669	Pripojka NN pre VO v km 0,250 cesty I/63 v križovatke "Rovinka"		2	8	2	357,78 €
670	Verejné osvetlenie v križovatke "Jarovce"		20	160	16	5 906,40 €
671	Verejné osvetlenie v križovatke "Rusovce"		54	64	16	4 230,24 €
672	Verejné osvetlenie cesty I/2 v križovatke "Rusovce"		16	54	16	2 560,14 €
673	Výstražné osvetlenie na ochranu vtákov na moste cez Dunaj		16	64	16	2 862,24 €
674	Verejné osvetlenie v križovatke "Ketelec"		80	180	16	8 670,60 €
675	Verejné osvetlenie v križovatke "Rovinka"		60	160	16	7 346,40 €
676	Verejné osvetlenie cesty I/63 v križovatke "Rovinka"		16	54	16	2 560,14 €
677	Verejné osvetlenie chodníka pri ceste II/572 v obci Most pri Bratislave		8	16	4	859,56 €
678	Verejné osvetlenie v križovatke "Ivanka - sever"		90	180	16	9 030,60 €
679	Kiosková trafostanica TS10 v km 0,180 D4		16	40	12	2 049,00 €
	Vedenia ZSR		-	-	-	-
681	Dočasná úprava trakčného vedenia žkm 115,461 (km 2,069 D4)		16	56	16	20 067,54 €
682	Definitívna úprava trakčného vedenia žkm 115,461 (km 2,069 D4)		12	28	8	1 454,28 €
683	Dočasná úprava trakčného vedenia žkm 65,881-66,314 (km 22,227 D4)		32	64	24	3 614,64 €
684	Definitívna úprava trakčného vedenia žkm 65,881- 66,314 (km 22,227 D4)		14	48	4	2 042,28 €
691	Úprava vedení ŽSR OZT žkm 115,461 (km 2,069 D4)		16	30	8	1 658,70 €
692	Úprava vedenia NN ZSR v km 1,489 D4		16	30	8	1 658,70 €
693	Preložka 6 kV ŽSR v km 22,238 D4		14	48	4	2 042,28 €
694	Preložka DK ŽSR v km 22,180 D4		16	30	8	1 658,70 €
695	Preložka OK ŽSR v km 22,227 D4		16	30	8	1 658,70 €
696	Preložka UA ŽSR a TK ŽSR v km 22,238 D4		16	30	8	1 658,70 €
	Plynovody		-	-	-	-
701	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 2,215 D4		40	80	16	4 209,60 €
702	Preložka plynovodu DN500 v km 0,710 cesty I/63, v križovatke "Rovinka"		40	80	16	4 209,60 €
703	Ochrana produktovodu (ropovodu) DN500 TRANSPETROL v km 0,578 c.I/63, v križovatke "Rovinka"			28	8	1 022,28 €
704	Ochrana produktovodov DN250 a DN300 SLOVNAFT v km 0,600 a 0,628 c.I/63 v križovatke "Rovinka"			32	16	1 319,52 €
705-01	Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 12,133 D4		20	64	16	3 006,24 €
705-02	Preložka VTL plynovej prípojky DN150 do regulačnej stanice v km 12,133 D4		12	28	8	1 454,28 €
706	Preložka STL plynovodu DN 90 v km 15,470 D4		20	180	24	6 687,00 €
707	Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 D4		20	54	16	2 704,14 €
708	Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 21,700 D		40	80	24	4 386,00 €
709	Preložka katodickej ochrany VTL plynovodu DN 300 v km 1,150 - 1,250 preložky cesty I/61 vľavo			28	12	1 110,48 €
	Oznamovacie vedenie		-	-	-	-
751	Preložka káblov SLOVAK TELEKOM v km 0,048 D4		2	8		313,68 €
752	Preložka káblov ISD v križovatke "Jarovce"		2	8		313,68 €
753	Preložka optických káblov PANTEL v km 2,077 D4		2	8		313,68 €

754	Preložka optických káblov SWAN v v km 2,077 D4		2	8	313,68 €
755	Preložka DOK kábľa SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4		2	8	313,68 €
756	Preložka MOK kábľa SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4		2	8	313,68 €
757	Preložka optického kábľa a zariadení SITEL v km 2,436 D4		8	24	1 101,24 €
758	Preložka MOK kábľa SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4		8	16	859,56 €
759	Preložka DK kábľa SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4		8	24	1 101,24 €
760	Ochrana DK kábľa ENERGOTEL v km 7,900 - 8,000 D4		2	8	313,68 €
761	Preložka vzdúšného vedenia SLOVAK TELEKOM v km 7,800 - 7,900 D4		4	12	594,72 €
762	Ochrana DK kábľa SLOVNAFT v km 10,300 - 10,900 D4		2	8	313,68 €
763	Ochrana optického kábľa a zariadení TRANSPETROL v km 10,300 - 10,900 D4		2	8	313,68 €
764	Preložka optického kábľa a zariadení SITEL, ORANGE, SISP, ST v km 10,600 - 10,800 D4		16	32	1 895,52 €
765	Preložka optických káblov a zariadení SLOVAK TELEKOM v km 10,700 - 11,000 D4		12	28	1 454,28 €
766	Preložka optického kábľa SITEL v km 12,145 D4		4	12	594,72 €
767	Preložka DK kábľa SLOVAK TELEKOM v km 15,482 D4		12	28	1 454,28 €
768	Preložka MOK kábľa SLOVAK TELEKOM v km 15,485 D4		8	16	859,56 €
769	Preložka optického kábľa SLOVAK TELEKOM pri c. II/572 v km 15,499 D4		8	16	859,56 €
770	Preložka MTS SLOVAK TELEKOM pri preložke c. II/572 v km 15,508 D4		4	12	594,72 €
771	Preložka PDOK kábľa SLOVAK TELEKOM v km 0,160 - 0,383 preložky c. II/572		4	12	594,72 €
772	Preložka oznamovacieho vedenia LPS Bratislava v km 16,736 D4		6	8	457,68 €
773	Preložka OK SWAN Bratislava v km 18,625 - 18,930 D4		12	12	970,92 €
774	Preložka chráničky BVS Bratislava v km 18,625 - 18,930 D4		6	8	457,68 €
775	Preložka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,236 D4		4	12	715,56 €
776	Preložka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,245 D4		4	12	594,72 €
777	Preložka oznamovacieho vedení LPS Bratislava v km 20,875 - 21,040 D4		4	12	594,72 €
778	Ochrana OK SWAN Bratislava pod cestou I/61 pozdĺž Šúrskeho kanála		6	8	457,68 €
779	Preložka OK TURKTELEKOM Bratislava na ceste I/61 v km 1,160 - 1,250		6	8	457,68 €
780	Preložka rádiomajáka NDB L id D v km 20,900 D4		32	64	3 438,24 €
781	Preložka oznamovacieho vedenia ZSE v km 15,485 D4		32	64	3 438,24 €
	Informačný systém				25 386,60 €
791-01	Informačný systém D4, úsek km 0,000 - 6,500 D4 - stavebná časť		40	120	6 123,60 €
792-01	Informačný systém D4, úsek km 6,500 - 11,000 D4 - stavebná časť		40	120	6 123,60 €
793-01	Informačný systém D4, úsek km 11,000 - 22,561 D4 - stavebná časť		40	120	6 123,60 €
794-01	Informačný systém na jestvujúcej D2 v križovatke "Jarovec" - stavebná časť		24	70	3 507,90 €
795-01	Informačný systém na jestvujúcej D1 v križovatke "Ivanka - sever" - stavebná časť		24	70	3 507,90 €
	Pristupové komunikácie na stavenisko				8 640,06 €
801	Pristupová komunikácia k mostu nad preložkou cesty I/2 v križovatke "Rusovce"		-	24	725,04 €
802	Pristupová komunikácia k mostu nad Jaroveckým ramenom v km 2,723 D4		24	24	725,04 €
803	Pristupová komunikácia k mostu nad Jaroveckým ramenom v km 3,085 - 3,350 D4		24	24	725,04 €
804	Pristupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,430 D4		24	24	725,04 €
805	Pristupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,700 D4		30	36	906,30 €
806	Pristupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,300 D4		36	36	1 087,56 €
807	Pristupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,400 D4		24	24	725,04 €
808	Pristupová komunikácia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,400 D4		48	48	1 450,08 €
810	Pristupová komunikácia ku križovatke „Ivanka - sever“		52	52	1 570,92 €
	Prevádzkové súbory:				46 507,08 €
310-75	Parkovací systém PNV, odpočívadlo Rovinka vľavo		24	24	813,24 €
310-76	Váha - technologická časť, odpočívadlo Rovinka vľavo		22	22	752,82 €
310-77	Čerpacia stanica požiarnej vody, odpočívadlo Rovinka vľavo		48	48	1 538,28 €
310-78	Čerpacia stanica úžitkovej vody, odpočívadlo Rovinka vľavo		48	48	1 538,28 €
310-79	Prečerpávacia stanica splaškových vôd, odpočívadlo Rovinka vľavo		24	24	813,24 €
320-75	Parkovací systém PNV, odpočívadlo Rovinka vpravo		24	24	813,24 €

320-76	Váha - technologická časť, odpočívadlo Rovinka vpravo				22	4	752,82 €
320-77	Čerpacia stanica požiarnej vody, odpočívadlo Rovinka vpravo				48	4	1 538,28 €
320-78	Čerpacia stanica úžitkovej vody, odpočívadlo Rovinka vpravo				48	4	1 538,28 €
320-79	Prečerpávacía stanica splaškových vôd, odpočívadlo Rovinka vpravo				48	4	1 538,28 €
551-02	Čerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, technologická časť				48	4	1 538,28 €
552-02	Uprava čerpacej stanice v križovatke "Jarovce", technologická časť				36	4	1 175,76 €
553-02	Čerpacia stanica v km 20,625 D4, technologická časť				48	4	1 538,28 €
791-02	Informačný systém D4 úsek km 0,000 - 6,500 D4 - technologická časť			40	120	48	6 123,60 €
792-02	Informačný systém D4, úsek km 6,500 - 11,000 D4 - technologická časť			40	120	48	6 123,60 €
793-02	Informačný systém D4, úsek km 11,000 - 22,561 D4 - technologická časť			40	120	48	6 123,60 €
794-02	Informačný systém na jestvujúcej D2 v križovatke "Jarovce" - technologická časť			40	120	48	6 123,60 €
795-02	Informačný systém na jestvujúcej D1 v križovatke "Ivanka - sever" - technologická časť			40	120	48	6 123,60 €
	Zmena svetelnej približovacej sústavy letiska			240	620	120	30 016,20 €
	Uloženie vodovodného potrubia na mostné objekty 200, 204, 205, 206, 207			120	400	119	19 027,95 €
E	Doklady					170	3 748,50 €
F	Dokumentácia prieskumov						788 297,56 €
	Podrobný inžiersko-geologický a hydrogeologický prieskum						647 018,00 €
	Dopravno-inžierske podklady - aktualizácia z DÚR spracovaná s ďalšími stavbami Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice, Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave			40	420	120	16 774,20 €
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov - aktualizácia z DÚR			200	180	120	15 283,80 €
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín - aktualizácia z DÚR			200	320	150	20 174,70 €
	Hluková štúdia - aktualizácia z DÚR				200		6 042,00 €
	Koróznny prieskum - aktualizácia z DÚR			24	54	16	2 848,14 €
	Pyrotechnický prieskum			16	32		1 542,72 €
	Geodetický elaborát						78 614,00 €
G	Dokumentácia pre MP usporiadanie						72 800,00 €
H	Dokumentácia pre odňatie PP a vyňatie LP			180	420	120	21 814,20 €
I	Dokumentácia pre ŽSR			12	170		5 567,70 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci				20		604,20 €
L.1	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP			200	220	80	15 610,20 €
L.2	Projekt geotechnického monitoringu				80		2 416,80 €
M	Kompenzačné opatrenia						33 766,92 €
	Sprievodná správa			40	80	24	4 386,00 €
	Environmentálna charakteristika				80	16	2 769,60 €
	Mapa kompenzačných opatrení				24	16	1 077,84 €
	Kompenzačné opatrenia - objekty pre vydanie rozhodnutia o využití územia						5 506,20 €
071	Kompenzačné opatrenie 1, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.u. Rusovce			8	24	4	1 101,24 €
072	Kompenzačné opatrenie 2, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.u. Čunovo			8	24	4	1 101,24 €
073	Kompenzačné opatrenie 3, zmena pozemkov na lesný pozemok v k.u. Čunovo			8	24	4	1 101,24 €
074	Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.u. Podunajské Biskupice			8	24	4	1 101,24 €
075	Kompenzačné opatrenie 5, zatrávnenie pozemkov v k.u. Kalinkovo			8	24	4	1 101,24 €
076	Kompenzačné opatrenie 6, sprietočnenie Biskupického ramena			40	400	48	14 582,40 €
077	Kompenzačné opatrenie 6, most na ľesnej ceste nad Biskupickým ramenom			48	64	24	4 190,64 €
	Doklady					24	1 254,24 €
N	Vplyv stavby na životné prostredie			90	180	80	10 441,80 €
O	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete			70	220		9 166,20 €
P	Návrh projektu organizácie výstavby			24	90		3 582,90 €
R	Orientačný rozpočet			70	340		12 791,40 €
S	Bulletin			24	48		2 314,08 €
	Navrhovaná cena bez DPH - SPOLU časti A+S						3 424 082,48 €

DPH 20 %	684 816,50 €
Navrhovaná cena	4 108 898,98 €

Cena za reprografické práce a služby za 1 ks DSP (komplet)	300
------------------------------------------------------------	-----

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa bunky označené žltou farbou
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 2

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum - predpokladaný rozsah prác

Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever
Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j. podľa ponuky	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	
A1	TERENNE PRACE					
	385 977,00					
		jadrové inžinierskogeologické vrtý vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, späťnej úpravy vrtu	m	2 550,00	47,00	119 850,00
		jadrové IG vrtý s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, späťnej úpravy vrtu	m	1,00	115,00	115,00
		jadrové IG vrtý, vrátane prípravných prác - vodná plocha	m	240,00	155,00	37 200,00
		presiomietrické jadrové IG vrtý, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, späťnej úpravy vrtu	m	900,00	55,00	49 500,00
		presiomietrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	75,00	120,00	9 000,00
		piezometrické vrtý so zabudovaním, vrátane príprav, prác, zriadenia staveniska, dopravy	m	780,00	53,00	41 340,00
		piezometrické vrtý so zabudovaním - 3 úrovnňové, vrátane príprav, prác, zriadenia staveniska, dopravy	m	1,00	90,00	90,00
		prieupustnosť horninového prostredia - nalievací skúška	ks	22,00	281,00	6 182,00
		hydrogeologický vt pre hydrodynamickú skúšku - vrátane príprav - prác, zriadenia staveniska, dopravy	m	225,00	135,00	30 375,00
		hydrodynamická skúška (šerpacia a stúpacia)	ks	15,00	425,00	6 375,00
		dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, späťnej úpravy vrtu	m	1 500,00	30,00	45 000,00
		dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, späťnej úpravy vrtu - vodná plocha	m	240,00	65,00	15 600,00
		statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, späťnej úpravy vrtu	m	300,00	55,00	16 500,00
		kopané sondy - šachtice, vrátane späťnej úpravy	m	30,00	120,00	3 600,00
		dočasná prístupová cesta	m	750,00	7,00	5 250,00
	A2	GEOFYZIKALNE PRACE				
		40 855,00				
			georadarové meranie - priemerný náklad s vyhodnotením - vodná plocha	m	400,00	3,00
		georadarové meranie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	3 100,00	1,20	3 720,00
		geoelektrické odporové merania - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením - vodná plocha	m	1 500,00	3,60	5 400,00
		geoelektrické odporové merania - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	6 050,00	1,70	10 285,00
		Dipólové elektromagnetické profilovanie (DEMP)	m	45 000,00	0,45	20 250,00
		LABORATORNE PRACE - mechanika zemín a skalných hornín				48 026,00
		porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	450,00	50,50	22 725,00
		neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	150,00	65,50	9 825,00
B1	LABORATORNE PRACE - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť					
		zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	30,00	50,50	1 515,00
		zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	23,00	132,00	3 036,00
		zeminy - triaxiálna šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	1,00	242,00	242,00
		zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	38,00	110,00	4 180,00
		zeminy - sťahiteľnosť s rekonsolidáciou	ks	15,00	50,00	750,00

B2	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie; cv	ks	15,00	11,00	165,00		
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks	15,00	33,00	495,00		
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR, zemín, bez sýtienia	ks	30,00	59,00	1 590,00		
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	23,00	14,50	333,50		
	zeminy - zhutiteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	30,00	55,00	1 650,00		
	zeminy - bobtnavosť	ks	1,00	19,00	19,00		
	zeminy - priepustnosť	ks	15,00	82,50	1 237,50		
	zeminy - presadavosť	ks	1,00	19,00	19,00		
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vŕkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť 48hod)	ks	1,00	57,00	57,00		
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku - mín. 3 teleska	ks	1,00	33,00	33,00		
	skalné horniny - pretvárne vlastnosti - 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	1,00	124,00	124,00		
	skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=10 ks, resp. úlomkov horniny)	ks	1,00	30,00	30,00		
	LABORATORNE PRACE – chémia vôd a zemín						
		základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	50,00	57,10	2 855,00	
		rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	30,00	25,00	750,00	
	C	MERACSKÉ PRACE					
		vytýčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	525,00	5,00	2 625,00	
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	525,00	5,00	2 625,00		
	polohové a výškové zameranie stabilizovaných profilov s vyhodnotením	m	400,00	1,50	600,00		
D	PRACE GEOLOGICKEJ SLUŽBY						
	projekt geologických prác	ks	3,00	800,00	2 400,00		
	archivácia vrtného jadra (vzorkovnice s krytom + doprava do skladu NDS)	m	1,00	500,00	500,00		
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	510,00	6,50	3 315,00		
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	180,00	6,50	1 170,00		
	vzorkovanie - technologické vzorky	ks	30,00	6,50	195,00		
	vzorkovanie - voda	ks	30,00	6,50	195,00		
	kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	2 250,00	10,00	22 500,00		
	denný úhm zrážok - údaje z najbližšej stanice SHMU	ks	730,00	16,00	11 680,00		
	prispôbenie čínu pre vrtné práce + prevádzka počas víťania vítane personálu lode +	ks	1,00	12000,00	12 000,00		
	náhrada majetkovej újmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	1 500,00	9,50	14 250,00		
	návrh podrobnej špecifikácie IG prác pre ďalšiu etapu IG a HG prieskumu	ks	1,00	600,00	600,00		
	záverečné spracovanie; záverečná správa; hydraulický model; grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných - t.j. archívnych i realizovaných diel a profilov, účelová IG mapa, pozdĺžne a priečne IG rezy, vysvetlivky, stabilné výpočty násypov, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením; geotechnické zhodnotenie trasy, zariadenia, mostných objektov, ako aj tesniacich vaní) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných; fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilné výpočty násypov, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyzikálnych, technická správa), hydrogeologický posudok + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopírovaniu), počet výtlačkov záverečnej správy je uvedený v časti B.1 príloha 1a	súprava	1,00		93 900,00		
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)							
				93900,00	547 018,00		

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 3

Geodetický elaborát - účelová mapa a Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie

Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €
F. Geodetický elaborát				
F.8.1 Účelová mapa a profily	ha	10	200,00	2000,00
F.8.2 Vytýčovací sieť	bod	113	650,00	73450,00
F.8.3 Vytýčenie priestorovej polohy	200 m	113	28,00	3164,00
F. Dokumentácia meračských prác - cena celkom				78614,00
G. Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie				
G.1 Geometrické plány	100 m	500	40,00	20000,00
G.2 Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv	100 m	300	20,00	6000,00
G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	100 m	300	40,00	12000,00
G.4 Výkupné elaboráty	vlastník	1600	3,00	4800,00
G.5 Prehľad záberov pozemkov	100 m	1200	10,00	12000,00
G.6 Podklady pre geometrické plány	100 m	1200	15,00	18000,00
G. Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie - cena celkom				72800,00

UPOZORNENIE:

Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 4

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006

Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

	Názov časti dokumentácie	Potrebný počet hodín			Cena celkom v €
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	
1	Správa	45,34	36,00	22,05	3 856,56 €
2	Prílohy	24	72	8	2 928,84 €
3	Netechnické zhrnutie	6	64	16	901,84 €
	Navrhovaná cena bez DPH	16		8	7 687,24 €
	DPH 20 %				1 537,45 €
	Navrhovaná cena				9 224,69 €
Cena za reprografické práce a služby za 1 ks 8a					50

Poznámky:

- Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Dotatok stavebného zámeru

Stavba: Dialnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
		45,34	36,00	30,21	22,05		
Dotatok stavebného zámeru		Potrebný počet hodín					
A	Správa	-	-	-	-	-	
B	Ekonomická správa		120				4 320,00 €
C	Výkresy		80				2 880,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH			200			6 042,00 €
	DPH 20 %						13 242,00 €
	Navrhovaná cena						2 648,40 €
							15 890,40 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Dokumentácia na stavebné povolenie

Stavba : Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

		Názov časti dokumentácie					Cena celkom	
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	v €
A.1	Sprievodná správa	100						13 662,40 €
A.2	Netechnické zhrnutie		220	40				1 324,20 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000		20	20				1 324,20 €
B.2	Celková situácia M 1:10 000		40	60				3 252,60 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:10 000 / 1000		20	20	16			1 677,00 €
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000		30	60	16			3 245,40 €
B.5	Ortofotomapa M 1:2 000		20	90	16			3 791,70 €
B.6	Vizualizácie	40	70	32				5 300,32 €
C.1	Koordinátne výkresy M 1:1 000, M 1:2 000	16	160	60				8 298,04 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby		40	260	300			15 909,60 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov							410 168,82 €
	Priprava územia							1 101,24 €
010	Úprava plôch pre zariadenia staveniska		8	24	4			1 101,24 €
	Rekultivácie							4 016,52 €
020	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Ivanka pri Dunaji			6	4			269,45 €
021	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Vajnory		8	16	4			859,56 €
022	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Svätý Jur			8	4			329,88 €
023	Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Svätý Jur		18	24	8			1 549,44 €
024	Rekultivácia opusteného úseku c.III/5021 v km 1.300 D4		8	18	8			1 008,18 €
	Vegetačné úpravy							5 682,12 €
031	Vegetačné úpravy diaľnice D4		16	32	12			1 807,32 €
032-01	Vegetačné úpravy pri ekodukte v km 1.950 D4		6	16	8			875,76 €
032-02	Vegetačné úpravy pri ekodukte nad MK v km 1.950 D4			16	8			659,76 €
033	Vegetačné úpravy na ceste III/5021 v km 1.340 D4 v križovatke "Čierna voda"		6	16	8			875,76 €
034	Vegetačné úpravy na ceste II/502 v k.ú. Vajnory		2	16	8			731,76 €
035	Vegetačné úpravy na ceste II/502 v k.ú. Svätý Jur			16	8			731,76 €
	Cestné objekty							94 659,72 €
101	Diaľnica D4, úsek km 0,000 - 4,400		160	600	450			33 808,50 €
102	Križovatka "Čierna voda"		40	240	100			10 895,40 €
103	Križovatka "Rača"		40	200	250			12 994,50 €
111	Prieložka cesty III/5021 v km 1,363 D4 v križovatke "Čierna voda"		20	160	80			7 317,60 €
112-01	Miestna komunikácia v km 1,600 - 2,300 D4			80	60			3 739,80 €
112-02	Miestna komunikácia v km 2,300 - 2,400 D4			40	10			1 428,90 €
112-03	Miestna komunikácia v km 2,400 - 2,600 D4			60	40			2 694,60 €
113	Prieložka miestnej komunikácie v km 3,810 D4 do NPR Šúr			40	10			1 428,90 €
114	Prieložka poľnej cesty v km 0,590 D4			40	10			1 428,90 €
115-01	Prieložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Svätý Jur			80	80			4 180,80 €
115-02	Prieložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Vajnory			80	60			3 739,80 €
116-01	Prieložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Svätý Jur			60	60			3 135,60 €
116-02	Prieložka poľnej cesty v km 4,400 D4 v k.ú. Vajnory			70	30			2 776,20 €

151	Obchádzka na ceste III/5021 v križovatke "Čierna				50	30	2 172,00 €
152	Obchádzka na ceste II/502 v križovatke "Rača"			42			1 268,82 €
153	Úprava cesty II. a III. triedy (po ukončení výstavby)			40		20	1 649,40 €
	Mosť						162 268,54 €
201	Mosť na D4 v km 0,580 nad Vajnorským potokom	170		600		100	26 451,00 €
202	Mosť na c.III/5021 v km 1,363 nad diaľnicou D4	50		350		46	13 387,80 €
203	Mosť na c.III/5021 v km 1,573 nad diaľnicou D4 v križovatke "Čierna voda"	50		350		46	13 387,80 €
204-01	Ekodukt v km 1,948 D4	140		380		85	18 394,05 €
204-02	Ekodukt nad MK v km 1,948 D4	100		204		42	10 688,94 €
205	Mosť na D4 v km 2,560 nad Račianskym potokom	100		204		42	10 688,94 €
206	Mosť na D4 v km 3,810 nad miestnou komunikáciou do NPR Šúr	60		153		26	7 355,43 €
207	Mosť na D4 v km 4,160 nad traťou ŽSR Bratislava - Žilina v žkm 10,760	140		510		85	22 321,35 €
208	Mosť na vetve "BS" v križovatke "Rača" nad preložkou cesty II/502	70		350		46	14 107,80 €
209	Mosť na vetve "SB" v križovatke "Rača" nad preložkou cesty II/502	70		350		46	14 107,80 €
210	Mosť na MK v km 2,300 D4 nad Vajnorským potokom	20		90		26	4 012,20 €
211	Mosť na MK v km 2,300 D4 nad Račianskym potokom	60		153		26	7 355,43 €
	Protihlukové opatrenia						38 500,50 €
261	Protihluková stena km 0,450 - 1,355 D4 vpravo	40		80		16	4 209,60 €
262	Protihluková stena km 0,400 - 1,650 D4 vľavo	60		90		24	5 408,10 €
263	Protihluková stena km 2,000 - 3,950 D4 vpravo	60		90		24	5 408,10 €
264	Protihluková stena km 2,000 - 2,950 D4 vľavo	40		80		16	4 511,70 €
265	Protihluková stena na vetve "VA-ST" vpravo v križovatke "Čierna voda"	20		60		8	2 709,00 €
266	Protihluková stena na vetve "ST-VA" vpravo v križovatke "Čierna voda"	20		60		8	2 709,00 €
267	Protihluková stena na vetve "VA-CV1" vľavo v križovatke "Čierna voda"	20		60		8	2 709,00 €
268	Protihluková stena na vetve "VA-CV1" vpravo v križovatke "Čierna voda"	20		60		8	2 709,00 €
269	Protihluková stena na vetve "CV-VA" vľavo v križovatke "Čierna voda"	20		60		8	2 709,00 €
270	Protihluková stena na vetve "VA-CV2" vpravo v križovatke "Čierna voda"	20		60		8	2 709,00 €
281	Fasádna úprava vo Vajnorch v km 1,200 - 1,600 D4 vľavo	20		60		8	2 709,00 €
	Oplotenia						4 894,02 €
301	Oplotenie diaľnice D4			58			1 752,18 €
302	Oplotenie vinohradov v križovatke "Rača"			40			1 208,40 €
303-01	Oplotenie cesty II/502 v križovatke "Rača" v k.ú. Svätý Jur			32			966,72 €
303-02	Oplotenie cesty II/502 v križovatke "Rača" v k.ú. Vajnory			32			966,72 €
	Úprava vodných tokov						2 908,56 €
320	Úprava Račieho potoka v križovatke "Rača"	12		28		8	1 454,28 €
321	Úprava bežmenného potoka v križovatke "Rača"	12		28		8	1 454,28 €
	Kanalizácie, vodovody, závlahy a meliorácie						15 733,20 €
501	Odvodnenie diaľnice D4	24		48		8	2 490,48 €
502	Preložka tlakovej kanalizácie DN250	16		32		16	1 895,52 €
510	Úprava vodovodu DN 400 v km 1,291 D4	8		40		8	1 672,80 €
511	Preložka vodovodného potrubia DN 500	12		50		4	2 030,70 €
520	Preložka závlahového potrubia DN 600 v km 1,225 - 2,540	12		50		4	2 030,70 €
521	Úprava závlahových potrubí DN 250 v km 0,000 - 2,350 D4	12		50		16	2 295,30 €
522	Úprava meliorácií v k.ú. Vajnory	12		48		8	2 058,48 €
523	Úprava meliorácií v k.ú. Svätý Jur	2		32		10	1 259,22 €
	Objekty elektrických vedení VN, VN, NN a VO						46 122,36 €
601	Preložka vzdušného vedenia VVN 110 kV I.č. 8708, 8710 v km 4,020 D4	32		72		24	3 856,32 €
611	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I.č. 210, 1106 v km 1,200 D4	8		24		4	1 101,24 €
612	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I.č. 210, 263 v km 3,450 D4	16		48		4	2 114,28 €
613	Preložka vzdušného vedenia NN v km 3,830 D4	4		12		8	682,92 €
614	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I.č. 139 v km 4,046 D4	8		32		4	1 342,92 €
615	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I.č. 1015 v km 4,060 D4	8		24		4	1 101,24 €

	Korózný prieskum - aktualizácia z DJR			24	56	16	2 908,56 €
	Pyrotechnický prieskum		8	16			771,36 €
	Geodetický elaborát		-	-	-	-	18 482,00 €
G	Dokumentácia pre MP vysporiadanie		-	-	-	-	30 700,00 €
H	Dokumentácia pre odňatie PP a vyňatie LP		140	300	90		16 087,50 €
I	Dokumentácia pre ŽSR		6	130			4 143,30 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		40	20	80		604,20 €
L.1	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP			160			8 037,60 €
L.2	Projekt geotechnického monitoringu		40	40			1 208,40 €
N	Vplyv stavby na životné prostredie		40	160	80		8 037,60 €
O	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete		8	120			3 913,20 €
P	Návrh projektu organizácie výstavby		12	40			1 640,40 €
R	Orientačný rozpočet		40	160			6 273,60 €
	Navrhovaná cena bez DPH - SPOLU časti A+R		-	-	-		771 794,60 €
	DPH 20 %						154 358,92 €
	Navrhovaná cena						926 153,52 €

Cena za reprografické práce a služby za 1 ks DSP (kompiet)	150
------------------------------------------------------------	-----

Poznámky:

- Uchádzač vypíňa bunky označené žltou farbou
 - Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla
- Uchádzač v položke Dopravno-inžinierske podklady uvedie iba cenu za reprografické práce**

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 7

Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum - predpokladaný rozsah prác

Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j. podľa ponuky	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	
A1	TERENNE PRACE					
					99 125,00	
		jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	559,00	47,00	26 273,00
		jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	75,00	115,00	8 625,00
		presiomietrické jadrové IG vrty, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	208,00	55,00	11 440,00
		presiomietrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	39,00	120,00	4 680,00
		piezometrické vrty so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, dopravy	m	150,00	53,00	7 950,00
		piezometrické vrty s dvojitou jadrovnicou so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, dopravy	m	45,00	120,00	5 400,00
		piezometrické vrty so zabudovaním - 3 úrovnové, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, dopravy	m	1,00	90,00	90,00
		priepustnosť horninového prostredia - nalievací skúška	ks	2,00	281,00	562,00
		hydrogeologický vrt pre hydrodynamickú skúšku - vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, dopravy	m	65,00	135,00	8 775,00
		hydrodynamická skúška (čerpacia a stúpacia)	ks	7,00	425,00	2 975,00
		dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	156,00	30,00	4 680,00
		statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu	m	195,00	55,00	10 725,00
		kopané sondy - šachtice, vrátane spätnej úpravy	m	20,00	120,00	2 400,00
		dočasná prístupová cesta	m	650,00	7,00	4 550,00
		GEOFYZIKÁLNE PRACE				8 716,60
A2	georadarové meranie - priemerný náklad s vyhodnotením - vodná plocha	m	1	3,00	3,00	
	georadarové meranie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	900	1,20	1 080,00	

B1	geoelektrické odporové merania - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením - vodná plocha	m	1	3,60	3,60	3,60
	geoelektrické odporové merania - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	2900	1,70	1,70	4 930,00
B2	Dipólové elektromagnetické profilovanie (DEMP)	m	6000	0,45	0,45	2 700,00
	LABORATORNE PRACE – mechanika zemín a skalných hornín					18 246,50
	porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	130,00	50,50	50,50	6 565,00
	neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	78,00	65,50	65,50	5 109,00
	technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	13,00	50,50	50,50	656,50
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	6,00	132,00	132,00	792,00
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	1,00	242,00	242,00	242,00
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	6,00	110,00	110,00	660,00
	zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou	ks	7,00	50,00	50,00	350,00
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv	ks	7,00	11,00	11,00	77,00
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (2 valčeky)	ks	8,00	33,00	33,00	264,00
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sýtenia	ks	13,00	53,00	53,00	689,00
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	7,00	14,50	14,50	101,50
	zeminy - zhutiteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	13,00	55,00	55,00	715,00
	zeminy - bobtnavosť	ks	1,00	19,00	19,00	19,00
	zeminy - priepustnosť	ks	7,00	82,50	82,50	577,50
	zeminy - presadavosť	ks	2,00	19,00	19,00	38,00
skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť 48hod)	ks	8,00	57,00	57,00	456,00	
skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku - mín. 3 telieska	ks	5,00	33,00	33,00	165,00	
skalné horniny - pretvárné vlastnosti - 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	5,00	124,00	124,00	620,00	
skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=10 ks, resp. úlomkov horniny)	ks	5,00	30,00	30,00	150,00	
LABORATORNE PRACE – chémia vôd a zemín					1 345,70	
základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	17,00	57,10	57,10	970,70	
rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	15,00	25,00	25,00	375,00	
MERACSKÉ PRACE					4 225,00	
C	vytýčenie vrtovej, penetračných sond, šachtíc, bodov GF	ks	130,00	5,00	5,00	650,00
	polohové a výškové zameranie vrtovej, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	130,00	5,00	5,00	650,00
	polohové a výškové zameranie stabilitných profilov s vyhodnotením	m	1950,00	1,50	1,50	2 925,00
PRACE GEOLOGICKEJ SLUŽBY					48 104,50	
D	projekt geologických prác	ks	2,00	400,00	400,00	800,00

archivácia vrtného jadra (vzorkovnice s krytom + doprava do skladu NDS)	m	1,00	500,00	500,00	500,00
vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	156,00	6,50	6,50	1 014,00
vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	78,00	6,50	6,50	507,00
vzorkovanie - technologické vzorky	ks	13,00	6,50	6,50	84,50
vzorkovanie - voda	ks	26,00	6,50	6,50	169,00
kontrolné meranie hladiny podzemnej vody	ks	1300,00	10,00	10,00	13 000,00
denný úhrn zrážok - údaje z najbližšej stanice SHMÚ	ks	365,00	16,00	16,00	5 840,00
návrh podrobnej špecifikácie IG prác pre ďalšiu etapu IG a HG prieskumu	ks	1,00	350,00	350,00	350,00
náhrada majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	400,00	9,50	9,50	3 800,00
záverečné spracovanie: záverečná správa; grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných - t.j. archivných i realizovaných diel a profilov, účelová IG mapa, pozdĺžne a priečne IG rezy, vysvetlivky, stabilítne výpočty násypov, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením, geotechnické zhodnotenie trasy, zakladania, mostných objektov,) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrto, šachtíc - archivných i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilítne výpočty násypov, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyzikálnych, technická správa), hydrogeologický posudok + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopirovaniu), počet výtlačkov záverečnej správy je uvedený v časti B.1 príloha 1a	súprava	1,00	22040,00	22040,00	22 040,00
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)					179 763,30

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 8

Geodetický elaborát - účelová mapa a Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie

Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €
F. Dokumentácia meračských prác				
F.8.1 Geodetický elaborát - účelová mapa	ha	5	200,00	1000,00
F.8.2 Vytýčovací sieť	bod	25	650,00	16250,00
F.8.3 Vytýčenie priestorovej polohy	200 m	44	28,00	1232,00
F. Dokumentácia meračských prác - cena celkom				18482,00
G. Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie				
G.1 Geometrické plány	100 m	200	40,00	8000,00
G.2 Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv	100 m	150	20,00	3000,00
G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	100 m	150	40,00	6000,00
G.4 Výkupné elaboráty	vlastník	400	3,00	1200,00
G.5 Situácia dotknutých pozemkov	100 m	500	10,00	5000,00
G.6 Zoznam dotknutých parciel	100 m	500	15,00	7500,00
G. Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie - cena celkom				30700,00

UPOZORNENIE:

Uvedené počty memých jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 9

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006

Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
		45,34	36,00	30,21	22,05		
1	Správa	18	48	Potrebný počet hodín			2 720,52 €
2	Prílohy	8	32				1 691,12 €
3	Netechnické zhrnutie	16					901,84 €
	Navrhovaná cena bez DPH						5 313,48 €
	DPH 20 %						1 062,70 €
	Navrhovaná cena						6 376,18 €
Cena za reprografické práce a služby za 1 ks 8a							50

Poznámky:

- Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Dodatok stavebného zámeru

Stavba: Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
	45,34	36,00	30,21	22,05	
Dodatok stavebného zámeru					
A Správa	-	-	-	-	
B Ekonomická správa		100			3 600,00 €
C Výkresy		40			1 440,00 €
Navrhovaná cena bez DPH			150		4 531,50 €
DPH 20 %					9 571,50 €
Navrhovaná cena					1 914,30 €
					11 485,80 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplní žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2. desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 11

Dokumentácia na stavebné povolenie

Stavba : Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

		Název časti dokumentácie		Potrebný počet hodín		Cena celkom				
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	45,34	36,00	30,21	22,05	v €
A.1	Sprievodná správa	20		70	40					4 635,20 €
A.2	Netechnické zhrnutie			5	20					784,20 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:10 000			5	20					784,20 €
B.2	Celková situácia M 1:5 000			10	60					2 172,60 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1: 500 / 50				20	16				967,00 €
B.4	Ortofotozmapa M 1:5 000			2	20	16				1 029,00 €
B.5	Ortofotozmapa M 1:2 000			2	20	16				1 029,00 €
B.6	Vizualizácie	40		70	32					5 300,32 €
C.1	Koordináčne výkresy M 1:500			20	50					2 230,50 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby			20	90	100				5 643,90 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov									44 811,06 €
011	Úprava plôch pre zariadenie staveniska pri ceste II/06359			2	24	4				885,24 €
021	Spätná rekultivácia dočasných záberov v k.ú. Podunajské Biskupice			2	20	4				764,40 €
051	Vegetačné úpravy c.II/572, úsek km 0,000 - 2,202			15	32	16				1 895,52 €
101	Cesta II/572, úsek km 0,000 - 2,202			20	420	170				17 156,70 €
121	Križovatka "Vrakuňa"			20	160	80				7 317,60 €
151	Obchádzka na ceste II/572 v križovatke "Vrakuňa"				90	50				3 821,40 €
152	Obchádzka na ceste II/06359 v križovatke "Odeská"				70	30				2 776,20 €
321	Preložka závlahového vodovodu DN300 (vetva D10) v km 0,984 c.II/572			8	32	24				1 783,92 €
522	Preložka závlahového vodovodu DN200 (vetva D9) v km 1,540 c.II/572			8	48	8				1 914,48 €
523	Preložka závlahového vodovodu DN350 (vetva E) v križovatke "Podunajské Biskupice"			16	48	12				2 290,68 €
611	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV j. č. 436 v km 1,917 c.II/572			4	12	8				682,92 €
621	Pripojka NN pre VO križovatky „Odeská“			4	24	4				957,24 €
631	Verejné osvetlenie v križovatke „Odeská“			4	24	4				1 133,64 €
751	Preložka MK kábla SLOVAK TELEKOM v križovatke „Vrakuňa“			2	8	2				357,78 €
752	Preložka DK a OK káblov SLOVAK TELEKOM v km 0,960 c.II/572			2	8	2				357,78 €
753	Ochrana kábla Rovinka SLOVAK TELEKOM v km 1,480 c.II/572			2	8	2				357,78 €
754	Preložka označovacieho vedenia ZSE v km 0,960 c.II/572			2	8	2				357,78 €
E	Doklady									604,20 €
F	Dokumentácia prieskumov				20					48 027,74 €
	Podrobný inžiniersko-geologický prieskum									26 846,70 €
	Dopravno-inžinierske podklady - prevziať príslušajúcu časť z DIP stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever									300,00 €
	Pedologický prieskum - aktualizácia z DJR			6	8					457,68 €
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov - aktualizácia z DJR			8	12	8				826,92 €
	Archeologický prieskum - aktualizácia z DJR				70	30				2 776,20 €
	Hluková štúdia - aktualizácia z DJR				10					302,10 €
	Imisná štúdia - aktualizácia z DJR				50					1 510,50 €
	Koróznny prieskum - aktualizácia z DJR				26					785,46 €
	Pyrotechnický prieskum				8					241,68 €

Geodetický elaborát									
G	Dokumentácia pre MP vysporiadanie	-	-	-	-	-	-	-	12 470,00 €
H	Dokumentácia pre odňatie PP	-	-	-	-	-	-	-	11 490,00 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	40	100	50					5 563,50 €
L.1	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP		20						604,20 €
L.2	Projekt geotechnického monitoringu		48	30					2 111,58 €
N	Vplyv stavby na životné prostredie		32						966,72 €
O	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	8	40	16					1 561,20 €
P	Návrh projektu organizácie výstavby	4	120						3 913,20 €
R	Orientačný rozpočet	4	40						1 352,40 €
	Navrhovaná cena bez DPH - SPOLU časti A+R		4	80					2 560,80 €
	DPH 20 %								148 132,52 €
	Navrhovaná cena								29 626,50 €
	Cena za reprografické práce a služby za 1 ks DSP (kompiét)								177 759,02 €
									150

Poznámky:

- Uchádzač vyplní burky označené žltou farbou

- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Uchádzač v položke Dopravno-inžinierske podklady uvedie iba cenu za reprografické práce prislúchajúcej časti DIP

Špecifikácia ceny predpokladaných geologických prác

Podrobný inžinierskogeologický prieskum

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	
	TERENNE PRACE				10 635,00 €	
A1	jadrové inžinierskogeologické vrtý vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	90	47,00	4 230,00 €	
	piesiometrické jadrové IG vrtý, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, prestojov, dopravy a spätnej úpravy vrtu	m	1	55,00	55,00 €	
	piesiometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením	ks	1	120,00	120,00 €	
	hydrogeologické jadrové IG vrtý na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, dopravy	m	20	68,00	1 360,00 €	
	piezometrické jadrové IG vrtý na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, dopravy	m	10	53,00	530,00 €	
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy terénu	m	28	30,00	840,00 €	
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy terénu	m	10	55,00	550,00 €	
	kopané sondy - šachtice, pažené, hĺbka do 6m, vrátane spätnej úpravy terénu, dopravy	m	10	120,00	1 200,00 €	
	dočasné prístupové cesty (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu)	m	250	7,00	1 750,00 €	
	GEOFYZIKÁLNE PRACE					851,20 €
	A2	geoelektrické odporové meranie - mulielektródový systém - priemerný náklad s vyhodnotením	m	400	1,70	680,00 €
		vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením	m	1	4,20	4,20 €
		karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením (inklínometria, rezistivimetria, termometria, gamakarotáž)	m	10	16,70	167,00 €
LABORATORNE PRACE – mechanika zemín a skalných hornín					6 139,00 €	
	zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	60	50,50	3 030,00 €	
	zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	18	65,50	1 179,00 €	
	zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť	ks	3	50,50	151,50 €	
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks	5	14,50	72,50 €	
	zeminy - stanovenie obsahu uhlíkatov	ks	2	6,50	13,00 €	
	zeminy - sťačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidácie + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovaci stupeň)	ks	3	50,00	150,00 €	
	zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zaťažovací stupeň)	ks	3	11,00	33,00 €	

B1	zeminy - stanovenie napúšťacieho tlaku v oedometrii	ks	3	45,00	135,00 €
	zeminy - presadavosť / napúšťavosť po skúške sťačiteľnosti	ks	1	19,00	19,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napúšťavosť)	ks	2	15,00	30,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	1	132,00	132,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	1	242,00	242,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	2	110,00	220,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	2	49,50	99,00 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	2	82,50	165,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sytienia	ks	1	53,00	53,00 €
	zeminy - zhrnuteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	1	55,00	55,00 €
	zeminy - zhrnuteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	1	55,00	55,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	1	57,00	57,00 €
	skalné horniny - mrazuvzdornosť	ks	1	61,00	61,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	1	33,00	33,00 €
B2	skalné horniny - pretváranie vlastností 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	1	124,00	124,00 €
	skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	1	30,00	30,00 €
	LABORATORNE PRACE – chémia vôd a zemín				886,00 €
	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks	10	57,10	571,00 €
	základný fyzikálno-chemický rozbor pre pitné vody v zmysle vyhlášky č. 354/2006	ks	2	95,00	190,00 €
	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks	5	25,00	125,00 €
	MERACSKÉ PRACE				425,00 €
	vytyčenie vrto, penetračných sond, šachtíc, bodov Gf	ks	40	5,00	200,00 €
	polohové a výškové zameranie vrto, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks	45	5,00	225,00 €
	PRACE GEOLOGICKEJ SLUŽBY				7 910,50 €
C	projekt geologickej úlohy	ks	2	200,00	400,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín	ks	65	6,50	422,50 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks	18	6,50	117,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín	ks	4	6,50	26,00 €
	vzorkovanie - voda	ks	10	6,50	65,00 €
	náhrada majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	400	9,50	3 800,00 €
	kontrolné merania hladiny podzemnej vody na novozrealizovaných hydrogeologických vrtoch (minimálne 4x)	ks	2	40,00	80,00 €
	meranie hladín podzemnej vody á 1 vrt)				
	kontrolné merania hladiny podzemnej vody na novozrealizovaných piezometrických vrtoch + kontinuálny snímač hladiny podzemnej vody vrátane kalibračných listov (minimálne 4x odčítanie nameraných hladín podzemnej vody z kontinuálnych snímačov na novom vrte)	ks	1	600,00	600,00 €
	D				

<p>archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilítne výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a základania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrto, šachtic - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratórných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilítne výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel , geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopirovaniu) + repro-grafické práce - počet výťažkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2 a dodanie záverečnej správy aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dxf a pod.) nezabezpečenej proti kopirovaniu a tlačeniu</p>	súbor	1	2400,00	2 400,00 €
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				26 846,70 €
DPH 20%				5 369,34 €
Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				32 216,04 €

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 13

Geodetický elaborát - účelová mapa a Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie

Stavba: Preložka cesty III/572 v predĺžení Galvaniho ulice

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.i.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €
F. Geodetický elaborát				
F.11.1 Účelová mapa a profily	ha	5	200,00	1000,00
F.11.2 Vytyčovací sieť	bod	17	650,00	11050,00
F.11.3 Vytýčenie priestorovej polohy	200 m	15	28,00	420,00
F. Dokumentácia meračských prác - cena celkom				12470,00
G. Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie				
G.1 Geometrické plány	100 m	30	40,00	1200,00
G.2 Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv	100 m	30	20,00	600,00
G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	100 m	50	40,00	2000,00
G.4 Výkupné elaboráty	vlastník	480	3,00	1440,00
G.5 Prehľad záberov pozemkov	100 m	250	10,00	2500,00
G.6 Podklady pre geometrické plány	100 m	250	15,00	3750,00
G. Dokumentácia pre majetkové vyrovnanie - cena celkom				11490,00

UPOZORNENIE:

Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávateľom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 14

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006

Stavba: Preložka cesty III/572 v predĺžení Galvaniho ulice

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
		45,34	36,00	30,21	22,05		
1	Správa	16	32		8		2 053,84 €
2	Prílohy	8	32		8		1 691,12 €
3	Netechnické zhrnutie	16			8		901,84 €
Navrhovaná cena bez DPH							4 646,80 €
DPH 20 %							929,36 €
Navrhovaná cena							5 576,16 €

Cena za reprografické práce a služby za 1 ks 8a	50
-------------------------------------------------	----

Poznámky:

- Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Dodatok stavebného zámeru

Stavba: Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaního ulice

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
		45,34	36,00	30,21	22,05	
Dodatok stavebného zámeru						
A	Správa	-	-	-	-	
B	Ekonomická správa		30			1 080,00 €
C	Výkresy		20			720,00 €
	Navrhovaná cena bez DPH			60		1 812,60 €
	DPH 20 %					3 612,60 €
	Navrhovaná cena					722,52 €
						4 335,12 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

612	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 414 v km 2,543 c.II/572									
622	Pripojka NN pre VO križovatky „Podunajské Biskupice“	8	24	4					1 101,24 €	
632	Verijné osvetlenie v križovatke „Podunajské Biskupice“	8	24	12					1 277,64 €	
701	Preložka VTL plynovodu DN 150, PN 40 v km 1,174 c.II/572	32	44	16					2 834,04 €	
702	Ochrana produktovodov DN300 a DN250 SLOVNAFT v križovatke „Most pri Bratislave“	52	96	22					5 257,26 €	
755	Ochrana OK káblou TRANSPETROL v km 1,400 c.II/752	24	64	6					2 929,74 €	
756	Ochrana kábla LPS v km 1,790 c.II/752	2	8	2					357,78 €	
757	Preložka MK kábla SLOVAK TELEKOM v križovatke „Most pri Bratislave“	2	8	2					357,78 €	
758	Ochrana kábla DK Slovnaf v križovatke „Most pri Bratislave“	2	8	2					357,78 €	
E	Doklady								604,20 €	
F	Dokumentácia prieskumov								96 544,53 €	
	Podrobný inžiniersko-geologický prieskum	-	-	-					71 228,20 €	
	Dopravno-inžinierske podklady - prevziať prislúchajúcu časť z DIP stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivancka sever	-	-	-					300,00 €	
	Pedologický prieskum - aktualizácia z DÚR	6	8						457,68 €	
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov - aktualizácia z DÚR	8	12	8					826,92 €	
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevin - aktualizácia z DÚR		71	30					2 806,41 €	
	Archeologický prieskum - aktualizácia z DÚR		10						302,10 €	
	Hluková štúdia - aktualizácia z DÚR		50						1 510,50 €	
	Imisná štúdia - aktualizácia z DÚR		50						1 510,50 €	
	Korózný a geoelektrický prieskum - aktualizácia z DÚR	32	72	12					3 591,72 €	
	Seizmický prieskum	8	32	2					1 298,82 €	
	Pyrotechnický prieskum		8						241,68 €	
	Geodetický elaborát		-	-					12 470,00 €	
G	Dokumentácia pre MP vysporiadanie								13 622,00 €	
H	Dokumentácia pre odňatie PP	40	100	50					5 563,50 €	
K	Plan bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		20						604,20 €	
L.1	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP		48	30					2 111,58 €	
L.2	Projekt geotechnického monitoringu		32						966,72 €	
N	Vplyv stavby na životné prostredie		40	16					1 561,20 €	
O	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	8	120						3 913,20 €	
P	Návrh projektu organizácie výstavby	4	40						1 352,40 €	
R	Orientačný rozpočet	4	80						2 560,80 €	
	Navrhovaná cena bez DPH - SPOLU časti A+R								292 879,22 €	
	DPH 20 %								58 575,84 €	
	Navrhovaná cena								351 455,06 €	
Cena za reprografické práce a služby za 1 ks DSP (komplet)										
150										

Poznámky:

- Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Uchádzač v položke Dopravno-inžinierske podklady uvedie iba cenu za reprografické práce prislúchajúcej časti DIP

Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave
Špecifikácia ceny predpokladaných geologických prác
 Podrobný inžinierskogeologický prieskum

Tabuľka č. 17

Časť	Druh prác	m.j.	počet m. j.	Cena za m.j. v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
A1	TERENNE PRACE				
	jadrové inžinierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, doprava a spätné úpravy vrtu				
		m	400	47,00	18 800,00 €
	presiomietrické jadrové IG vrty, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, prestojov, doprava a spätné úpravy vrtu				
		m	60	55,00	3 300,00 €
	presiomietrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením				
		ks	12	120,00	1 440,00 €
	hydrogeologické jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, doprava				
		m	50	68,00	3 400,00 €
	piezometrické jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zariadenia staveniska, prvotnej hmotnej dokumentácie vrtného jadra, doprava				
		m	20	53,00	1 060,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy terénu				
		m	100	30,00	3 000,00 €
	A2	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zariadenia staveniska a dopravy, spätné úpravy terénu			
		m	30	55,00	1 650,00 €
kopané sondy - šachtice, pažené, hĺbka do 6m, vrátane spätné úpravy terénu, doprava					
		m	15	130,00	1 950,00 €
dočasné prístupové cesty (vrátane všetkých potrebných úkonov a povolení na výstavbu prístupovej cesty, popr. uvedenie terénu do pôvodného stavu)					
		m	500	7,00	3 500,00 €
GEOFYZIKÁLNE PRACE					
geoelektrické odporové meranie - multielektrodový systém - priemerný náklad s vyhodnotením					
		m	1000	1,70	1 700,00 €
vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením					
	m	1	4,20	4,20 €	
karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením (inklínometria, rezistivimetria, termometria, gamakarotáž)					
	m	30	16,70	501,00 €	
LABORATORNE PRACE – mechanika zemín a skalných hornín					
10 162,00 €					
zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001					
	ks	100	50,50	5 050,00 €	
zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť					
	ks	32	65,50	2 096,00 €	
zeminy - technologické vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť					
	ks	6	50,50	303,00 €	
zeminy - stanovenie obsahu organických látok					
	ks	7	14,50	101,50 €	
zeminy - stanovenie obsahu uhlíkatov					
	ks	5	6,50	32,50 €	
zeminy - sťahiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidácie + 4 zatlačovacie + 1 odľahčovaci stupeň)					
	ks	7	50,00	350,00 €	
zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv (1 zatlačovací stupeň)					
	ks	7	11,00	77,00 €	

B1	zeminy - stanovenie napúšťacieho tlaku v oedometrii	ks	5	45,00	225,00 €
	zeminy - presadavosť / napúšťavosť po skúške sťačiteľnosti	ks	1	19,00	19,00 €
	zeminy - bobtnavosť (napúšťavosť)	ks	3	15,00	45,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	2	132,00	264,00 €
	zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť)	ks	1	242,00	242,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška UU	ks	3	110,00	330,00 €
	zeminy - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	3	49,50	148,50 €
	zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	3	82,50	247,50 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín, bez sytenia	ks	2	53,00	106,00 €
	zeminy - zhuťiteľnosť súdržných zemín Proctor standard	ks	2	55,00	110,00 €
	zeminy - zhuťiteľnosť nesúdržných zemín (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti	ks	2	55,00	110,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	1	57,00	57,00 €
	skalné horniny - mrazuvzdornosť	ks	1	61,00	61,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	1	33,00	33,00 €
	B2	skalné horniny - pretvárame vlastnosti 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	1	124,00
skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)		ks	1	30,00	30,00 €
LABORATORNE PRACE – chémia vôd a zemín					2 372,50 €
základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375		ks	25	57,10	1 427,50 €
základný fyzikálno-chemický rozbor pre pitné vody v zmysle vyhlášky č. 354/2006		ks	6	95,00	570,00 €
rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)		ks	15	25,00	375,00 €
MERACSKÉ PRACE					825,00 €
vytyčenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF		ks	80	5,00	400,00 €
polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením		ks	85	5,00	425,00 €
PRACE GEOLOGICKEJ SLUŽBY					17 563,50 €
projekt geologickej úlohy		ks	2	300,00	600,00 €
vzorkovanie - porušené vzorky + agresivita zemín		ks	115	6,50	747,50 €
vzorkovanie - neporušené vzorky		ks	32	6,50	208,00 €
vzorkovanie - technologické vzorky + vzorky mechaniky hornín		ks	7	6,50	45,50 €
vzorkovanie - voda		ks	25	6,50	162,50 €
náhrada majetkovej ujmy poľnohospodárom a vlastníkom pozemkov za škody spôsobené pri realizácii terénnych (vrtných) prác	m ²	400	9,50	3 800,00 €	
kontrolné merania hladiny podzemnej vody na novozrealizovaných hydrogeologických vrtoch (minimálne 4x meranie hladín podzemnej vody á 1 vrt)	ks	5	40	200,00 €	
kontrolné merania hladiny podzemnej vody na novozrealizovaných piezometrických vrtoch + kontinuálny snímač hladiny podzemnej vody vrátane kalibračných listov (minimálne 4x odčítanie nameraných hladín podzemnej vody z kontinuálnych snímačov na novom vrte)	ks	2	600	1 200,00 €	
D					

<p>archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová inžinierskogeologická mapa - inžinierskogeologické mapovanie, pozdĺžne a priečne IG rezy, IG profily zosuvov, vysvetlivky, stabilizné výpočty, inklinometrické merania so zhodnotením, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením,) a textové prílohy (inžinierskogeologické a hydrogeologické zhodnotenie územia, geotechnické zhodnotenie trasy a zakladania mostných objektov, horninového masívu, geologická písomná dokumentácia vrto, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásype, výsledky laboratorných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilizné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel , geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + vypracovanie hydro-geologického posudku + CD/DVD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a kopitovaniu) + repro-grafické práce - počet výtlačkov dokumentácie podľa časti B.1 Príloha č. 1 a časti B.1 Príloha č. 2 a dodanie zverejnenej správy aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwt a pod.) nezabezpečenej proti kopirovaniu a tlačeniu</p>	súbor	1	10600,00	10 600,00 €
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				71 228,20 €
DPH 20%				14 245,64 €
Cena s DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)				85 473,84 €

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 18

Geodetický elaborát - účelová mapa a Dokumentácia pre majetkoprávne vyrovnanie

Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Položka	m.j.	predpokladané množstvo m.j.	cena za m.j. bez DPH v €	cena celkom bez DPH v €
F. Geodetický elaborát				
F.12.1 Účelová mapa a profily	ha	5	200,00	1000,00
F.12.2 Vytýčovací sieť	bod	17	650,00	11050,00
F.12.3 Vytýčenie priestorovej polohy	200 m	15	28,00	420,00
F. Dokumentácia meračských prác - cena celkom				12470,00
G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie				
G.1 Geometrické plány	100 m	80	40,00	3200,00
G.2 Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv	100 m	30	20,00	600,00
G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	100 m	50	40,00	2000,00
G.4 Výkupné elaboráty	vlastník	524	3,00	1572,00
G.5 Prehľad záberov pozemkov	100 m	250	10,00	2500,00
G.6 Podklady pre geometrické plány	100 m	250	15,00	3750,00
G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie - cena celkom				13622,00

UPOZORNENIE:

Uvedené počty merných jednotiek sú len orientačné a slúžia pre potreby verejnej súťaže. Zhotoviteľ môže fakturovať len skutočne vykonané práce, ktoré boli s objednávatelom vopred dohodnuté.

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č. 19

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006

Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €	
1	Správa	16	32	36,00	30,21	22,05	2 053,84 €	
2	Prílohy	8	32			8	1 691,12 €	
3	Netechnické zhrnutie	16				8	901,84 €	
Navrhovaná cena bez DPH								4 646,80 €
DPH 20 %								929,36 €
Navrhovaná cena								5 576,16 €

Cena za reprografické práce a služby za 1 ks 8a

50

Poznámky:

- Uchádzač vyplní bunky označené žltou farbou
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác

Dodatok stavebného zámeru

Stavba: Preložka cesty II/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Názov časti dokumentácie	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
	45,34	36,00	30,21	22,05	
Dodatok stavebného zámeru					
A Správa	-	-	-	-	
B Ekonomická správa	60				2 160,00 €
C Výkresy	20		70		720,00 €
Navrhovaná cena bez DPH					2 114,70 €
DPH 20 %					4 994,70 €
Navrhovaná cena					998,94 €
					5 993,64 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplnía žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desiatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla

Špecifikácia ceny prác spolu

Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

	Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever		Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača		Preložka cesty III/572 v predĺžení Galvaniho ulice		Preložka cesty III/572, diaľnica D4 - Most pri Bratislave		CENA SPOLU za 4 stavby	
	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena celkom v €
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)	3 424 082,48 €	771 794,60 €	148 132,52 €	292 879,22 €	4 636 888,82 €	927 377,76 €	5 564 266,58 €			
Dokumentácia Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a)	7 687,24 €	5 313,48 €	4 646,80 €	4 646,80 €	22 294,32 €	4 458,86 €	26 753,18 €			
Dodatok stavebného zámeru	13 242,00 €	9 571,50 €	3 612,60 €	4 994,70 €	31 420,80 €	6 284,16 €	37 704,96 €			
Spolu	3 445 011,72 €	788 679,58 €	156 391,92 €	302 520,72 €	4 690 603,94 €	938 120,79 €	5 628 724,73 €			

	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena celkom v €
Cena za reprografické práce - naviac							
10 paré DSP - nad rámec v zmysle prílohy č.1a bodu č.4.6.	3 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	7 500,00 €	1 500,00 €	9 000,00 €	
5 paré Oznámenia 8a - nad rámec v zmysle prílohy č.1a bodu č.4.6.	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1 000,00 €	200,00 €	1 200,00 €	

Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže - kritérium)

4 699 103,94 €

Príloha č. 2

Harmonogram postupu prác

**Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Doplnku stavebného zámeru (dSZ) pre stavby:
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice, Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave**

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa: 7778-00

Harmonogram postupu prác spolu s návrhom termínov pracovných rokovaní

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

d.1 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Bude spracovaná v rozsahu a obsahu podľa súťažných podkladov a Technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, ktoré vydalo MDPT SR v januári 2007. DSP bude vypracovaná v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, podmienok protokolu o vykonaní štátnej expertízy a záverečného stanoviska EIA.

Na začiatku projektových prác preveríme možnosť zmeny nivelety diaľnice v km 21,0 v prípade schválenia navrhovanej zmeny ochranných pásiem letiska M.R. Štefánika, v mieste MÚK Ivanka sever skordinujeme dokumentáciu s nadväzujúcou časťou diaľnice D4 v úseku Ivanka sever–Rača a so stavbou „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh“.

Po odsúhlasení smerového a výškového vedenia diaľnice D4 sa rozpracujú objekty križovatiek a ďalšie objekty stavby. Na základe aktualizácie dopravno-inžinierske podkladov, ktoré budú spracované s ďalšími stavbami Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice a Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave, sa preverí technický návrh križovatiek, šírkové usporiadanie typ vozovky na diaľnici D4. Návrh riešenia prerokujeme s objednávatelom a s ostatnými dotknutými orgánmi a organizáciami. Na základe záverov z tohto prerokovania budeme pokračovať v projektových prácach.

Technické riešenie bude podrobnejšie rozpracované, v súlade s koncepciou riešenia ostatných objektov stavby a v zmysle požiadaviek v súťažných podkladoch.

Návrh konštrukcie vozovky s posúdením a koncept riešenia mostných objektov budú odsúhlasené na pracovných rokovaníach. Poloha a rozsah všetkých objektov budú navrhnuté v koordinácii s mapovými podkladmi pozemnoknižného katastra (KN, PKN). Pre zaujímavé úseky trasy diaľnice D4, osadenie veľkých mostov, križovatiek, odpočívadla a protihlukových stien sa spracujú vizualizácie.

Navrhnuté stavebné objekty budú prerokované v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane užívateľov a vlastníkov budúcich objektov, objektová skladba bude odsúhlasená objednávatelom.

V prípade nových záberov sa pre spracovanie geometrických plánov sa vyhotoví účelová mapa s majetkovou hranicou, s dočasnými zábermi, ročnými zábermi a s vecnými bremenami. Táto bude odsúhlasená s obstarávateľom dokumentácie.

V priebehu spracovania DSP bude vykonaný podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, ďalšie potrebné prieskumy, dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie, dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy a ďalšie prílohy, ktoré sú súčasťou DSP.

DSP prerokujeme na záverečnom prerokovaní, záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri. Dopravné značenie bude odsúhlasené s NDS (prevádzkový úsek) a s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ, podľa § 14, ods.1), písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pošleme DSP na posúdenie na Technickú inšpekciu, príslušnému dráhovému správne mu orgánu, dokumentáciu pre ŽSR odošleme na odsúhlasenie dotknutým zložkám ŽSR za účelom získania súhrnného stanoviska ŽSR.

V závere prác vypracujeme podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete a všetky náležitosti potrebné k udeleniu prípadných výnimiek z STN vrátane dokumentácie.

V zmysle požiadaviek v Súťažných podkladoch vypracujeme ďalšie samostatné prílohy:

- Návrh projektu organizácie výstavby
- Orientačný rozpočet
- Bulletin
- Dodatok stavebného zámeru (dodatok SZ) iba na pokyn obstarávateľa,
- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a)

O všetkých prácach budeme obstarávateľa priebežne informovať. Okrem pravidelných pracovných rokovaní sa môže obstarávateľ informovať o dosahovaných výsledkoch, o spôsobe riešenia

jednotlivých problémov, prípadne o iných aspektoch projektovania v ktoromkoľvek čase v priebehu prác.

Po dodaní dokumentácie sa zúčastníme na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaníach súvisiacich a predmetnou stavbou.

d.2 Dodatok stavebného zámeru (dodatok SZ)

Dokumentácia Dodatok stavebného zámeru bude vypracovaná iba na pokyn obstarávateľa. Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle vyhlášky MVRR SR č. 83/2008, zákona 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, Usmernenia MDPT SR OVRE k TP 03/2006 z 31.8.2009 a súťažných podkladov. Podkladom pre jej spracovanie bude DSP.

d.3 Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

V zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle súťažných podkladov sa vykoná porovnanie technického riešenia navrhnutého v EIA a technického riešenia v DSP, spracuje sa charakteristika vplyvov navrhovanej zmeny na chránené územia a obyvateľov.


Samostatnou súčasťou dokumentácie bude aj posúdenie stavby v zmysle Smernice 2000/60/ES európskeho parlamentu a rady z 23.10.2000 v platnom znení, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.

Taktiež bude samostatnou súčasťou dokumentácie aj vyhodnotenie rizík klimatických zmien (odolnosť a zraniteľnosť projektu voči klimatickým zmenám) spolu s návrhom adaptačných opatrení.

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ DSP


Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever (1. stavba)

DSP	210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy						
	30	60	90	120	150	180	210
A.1 Sprievodná správa							
A.2 Netechnické zhrnutie							
B.1 Prehľadná situácia							
B.2 Celková situácia stavby							
B.3 Pozdĺžny rez							
B.4 Ortofotomapa 1:10000							
B.5 Ortofotomapa 1:2000							
B.6 Vizualizácie							
C1. Koordinačné výkresy							
C2. Dopravné značenie							
D. Písomnosti a výkresy							
E. Doklady							
F. Dokumentácia prieskumov							
F.1 Podrobný IG a HG prieskum							
F.2 Dopravno-inžinierske údaje – akt.							
F.3 Inventarizácia biotopov – akt.							
F.4 Inventarizácia drevin – akt.							
F.5 Hluková štúdiá – akt.							
F.6 Koróznny prieskum – akt.							
F.7 Pyrotechnický prieskum							
F.8 Geodetický elaborát							
G. Dokum. pre MP vysporiadanie							
H. Dokum. pre vyňatie pôdy							

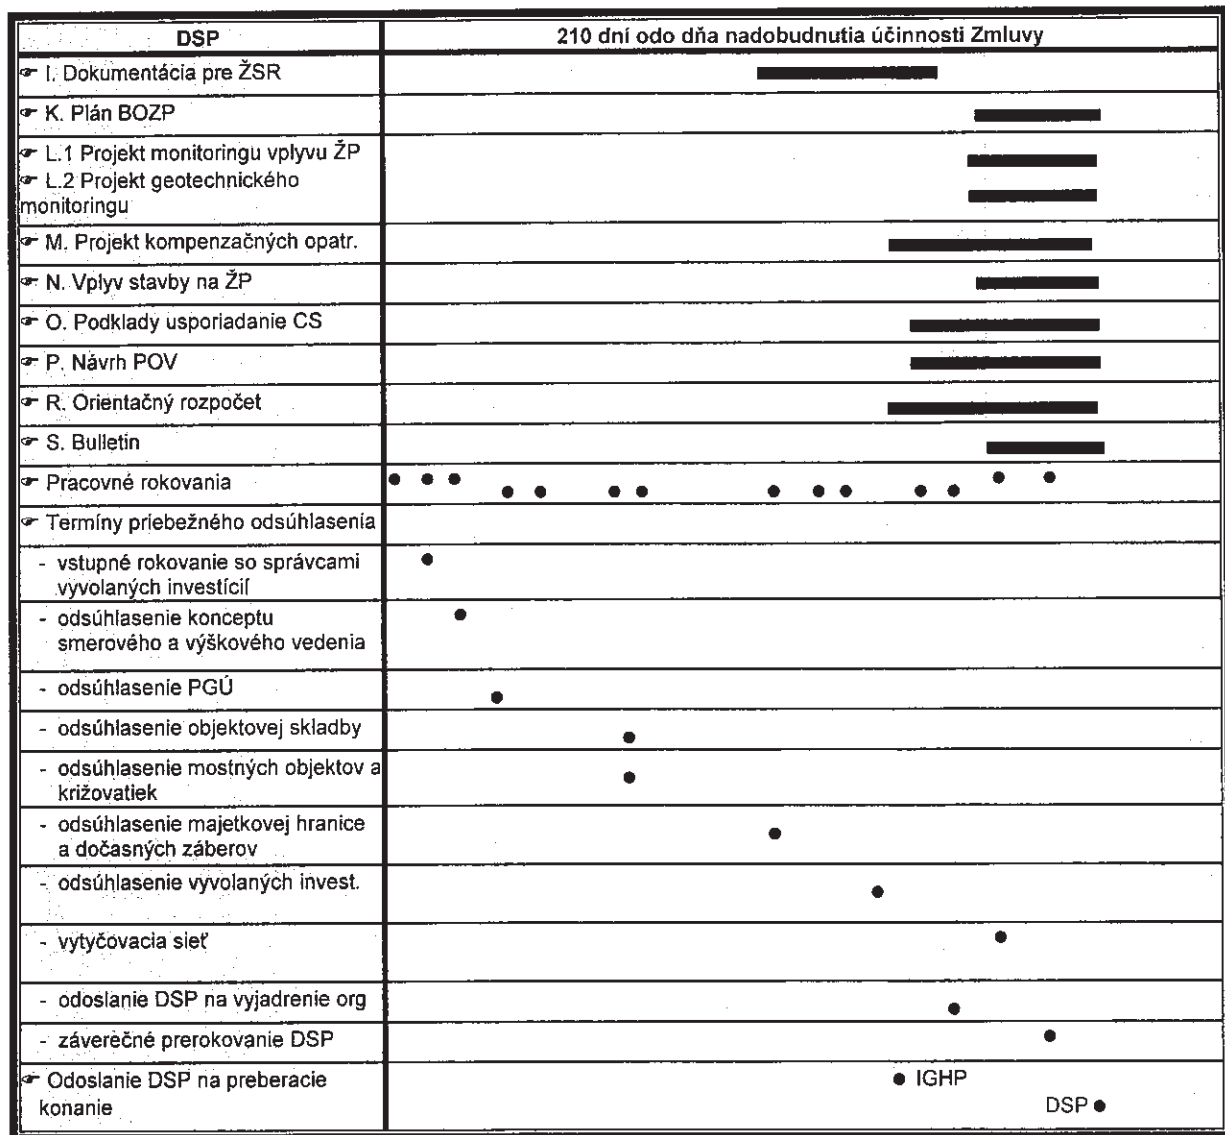

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC OZNÁMENIA 8a

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever (1. stavba)

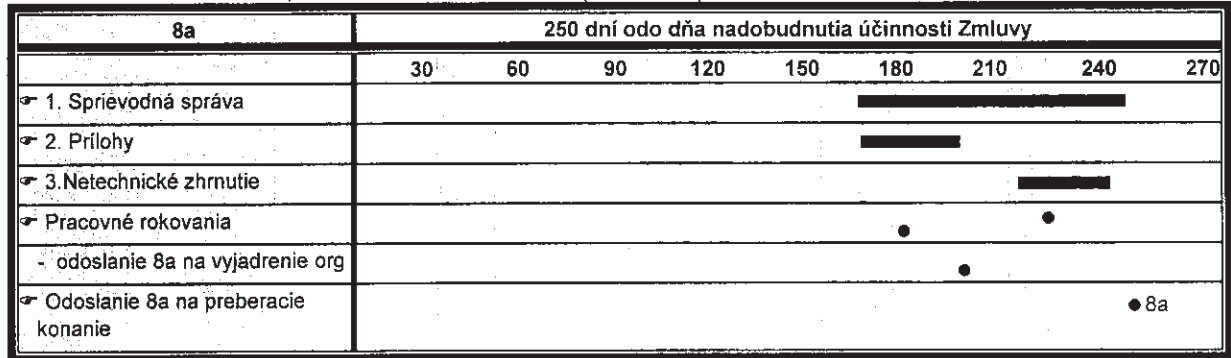

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC DOPLNKU SZ

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever (1. stavba)

Doplnok SZ	210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy						
	30	60	90	120	150	180	210
☞ A. Správa						██████████	
☞ B. Ekonomická správa						██████████	
☞ C. Výkresy						██████████	
☞ Pracovné rokovania						●	●
☞ Odoslanie Doplnku SZ na preberacie konanie							SZ ●

Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača

d.1 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Bude spracovaná v rozsahu a obsahu podľa súťažných podkladov a Technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, ktoré vydalo MDPT SR v januári 2007. DSP bude vypracovaná v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, podmienok protokolu o vykonaní štátnej expertízy a záverečného stanoviska EIA.

V mieste MÚK Ivanka sever skordinujeme dokumentáciu s nadväzujúcou časťou diaľnice D4 v úseku Jarovce – Ivanka sever a so stavbou „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh“.

Po odsúhlasení smerového a výškového vedenia diaľnice D4 sa rozpracujú objekty križovatiek a ďalšie objekty stavby. Na základe aktualizácie dopravno-inžinierske podkladov, ktoré budú prevzaté zo stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, sa preverí technický návrh križovatiek, šírkové usporiadanie typ vozovky na diaľnici D4. Návrh riešenia prerokujeme s objednávatelom a s ostatnými dotknutými orgánmi a organizáciami. Na základe záverov z tohto prerokovania budeme pokračovať v projektových prácach.

Technické riešenie bude podrobnejšie rozpracované, v súlade s koncepciou riešenia ostatných objektov stavby a v zmysle požiadaviek v súťažných podkladoch.

Návrh konštrukcie vozovky s posúdením a koncept riešenia mostných objektov budú odsúhlasené na pracovných rokovaníach. Poloha a rozsah všetkých objektov budú navrhnuté v koordinácii s mapovými podkladmi pozemnoknižného katastra (KN, PKN). Pre zaujímavé úseky trasy diaľnice D4, osadenie veľkých mostov, križovatiek, odpočívadla a protihlukových stien sa spracujú vizualizácie.

Navrhnuté stavebné objekty budú prerokované v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane užívateľov a vlastníkov budúcich objektov, objektová skladba bude odsúhlasená objednávatelom.

V prípade nových záberov sa pre spracovanie geometrických plánov sa vyhotoví účelová mapa s majetkovou hranicou, s dočasnými zábermi, ročnými zábermi a s vecnými bremenami. Táto bude odsúhlasená s obstarávateľom dokumentácie.

V priebehu spracovania DSP bude vykonaný podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, ďalšie potrebné prieskumy, dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie, dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy a ďalšie prílohy, ktoré sú súčasťou DSP.

DSP prerokujeme na záverečnom prerokovaní, záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri. Dopravné značenie bude odsúhlasené s NDS (prevádzkový úsek) a s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ, podľa § 14, ods.1), písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pošleme DSP na posúdenie na Technickú inšpekciu, príslušnému dráhovému správnomu orgánu, dokumentáciu pre ŽSR odošleme na odsúhlasenie dotknutým zložkám ŽSR za účelom získania súhrnného stanoviska ŽSR.

V závere prác vypracujeme podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete a všetky náležitosti potrebné k udeleniu prípadných výnimiek z STN vrátane dokumentácie.

V zmysle požiadaviek v Súťažných podkladoch vypracujeme ďalšie samostatné prílohy:

- Návrh projektu organizácie výstavby
- Orientačný rozpočet
- Dodatok stavebného zámeru (dodatok SZ) iba na pokyn obstarávateľa,
- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a)

O všetkých prácach budeme obstarávateľa priebežne informovať. Okrem pravidelných pracovných rokovaní sa môže obstarávateľ informovať o dosahovaných výsledkoch, o spôsobe riešenia jednotlivých problémov, prípadne o iných aspektoch projektovania v ktoromkoľvek čase v priebehu prác.

Po dodaní dokumentácie sa zúčastníme na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaníach súvisiacich a predmetnou stavbou.

d.2 Dodatok stavebného zámeru (dodatok SZ)

Dokumentácia Dodatok stavebného zámeru bude vypracovaná iba na pokyn obstarávateľa. Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle vyhlášky MVRR SR č. 83/2008, zákona 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, Usmernenia MDPT SR OVRE k TP 03/2006 z 31.8.2009 a súťažných podkladov. Podkladom pre jej spracovanie bude DSP.

d.3 Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

V zmysle prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle Súťažných podkladov sa vykoná porovnanie technického riešenia navrhnutého v EIA a technického riešenia v DSP, spracuje sa charakteristika vplyvov navrhovanej zmeny na chránené územia a obyvateľov.

Samostatnou súčasťou dokumentácie bude aj posúdenie stavby v zmysle Smernice 2000/60/ES európskeho parlamentu a rady z 23.10.2000 v platnom znení, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločnosti v oblasti vodného hospodárstva.

Taktiež bude samostatnou súčasťou dokumentácie aj vyhodnotenie rizík klimatických zmien (odolnosť a zraniteľnosť projektu voči klimatickým zmenám) spolu s návrhom adaptačných opatrení.

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC DSP

Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača (2. stavba)

DSP	210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy						
	30	60	90	120	150	180	210
☛ A.1 Sprievodná správa							
☛ A.2 Netechnické zhrnutie							
☛ B.1 Prehľadná situácia							
☛ B.2 Celková situácia stavby							
☛ B.3 Pozdĺžny rez							
☛ B.4 Ortofotomapa 1:10000							
☛ B.5 Ortofotomapa 1:2000							
☛ B.6 Vizualizácie							
☛ C1. Koordinačné výkresy							
☛ C2. Dopravné značenie							
☛ D. Písomnosti a výkresy							
☛ E. Doklady							
☛ F. Dokumentácia prieskumov							
F.1 Podrobný IG a HG prieskum							
F.2 Dopravno-inžinierske údaje – akt.							
F.3 Inventarizácia biotopov – akt.							
F.4 Inventarizácia drevín – akt.							
F.5 Hluková štúdia – akt.							
F.6 Koróznny prieskum – akt.							
F.7 Pyrotechnický prieskum							
F.8 Geodetický elaborát							

DSP	210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
☞ G. Dokum. pre MP vysporiadanie	
☞ H. Dokum. pre vyňatie pôdy	
☞ I. Dokumentácia pre ŽSR	
☞ K. Plán BOZP	
☞ L.1 Projekt monitoringu vplyvu ŽP	
☞ L.2 Projekt geotechnického monitoringu	
☞ M. Projekt kompenzačných opatr.	
☞ N. Vplyv stavby na ŽP	
☞ O. Podklady usporiadanie CS	
☞ P. Návrh POV	
☞ R. Orientačný rozpočet	
☞ Pracovné rokovania	
☞ Termíny priebežného odsúhlasenia	
- vstupné rokovanie so správcami vyvolaných investícií	
- odsúhlasenie konceptu smerového a výškového vedenia	
- odsúhlasenie PGÚ	
- odsúhlasenie objektovej skladby	
- odsúhlasenie mostných objektov a križovatiek	
- odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov	
- odsúhlasenie vyvolaných invest.	
- vytyčovací sieť	
- odoslanie DSP na vyjadrenie org	
- záverečné prerokovanie DSP	
☞ Odoslanie DSP na preberacie konanie	

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC OZNÁMENIA 8a

Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača (2. stavba)

8a	250 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy								
	30	60	90	120	150	180	210	240	270
☞ 1. Sprievodná správa									
☞ 2. Prílohy									
☞ 3. Netechnické zhrnutie									
☞ Pracovné rokovania									
- odoslanie 8a na vyjadrenie org									
☞ Odoslanie 8a na preberacie konanie									

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ DOPLNKU SZ

Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača (2. stavba)

Doplnok SZ	210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy						
	30	60	90	120	150	180	210
☞ A. Správa						██████████	
☞ B. Ekonomická správa						██████████	
☞ C. Výkresy						██████████	
☞ Pracovné rokovania						●	●
☞ Odoslanie Doplnku SZ na preberacie konanie							SZ ●

Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice

d.1 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Bude spracovaná v rozsahu a obsahu podľa súťažných podkladov a Technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, ktoré vydalo MDPT SR v januári 2007. DSP bude vypracovaná v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby a podmienok protokolu o vykonaní štátnej expertízy.

V mieste MÚK Podunajské Biskupice skoordingueme dokumentáciu so stavbou Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever a so stavbou Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave.

Po odsúhlasení smerového a výškového vedenia preložky cesty II/572 sa rozpracujú objekty križovatiek a ďalšie objekty stavby. Na základe aktualizácie dopravno-inžinierske podkladov, ktoré budú prevzaté zo stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, sa preverí technický návrh križovatiek. Návrh riešenia prerokujeme s objednávatelom a s ostatnými dotknutými orgánmi a organizáciami. Na základe záverov z tohto prerokovania budeme pokračovať v projektových prácach.

Technické riešenie bude podrobnejšie rozpracované, v súlade s koncepciou riešenia ostatných objektov stavby a v zmysle požiadaviek v súťažných podkladoch.

Návrh konštrukcie vozovky s posúdením a koncept riešenia mostných objektov budú odsúhlasené na pracovných rokovaníach. Poloha a rozsah všetkých objektov budú navrhnuté v koordinácii s mapovými podkladmi pozemnoknižného katastra (KN, PKN). Pre zaujímavé úseky trasy preložky cesty II/572 a križovatiek sa spracujú vizualizácie.

Navrhnuté stavebné objekty budú prerokované v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane užívateľov a vlastníkov budúcich objektov, objektová skladba bude odsúhlasená objednávatelom.

V prípade nových záberov sa pre spracovanie geometrických plánov sa vyhotoví účelová mapa s majetkovou hranicou, s dočasnými zábermi, ročnými zábermi a s vecnými bremenami. Táto bude odsúhlasená s obstarávateľom dokumentácie.

V priebehu spracovania DSP bude vykonaný podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, ďalšie potrebné prieskumy, dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie, dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy a ďalšie prílohy, ktoré sú súčasťou DSP.

DSP prerokujeme na záverečnom prerokovaní, záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri. Dopravné značenie bude odsúhlasené s NDS (prevádzkový úsek) a s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ, podľa § 14, ods.1), písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pošleme DSP na posúdenie na Technickú inšpekciu.

V závere prác vypracujeme podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete a všetky náležitosti potrebné k udeleniu prípadných výnimiek z STN vrátane dokumentácie.

V zmysle požiadaviek v Súťažných podkladoch vypracujeme ďalšie samostatné prílohy:

- Návrh projektu organizácie výstavby
- Orientačný rozpočet
- Dodatok stavebného zámeru (dodatok SZ) iba na pokyn obstarávateľa,
- Oznamenie o zmene navrhovanej činnosti (8a)

O všetkých prácach budeme obstarávateľa priebežne informovať. Okrem pravidelných pracovných rokovaní sa môže obstarávateľ informovať o dosahovaných výsledkoch, o spôsobe riešenia jednotlivých problémov, prípadne o iných aspektoch projektovania v ktoromkoľvek čase v priebehu prác.

Po dodaní dokumentácie sa zúčastníme na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaníach súvisiacich a predmetnou stavbou.

d.2 Dodatok stavebného zámeru (dodatok SZ)

Dokumentácia Dodatok stavebného zámeru bude vypracovaná iba na pokyn obstarávateľa. Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle vyhlášky MVRR SR č. 83/2008, zákona 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, Usmernenia MDPT SR OVRE k TP 03/2006 z 31.8.2009 a Súťažných podkladov. Podkladom pre jej spracovanie bude DSP.

d.3 Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

V zmysle prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle Súťažných podkladov sa vykoná porovnanie technického riešenia DSP s existujúcim stavom územia, spracuje sa charakteristika vplyvov navrhovanej zmeny na chránené územia a obyvateľov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC DSP

Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice (3. stavba)

DSP	210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy						
	30	60	90	120	150	180	210
☞ A.1 Sprievodná správa						██████████	
☞ A.2 Netechnické zhrnutie						██████████	
☞ B.1 Prehľadná situácia						██████████	
☞ B.2 Celková situácia stavby	██████████					██████████	
☞ B.3 Pozdĺžny rez	██████████					██████████	
☞ B.4 Ortofotomapa 1:5000						██████████	
☞ B.5 Ortofotomapa 1:2000						██████████	
☞ B.6 Vizualizácie						██████████	
☞ C1. Koordinačné výkresy		██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
☞ C2. Dopravné značenie				██████████	██████████	██████████	██████████
☞ D. Písomnosti a výkresy	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
☞ E. Doklady						██████████	
☞ F. Dokumentácia prieskumov							
F.1 Podrobný IG a HG prieskum	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
F.2 Dopravno-inžinierske podklady	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
F.3 Pedologický prieskum – akt.	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
F.4 Inventarizácia biotopov – akt.						██████████	
F.5 Inventarizácia drevín – akt.						██████████	
F.6 Archeologický prieskum – akt.						██████████	
F.7 Hluková štúdia – akt.			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
F.8 Imisná štúdia – akt.						██████████	
F.9 Koróznny prieskum		██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
F.10 Pyrotechnický prieskum						██████████	
F.11 Geodetický elaborát	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
☞ G. Dokum. pre MP vysporiadanie						██████████	

Doplnok SZ	210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy						
	30	60	90	120	150	180	210
☞ A. Správa						██████████	
☞ B. Ekonomická správa						██████████	
☞ C. Výkresy						██████████	
☞ Pracovné rokovania						●	●
☞ Odoslanie Doplnku SZ na preberacie konanie							SZ ●

Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave

d.1 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Bude spracovaná v rozsahu a obsahu podľa súťažných podkladov a Technických podmienok TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, ktoré vydalo MDPT SR v januári 2007. DSP bude vypracovaná v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby a podmienok protokolu o vykonaní štátnej expertízy.

V mieste MÚK Podunajské Biskupice skordinujeme dokumentáciu so stavbou Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever a so stavbou Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice.

Po odsúhlasení smerového a výškového vedenia preložky cesty II/572 sa rozpracujú objekty križovatiek a ďalšie objekty stavby. Na základe aktualizácie dopravnno-inžinierske podkladov, ktoré budú prevzaté zo stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, sa preverí technický návrh križovatiek. Návrh riešenia prerokujeme s objednávatelom a s ostatnými dotknutými orgánmi a organizáciami. Na základe záverov z tohto prerokovania budeme pokračovať v projektových prácach.

Technické riešenie bude podrobnejšie rozpracované, v súlade s koncepciou riešenia ostatných objektov stavby a v zmysle požiadaviek v súťažných podkladoch.

Návrh konštrukcie vozovky s posúdením a koncept riešenia mostných objektov budú odsúhlasené na pracovných rokovaníach. Poloha a rozsah všetkých objektov budú navrhnuté v koordinácii s mapovými podkladmi pozemnoknižného katastra (KN, PKN). Pre zaujímavé úseky trasy preložky cesty II/572 a križovatiek sa spracujú vizualizácie.

Navrhnuté stavebné objekty budú prerokované v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane užívateľov a vlastníkov budúcich objektov, objektová skladba bude odsúhlasená objednávatelom.

V prípade nových záberov sa pre spracovanie geometrických plánov sa vyhotoví účelová mapa s majetkovou hranicou, s dočasnými zábermi, ročnými zábermi a s vecnými bremenami. Táto bude odsúhlasená s obstarávateľom dokumentácie.

V priebehu spracovania DSP bude vykonaný podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, ďalšie potrebné prieskumy, dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie, dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy a ďalšie prílohy, ktoré sú súčasťou DSP.

DSP prerokujeme na záverečnom prerokovaní, záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na ich hlavičkovom papieri. Dopravné značenie bude odsúhlasené s NDS (prevádzkový úsek) a s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ, podľa § 14, ods.1), písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pošleme DSP na posúdenie na Technickú inšpekciu.

V závere prác vypracujeme podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete a všetky náležitosti potrebné k udeleniu prípadných výnimiek z STN vrátane dokumentácie.

V zmysle požiadaviek v súťažných podkladoch vypracujeme ďalšie samostatné prílohy:

- Návrh projektu organizácie výstavby
- Orientačný rozpočet
- Dodatok stavebného zámeru (dodatok SZ) iba na pokyn obstarávateľa,
- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a)

O všetkých prácach budeme obstarávateľa priebežne informovať. Okrem pravidelných pracovných rokovaní sa môže obstarávateľ informovať o dosahovaných výsledkoch, o spôsobe riešenia jednotlivých problémov, prípadne o iných aspektoch projektovania v ktoromkoľvek čase v priebehu prác.

Po dodaní dokumentácie sa zúčastníme na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaníach

súvisiacich a predmetnou stavbou.

d.2 Dodatok stavebného zámeru (dodatok SZ)

Dokumentácia Dodatok stavebného zámeru bude vypracovaná iba na pokyn Obstarávateľa. Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle vyhlášky MVRR SR č. 83/2008, zákona 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, Usmernenia MDPT SR OVRE k TP 03/2006 z 31.8.2009 a Súťažných podkladov. Podkladom pre jej spracovanie bude DSP.


d.3 Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

V zmysle prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle Súťažných podkladov sa vykoná porovnanie technického riešenia DSP s existujúcim stavom územia, spracuje sa charakteristika vplyvov navrhovanej zmeny na chránené územia a obyvateľov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC DSP


Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave (4. stavba)

DSP	210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy							
	30	60	90	120	150	180	210	
☞ A.1 Sprievodná správa								
☞ A.2 Netechnické zhrnutie								
☞ B.1 Prehľadná situácia								
☞ B.2 Celková situácia stavby								
☞ B.3 Pozdĺžny rez								
☞ B.4 Ortofotomapa 1:5000								
☞ B.5 Ortofotomapa 1:2000								
☞ B.6 Vizualizácie								
☞ C.1 Koordinačné výkresy								
☞ C.2 Dopravné značenie								
☞ D. Pisomnosti a výkresy								
☞ E. Doklady								
☞ F. Dokumentácia prieskumov								
F.1 Podrobný IG a HG prieskum								
F.2 Dopravno-inžinierske podklady								
F.3 Pedologický prieskum – akt.								
F.4 Inventarizácia biotopov – akt.								
F.5 Inventarizácia drevín – akt.								
F.6 Archeologický prieskum – akt.								
F.7 Hluková štúdia – akt.								
F.8 Imišná štúdia – akt.								
F.9 Koróznny prieskum								
F.10 Seizmický prieskum								
F.11 Pyrotechnický prieskum								
F.12 Geodetický elaborát								
☞ G. Dokum. pre MP vysporiadanie								
☞ H. Dokum. pre vyňatie pôdy								
☞ K. Plán BOZP								
☞ L.1 Projekt monitoringu vplyvu ŽP								
☞ L.2 Projekt geotechnického monitoringu								
☞ N. Vplyv stavby na ŽP								

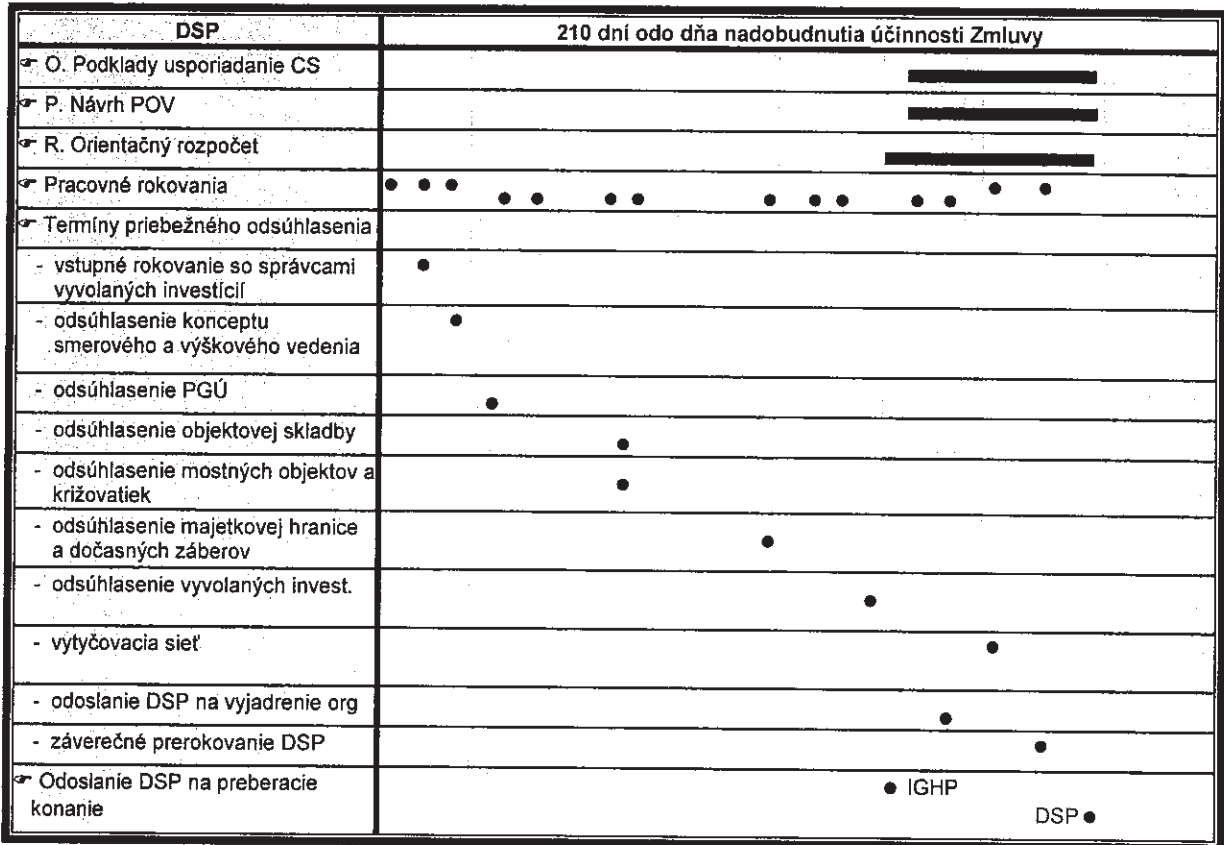

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC OZNÁMENIA 8a

Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave (4. stavba)

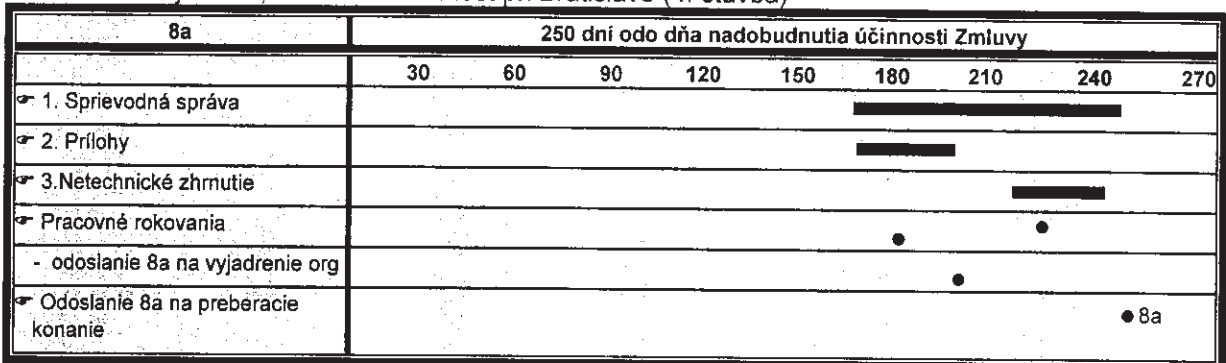

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC DOPLNKU SZ

Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave (4. stavba)

Doplnok SZ	210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy						
	30	60	90	120	150	180	210
☞ A. Správa						■	
☞ B. Ekonomická správa						■	
☞ C. Výkresy						■	
☞ Pracovné rokovania						●	●
☞ Odoslanie Doplnku SZ na preberacie konanie							SZ ●

Príloha č. 4

Časť B1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

**Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Doplnku stavebného zámeru (dSZ) pre stavby:
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice, Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave**

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa: 7778-00

CD 1

DÚR Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever:

- Sprievodná správa
- Technická správa
- Výkresy
- Projekt kompenzačných opatrení

DÚR Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača:

- Sprievodná správa
- Technická správa
- Výkresy

DÚR Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice:

- Sprievodná správa
- Technická správa
- Výkresy

DÚR Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave:

- Sprievodná správa
- Technická správa
- Výkresy

CD2

- Záverečné stanovisko MŽP SR k navrhovanej činnosti Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Oprava zrejmych chýb záverečného stanoviska Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Záverečné stanovisko MŽP SR k navrhovanej činnosti Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a – pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a – pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
- Vyjadrenie MŽP SR k 8a – pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Vyjadrenie MŽP SR k 8a – pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača
- Územné rozhodnutie na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
- Územné rozhodnutie na stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača
- Územné rozhodnutie na stavbu Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
- Územné rozhodnutie na stavbu Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave
- Opis predmetu zákazky:
 - Stavba Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
 - č.1.1a Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP, dSZ a 8a
 - č.1.1b Podklady a požiadavky na podrobný IGHP prieskum
 - č.1.1c Návrh rozsahu prác pre ďalšiu etapu IGHP
 - č.1.1d Objektová skladba
 - č.1.2a Základné náležitosti DSP
 - Stavba Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača
 - č.2.1a Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP, dSZ a 8a
 - č.2.1b Podklady a požiadavky na podrobný IGHP prieskum
 - č.2.1c Návrh rozsahu prác pre ďalšiu etapu IGHP
 - č.2.1d Objektová skladba
 - č.2.2a Základné náležitosti DSP
 - Stavba Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho
 - č.3.1a Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP, dSZ a 8a
 - č.3.1b Podklady a požiadavky na podrobný IGP prieskum
 - č.3.1c Návrh rozsahu prác pre ďalšiu etapu IGP
 - č.3.1d Objektová skladba
 - č.3.2a Základné náležitosti DSP
 - Stavba Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave
 - č.4.1a Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP, dSZ a 8a
 - č.4.1b Podklady a požiadavky na podrobný IGP prieskum
 - č.4.1c Návrh rozsahu prác pre ďalšiu etapu IGP
 - č.4.1d Objektová skladba
 - č.4.2a Základné náležitosti DSP
- Spoločné dokumenty
 - č. 2b Základné náležitosti dodatku SZ
 - č. 2c Základné náležitosti 8a
 - č. 3 Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavieb
 - č. 4 Tabuľky pre časť G a H
