

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa:536/2011.....

č. zhotoviteľa: 201136/PO

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„I/72 Kráľová Lehota – most 036“

Článok 1. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Slovenská správa ciest

Sídlo:
Štatutárny orgán:

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.,- generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
Sídlo:

Ing. František Faktor, PhD., riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č.
38070//0001/2010 zo dňa 29.10.2010

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

00 33 28
2021067785
Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou
č.5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86
zo dňa 22. 5. 2008

Číslo telefónu, faxu:
E-mail:

tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

JUDr. Radoslav Jandzík – právnik
Ing. Janka Holtánová – odd. ver. Obstarávania
Ing. Matúš Salát – ved. odd. prípravy stavieb

- vo veciach technických:

- vo veciach realizácie:

Ing. Jozef Chochula- námestník investičnej výstavby
Ing. Vladimír Hudec – stavebný dozor
Ing. Žaneta Kubicová

- vo veciach cenových:

- vo veciach ekonomických:

p. Katarína Staneková

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:
Číslo telefónu, faxu:
E-mail:

7000135433/8180
tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)
beata.bulejcikova@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ

Názov: **TSS GRADE, a.s.**
Sídlo: Bratislavská 4, 917 02 Trnava
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ľuboš Hačko, predseda predstavenstva
Tomáš Kizek, generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Právna forma: akciová spoločnosť

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sa, vložka č. 10199/T

Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Trnava
Číslo účtu: 284653045/0900
IČO: 35 802 723
IČ DPH: SK2020281571

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : JUDr. Igor Zelník, vedúci právneho oddelenia
technických : Ing. Pavol Trúnek, výrobný riaditeľ cestných stavieb
Ing. Juraj Cabadaj, obchodný riaditeľ cestných stavieb

Telefón, fax : 033/5511 595 / 033/5515 493
E-mail : info@tss.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž.

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce vrátane dokumentácie skutočnej realizácie stavby (DSRS) na stavbe:
- „I/72Kráľová Lehota – most 036“**
(ďalej len „dielo“)
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

Článok 3.

Vykonávanie diela, rozsah prác

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle čl. 2 je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č.j. 218/2011/VO-6431/2454 zo dňa 28.04.2011 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 30.3.2011.
- 3.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) vypracovanej projektantom: **Cemos, spol. s r.o.** Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava
- 3.3 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, dokumenty majú nasledovnú prioritu:
- Zmluva o dielo,
 - Dokumentácia pre ponuku (DP-DSRS) + stavebné povolenie,
 - Ponuka zhotoviteľa.
- 3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy (stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre

výstavbu, zákon č. 260/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 3.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby odovzdaných písomnou formou objednávateľom;
 - b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
 - c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 3.7 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných objednávateľom bude sa postupovať v zmysle bodu 21.2c).
- 3.8 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.10 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 3.11 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením, a to priebežne.

Článok 4.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
- a) do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
 - b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami.

Článok 5.

Cena diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	259 320,42
DPH 20% (EUR)	51 864,07
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	311 184,49

Slovom: Tristojedenašťtisíc stoosemdesiatštyri 49/100 EUR

- 5.2 Prílohu ZoD tvoria:
- 5.2.1 Rozpočet (ocenený výkaz výmer)
- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení každého mesiaca zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v rozpočte (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku, ktorý bude prílohou faktúry. Splatnosť faktúry je 90 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.

- 5.3.1 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozorovi tieto doklady k odsúhlaseniu vykonaných prác vo fakturovanom mesiaci k faktúre:
1. Kópie stavebných denníkov
 2. Kvalitatívne doklady zabudovaných materiálov a prác (atesty) v súlade s kontrolným a skúšobným plánom vrátane certifikátov
 3. Grafický denník potvrdený zodpovedným geodetom (výpočet mesačných výkonov)
 4. Prehľad o preberaní zakrytých častí
 5. Celkový prehľad plnenia od začiatku stavby po objektoch
- 5.3.2 Faktúry za dodatočné práce a navyše práce budú vystavené ako samostatné, až po odsúhlasení prác uvedených v doplnku k rozpočtu projektantom – autorským dozorom a objednávateľom – stavebným dozorom a následným dodatkom k zmluve o dielo podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 5.4 Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a
- a) uhradí zhotoviteľovi 90% z fakturovanej ceny s DPH v lehote do 90 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - b) zadrží zhotoviteľovi 10% z fakturovanej ceny s DPH do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z..
- 5.5 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok, bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.6 V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 5.4
- 5.7 Stavebno-technický dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykoná v súlade so zmluvou.
- 5.8 Všeobecné položky budú fakturované nasledovne:
- a) Zariadenie a odstránenie zariadenia staveniska podľa rozpisu vždy po ich zrealizovaní.
 - b) Prevádzku zariadenia staveniska v mesačných faktúrach alikvotne pomerom nákladu na prevádzku a dobu realizácie doložiť položkovitým súpisom prevádzky zariadenia staveniska.
 - c) Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) po zápisničnom prevzatí a odsúhlasení objednávateľom. Uhradená bude max. do výšky ponukovej ceny za jednotlivé položky.
- 5.9 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia,
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Článok 6. Čas plnenia

- 6.1
- a) Začatie realizácie diela: dňom odovzdania staveniska .
 - b) Dokončenie realizácie diela: **30. 6. 2012.**
 - c) Stavenisko bude odovzdané po podpise ZoD (najneskôr do 14 dní po podpise ZoD). Objednávateľ si vyhradzuje právo odovzdať stavenisko po objektoch.
 - d) V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.

Článok 7. Riziká zhotoviteľa

- 7.1 Riziká zhotoviteľa
- 7.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 7.1.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych skutočností, ktorými sú:
- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
 - b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 8. Poistenie

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia celej stavby:
- a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa,
 - b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou:
 - ba) komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;
 - c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.
- 8.2 Poistné zmluvy alebo poistné osvedčenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr pred podpisom ZoD.
- 8.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
- 8.4 V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.
- 8.5 Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.
- 8.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať ZoD, ak zhotoviteľ nepredloží doklad o uzavretom poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ktorej finančné plnenie bude vo výške minimálne 20% z predpokladanej hodnoty zákazky.

Článok 9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

- 9.1 *Zhotoviteľ*
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom;
 - b) sa zaväzuje, že bude podnikáť všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 9.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“ - Príloha č. 1. k PGR č. 45/2006, ktoré sú súčasťou zmluvy.
- 9.3 Protipožiarna ochrana
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarom a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 9.4 Ochrana životného prostredia
- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru.
 - b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

- c) V prípade nedodržania článku 9. ods. 9.4.a), 9.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- d) Zhotoviteľ si zmluvne zabezpečí skládku vybúraných hmôt, nebezpečného odpadu, prebytočnej (nevhodnej) zeminy.

Článok 10. Stavenisko

Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii. Súčasťou staveniska sú aj dočasné zábery potrebné pre výstavbu, ktoré boli zhotoviteľovi poskytnuté objednávateľom, zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.1 Odovzdanie staveniska:

10.1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr k termínu začatia stavby a k tomuto termínu sa zaväzuje, že zabezpečí:

- a) vytýčenie vytyčovanej siete osi cesty a obvodu staveniska v termíne do 14 dní od uzatvorenia ZoD;
- b) právo vstupu zhotoviteľa na pozemky potrebné pre výstavbu;

10.1.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť, vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa PD a podmienok dohodnutých v zmluve.

10.1.3 Vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení **zabezpečí zhotoviteľ** v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. Vytyčovanie trás, ich vyznačenie na povrchu kolíkmi, zápisničné odovzdanie a prevzatie vytýčených sietí sa uskutoční **za účasti správcu, objednávateľa a zhotoviteľa**.

10.1.4 Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzatú vytyčovaciu sieť, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti za presnosť vytýčenia.

10.1.5 Vytyčovacia sieť a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu zmluvy sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zničení týchto bodov, zriadiť náhradné body a túto zmenu so všetkými údajmi písomne odovzdať objednávateľovi.

10.1.6 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi podľa projektu prístup na stavenisko.

10.1.7 Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za čas, po ktorý je v omeškaní z vlastnej viny.

10.1.8 Závázky prijaté na odovzdaní staveniska nesmú byť v rozpore so zmluvou. Zápisnica musí byť potvrdená štatutármi zmluvných strán prípadne splnomocnenými zástupcami.

10.1.9 Zhotoviteľ si zabezpečí všetky náležitosti pre zariadenie staveniska v súlade s PD stavby, vrátane odberov elektrickej energie a vody pre zariadenie staveniska. Prípadné nové plochy „ZS“ si je zhotoviteľ povinný príslušne odsúhlasiť a MP vysporiadať.

10.1.10 Zhotoviteľ bude stavenisko udržiavať v prevádzky schopnom stave pre verejnú dopravu. Počas realizácie stavby si zhotoviteľ zabezpečí údržbu predmetnej cesty I/72, jej zjazdnosť v celom obvode staveniska.

Článok 11. Prístup na stavenisko

11.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

Článok 12.
Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

12.1 Zamestnanci zhotoviteľa

12.1.1 Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávatelom.

12.1.2 Ak objednávatel požiadá zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník ihneď opustí stavenisko a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

12.1.3 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>Funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Martin Čupec	Vedúci stavby	Ing. Bystrík Ižold

12.2 Zamestnanci objednávatel'a

12.2.1 Zamestnanci objednávatel'a oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
JUDr. Radoslav Jandzík	právník	
Ing. Ružena Moravčíková, PhD.	Vedúca odd. OKK	Ing. Peter Onofrej Ing. Pavol Muráň
Ing. Branislav Rička	Referent BOZP	
Ing. Štoderová Jana	Zodpovedný geodet	

Článok 13.
Príkazy

13.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávatel'a, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok 14.
Vlastníctvo na zhotovovanej veci

14.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenia § 542 ods. 1, 2 obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do vyhotovenia a podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo jej dokončenej časti v zmysle Vyhl. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., v zmysle vyhlášky č. 83/2008 MV RR SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z..

14.2 Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

14.3 Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považuje za vlastníctvo objednávatel'a a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

Článok 15.
Zmeny a doplnky

15.1 Objednávatel' je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny zabudovaných výrobkov a stavebných prác, ktoré majú za následok zvýšenie kvality.

15.1.1 Zhotoviteľ je povinný:

- a) nevykonať práce, ktoré objednávatel' určí nevykonať;
- b) zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;

c) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela po dohode;

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

15.2 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 16.

Predĺženie doby výstavby

16.1 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, že:

- a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
- b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
- d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Článok 17.

Harmonogram prác

17.1 Najneskôr do dvoch týždňov po obojstrannom podpísaní zmluvy zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program – harmonogram výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.

17.2 Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Článok 18.

Obchodné tajomstvo

18.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v centrálnom registri zmlúv.

18.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 19.

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

19.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

19.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.

19.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.

19.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

19.5 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: **Ing. Bystríka Ižolda**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.

19.6 Objednávateľ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru **Ing. Vladimíra Hudeca**. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi **Ing. Dušan Filípek**. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.

1

- 19.7 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebno-technického dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k zmluve.
- 19.8 Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v zmluve (okrem osôb uvedených v bode 19.5 a 19.6) sú obidve zmluvné strany povinné písomne oznámiť do 10 dní a to písomnou formou.
- 19.9 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
- 19.10 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebno-technickému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 19.11 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebno-technického dozoru, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 19.12 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ.
- 19.13 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.
- 19.14 Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 15-tich dní od odovzdania staveniska, objednávateľovi "Plán povodňových zabezpečovacích prác", odsúhlasený príslušným vodohospodárskym orgánom, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom povodia.

Článok 20.

Plnenie povinností

- 20.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 20.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 20.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 20.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie;
 - c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť štátnu cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť.
- 20.5 Dočasný záber staveniska potrebný pre výstavbu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.
- 20.6 Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo, predloží objednávateľovi na odsúhlasenie skúšobný plán stavby v súlade s § 13 zákona č. 260/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.254/1998 o verejných prácach.
- 20.7 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

Článok 21.

Prerušenie a zastavenie prác

- 21.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

- 21.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) Zistenie vady projektu;
 - b) Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;
 - c) V prípade uvedenom v § 551 ods. 1) Obch. zákonníka:
 - ca) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekračujú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov o čas, počas ktorého bolo nevyhnutné vykonanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.
 - cb) Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použitie pri zhotovovaní diela trval.
 - cc) Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v písmene ca), zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.
- 21.3 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby.
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 21.4 Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 21.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Článok 22.

Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 22.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 22.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú zákonu č. 264/1999 Z.z. Atesty materiálov – kamenivo do konštrukčných vrstiev vozovky, betónov a asfaltových vrstiev nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. V opačnom prípade budú považované za neplatné. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 22.3 Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebno-technickým dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 22.4 V prípade, že sa stavebno-technický dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle ods. 22.1 – 22.3 bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
- 22.5 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky, a to:
- a) ak sa dodatočne preukáže, že počiatočná skúška typu je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod. náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

22.6 Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v skúšobnom pláne stavby odsúhlasenom objednávateľom v zmysle článku 20.6 tejto zmluvy.

Článok 23.

Zmeny vo výmerách a naviac práce

- 23.1 Všetky zmeny podľa článku 15 a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi podľa bodu 23.2
- 23.2 V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.
- 23.3 Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.
- 23.4 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebno-technického dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatený bude až po podpísaní obidvoch zmluvnými stranami.
- 23.5 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

Článok 24.

Úprava ceny

- 24.1 Zmluvná jednotková cena v priebehu výstavby nebude upravovaná.

Článok 25.

Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

- 25.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 25.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 25.3 Do 28 dní po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (alebo jej dokončenej časti) v zmysle Vyhl. č.83/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. účastníkmi výstavby, správcu a budúceho užívateľa predloží zhotoviteľ objednávateľovi konečnú faktúru.
- 25.4 Najneskôr do 90 dní po prijatí konečnej faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru konečná v súlade so zmluvou, vrátane vyrovnaní medzi objednávateľom a zhotoviteľom, so zreteľom na všetky predchádzajúce platby objednávateľa a na všetky čiastky, na ktoré má zhotoviteľ nárok.

Článok 26.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 26.1 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- a) stavebné denníky;
 - b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania;
 - c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie.
 - d) štyri sady : výkresy skutočného realizovania diela so zakreslenými zmenami oproti DP označených červenou farbou a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; aj v digitálnom formáte.
 - e) meračský elaborát (výkresová časť a dokumentácia vytyčovacích prvkov v súradnicovom systéme) a omedzníkovanie skutočného trvalého záberu stavby v prípade, že bude potrebné.
 - f) doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku.

- g) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy)
 - h) štyri vyhotovenia mostného zošita každého mostného objektu stavby v tlačenej forme a jedno vyhotovenie v digitálnej forme.
- 26.2 K preberaciemu konaniu objednávateľ pripraví:
- a) správu stavebno-technického dozoru o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu, dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom;
 - b) vyhotovenie záznamu skúšok, ktoré boli priebežne alebo na konci vykonané.
- 26.3 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíše protokol o preberaní prác v zmysle Vyhl. č. 83/2008 Z.z..
- 26.4 Obdobné podmienky platia aj pri odovzdávaní a preberaní samostatných ucelených častí diela. K preberaciemu konaniu týchto častí predloží zhotoviteľ doklady ako v bode 26.1 a) až 26.1 f) (dokumenty týkajúce sa len odovzdaných objektov).
- 26.5 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov zadrží objednávateľ zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny diela. Zo zadržanej čiastky uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 40% zádržného za príslušný objekt, alebo skupinu objektov, ktoré sú schopné samostatného užívania s odovzdaním príslušných dokladov v zmysle Vyhlášky č. 83/2008 Z. z., prílohy č. 3(Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo jej dokončenej časti) po dodaní konečnej faktúry na tieto objekty alebo jej dokončené časti. Zostávajúca časť 60 % zádržného bude uhradená po podpísaní protokolu o odstránení prípadných väd a nedorobkov celej stavby objednávateľom a zhotoviteľom.

Článok 27.

Prípady odškodnenia

- 27.1 Prípadmi odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:
- a) objednávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;
 - b) stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce
 - ba) vada zapríčinená objednávateľom;
 - bb) dodatočná práca vyžadovaná z hľadiska bezpečnosti alebo iných dôvodov;
- 27.2 Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výdavky alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú či a o koľko sa zvýši zmluvná cena a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.
- 27.3 Ako náhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu zmluvnej ceny.
- 27.4 Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespolupracoval.

Článok 28.

Sankcie

- 28.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- | | |
|--|-------|
| a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 6.1 b) | 100 € |
| b) nepredloženie poistných zmlúv podľa bodu 8.2 | 100 € |
| c) nepredloženie programu prác podľa bodu 17.1 | 100 € |
| e) nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 20.6 | 100 € |
| f) nepredloženie počiatočných skúšok typu podľa bodu 20.6 | 100 € |
| g) ak nezačne s odstraňovaním väd podľa bodu 29.6 | 150 € |
| h) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 29.6 | 150 € |
- 28.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.
- 28.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

- 28.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je objednávateľ v omeškaní za:
- | | |
|--|-------|
| a) omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 5.4 | 0,05% |
| b) omeškanie s úhradou konečnej faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 25.4 | 0,05% |

Článok 29.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 29.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím celého diela objednávateľom bez vád a nedorobkov v zmysle Vyhlášky č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.
- 29.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
- 29.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 29.4 Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.
- 29.5 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 29.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v zmysle článkov 30.1 a 30.2 do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.
- 29.7 Zhotoviteľ zloží bankovú zábezpeku na odstránenie vád počas záručnej doby vo výške 5 000 EUR v termíne najneskôr 30 dní pred odovzdaním celej stavby a na celú záručnú dobu.

Článok 30.

Zisťovanie vád

- 30.1 Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
- 30.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 31.

Odstránenie vád

- 31.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.
- 31.2 Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstraňovanie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
- 31.3 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli zistené počas záručnej doby.
- 31.4 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy, ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 32.

Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 32.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.

- 32.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby (podľa čl. 29.6), objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry alebo budú uhradené z jeho záruky na zákazku.

Článok 33. Odstúpenie od zmluvy

- 33.1 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 33.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 33.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka.
- 33.4 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka
- 33.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 33.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 34. Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti

- 34.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 34.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 35. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 35.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
 - b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
 - c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
 - d) Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 35.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 35.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

Článok 36. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 36.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

- 36.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 36.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Článok 37. Zmena záväzkov

- 37.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 37.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak sa zmení podstatne rozsah projektovaných prác;
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby;
 - c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
 - d) v prípade živelných pohrôm

Článok 38. Spory

- 38.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Článok 39. Záverečné ustanovenia

- 39.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 39.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 39.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 39.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 39.5 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy sú (víťazný uchádzač):
- (a) rozpočet (ocenený výkaz výmer),
 - (b) kalkulačný vzorec,
 - (c) databáza profesií, strojov a dopravy,
 - (d) schválená projektová dokumentácia vrátane dokladovej časti DSP,
 - (e) harmonogram prác,
 - (f) skúšobný plán stavby,
 - (g) poisťna zmluva,
 - (h) zásady BOZP na stavenisku,
 - (i) ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ),
- 39.6 Táto zmluva má 16 strán. Je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, štyri sú pre objednávateľa.
- 39.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi a účinnosť v súlade so znením § 47a ods.(1) Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom

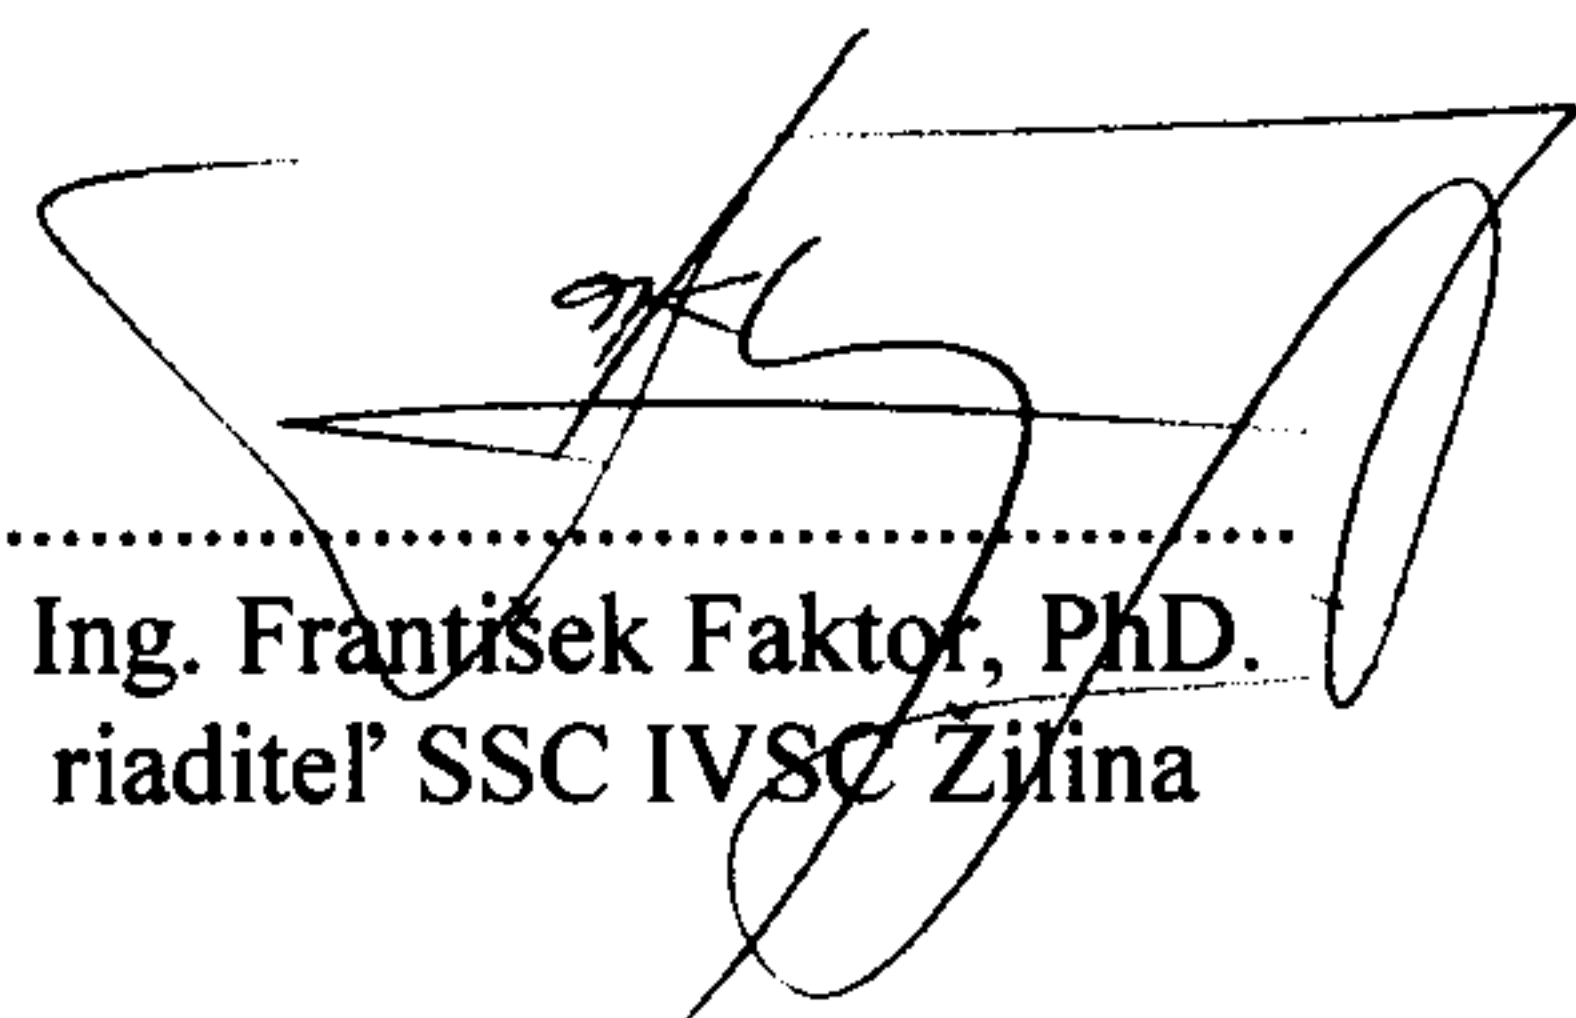
vlády SR okrem údajov, ktoré sa podľa osobitného zákona nezverejňujú a nadobúdajú účinnosť spolu s platnosťou zmluvy.

- 39.8 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

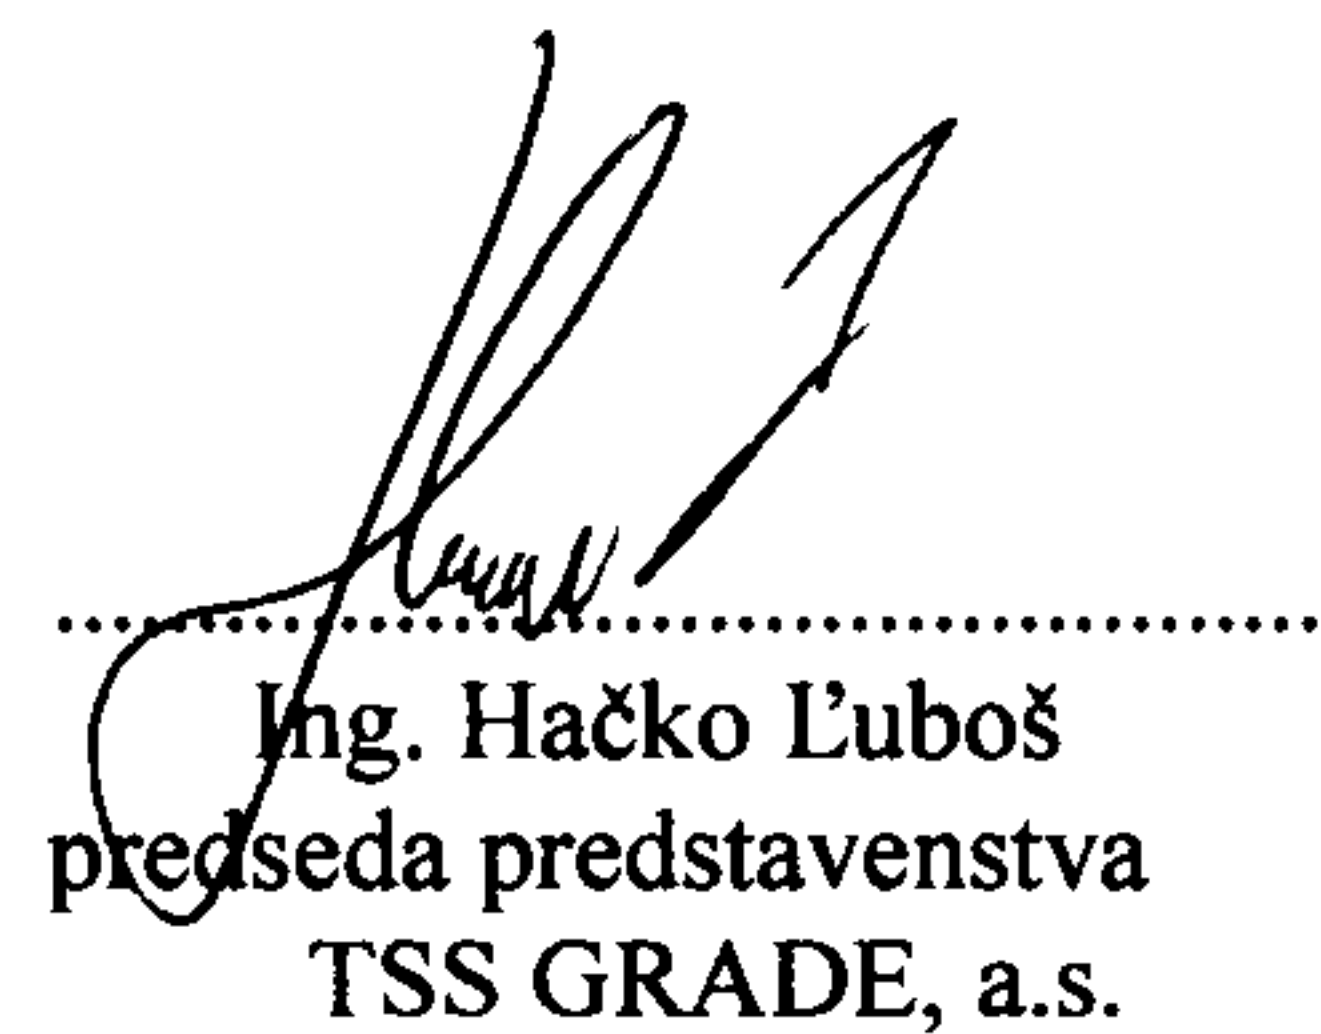
V ŽILINE, dňa: 10.6.2011

Za objednávateľa:


.....
Ing. František Faktor, PhD.
riaditeľ SSC IVSC Žilina

V Trnave, dňa: 3.6.2011

Za zhotoviteľa:


.....
Ing. Hačko Ľuboš
predseda predstavenstva
TSS GRADE, a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

TSS **GRADE, a.s.** **- 45 -**
Bratislavská 4, P.O. BOX 15
917 02 Trnava
IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK2020281571
