



**Zmluva na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR),  
dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
dokumentácie na ponuku (DP), majetkovoprávne vysporiadanie (MPV), inžiniersku činnosť (IČ) a  
výkon autorského dozoru (AD)  
na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: ZM/2011/0423

Číslo zhotoviteľa: 7732-00

### Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
 Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
  - vo veciach technických :
- vo veciach cenových:
- Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 IČO: 35 919 001  
 DIČ: 2021937775  
 IČ DPH: SK2021937775  
 Tel./Fax:
- ďalej len „objednávateľ“
- a
- 1.2 Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Sídlo: Kominárska 2, 4 , 832 03 Bratislava  
 Právna forma: Akciová spoločnosť,  
 Zápis v obchodnom registri: zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Bratislava I,  
 Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B  
 predstavenstvo  
 Štatutárny orgán: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**  
 v zastúpení: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
**Ing. Bartolomej Šechný,**  
 podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
  - vo veciach technických:
  - vo veciach cenových:
- Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 IČO: 31 322 000  
 DIČ: 202054770  
 Tel./Fax:
- ďalej len „zhotoviteľ“
- ďalej spoločne „zmluvné strany“

## PREAMBULA

Nakoľko ide o veľmi rozsiahly predmet zmluvy, zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti :

- Časť 1., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP),
- Časť 2., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností (MPV),
- Časť 3., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok vykonania inžinierskej činnosti (IČ),
- Časť 4., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu autorského dozoru (AD),
- Časť 5., predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto zmluvy.

## ČASŤ 1

### Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 časti 1 (ďalej len „dielo“). Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 časti 1.

### Čl. 2 PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, a to :
- 2.1.1 dokumentáciu na územné rozhodnutie (ďalej len „DUR“)
  - 2.1.2 dokumentáciu stavebného zámeru (ďalej len „DSZ“)
  - 2.1.3 dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“)
  - 2.1.4 dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“)
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

### Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA

- 3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 časti 1 je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), majetkovoprávne vysporiadanie (MPV), inžiniersku činnosť (IČ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“ vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „Súťažné podklady“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa bodu 3.1 tohto článku v rámci dohodnutej ceny takto :
- 3.2.1 DUR v 6 súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD
  - 3.2.2 DSZ v 6 súpravách v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD, resp. DVD
  - 3.2.3 DSP v 6 súpravách v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD, resp. DVD
  - 3.2.4 DP v 6 súpravách v tlačenej forme a 100 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD
  - 3.2.5 výtlačky navyše z DUR:
 

➤ prehľadná situácia M 1:10 000	10 x
➤ situácia stavby M 1:5 000	10 x
➤ ortofotomapa M 1:5 000	10 x
➤ geometrické plány – overený trvalý záber	3 x
➤ geometrické plány – dočasný záber	3 x
➤ geometrické plány – ročný záber	3 x
➤ výkupový elaborát	3 x
➤ informačný bulletin z DUR v tlačenej forme:	100 x

- v digitálnej forme navyiac:
- ortofotomapa 1x
  - informačný bulletin z DUR v slovenskom jazyku v digitálnej forme na CD (text, vizualizácie, animácie, ortofotomapy a pod.): 2 x
- 3.2.6 výtlačky navyiac z DSP
- prehľadná situácia M 1:10 000 10 x
  - situácia stavby M 1:5 000 10 x
  - ortofotomapa M 1:5 000 10 x
  - podklady pre vyňatie z PPF a LPF 2 x
  - v digitálnej forme navyiac
  - ortofotomapa 1x
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi výkresovú časť dokumentácie vo formáte .dwg alebo .dgn, textovú a tabuľkovú časť vo formáte .doc, .xls, obrázkovú časť vo formáte .pdf a .jpg a kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

#### Čl. 4

#### PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady :
- 4.1.1 Technická štúdia rýchlostnej cesty R7 Bratislava – Lučenec, úsek Bratislava – Dunajská Lužná (Geoconsult, 12/2006),
  - 4.1.2 Zámer EIA rýchlostnej cesty R7 Bratislava – Dunajská Lužná (Geoconsult, 01/2007),
  - 4.1.3 Správa o hodnotení rýchlostnej cesty R7 Bratislava – Dunajská Lužná (Geoconsult, 09/2008),
  - 4.1.4 Posudok na Správu o hodnotení vplyvov rýchlostnej cesty R7 Bratislava – Dunajská Lužná (Ing. Karol Mahr, 02/2009),
  - 4.1.5 Záverečné stanovisko MŽP SR Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná vydané Ministerstvom životného prostredia SR dňa 15.6.2009,
  - 4.1.6 Technická štúdia rýchlostnej cesty R7 Bratislava – Lučenec, úsek Dunajská Lužná – Holice (Dopravoprojekt, 06/2006),
  - 4.1.7 Správa o hodnotení vplyvov rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná – Holice (Dopravoprojekt, 11/2009).
- 4.2 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

#### Čl. 5

#### TERMÍN PLNENIA DIEĽA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DUR** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSZ** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **24.01.2013**.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do **29.02.2012**.

- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do **02.05.2012**.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do **2 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľa**.
- 5.7 Dňom doručenia DÚR, DSZ, DSP a DP do sídla objednávateľa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DÚR, DSZ, DSP a DP spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DÚR, DSZ, DSP a DP nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 5.8 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DÚR, DSZ, DSP a DP nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
- 5.9 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol samostatne pre DÚR, DSZ, DSP a DP v lehote do jedného mesiaca odo dňa ich doručenia do sídla objednávateľa. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
- 5.10 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DÚR, DSZ, DSP a DP má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.9 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vad.
- 5.11 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.9 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DÚR, DSZ, DSP a DP spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v článku 5.9 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 5.12 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DÚR, DSZ, DSP a DP už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.9 tohto článku.
- 5.13 V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DÚR, DSZ, DSP a DP a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

## Čl. 6

### CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 6.2 a) Cena DUR bez DPH v EUR: 41 584,16 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 8 316,83 €  
 Cena DUR vrátane DPH v EUR: 49 900,99 €  
 (slovom: štyridsaťdeväťtisícdeväťsto celých a deväťdesiatdeväť stotín eura);
- b) Cena DSZ bez DPH v EUR: 176 343,92 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 35 268,78 €  
 Cena DSZ vrátane DPH v EUR: 211 612,70 €  
 (slovom: dvestojedenásťtisícšesťstodvanásť celých a sedemdesiat stotín eura);
- c) Cena DSP bez DPH v EUR: 223 098,63 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 44 619,73 €  
 Cena DSP vrátane DPH v EUR: 267 718,36 €  
 (slovom: dvestošesťdesiatšesťtisícšesťstosemstoosemnásť celých a tridsaťšesť stotín eura);

d) Cena DP bez DPH v EUR:	132 737,66 €
Sadzba DPH 20% v EUR:	26 547,53 €
Cena DP vrátane DPH v EUR:	159 285,19 €

(slovom: jednostopäťdesiatdeväťtisícdivoosemdesiatpäť celých a devätnásť stotín eura);

e) Cena diela celkom bez DPH v EUR:	573 764,37 €
Sadzba DPH 20%:	114 752,87 €
<b>Cena diela celkom vrátane DPH v EUR:</b>	<b>688 517,24 €</b>

(slovom: šesťstoosemdesiatosemtisícpäťstosedemnášť celých a dvadsaťštyri stotín eura);

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín. Rozpočet tvorí ako príloha č. 8 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. a) tohto článku za DÚR na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.7 až 5.13 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. b) tohto článku za DSZ na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.7 až 5.13 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. c) tohto článku za DSP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.7 až 5.13 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. d) tohto článku za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.7 až 5.13 článku 5 časti 1 tejto zmluvy.
- 6.4 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy a predmet fakturácie v zmysle článku 2 tejto zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby pridelené objednávateľom 1533. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na DUR /V3\_4/, náklady na DSZ /V3\_4/, náklady na DSP /V3\_5/, náklady na DP /V3\_6/. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 6.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy.
- 6.7 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z časti 1 tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 6.8 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa.
- 6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

## Čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DUR, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za DUR uvedenej v bode 6.2 písm. a) časti 1 za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSZ, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za DSZ uvedenej v bode 6.2 písm. b) časti 1 za každý deň omeškania

- 7.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSP, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za DSP uvedenej v bode 6.2 písm. c) časti 1 za každý deň omeškania.
- 7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DP, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za DP uvedenej v bode 6.2 písm. d) časti 1 za každý deň omeškania.
- 7.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 časti 1 zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.6 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.7 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

#### Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 4.2 článku 4 časti 1).
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

#### Čl. 9 OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 časti 1 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola DUR, DSZ, DSP alebo DP alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy.
- 9.4 Vlastnícke právo k DUR, DSZ, DSP alebo DP objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy.
- 9.5 Nebezpečenstvo škody na DUR, DSZ, DSP alebo DP prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 9.4 tohto článku.

- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní, všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní pre výber zhotoviteľa stavebných prác pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác), cenovej časti (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a projektovej dokumentácie (Zväzok 5 uvedených súťažných podkladov).
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri zostavovaní súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti Stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný vypracovať pre objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky“ (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber dodávateľa) týkajúce sa opisu projektu, v rozsahu a v zmysle požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.

## ČASŤ 2

### Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 časti 2 (ďalej len „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 časti 2.

### Čl. 2 PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná **majetkovoprávnu prípravu** nehnuteľností v katastrálnych územiach Podunajskej Biskupice, Rovinka, Jánošíková a Nové Košariská, k stavebnému povoleniu na základe DUR a následné kompletne **majetkovoprávne vysporiadanie** (ďalej len „MPV“) až po zápis na list vlastníctva na základe geometrických plánov.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

### Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA

- 3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 časti 2 je uvedená v Súťažných podkladoch.
- 3.2 Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spočíva :
- vo vypracovaní a doručení návrhov zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich nájomných zmluvách a výziev s doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým alebo právnickým osobám, v prípade potreby vypracovanie a doručenie aj iných zmlúv alebo vykonanie iných právnych úkonov potrebných na získanie práva k pozemkom,
  - v zabezpečení uzavretia zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich nájomných zmluvách, iných zmlúv alebo dodanie právoplatného vyvlastňovacieho rozhodnutia, resp. právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vyvlastňovanej nehnuteľnosti.
- Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi pozemky zbavené práv tretích osôb. Uvedené zmluvy, resp. iné právne úkony sa budú realizovať na základe overených geometrických plánov pre trvalý záber a geometrických plánov pre dočasný záber vypracovaných v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie.

- 3.3 Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva spočíva:
- v prerokovaní právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, vyhotovenie a doručenie návrhov zmlúv a výziev doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým alebo právnickým osobám,
  - v zabezpečení uzavretia kúpnych zmlúv a nájomných zmlúv alebo v dodaní právoplatného súdneho rozhodnutia, v prípade potreby v zabezpečení aj iných zmlúv alebo vykonanie iných úkonov potrebných na získanie práva k pozemkom v zmysle príslušných geometrických plánov a znaleckých posudkov,
  - vo vypracovaní, doručení a zabezpečení uzavretia zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby na základe porealizačných geometrických plánov a znaleckých posudkov, ktoré zhotoviteľovi dodá objednávateľ,
  - v podaní návrhu na vklad alebo zápis do katastra nehnuteľností a zabezpečení vystavenia listov vlastníctva na objednávateľa.
- 3.4 Čiastkové činnosti :
- Zabezpečenie evidenčných zápisov overených geometrických plánov do katastra nehnuteľnosti.
  - Zhotoviteľ je povinný kúpne zmluvy vyhotovovať minimálne v štyroch rovnopisoch (pre potreby zápisu do KN i viac podľa počtu spoluvlastníkov), pričom dve vyhotovenia originálnych kúpnych zmlúv s úradne osvedčeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti/í je povinný zaslať na zápis do katastra nehnuteľností, jedno originálne vyhotovenie kúpnej zmluvy s osvedčeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti/í s príslušnou kópiou návrhu na povolenie vkladu je povinný odovzdať objednávateľovi pre potreby majetkovoprávneho oddelenia a jedno originálne vyhotovenie kúpnej zmluvy je povinný odovzdať vlastníkovi nehnuteľnosti/í.
  - Zmluvy, ktoré nepôjdu na zápis do katastra nehnuteľností - nájomné zmluvy a všetky ostatné zmluvy, ktoré bude potrebné v rámci majetkovoprávneho vysporiadania s vlastníkmi uzatvoriť je zhotoviteľ povinný vyhotoviť každú v štyroch exemplároch. Tri originálne vyhotovenia z každej takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi spolu s príslušnými dokladmi o vlastníctve pre potreby majetkovoprávneho oddelenia a jedno originálne vyhotovenie zmluvy je povinný odovzdať vlastníkovi nehnuteľnosti/í.
  - Na základe porealizačných geometrických plánov pre zriadenie vecného bremena je zhotoviteľ povinný zabezpečiť rokovanie s vlastníkmi nehnuteľností, vyhotovenie zmlúv o zriadení vecného bremena (ďalej len „ZoVB“), resp. zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (ďalej len „ZoVB v prospech tretej osoby“) a výziev, ich doručenie doručenkou do vlastných rúk vlastníkom nehnuteľností a zabezpečenie uzavretie ZoVB, resp. ZoVB v prospech tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný zmluvy o zriadení vecného bremena vyhotovovať minimálne v štyroch rovnopisoch (pre potreby zápisu do KN i viac podľa počtu spoluvlastníkov), pričom dve vyhotovenia originálnych zmlúv s úradne osvedčeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti/í je povinný zaslať na zápis do katastra nehnuteľností, jedno originálne vyhotovenie zmluvy s osvedčeným podpisom vlastníka nehnuteľnosti/í s príslušnou kópiou návrhu na povolenie vkladu je povinný odovzdať objednávateľovi pre potreby majetkovoprávneho oddelenia a jedno originálne vyhotovenie zmluvy je povinný odovzdať vlastníkovi nehnuteľnosti/í.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný dodať originály všetkých obojstranne podpísaných typov zmlúv (kúpne, nájomné a iné zmluvy) v zoskenovanej podobe v programe **IfranView** vo formáte **tiff** a v programe **Word** vo formáte **doc** (bez podpisov zmluvných strán) uložené na CD nosiči. CD nosič s uvedenými zmluvami zoskenovanými v príslušných formátoch je zhotoviteľ povinný objednávateľovi dodať pred podaním návrhu na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností pre účely zverejnenia zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Po uverejnení zmlúv v CRZ objednávateľ zabezpečí potvrdenie o ich uverejnení. Toto potvrdenie bude tvoriť prílohu návrhu na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy, verejnej správy, územnej samosprávy, súdmi a inými právnymi subjektmi. V osobitných prípadoch zabezpečí konanie o súdnej úschove finančných náhrad na základe právoplatného vyvlastňovacieho konania, resp. súdneho konania (zákon č. 129/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ sa zaväzuje zastupovať objednávateľa na príslušných orgánoch vo všetkých správnych a súdnych konaniach vedených v súvislosti s majetkovoprávnou prípravou k stavebnému povoleniu a následným kompletným majetkovoprávnym vysporiadaním predmetnej stavby rýchlostnej cesty až do právoplatného skončenia.
- 3.7 Všetky úkony súvisiace s vyhotovením požadovaného majetkovoprávneho vysporiadania bude zhotoviteľ vykonávať v mene objednávateľa na základe udelenej plnej moci, ktorú mu objednávateľ udelí po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.



#### Čl. 4

#### PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady:
- Vzory tabuliek pre napĺňanie dát do programu ESID pre daňové a registratúrne účely, ktoré poskytne objednávateľ, resp. do iného dohodnutého programu podľa požiadavky objednávateľa,
  - Vzory zmlúv na majetkovoprávne vysporiadanie, ktoré bude zhotoviteľ povinný používať.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela, a ktorá by mohla mať alebo bude mať vplyv na predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa článku 5 časti 2.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňajúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

#### Čl. 5

#### TERMÍN PLNENIA DIEĽA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať **kompletné MPV najneskôr do 31.12.2014.**
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný doručovať do sídla objednávateľa podpísané zmluvy v počtoch vyhotovení uvedených v článku 3 časti 2 do 10 dní odo dňa ich podpísania oboma zmluvnými stranami za účelom ich včasného zverejnenia v CRZ. O odovzdaní a prevzatí podpísaných zmlúv podpíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Súčasťou odovzdávaných zmlúv budú vyplnené tabuľky uvedené v bode 4.1 článku 4 časti 2. Na účely fakturácie sa za deň dodania nepovažuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa tohto bodu.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do desiatich dní po skončení kalendárneho štvrtroku zoznam skutočne vykonaných úkonov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania za účelom jeho schválenia. Zoznam je zhotoviteľ povinný predložiť v tabuľkovej forme. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň schválenia zoznamu skutočne vykonaných úkonov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania za kalendárny štvrtrok.

#### Čl. 6

#### CENA DIEĽA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. V cene diela nie sú zahrnuté správne, súdne poplatky a poplatky za znalecké posudky.
- 6.2 Cena za MPV jedného vlastníka bez DPH v EUR:
- |   |         |
|---|---------|
| A: Zabezpečenie LV a PK vložky, výpisu zo železničnej knihy (resp. dedičského rozhodnutia),<br>Lustrácia LV, PK vložky alebo vložky zo železničnej knihy<br>Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľností alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť výstavbou priamo dotknuté | 44,00 € |
| B: Vypracovanie a doručenie návrhu zmluvy a výzvy doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým a právnickým osobám + tabuľka v exceli  | 2,00 €  |
| C: Zabezpečenie uzavretia zmluvy, pri neuzavretej zmluve dodanie právoplatného vyvlastňovacieho rozhodnutia, alebo právoplatného súdneho rozhodnutia  | 95,00 € |
| D: Podanie návrhu na zápis zmluvy do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva   | 2,00 €  |
| E: Zastupovanie pred súdmi v rámci celého konania, alebo zabezpečenie celého konania o súdnej úschove   | 2,00 €  |
- Celková cena za MPV bude stanovená podľa skutočného počtu vysporiadaných vlastníkov.

- 6.3 Pri MPV je dohodnutá cena za vysporiadanie jedného vlastníka podľa špecifikácie predmetu zmluvy podľa tabuľky, ktorá ako príloha č. 8 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.4 Ak sa vlastníkovi zaberá v jednom katastrálnom území väčší počet pozemkov, uvedú sa všetky pozemky v jednej zmluve, resp. pre výpočet ceny sa rátajú zmluvy s ním uzatvorené ako jedna merná jednotka. V osobitných prípadoch, ako je zmena podkladov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu, zmeny záberov pozemkov, novoobjavené vlastníctvo a pod., je možné zabezpečiť s vlastníkom pre konkrétny typ záberu uzatvorenie viacerých zmlúv, v takomto prípade si zhotoviteľ bude fakturovať skutočne vykonané práce podľa príslušných položiek podľa bodu 6.2 tohto článku.
- 6.5 Zmluva so Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len „SPF“), predmetom ktorej bude prevod vlastníctva k všetkým pozemkom nezistených vlastníkov, resp. prevod vlastníctva k všetkým pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, neknihovaných pozemkov a pod. sa počíta ako jedna zmluva. Zmluva so SPF, predmetom ktorej bude nájom všetkých pozemkov nezistených vlastníkov, resp. nájom všetkých pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, neknihovaných pozemkov a pod. sa počíta ako jedna zmluva. Obdobne sa postupuje pri návrhu na vyvlastnenie, resp. na obmedzenie vlastníckeho práva nezistených vlastníkov zastúpených SPF a pri návrhu na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
- 6.6 Kúpna zmluva alebo nájomná zmluva pri spoločnej nehnuteľnosti uzatvorená podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločnostiach v znení neskorších predpisov sa počíta ako súčet príslušných merných jednotiek. Obdobne sa postupuje pri návrhu na vyvlastnenie, resp. na obmedzenie vlastníckeho práva. V návrhu na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností budú uvedení všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti a tento návrh so všetkými spoluvlastníkmi sa bude počítať ako jedná merná jednotka. Pri ZoVB, resp. ZoVB v prospech tretej osoby sa použije rovnaký postup ako pri spoločnej nehnuteľnosti.
- 6.7 Výsledná cena za majetkovoprávne vysporiadanie sa stanoví ako súčet súčínov ceny prác a počtu merných jednotiek v jednotlivých častiach A – E podľa špecifikácie v bode 6.2 tohto článku.
- 6.8 Prípadné navyše služby, ktorých potreba vyplynie v priebehu vypracovania majetkovoprávnej dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom sa vykonajú po uzatvorení dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude špecifikovaný rozsah plnenia a navyše práce sa ocenia spôsobom podľa tejto zmluvy v jednotkových cenách podľa bodu 6.2 tohto článku.
- 6.9 Správne poplatky, ktoré bude potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť pri podávaní návrhov zmlúv na zápis do katastra nehnuteľností, resp. pri podávaní návrhov na začatie vyvlastňovacích konaní uhradí zhotoviteľ. Následne objednávateľ zhotoviteľovi uhradí hodnotu zakúpených kolkových známok použitých pri podávaní návrhov zmlúv na zápis do katastra nehnuteľností, resp. pri podávaní návrhov na začatie vyvlastňovacích konaní, a to na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ v písomnej forme doručí objednávateľovi. Prílohou každej faktúry musí byť doklad (potvrdenie) o zakúpení kolkových známok a kópie návrhov na zápis zmlúv do katastra nehnuteľností s vyznačeným potvrdením o prijatí návrhu príslušnou správou katastra nehnuteľností, resp. kópie návrhov na začatie vyvlastňovacích konaní s písomným (vyznačeným) potvrdením o prijatí návrhov príslušným úradom, ktorý bude o vyvlastňovaní rozhodovať.
- 6.10 Súdne poplatky, ktoré bude potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť pri podávaní návrhov na začatie súdnych konaní uhradí zhotoviteľ. Následne objednávateľ zhotoviteľovi uhradí hodnotu súdnych poplatkov za podanie návrhov na začatie súdnych konaní, a to na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ v písomnej forme doručí objednávateľovi. Prílohou každej faktúry musí byť doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku a kópie návrhov na začatie súdnych konaní s vyznačeným potvrdením o prijatí návrhu príslušným súdom, ktorý bude vo veci návrhu konať a rozhodovať.
- 6.11 Vypracovanie znaleckých posudkov potrebných pre majetkovoprávnu prípravu k stavebnému povoleniu a následné kompletne majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby zabezpečí zhotoviteľ. Znalca, ktorý má vypracovať znalecké posudky určí objednávateľ. Následne objednávateľ zhotoviteľovi uhradí hodnotu znaleckých posudkov, a to na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ v písomnej forme doručí objednávateľovi. Prílohou každej faktúry musí byť doklad osvedčujúci zaplatenie znaleckých posudkov a kópie predných strán znaleckých posudkov.
- 6.12 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.13 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na

číslo zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby podľa číselníka stavieb u objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť/priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V4\_3 náklady na vyhotovovanie zmlúv o budúcich zmluvách, V11\_2 nájomných zmlúv a vecných bremien a náklady na kolky V13. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa zastavuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni písomného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

## Čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela, resp. jeho časti podľa bodu 5.1 článku 5 časti 2 z dôvodov na strane zhotoviteľa zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 Eur (slovom desať eur) za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade ak z dôvodu na strane zhotoviteľa dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu katastrálneho alebo vyvlastňovacieho konania zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur (slovom päťdesiat eur) za každé takéto prerušenia alebo zastavenie.
- 7.3 V prípade ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi podpísané zmluvy v počtoch vyhotovení uvedených v článku 3 časti 2 do 10 dní odo dňa ich podpísania oboma zmluvnými stranami zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania s doručením podpísaných zmlúv.
- 7.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 časti 2 zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.5 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.6 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

## Čl. 8 OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 časti 2, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo ukončené kompletne MPV.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch a že bude bez vád.
- 8.6 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností.

### ČASŤ 3

#### Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 časti 3 (ďalej len „dielo“). Objávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 časti 3.

#### Čl. 2 PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná **inžiniersku činnosť** (ďalej len „IČ“) na zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a na zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“.
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

#### Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA

- 3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 časti 3 je uvedená v Súťažných podkladoch.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa bodu 3.1 tohto článku v rámci dohodnutej ceny takto:
- 3.2.1 v rámci inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
- 1 x originál protokolu o vykonaní štátnej expertízy
  - 1 x originál právoplatného územného rozhodnutia
  - 1 x dokumentáciu pre územné rozhodnutie potvrdenú stavebným úradom
  - 1 x originál žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
  - 2 x notársky overené kópie právoplatného územného rozhodnutia
- 3.2.2 v rámci inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
- 1 x originál žiadosti o vydanie stavebného povolenia
  - 1 x originál právoplatného stavebného povolenia
  - 2 x dokumentáciu pre stavebné povolenie potvrdenú stavebným úradom
  - 1 x originál rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF a LPF
  - 2 x notársky overené kópie právoplatného stavebného povolenia

#### Čl. 4 SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela, a ktorá by mohla mať alebo bude mať vplyv na predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa článku 5 časti 3 tejto zmluvy.
- 4.2 Objávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.3 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

#### Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať IČ pre územné konanie najneskôr do **04. 10. 2012**.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť protokol o vykonaní štátnej expertízy do **17. 07. 2012**.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DUR do **11. 07. 2012**.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť **právoplatné územné rozhodnutie** do **04. 10. 2012**.

- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať IČ pre stavebné konanie najneskôr do **28. 03. 2013**.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k DSP do **28. 02. 2013**.
- 5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF najneskôr do **28. 02. 2013**.
- 5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF najneskôr do **28. 02. 2013**.
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť **právoplatné stavebné povolenie do 01.04.2013**.
- 5.10 O odovzdaní a prevzatí diela ako aj jeho čiastkových plnení v zmysle bodov 5.1 až 5.9 tohto článku spíšu zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Na účely tejto zmluvy sa za deň dodania nepovažuje deň podpísania preberacieho protokolu k čiastkovým plneniam uvedeným v bodoch 5.2, 5.3, 5.6, 5.7 a 5.8 tohto článku.

## Čl. 6

### CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. V cene diela nie sú zahrnuté správne a súdne poplatky.
- 6.2 a) Cena za IČ pre územné konanie bez DPH: 24 305,00 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 4 861,00 €  
 Cena za IČ pre územné konanie spolu vrátane DPH v EUR: 29 166,00 €  
 (slovom: dvadsaťdeväťtisícjedenstošesťdesiatšesť eur);
- b) Cena za IČ pre stavebné konanie bez DPH: 25 988,20 €  
 Sadzba DPH 20% v EUR: 5 197,64 €  
 Cena za IČ pre stavebné konanie spolu vrátane DPH v EUR: 31 185,84 €  
 (slovom: tridsaťjedentisícjedenstoosemdesiatpäť celých a osemdesiatštyri stotín eura);
- c) Cena diela celkom bez DPH v EUR: 50 293,20 €  
 Sadzba DPH 20%: 10 058,64 €  
**Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: 60 351,84 €**  
 (slovom: šesťdesiatštyristopäťdesiatjeden celých a osemdesiatštyri stotín eura);
- Rozpočet tvorí ako príloha č. 8 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. a) tohto článku za IČ pre územné konanie na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 časti 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. b) tohto článku za IČ pre stavebné konanie na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 časti 3 tejto zmluvy.
- 6.4 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy a predmet fakturácie v zmysle článku 2 tejto zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby pridelené objednávateľom 1533. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na: náklady na inžiniersku činnosť (IČ) pre územné konanie /V1\_4/, náklady na inžiniersku činnosť (IČ) pre stavebné konanie /V1\_4/. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 6.6 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu k dielu podľa bodu 5.4 a 5.9 článku 5 časti 3 tejto zmluvy.
- 6.7 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z časti 3 tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie

tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

- 6.8 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa.
- 6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

#### Čl. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela, resp. akejkoľvek jeho časti v súlade s článkom 5 časti 3 tejto zmluvy zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela celkom za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 časti 3 zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

#### Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom boli preberacie protokoly k dielu podľa bodu 5.4 a 5.9 článku 5 časti 3 podpísané zmluvnými stranami, a skončí dňom vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“, a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 8.5 Objávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

#### Čl. 9 OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

## ČASŤ 4

### Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať
- autorský dozor (ďalej aj „AD“) počas trvania stavby**  
„Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“
- 1.2 Predmetom výkonu autorského dozoru je dohľad nad dodržiavaním dokumentácie na stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku počas realizácie stavby a to najmä:
- dohľad nad dodržiavaním celkovej koncepcie diela a jeho podrobných riešení
  - dohľad nad dodržiavaním predpokladaných a stanovených technológií
  - dohľad nad dodržiavaním stanovísk výstavbou dotknutých subjektov
  - prijímanie stanovísk k prípadným zmenám riešenia diela
- 1.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za výkon činnosti autorského dozoru cenu uvedenú v článku 4 časti 4 spôsobom dohodnutým v časti 4 tejto zmluvy.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“ v predpokladanej lehote 30 mesiacov (ďalej len „stavebné práce“).
- 1.5 Predpokladaný počet hodín výkonu činností autorského dozoru je minimálne 800 hodín.
- 1.6 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác.
- 1.7 Objednávateľ sa zaväzuje zaslať písomné oznámenie uvedené v bode 1.6 tohto článku doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr dvadsať dní pred začatím stavebných prác.
- 1.8 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“.

### Čl. 2 OBSAH A ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 2.1 Obsahom výkonu občasného autorského dozoru budú tieto činnosti:
- a) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v dokumentácii na ponuku (DP), v stavebných povoleniach, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
  - b) na základe požiadavky objednávateľa vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) z technického a technologického hľadiska,
  - c) na základe požiadavky objednávateľa vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby k tzv. „naviac prácam“, t.j. prácam nad rozsah dokumentácie na ponuku (DP),
  - d) účasť na kontrolných dňoch stavby a pracovných rokovaní zvolaných objednávateľom,
  - e) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane účasti na kolaudácii v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  - f) na požiadanie objednávateľa, prípadne stavebného dozoru, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby,
  - g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku navrhovať doplnkové riešenia,
  - h) v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
  - i) na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch,
  - j) v prípade potreby, na požiadanie objednávateľa, vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie (DSP, DP, DRS),

- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, na požiadanie objednávateľa v spolupráci so zhotoviteľom stavby navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny,
  - l) na základe písomnej výzvy stavebného dozoru sa autorský dozor dostavi v prípade problémov na stavbu do 3-och pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch je možné termín výkonu autorského dozoru vzájomne dohodnúť,
  - m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, resp. ich stanoviska, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu a zložitosti riešeného problému,
  - n) na požiadanie objednávateľa zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
  - o) odsúhlasenie dokumentáciu skutočného realizovania stavby v termínoch podľa vzájomnej dohody. Podkladom pre odsúhlasenie je dokumentácia podľa článku 3 bod 3.1 časti 4.
  - p) vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru a priebehu stavby, a to 21 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu na stavbu.
- 2.2 Súčasťou výkonu autorského dozoru je aj príprava na výkon autorského dozoru, potrebné konzultácie a preštudovanie poskytnutých podkladov od objednávateľa, ku ktorým sa má zhotoviteľ vyjadriť.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení stavebných prac spolupracovať na záverečnom technicko – ekonomickom vyhodnotení stavby (TEV) na požiadanie objednávateľa.

### Čl. 3

#### PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 3.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je:  
- dokumentácia na ponuku.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude zhotoviteľa pravidelne, včas a bez odkladov informovať o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

### Čl. 4

#### CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za výkon autorského dozoru podľa článku 2 časti 4 je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania autorského dozoru.
- 4.2 Cena AD bez DPH v EUR: 17 528,00 €  
Sadzba DPH 20% v EUR: 3 505,60 €  
Cena AD vrátane DPH v EUR: 21 033,60 €  
(slovom: dvadsaťjedentisícitridsaťtri celých a šesťdesiat stotín eura)
- 4.3 Zhotoviteľ vyhotoví mesačné faktúry za výkon autorského dozoru na základe objednávateľom podpísaného súpisu vykonaných prác autorského dozoru. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis vykonaných prác do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Na účely fakturácie sa za deň dodania služby považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba podľa predmetu časti 4 tejto zmluvy vzťahuje.
- 4.4 Faktúra a príslušný súpis, podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené.
- 4.5 Súpis musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby pre stavbu „Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná“ a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 4.6 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa podľa bodu 4.4 tohto článku.
- 4.7 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme v zmysle bodu 4.3 tohto článku do 15 dní odo dňa dodania služby, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.



- 4.8 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy a predmet fakturácie v zmysle článku 2 časti 4. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby pridelené objednávatelom 1533. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V5 – Autorský dozor. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah činnosti autorského dozoru vyplývajúci z časti 4 tejto zmluvy, ak v vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac činnosť“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac činnosťou alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosť.
- 4.10 Cenu činnosti autorského dozoru uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosť bude mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 4.11 V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 4.10 tohto článku naviac činnosť bude ocenená podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 4.12 V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 4.10 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac činnosti podľa bodu 4.11 tohto článku, bude táto ocenená v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

#### Čl. 5 SANKCIE

- 5.1 Objednávatelovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu za:
- neospravedlivenú neúčasť autorského dozoru na kontrolných dňoch stavby vo výške 300 € (slovom tristo eur) za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nesplní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcej mu z časti 4 tejto zmluvy, okrem prípadov uvedených v písmene b) a c) tohto bodu,
  - nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do jeho pôsobnosti podľa tejto zmluvy, alebo nesplní si inú povinnosť vyplývajúcu mu z časti 4 tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávatelom alebo v lehote vyplývajúcej z časti 4 tejto zmluvy vo výške 332 € (slovom tristo tridsaťdva eur),
  - neospravedlivenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok vo výške 332 € (slovom tristo tridsaťdva eur), ak bol vyzozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 5.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 4 časti 4 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 5.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

#### Čl. 6 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri výkone AD s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, je povinný riadiť sa zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán, potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávatelom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť výsledky predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely, ako tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa. V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, v lehote uvedenej v písomnom oznámení podľa bodu 6.4 tohto článku, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

## ČASŤ 5

### Čl. 1 DORUČOVANIE

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

### Čl. 2 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 1 500 000 EUR (slovom jeden milión päťstotisíc EUR).
- 2.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

### Čl. 3 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 3.1 Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby vykonať všetky potrebné opatrenia podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Ofertu, či iný návrh a/alebo podnet je povinný predložiť zhotoviteľ.

### Čl. 4 ZÁNIK ZMLUVY

- 4.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 4.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upraví aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 4.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje najmä:
  - a) časť 1 – neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.10 článku 5 časť 1 tejto zmluvy,
  - b) časť 2 – ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s doručením podpísaných zmlúv o viac ako 30 dní odo dňa ich podpísania zmluvnými stranami,
  - c) časť 4 – ak zhotoviteľ porušuje povinnosti uvedené v článku 2 bod 2.1 časť 4 tejto zmluvy,

- d) časť 5 - nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 2.1 článku 2 časť 5 tejto zmluvy alebo ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.
- 4.4 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 4.5 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie niektorého z predmetov tejto zmluvy (časť 1 článok 2, časť 2 článok 2, časť 3 článok 2 a časť 4 článok 2) z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 4.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 4.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 4.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 4.8 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal predmet tejto zmluvy (časť 1 článok 2, časť 2 článok 2, časť 3 článok 2 a časť 4 článok 2) doručením do jeho sídla, resp. tie časti, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu ich rozpracovaniu ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 4.10 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 4.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny uvedenú v článku 6 bod 6.2 časti 1, v článku 6 bod 6.2 časti 2, v článku 6 bod 6.2 časti 3 a v článku 4 bod 4.2 časti 4 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu zastavenia prác a uplynutia výpovednej lehoty.

## Čl. 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 5.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny aj zdôvodnenie ceny.
- 5.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 5.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 5.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 5.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
č.1 – harmonogram všetkých prác zhotoviteľa  
č.2 – harmonogram prác zhotoviteľa na DUR  
č.3 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSZ

- č.4 – harmonogram vydania územného rozhodnutia
- č.5 – harmonogram prác zhotoviteľa na DSP
- č.6 – harmonogram vydania stavebného povolenia
- č.7 – harmonogram prác zhotoviteľa na DP
- č.8 – špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (tabuľky 1.1 až 1.8)

5.7 Súčasťou tejto zmluvy sú aj súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa.

V Bratislave dňa **28. 10. 2011**

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky:

*Národná ústredná organizácia za dopravu a.s.*  
*BRATISLAVA*

**Ing. Ján Kotuľa**

predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

**Ing. Viktória Chomová**

členka predstavenstva

V Bratislave dňa *26. 10. 2011*

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
Divízia Bratislava I.

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**

predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Sechný**

podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.



## Príloha č.1




2012	Čtvrť 4, 2012			Čtvrť 1, 2013			Čtvrť 2, 2013			Čtvrť 3, 2013			Čtvrť 4, 2013			Čtvrť 1, 2014			Čtvrť 2, 2014			Čtvrť 3, 2014			Čtvrť 4, 2014			Čtvrť 1, 2015		
VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.

880 dny

Poznámka.

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezahŕňa prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác

dny

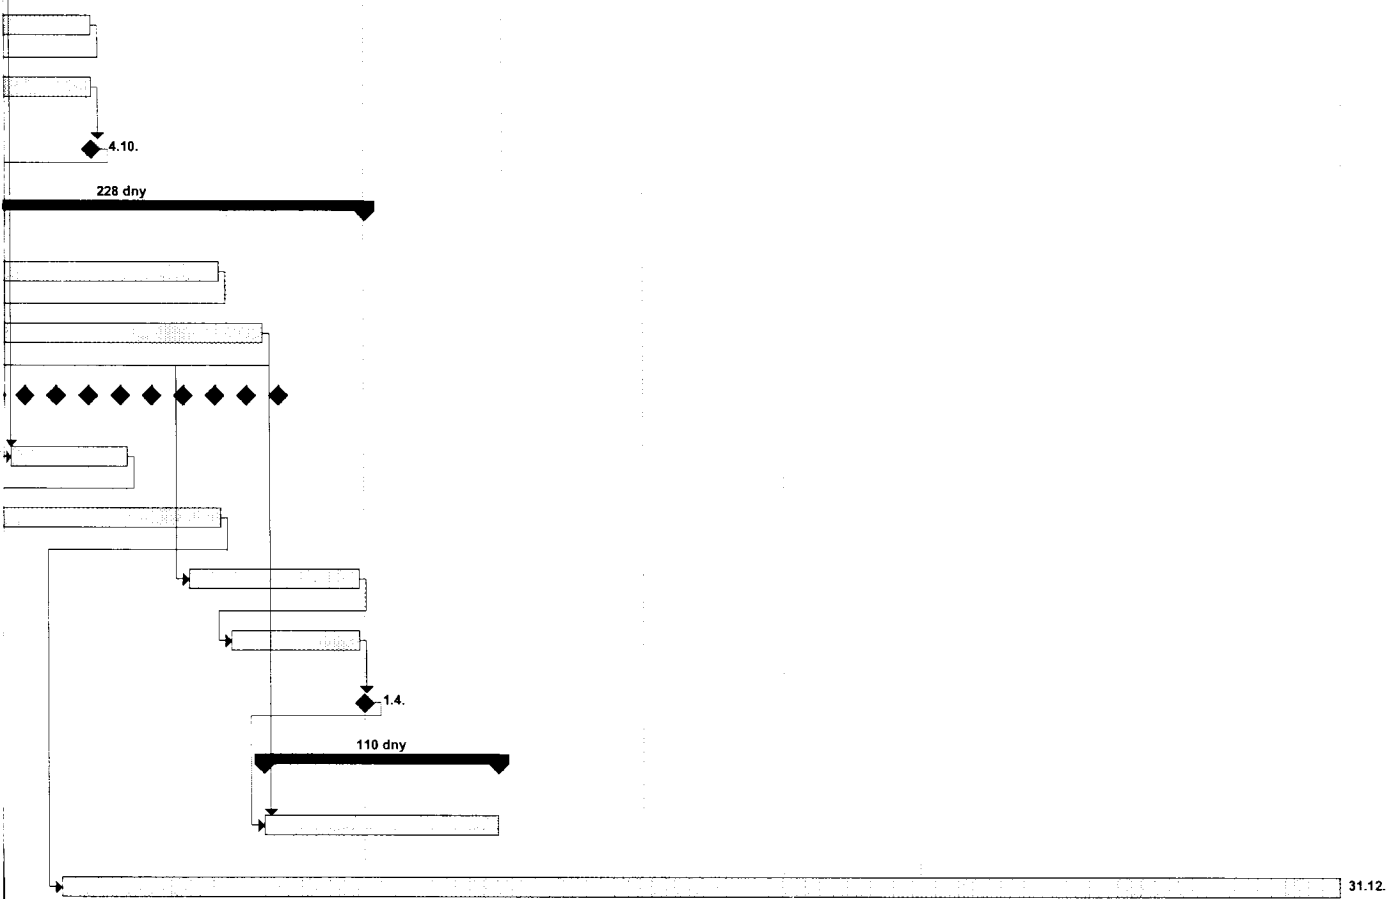

## HARMONOGRAM PRÁC ZHOTOVITEĽA NA DÚR

DÚR	2011		2012				
	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.
☞ viazanosť ponúk				29.02. ●			
☞ uzavretie ZoD	2.11.						
☞ A. Sprievodná správa					■		
☞ B. Technická správa					■		
☞ C. Ekonomická správa						■	
☞ D. Výkresy	■	■	■	■	■	■	■
☞ E. Doklady						■	■
☞ F. Podklady a prieskumy							
F.1 Dopravno-inžiniersky prieskum			■	■			
F.2 Pedologický prieskum			■	■			
F.3 Inventarizácia biotopov európ. význ.			■	■			
F.4 Invent. a spoloč. ohodnotenie drevín			■	■			
F.5 Architektonická štúdia					■	■	
F.6 Hluková štúdia			■	■			
F.7 Exhalačná štúdia				■	■		
F.8 Inžinierskogeologický prieskum			■	■			
F.9 Koróznny a geoelektrický prieskum				■	■		
F.10 Seizmický prieskum					■	■	
F.11 Archeologický prieskum					■	■	
F.12 Geodetický elaborát	■	■	■	■	■	■	■
☞ G. Cena verejnej práce						■	■
☞ H. Záber pozemkov					■	■	■
☞ J. Vplyv stavby na ŽP					■	■	
☞ K. Projekt monitoringu					■	■	
Informačný bulletin						■	■
☞ termíny pracovných rokovaní		●	●	●	●	●	●
☞ expedícia						● PRE IČ	● DÚR



# Harmonogram prác zhotoviteľa na DUR

## Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	2011			Čtvrť 1, 2012			Čtvrť 2, 2012			Čtvrť		
					VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.		V.	VI.
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	880 dny	19.8.11	31.12.14												
2		0 dny	31.8.11	31.8.11												
3		140 dny	19.8.11	29.2.12												
4		1 den	2.11.11	2.11.11												
5	Príprava stavby v stupni UR (DSZ)	241 dny	3.11.11	4.10.12												
6	Geodetický elaborát (zameranie)	14 týdny	3.11.11	8.2.12												
7	Predbežný IGHG prieskum a ďalšie prieskumy a štúdie	12 týdny	5.1.12	28.3.12												
8	Spracovanie dokumentácie DÚR	26 týdny	3.11.11	2.5.12												
9	Termíny pracovných rokovaní v stupni DÚR	106 dny	23.11.11	18.4.12												
18		26 týdny	3.11.11	2.5.12												
19		121 dny	23.11.11	9.5.12												
29		8 týdny	8.3.12	2.5.12												
30		54 dny	3.5.12	17.7.12												
31		8 týdny	3.5.12	27.6.12												
32		14 dny	28.6.12	17.7.12												
33		24 týdny	19.4.12	3.10.12												
34		12 týdny	12.7.12	3.10.12												
35		1 den	4.10.12	4.10.12												
36		228 dny	17.5.12	1.4.13												
37		32 týdny	17.5.12	26.12.12												
38		36 týdny	18.5.12	24.1.13												
39		166 dny	18.6.12	4.2.13												
52		11,2 týdny	10.8.12	26.10.12												
53		32 týdny	18.5.12	27.12.12												
54		16 týdny	7.12.12	28.3.13												
55		12 týdny	4.1.13	28.3.13												
56		1 den	1.4.13	1.4.13												
57		110 dny	25.1.13	27.6.13												
58		22 týdny	25.1.13	27.6.13												
59		600 dny	13.9.12	31.12.14												


Viazanosť ponuky uchádzača

29.2.


2.11.

241 dny

Geodetický elaborát (zameranie)




Predbežný IGHG prieskum a ďalšie prieskumy a štúdie



Spracovanie dokumentácie DÚR



Termíny pracovných rokovaní v stupni DÚR



3, 2012	Čtvrť 4, 2012				Čtvrť 1, 2013			Čtvrť 2, 2013			Čtvrť 3, 2013			Čtvrť 4, 2013			Čtvrť 1, 2014			Čtvrť 2, 2014			Čtvrť 3, 2014			Čtvrť 4, 2014			Čtvrť 1, 2015	
VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II

880 dny

Poznámky:

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác

34 dny

4.10.

228 dny

1.4.

110 dny

31.12.


## Príloha č.3

## HARMONOGRAM PRÁČ ZHOTOVITEĽA NA DSZ

DSZ	2 0 1 1		2 0 1 2				
	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.
☞ viazanosť ponúk				29.02. ●			
☞ uzavretie ZoD	2.11.						
☞ A. Sprievodná správa							
☞ B. Technická správa, časť B.1,B.2							
☞ C. Ekonomická správa							
☞ D. Výkresy							
☞ E. Doklady							
☞ F. Podklady a prieskumy							
F.1 Dopravno-inžiniersky prieskum							
F.2 Pedologický prieskum							
F.3 Inventarizácia biotopov európ. význ.							
F.4 Invent. a spoloč. ohodnotenie drevín							
F.5 Architektonická štúdia							
F.6 Hluková štúdia							
F.7 Exhalačná štúdia							
F.8 Inžinierskogeologický prieskum							
F.9 Korózný a geoelektrický prieskum							
F.10 Seizmický prieskum							
F.11 Archeologický prieskum							
F.12 Geodetický elaborát							
☞ G. Cena verejnej práce							
☞ termíny pracovných rokovaní		●	●	●	●	●	●
☞ expedícia						● PRE IČ	● DSZ

# Harmonogram prác zhotoviteľa na DSZ Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	2011											
					VIII	IX	Čtvrť 4, 2011			Čtvrť 1, 2012			Čtvrť 2, 2012			Čtvrť 3, 2012
					X	XI	XII	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.		
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	880 dny	19.8.11	31.12.14												
2	Výpis na zverejnenie stanoviska MDVaRR Zariadenie (pre časť DPA ukončený v d. 8.1.2012)	0 dny	31.8.11	31.8.11												
3	Výpis na projekty v štádiu	140 dny	19.8.11	29.2.12												
4	Príloha 2	1 den	2.11.11	2.11.11												
5	Príprava stavby v štádiu UA (DSZ)	241 dny	3.11.11	4.10.12												
6	Výpis na projektovú dokumentáciu	14 týždny	3.11.11	8.2.12												
7	Pracovný plán DSZ (preukomunikácia projektov v štádiu)	12 týždny	5.1.12	28.3.12												
8	Stanovisko externého experta (EaP)	26 týždny	3.11.11	2.5.12												
9	Termíny pracovných rokovaní v štádiu DSZ	106 dny	23.11.11	18.4.12												
18	Spracovanie dokumentácie DSZ	26 týždny	3.11.11	2.5.12												
19	Termíny pracovných rokovaní v štádiu DSZ	121 dny	23.11.11	9.5.12												
29	Stanovisko externého experta (EaP) (stanovisko externého experta)	8 týždny	8.3.12	2.5.12												
30	MDVaRR / Štátna expertiza	54 dny	3.5.12	17.7.12												
31	Vypracovanie expertízneho posudku (vrátane možnosti vypracovania expertízneho protokolu externou organizáciou)	8 týždny	3.5.12	27.6.12												
32	Vypracovanie expertízneho protokolu k štátnej expertíze	14 dny	28.6.12	17.7.12												
33	Stanovisko externého experta (EaP) (stanovisko externého experta)	24 týždny	19.4.12	3.10.12												
34	Stanovisko externého experta (EaP)	12 týždny	12.7.12	3.10.12												
35	Nadobudnutie právoplatného územného rozhodnutia	1 den	4.10.12	4.10.12												
36	Príprava stavby v štádiu DSP (DP)	228 dny	17.5.12	1.4.13												
37	Príprava stavby v štádiu DSP (DP)	32 týždny	17.5.12	26.12.12												
38	Príprava stavby v štádiu DSP (DP)	36 týždny	18.5.12	24.1.13												
39	Termíny pracovných rokovaní v štádiu DSP (DP)	166 dny	18.6.12	4.2.13												
52	Príprava stavby v štádiu DSP (DP) (výpis na projektovú dokumentáciu)	11,2 týždny	10.8.12	26.10.12												
53	Príprava stavby v štádiu DSP (DP)	32 týždny	18.5.12	27.12.12												
54	Príprava stavby v štádiu DSP (DP) (výpis na projektovú dokumentáciu)	16 týždny	7.12.12	28.3.13												
55	Príprava stavby v štádiu DSP (DP)	12 týždny	4.1.13	28.3.13												
56	Vydanie právoplatného územného rozhodnutia	1 den	1.4.13	1.4.13												
57	Príprava DP	110 dny	25.1.13	27.6.13												
58	Spracovanie DSZ (preukomunikácia projektov v štádiu)	22 týždny	25.1.13	27.6.13												
59	Kompletné majetkové opravné usporiadanie neobčianin a zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva	600 dny	13.9.12	31.12.14												

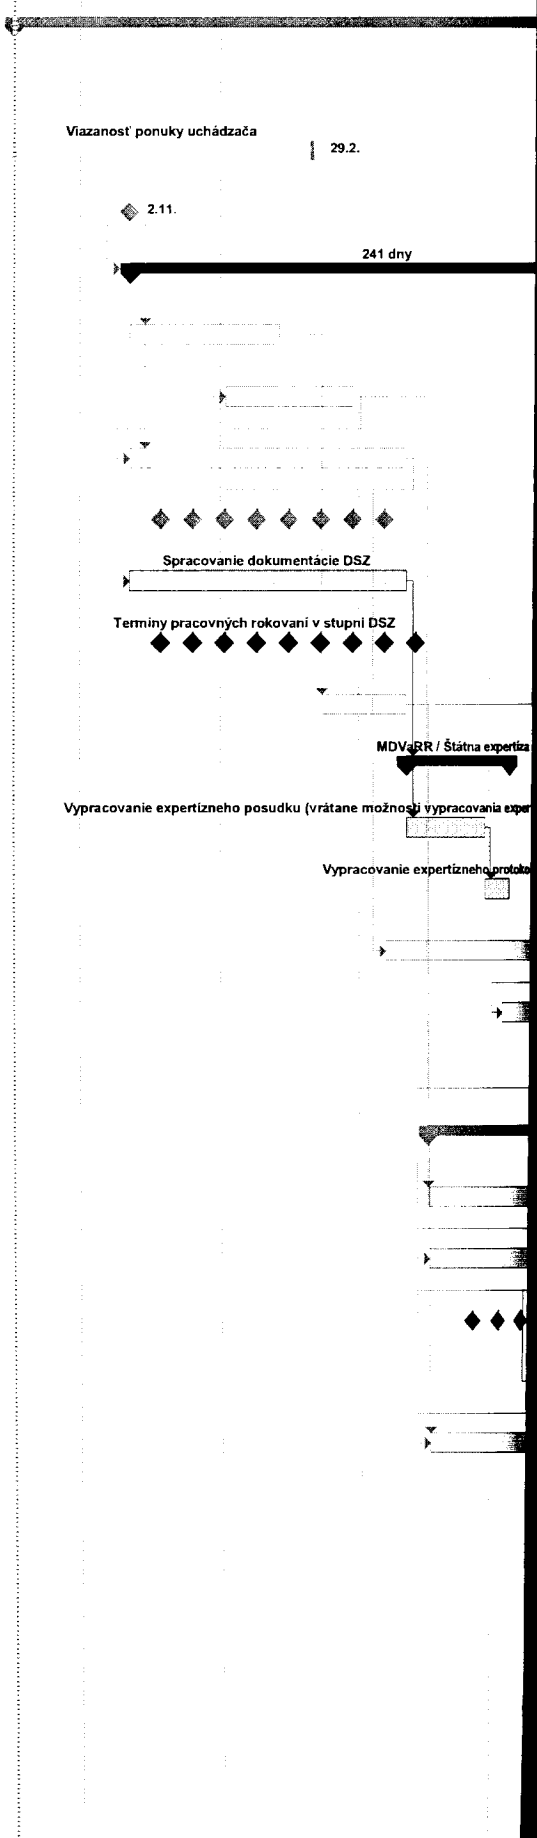

012	Čtvrť 4, 2012			Čtvrť 1, 2013			Čtvrť 2, 2013			Čtvrť 3, 2013			Čtvrť 4, 2013			Čtvrť 1, 2014			Čtvrť 2, 2014			Čtvrť 3, 2014			Čtvrť 4, 2014			Čtvrť 1, 2015		
VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.

880 dny

Poznámky:

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác

zneho protokolu externou organizáciou)

u k štátnej expertíze

4.10.

228 dny

1.4.

110 dny


31.12.

## Príloha č.4

# Harmonogram vydania územného rozhodnutia

## Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	2011		Čtvrt. 4, 2011			Čtvrt. 1, 2012			Čtvrt. 2, 2012			Čtvrt. VII.
					VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	880 dny	19.8. 11	31.12. 14												
2	Výdanie zverejnenia stanoviska MDVaRR Zámerný (príloha SOA) územného rozhodnutia 9.5.2011	0 dny	31.8. 11	31.8. 11												
3	Uloženie preskávania územného rozhodnutia	140 dny	19.8. 11	29.2. 12												
4	Príloha ZPÚ	1 den	2.11. 11	2.11. 11												
5	Príprava stavby v stupni UR (DSZ)	241 dny	3.11. 11	4.10. 12												
6	Terminový plánový harmonogram	14 týždny	3.11. 11	8.2. 12												
7	Príloha ZPÚ a IČ preskávania územného rozhodnutia	12 týždny	5.1. 12	28.3. 12												
8	Spracovanie dokumentu DRP	26 týždny	3.11. 11	2.5. 12												
9	Terminový plánový harmonogram v stupni UR	106 dny	23.11. 11	18.4. 12												
18	Spracovanie dokumentu DRZ	26 týždny	3.11. 11	2.5. 12												
19	Terminový plánový harmonogram v stupni DRZ	121 dny	23.11. 11	9.5. 12												
29	Spracovanie č.4 st. H. Dokumentácia územného rozhodnutia	8 týždny	8.3. 12	2.5. 12												
30	MDVaRR / Štátna expertíza	54 dny	3.5. 12	17.7. 12												
31	Vypracovanie expertízneho posudku a vypracovanie hodnoty vypracovania expertízneho posudku a odborného stanoviska	8 týždny	3.5. 12	27.6. 12												
32	Vypracovanie expertízneho posudku a odborného stanoviska	14 dny	28.6. 12	17.7. 12												
33	IČ pre územné konanie (zabezpečenie stanovísk a rozhodnutí k DÚR)	24 týždny	19.4. 12	3.10. 12												
34	Územné konanie	12 týždny	12.7. 12	3.10. 12												
35	Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia	1 den	4.10. 12	4.10. 12												
36	Príprava stavby v stupni DSP (DP)	228 dny	17.5. 12	1.4. 13												
37	Príloha IČ preskávania územného rozhodnutia a ďalšie preskávania územného rozhodnutia	32 týždny	17.5. 12	26.12. 12												
38	Spracovanie DRP	36 týždny	18.5. 12	24.1. 13												
39	Terminový plánový harmonogram v stupni DP	166 dny	18.6. 12	4.2. 13												
52	Spracovanie dokumentácie územného rozhodnutia (VPR)	11,2 týždny	10.8. 12	26.10. 12												
53	Majetkové právne vysvetlenie k stavbe a stavbe územného rozhodnutia	32 týždny	18.5. 12	27.12. 12												
54	IČ pre územné konanie (zabezpečenie stanovísk a rozhodnutí k DÚR) a ďalšie rozhodnutia k DÚR	16 týždny	7.12. 12	28.3. 13												
55	Stavebné konanie	12 týždny	4.1. 13	28.3. 13												
56	Vydanie právoplatného stavebného povolenia	1 den	1.4. 13	1.4. 13												
57	Príprava DP	110 dny	25.1. 13	27.6. 13												
58	Spracovanie Dokumentácie územného rozhodnutia (DRP)	22 týždny	25.1. 13	27.6. 13												
59	Kompletné majetkové právne usporiadanie nehnuteľnosti a zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva	600 dny	13.9. 12	31.12. 14												

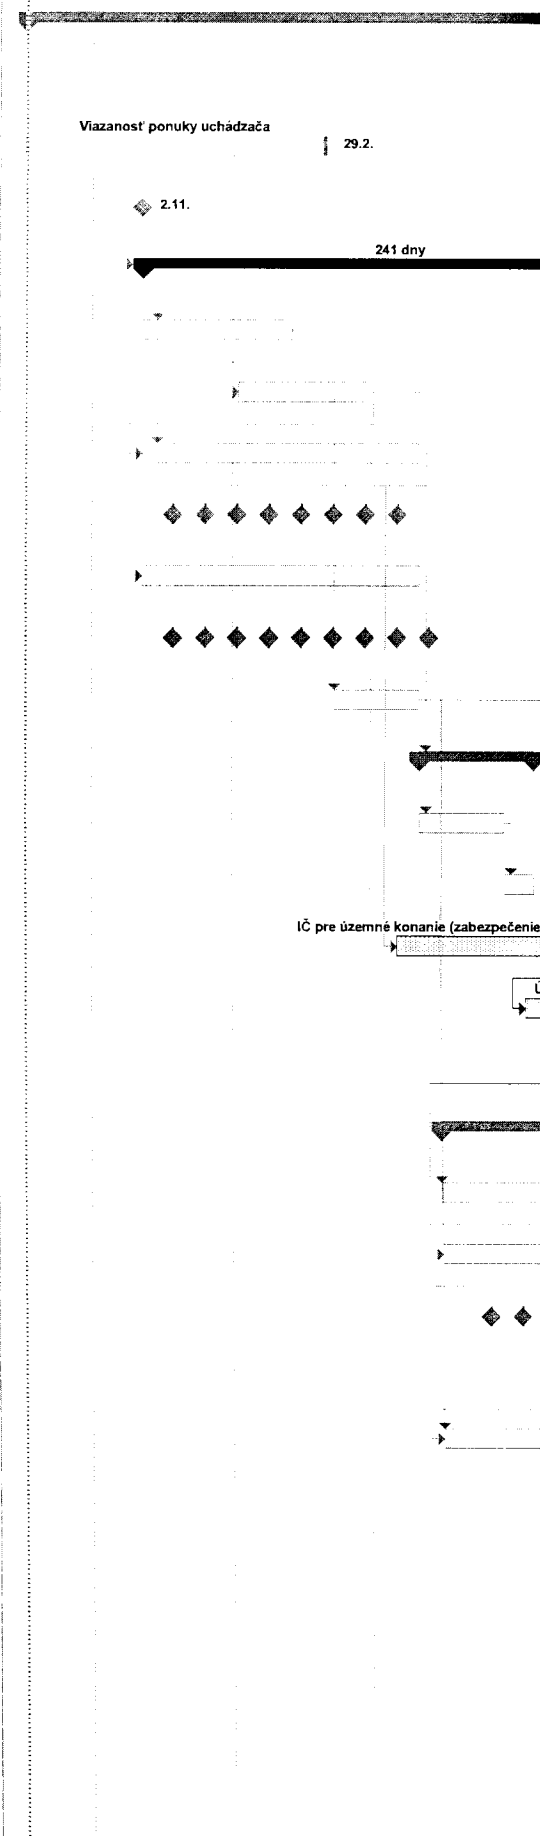

2012	Čtvrť 4, 2012			Čtvrť 1, 2013			Čtvrť 2, 2013			Čtvrť 3, 2013			Čtvrť 4, 2013			Čtvrť 1, 2014			Čtvrť 2, 2014			Čtvrť 3, 2014			Čtvrť 4, 2014			Čtvrť 1, 2015		
VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II

880 dny

Poznámky:

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác

4 dny

stanovisk a rozhodnutí k DÚR)

smerné konanie

4.10.

228 dny

14.

110 dny

31.12.

*Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.*



## Príloha č.5

## HARMONOGRAM PRÁČ ZHOTOVITEĽA NA DSP

DSP	2012							2013	
	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.
☞ A. Sprievodná správa							■		
☞ B.1 Prehľadná situácia							■		
☞ B.2 Celková situácia stavby							■		
☞ B.3 Pozdĺžny rez						■			
☞ B.4 Ortofotomapa								■	
☞ B.4 Vizualizácie								■	
☞ C1. Koordinačné výkresy						■			
☞ C2. Dopravné značenie celej stavby								■	
☞ D. Písomnosti a výkresy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
☞ E. Doklady								■	■
☞ F. Dokum. meračských prác								■	■
☞ G. Dokum. pre majetkoprávne vyspor.				■	■				
☞ H. Dokum. pre vyňatie pôdy z PPF a LPF					■	■			
☞ I. Dokumentácia prieskumov									
I.1 Inventarizácia a ohodnotenie biotop. EV							■		
I.2 Inventarizácia a ohodnotenie mimo lesa							■		
I.3 Hluková štúdia – akt.							■		
I.4 Exhalačná štúdia – akt.							■		
I.5 Koróznny a geoelektrický prieskum – akt.							■		
I.6 Dopravno-inžiniersky prieskum –akt.			■	■					
I.7 Pedologický prieskum – akt.			■	■					
I.8 Archeologický prieskum – akt.							■		
I.9 Podrobný IG prieskum – II. etapa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
☞ J. Dokumentácia pre ŽSR								■	■
☞ K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia								■	■
☞ L. Projekt monitoringu vplyvu ŽP								■	■
☞ M. Vplyv stavby na životné prostredie							■		
☞ N. Podklady usporiadanie cestnej siete								■	■
☞ O. Návrh projektu organizácie výstavby								■	■
☞ termíny pracovných rokovaní	●	●	●	●	●	●	●	●	●
☞ expedícia									● PRE IČ ● DSP

# Harmonogram prác zhotoviteľa na DSP

## Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	Časová os											
					2011 VIII.	IX.	Čtvrť 4, 2011			Čtvrť 1, 2012			Čtvrť 2, 2012			Čtvrť VI.
					X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.		
1	<b>Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná (stupň DSP)</b>	<b>880 dny</b>	<b>19.8. 11</b>	<b>31.12. 14</b>												
2	Výzva na záväznú stanovisku MZP A Zámena (prones E/A akadémia) dňa 9.8.2011	0 dny	31.8. 11	31.8. 11												
3	Príprava projektových podmienok	140 dny	19.8. 11	29.2. 12												
4	Príprava IIG	1 den	2.11. 11	2.11. 11												
5	Príprava stavby v stupni UR (D32)	<b>241 dny</b>	<b>3.11. 11</b>	<b>4.10. 12</b>												
6	Výzva na záväznú stanovisku MZP	14 týdny	3.11. 11	8.2. 12												
7	Príprava IIG a ďalšie preskumy a štúdie	12 týdny	5.1. 12	28.3. 12												
8	Výzva na záväznú stanovisku MZP	26 týdny	3.11. 11	2.5. 12												
9	Príprava stavby v stupni UR (D32)	106 dny	23.11. 11	18.4. 12												
18	Príprava stavby v stupni UR (D32)	26 týdny	3.11. 11	2.5. 12												
19	Príprava stavby v stupni UR (D32)	121 dny	23.11. 11	9.5. 12												
29	Príprava stavby v stupni UR (D32)	8 týdny	8.3. 12	2.5. 12												
30	MDVARS - Štruktúra úseku	<b>54 dny</b>	<b>3.5. 12</b>	<b>17.7. 12</b>												
31	Výzva na záväznú stanovisku MZP	8 týdny	3.5. 12	27.6. 12												
32	Príprava stavby v stupni UR (D32)	14 dny	28.6. 12	17.7. 12												
33	Príprava stavby v stupni UR (D32)	24 týdny	19.4. 12	3.10. 12												
34	Príprava stavby v stupni UR (D32)	12 týdny	12.7. 12	3.10. 12												
35	Návrhové štádium stavby (projektová dokumentácia)	1 den	4.10. 12	4.10. 12												
36	<b>Príprava stavby v stupni DSP</b>	<b>228 dny</b>	<b>17.5. 12</b>	<b>1.4. 13</b>												
37	Podrobný IIG preskum a ďalšie preskumy a štúdie	32 týdny	17.5. 12	26.12. 12												
38	Spracovanie DSP	36 týdny	18.5. 12	24.1. 13												
39	Termíny pracovných rokovani v stupni DSP	<b>166 dny</b>	<b>18.6. 12</b>	<b>4.2. 13</b>												
52	Príprava stavby v stupni UR (D32)	11,2 týdny	10.8. 12	26.10. 12												
53	Príprava stavby v stupni UR (D32)	32 týdny	18.5. 12	27.12. 12												
54	Príprava stavby v stupni UR (D32)	16 týdny	7.12. 12	28.3. 13												
55	Príprava stavby v stupni UR (D32)	12 týdny	4.1. 13	28.3. 13												
56	Výzva na záväznú stanovisku MZP	1 den	1.4. 13	1.4. 13												
57	Príprava DSP	<b>110 dny</b>	<b>25.1. 13</b>	<b>27.6. 13</b>												
58	Príprava stavby v stupni UR (D32)	22 týdny	25.1. 13	27.6. 13												
59	Konštrukčné a inžinierske práce na zabezpečenie výstavby ľahkej dopravy	600 dny	13.9. 12	31.12. 14												



2012	Čtvrť 4, 2012			Čtvrť 1, 2013			Čtvrť 2, 2013			Čtvrť 3, 2013			Čtvrť 4, 2013			Čtvrť 1, 2014			Čtvrť 2, 2014			Čtvrť 3, 2014			Čtvrť 4, 2014			Čtvrť 1, 2015		
VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II

880 dny

Poznámka:

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.j. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác

4 dny

4.10.

228 dny

kum a ďalšie prieskumy a štúdie

Spracovanie DSP

pracovných rokovaní v stupni DSP

1.4.

110 dny

31.12.

**Príloha č.6**

## Harmonogram vydania stavebného povolenia Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	2011											
					VIII	IX	X	XI	XII	Čtvrť 1, 2012			Čtvrť 2, 2012			
										I	II	III	IV	V	VI	
1	<b>Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná</b>	<b>880 dny</b>	<b>19.8. 11</b>	<b>31.12. 14</b>												
2	Výdanie záväzného stanoviska MOPK Zároveň (proces EIA ukončenie dňa 29.03.2011)	0 dny	31.8. 11	31.8. 11												
3	Príprava projektových dokumentov	140 dny	19.8. 11	29.2. 12												
4	Príprava BP	1 den	2.11. 11	2.11. 11												
5	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	241 dny	3.11. 11	4.10. 12												
6	Obnova výstavby v rámci ÚR (DOP)	14 týždne	3.11. 11	8.2. 12												
7	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	12 týždne	5.1. 12	28.3. 12												
8	Sprievodná dokumentácia ÚR	26 týždne	3.11. 11	2.5. 12												
9	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	106 dny	23.11. 11	18.4. 12												
18	Sprievodná dokumentácia ÚR	26 týždne	3.11. 11	2.5. 12												
19	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	121 dny	23.11. 11	9.5. 12												
29	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	8 týždne	8.3. 12	2.5. 12												
30	MDVARC (Štátna správa)	54 dny	3.5. 12	17.7. 12												
31	Výdanie stanoviska štátnej správy (Štátna správa)	8 týždne	3.5. 12	27.6. 12												
32	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	14 dny	28.6. 12	17.7. 12												
33	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	24 týždne	19.4. 12	3.10. 12												
34	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	12 týždne	12.7. 12	3.10. 12												
35	Návrh štátnych prírodných pamiatok	1 den	4.10. 12	4.10. 12												
36	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	228 dny	17.5. 12	1.4. 13												
37	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	32 týždne	17.5. 12	26.12. 12												
38	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	36 týždne	18.5. 12	24.1. 13												
39	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	166 dny	18.6. 12	4.2. 13												
52	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	11,2 týždne	10.8. 12	26.10. 12												
53	Príprava stavby v rámci ÚR (DOP)	32 týždne	18.5. 12	27.12. 12												
54	IČ pre stavebné konanie (vrátane zabezpečenia stanovisk, vyňatí z LPF a PPF a ďalších rozhodnutí k DSP)	16 týždne	7.12. 12	28.3. 13												
55	Stavebné konanie	12 týždne	4.1. 13	28.3. 13												
56	<b>Vydanie právoplatného stavebného povolenia</b>	1 den	1.4. 13	1.4. 13												
57	Príprava BP	110 dny	25.1. 13	27.6. 13												
58	Sprievodná dokumentácia ÚR	22 týždne	25.1. 13	27.6. 13												
59	Kompletná príprava výstavby úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná (vrátane vydaní stanovisk štátnej správy)	600 dny	13.9. 12	31.12. 14												

Viazanosť ponuky uchádzača

29.2.

2.11.

241 dny

Čtvrť 3, 2012			Čtvrť 4, 2012			Čtvrť 1, 2013			Čtvrť 2, 2013			Čtvrť 3, 2013			Čtvrť 4, 2013			Čtvrť 1, 2014			Čtvrť 2, 2014			Čtvrť 3, 2014			Čtvrť 4, 2014			Čtvrť 1, 2015	
VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.

880 dny

Poznámky:

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.z. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác

54 dny

4.10.

228 dny

stavebné konanie (vrátane zabezpečenia stanovisk, vyňatí z LPF a PPF a ďalších rozhodnutí k DSP)

Stavebné konanie

Vydanie právoplatného stavebného povolenia

1.4.

110 dny

31.12.

## HARMONOGRAM PRÁČ ZHOTOVITEĽA NA DP

DP	2013								
	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	
☞ Zväzok 1 – zabezpečuje objednávateľ									
☞ Zväzok 2 – zabezpečuje objednávateľ									
☞ Zväzok 3 – Technické špecifikácie					■				
☞ Zväzok 4 – Cenová časť					■				
☞ Zväzok 5 – DRS									
A. Sprievodná správa	■								
B.1 Prehľadná situácia		■							
B.2 Celková situácia stavby		■							
B.3 Pozdĺžny rez	■								
B.4 Ortofotomapa			■						
B.4 Vizualizácie			■						
C1. Koordinačné výkresy	■								
C2. Dopravné značenie celej stavby		■							
D. Pisomnosti a výkresy	■								
F. Dokum. meračských prác				■					
I. Dokumentácia prieskumov				■					
☞ termíny pracovných rokovaní	•	•	•	•	•	•	•	•	•
☞ expedícia									*DP •

\*Do 2 mesiacov od právoplatného stavebného povolenia

<b>AD</b>	<b>30 mesiacov počas realizácie stavby</b>
-----------	--

# Harmonogram prác zhotoviteľa na DP Úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná

ID	Název úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	2011											
					VIII	IX	Čtvrť 4, 2011			Čtvrť 1, 2012			Čtvrť 2, 2012			Čtvrť VII
					X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII		
1	Harmonogram prípravy pre výstavbu úseku rýchlostnej cesty R7 Bratislava - Dunajská Lužná	880 dny	19.8.11	31.12.14												
2	Výkresy záverečného stavu stavby MZP k Zametaniu pozemkov BIA úseku rýchlostnej cesty R7	0 dny	31.8.11	31.8.11												
3	Výkresy projektových územných podmienok	140 dny	19.8.11	29.2.12	Viazanosť ponuky uchádzača   29.2.											
4	Príloha 2.11	1 den	2.11.11	2.11.11	2.11.											
5	Príprava stavby v stupni UR (D3Z)	241 dny	3.11.11	4.10.12	241 dny											
6	Geologický plán a diaľkové sondy	14 týždne	3.11.11	8.2.12												
7	Príloha 2.11 a 2.13 pre územné podmienky úseku R7	12 týždne	5.1.12	28.3.12												
8	Spracovanie dokumentácie pre D3Z	26 týždne	3.11.11	2.5.12												
9	Čerpanie povolení na stavbu v stupni D3Z	106 dny	23.11.11	18.4.12												
18	Spracovanie dokumentácie pre D3Z	26 týždne	3.11.11	2.5.12												
19	Terénny plán úseku R7 v stupni D3Z	121 dny	23.11.11	9.5.12												
29	Formálne odvolanie EIR k EIR kmetu úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	8 týždne	8.3.12	2.5.12												
30	MDVaRR / Stráženie pozemkov	54 dny	3.5.12	17.7.12												
31	Výkresy návrhu územných podmienok úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	8 týždne	3.5.12	27.6.12												
32	Výkresy návrhu územných podmienok úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	14 dny	28.6.12	17.7.12												
33	Inžinierska doplnková projektová dokumentácia úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	24 týždne	19.4.12	3.10.12												
34	Uzemné podmienky	12 týždne	12.7.12	3.10.12												
35	Nadobudnutie právoplatnosti územných podmienok úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	1 den	4.10.12	4.10.12												
36	Príprava stavby v stupni D3Z (DP)	228 dny	17.5.12	1.4.13												
37	Príloha 2.11 pre územné podmienky úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	32 týždne	17.5.12	26.12.12												
38	Spracovanie DP	36 týždne	18.5.12	24.1.13												
39	Terénny plán úseku R7 v stupni DP	166 dny	18.6.12	4.2.13												
52	Spracovanie dokumentácie pre územné podmienky úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	11,2 týždne	10.8.12	26.10.12												
53	MDVaRR / Stráženie pozemkov úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	32 týždne	18.5.12	27.12.12												
54	MDVaRR / Stráženie pozemkov úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	16 týždne	7.12.12	28.3.13												
55	MDVaRR / Stráženie pozemkov úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	12 týždne	4.1.13	28.3.13												
56	Vydanie právoplatného stavu územných podmienok úseku R7 Bratislava - Dunajská Lužná	1 den	1.4.13	1.4.13												
57	Príprava DP	110 dny	25.1.13	27.6.13												
58	Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)	22 týždne	25.1.13	27.6.13												
59	Kompletné majetkové opätovanie a poriadanie nehnuteľnosti a zabezpečenie vystavenia listov vlastníctva	600 dny	13.9.12	31.12.14												



3. 2012			Čtvrť 4, 2012			Čtvrť 1, 2013			Čtvrť 2, 2013			Čtvrť 3, 2013			Čtvrť 4, 2013			Čtvrť 1, 2014			Čtvrť 2, 2014			Čtvrť 3, 2014			Čtvrť 4, 2014			Čtvrť 1, 2015	
VIII.	IX.	X.	XI.	XII.		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.

880 dny

**Poznámky:**

1. Termíny sú uvažované v pracovných dňoch (t.z. 1 týždeň predstavuje 5 pracovných dní a 1 mesiac 20 pracovných dní)
2. HMG nezohľadňuje prípadné odvolania sa voči jednotlivým rozhodnutiam
3. Výkon Autorského dozoru bude zabezpečený 30 mesiacov počas doby realizácie stavebných prác

54 dny

4.10.

228 dny

Stavebné konanie (vrátane zabezpečenia stanovisk, vyňatí z LPF a PPF a ďalších rozhodnutí k DSP)

Stavebné konanie

1.4.

110 dny

Spracovanie Dokumentácie pre ponuku (DP)

31.12.

**Špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (tabuľky 1.1 až 1.8)**

**Príloha č. 8**

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác  
 Dokumentácia stavebného zámeru  
 Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Tabuľka č.1.1

1	Názov časti dokumentácie	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
		36,51	28,21	21,91		
	Projektová časť					
A	Sprievodná správa	10	10	10		866,30 €
B	Technická správa	10	20	10		1 148,40 €
B1	Prehľadné tabuľky	4	16	20		1 035,60 €
B2	Výpočet smerového vedľa trasy	4	10	8		603,42 €
C	Ekonomická správa	20	10	10		1 231,40 €
D	Výkresy	100	1 600	840		67 191,40 €
E	Doklady		8	40		1 102,08 €
F	Podklady a prieskumy					
1	Dopravno-inžiniersky prieskum			120		2 629,20 €
2	Pedologický prieskum	20	16			1 181,56 €
3	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného		20	20		1 002,40 €
4	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa		20	20		1 002,40 €
5	Architektonická štúdia		10			282,10 €
6	Hluková štúdia		40			1 128,40 €
7	Exhalačná štúdia		40			1 128,40 €
8	Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum					72 430,75 €
9	Koróznny a geoelektrický prieskum	14	22	20		1 569,96 €
10	Seizmický prieskum	20	15			1 153,35 €
11	Archeologický prieskum		15	5		532,70 €
12	Geodetický elaborát	20	480	150		17 557,50 €
G	Cena verejnej práce		40	20		1 566,60 €
	Navrhovaná cena bez DPH					176 343,92 €
	DPH 20 %					35 268,78 €
	Navrhovaná cena s DPH					211 612,70 €

11.11.2014  
 11.11.2014

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác  
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie  
 Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Tabuľka č.1.2

Názov častí dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom v €
		<b>36,51</b>	<b>28,21</b>	<b>21,91</b>	Potrebný počet hodín		
1	Projektová časť						
A	Sprievodná správa		10	10			501,20 €
B	Technická správa		10	10			501,20 €
C	Ekonomická správa			10			219,10 €
D	Výkresy		180	180			9 021,60 €
2	Doklady		10	20			720,30 €
3	Podklady a prieskumy						
1	Dopravno-inžiniersky prieskum			8			175,28 €
2	Pedologický prieskum			8			175,28 €
3	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu			8			175,28 €
4	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa			8			175,28 €
5	Architektonická štúdia			8			175,28 €
6	Hluková štúdia			8			175,28 €
7	Exhalačná štúdia			8			175,28 €
8	Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum						- €
9	Koróznny a geoelektrický prieskum			8			175,28 €
10	Seizmický prieskum			8			175,28 €
11	Archeologický prieskum			8			175,28 €
12	Geodetický elaborát		30	30			1 503,60 €
4	Cena verejnej práce			8			175,28 €
5	Záber pozemkov	350	260	88			22 041,18 €
6	Vplyv stavby na životné prostredie		40				1 128,40 €
7	Projekt monitoringu	20	30	40			2 452,90 €
	Informačný bulletin		40	20			1 566,60 €
	Navrhovaná cena bez DPH						41 584,16 €
	DPH 20 %						8 316,83 €
	Navrhovaná cena s DPH						49 900,99 €

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie  
 Klasifikácia produkcie : 74.23.11.22-8

Názov časti dokumentácie	sadzba €/h		sadzba €/h		sadzba €/h		Cena celkom v €
	36,51	28,21	21,91				
Potrebný počet hodín							
<i>Dokumentácia na stavebné povolenie</i>							
A	Sprievodná správa	10	10	40			1 523,60 €
B.1	Prehľadná situácia M 1:10 000	8	10	20			1 012,38 €
B.2	Celková situácia stavby M 1:5 000	8	10	20			1 012,38 €
B.3	Pozdĺžny rez M 1:5 000/ 500	8	10	20			1 012,38 €
B.4	Ortofotomapa M 1:5 000	8	30	20			1 284,50 €
B.5	Vizualizácie	8	40	20			1 858,68 €
C.1	Koordinálny výkres M 1:1000	20	60	20			2 861,00 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000	8	60	40			2 861,08 €
D	Písomnosť a výkresy objektov	30	1 780	3 400			125 803,10 €
E	Doklady	8	30	20			1 576,58 €
F	Dokumentácia meračských prác	215	215	207			18 450,17 €
G	Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie	10	40	40			2 369,90 €
H	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF		20	20			1 002,40 €
I	Dokumentácia prieskumov						
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	5	10				464,65 €
	Inventarizácia a spol. ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa	20	40				1 858,60 €
	Hluková štúdia		15				423,15 €
	Exhalačná štúdia		15				423,15 €
	Koróznny a geoelektrický prieskum		5	16			491,61 €
	Dopravno-inžiniersky prieskum			70			1 533,70 €
	Pedologický prieskum			15			328,65 €
	Archeologický prieskum			5			109,55 €
	Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum						39 233,75 €
J	Dokumentácia pre ŽSR		120	80			5 138,00 €
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci		17	16			830,13 €
L	Projekt monitoringu vplyvu stavby na životné prostredie	40	40	60			3 903,40 €
M	Vplyv stavby na životné prostredie		10				282,10 €
N	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete		40	30			1 785,70 €
O	Návrh projektu organizácie výstavby	24	60	50			3 664,34 €
	Navrhovaná cena bez DPH						223 098,63 €
	DPH 20 %						44 619,73 €
	Navrhovaná cena s DPH						267 718,36 €

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác  
 Podrobný inžierskogeologický a hydrogeologický prieskum

Časť	Druh prác	m.j.	I. etapa		II. etapa		Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	
			počet m. j.	Cena za m.j. v €	počet m. j.	Cena za m.j. v €			
A1	<b>TERENNE PRACE</b>								
	jadrové inžierskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu		m	800	22,00	130	22,00	17 600,00 €	2 860,00 €
	jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine), vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu		m	1	55,00	1	55,00	55,00 €	55,00 €
	presimetrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu		m	180	22,00	200	22,00	3 960,00 €	4 400,00 €
	presimetrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením		ks	24	120,00	44	120,00	2 880,00 €	5 280,00 €
	horizontálny inžierskogeologický vrt s dvojitou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, spätnej úpravy vrtu		m	1	150,00	1	150,00	150,00 €	150,00 €
	inklimometrické jadrové IG vrty so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením		m	1	70,00	1	70,00	70,00 €	70,00 €
	inklimometrické jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy, nultého a prvého merania s vyhodnotením		m	1	80,00	1	80,00	80,00 €	80,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy		m	1	60,00	1	60,00	60,00 €	60,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy		m	1	70,00	1	70,00	70,00 €	70,00 €
	piezometrické jadrové vrty s dvojitou jadrovnicou (WireLine) so zabudovaním, vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska, ozvorkovania a dopravy		m	40	36,00	20	40,00	1 440,00 €	800,00 €
	hydrodynamická skúška (na 1 vrte)		ks	1	800,00	1	800,00	800,00 €	800,00 €
	vsakovacia skúška (na 1 vrte)		ks	1	300,00	5	300,00	300,00 €	1 500,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu		m	300	22,00	150	22,00	6 600,00 €	3 300,00 €
	statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy, spätnej úpravy vrtu		m	100	20,00	100	20,00	2 000,00 €	2 000,00 €
	kopané sondy - šachtičky, vrátane spätnej úpravy, dopravy		m	40	60,00	10	60,00	2 400,00 €	600,00 €
	dočasná prístupová cesta		m2	250	2,00	125	2,00	500,00 €	250,00 €
								<b>6 500,75 €</b>	<b>980,75 €</b>
	A2	<b>GEOFYZIKALNE PRACE</b>							
		metóda SOP - priemerný náklad s vyhodnotením		m	1	3,75	1	3,75	3,75 €
georadarové meranie - priemerný náklad s vyhodnotením		m	1	8,00	1	8,00	8,00 €	8,00 €	
vertikálne elektrické sondovanie - priemerný náklad s vyhodnotením		m	3200	1,80	400	1,80	5 760,00 €	720,00 €	
seizmické metódy - plytká seizmika - priemerný náklad s vyhodnotením		m	1	6,00	1	6,00	6,00 €	6,00 €	
gravimetria - priemerný náklad s vyhodnotením		m	1	3,00	1	3,00	3,00 €	3,00 €	
karotážne metódy - priemerný náklad s vyhodnotením		m	60	12,00	20	12,00	720,00 €	240,00 €	
							<b>15 628,00 €</b>	<b>9 700,00 €</b>	
<b>LABORATORNE PRACE - mechanika zemín a skalných hornín</b>									
zeminy - porušené vzorky - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť		ks	130	39,00	50	39,00	5 070,00 €	1 950,00 €	
zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť		ks	85	50,00	60	50,00	4 250,00 €	3 000,00 €	
zeminy - technologické vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť (PS, ID)		ks	12	50,00	5	50,00	600,00 €	250,00 €	
zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)		ks	15	102,00	10	102,00	1 530,00 €	1 020,00 €	
zeminy - krabicová šmyková skúška (reziduálna šmyková pevnosť)		ks	15	50,00	10	50,00	750,00 €	500,00 €	
zeminy - triaxiálna šmyková skúška		ks	10	85,00	10	85,00	850,00 €	850,00 €	
zeminy - sliateľnosť, bez rekonsolidácie		ks	10	26,00	15	26,00	260,00 €	390,00 €	



Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifická spôsobu výpočtu ceny

Tabuľka č. 1.5

Majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby

	Predmet	m.j.	počet m.j. *	Cena za m.j. bez DPH v €	Celková cena bez DPH v €
	Zabezpečenie LV a PK vločky (výpisu) zo železničnej knihy (resp. dedičského rozhodnutia)	ks	335	2,00	670,00 €
A	Lustrácia LV, Pk vločky alebo vločky zo železničnej knihy Identifikácia a zistenie adresy alebo sídla vlastníka nehnuteľnosti alebo inej osoby, ktorej práva môžu byť výstavbou priamo dotknuté	ks	335	2,00	670,00 €
B	Výpracovanie a doručenie návrhu zmluvy a výzvy doručenkou do vlastných rúk príslušným fyzickým a právnickým osobám+tabuľka v MS Excel	ks	335	2,00	670,00 €
C	Zabezpečenie uzavretia zmluvy , pri neuzavretej zmluve dodanie právoplatného vyvlastňovacieho rozhodnutia, obmedzeniavlastníckeho práva, alebo právoplatného súdneho rozhodnutia	ks	335	95,00	31 825,00 €
D	Podanie návrhu na zápis zmluvy do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia LV na nadobúdateľa	ks	335	2,00	670,00 €
E	Zastupovanie pred súdmi v rámci celého konania alebo zabezpečenie celého konania o súdnej úschove	ks	15	2,00	30,00 €
<b>Navrhovaná cena bez DPH</b>					<b>47 935,00 €</b>
<b>DPH 20 %</b>					<b>9 587,00 €</b>
<b>Navrhovaná cena s DPH</b>					<b>57 522,00 €</b>

K plneniu uvedených položiek je potrebné vypracovať prehľadnú tabuľku o stave MPV v MS Excel.  
 Vo výslednej cene nie sú obsiahnuté súdne a správne poplatky a pod., ktoré bude potrebné v zmysle platných právnych predpisov zaplatiť.

Pozn. \* uvedený počet m.j. slúži len pre účely vyhodnotenia sťažže





Dokumentácia pre ponuku a výkon autorského dozoru

Klasifikácia produkcie: 74.20.31

Činnosť	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Cena celkom v €
<b>DOKUMENTÁCIA PRE PONUKU</b>							
<b>3</b>	<b>Zväzok 3 Technické špecifikácie</b>						
3.I	Všeobecné informácie a požiadavky						
3.II	Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)						
3.III	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)						
<b>4</b>	<b>Zväzok 4 Cenová časť</b>						
4.I	10	10	10	10	10	10	647,20 €
4.II	10	10	30	30	30	30	1 211,40 €
4.III			80	80	160	160	5 762,40 €
4.IV					20	20	438,20 €
4.V			100	100	80	80	4 573,80 €
<b>5</b>	<b>Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)</b>						
A	Sprievodná správa						
B.1	6	6	40	40	40	40	1 722,70 €
B.2	8	8	40	40	12	12	1 610,38 €
B.3					40	40	1 683,40 €
B.4-5					30	30	1 722,70 €
B.6					12	12	262,92 €
C.1	8	8	40	40	30	30	1 785,70 €
C.2	16	16	20	20	20	20	1 294,48 €
D	10	10	80	80	80	80	4 593,76 €
F	20	20	1 800	1 800	2 150	2 150	98 249,60 €
I			100	100	20	20	3 989,40 €
					40	40	876,40 €
					800	800	17 528,00 €
<b>VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU</b>							
Navrhovaná cena bez DPH							
DPH 20 %							
Navrhovaná cena s DPH							
150 265,66 €							
30 053,13 €							
180 318,79 €							

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác spolu

Tabuľka č. 1.8

	Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
Dokumentácia stavebného zámeru	176 343,92 €	35 268,78 €	211 612,70 €
Dokumentácia pre územné rozhodnutie	41 584,16 €	8 316,83 €	49 900,99 €
Dokumentácia na stavebné povolenie	223 098,63 €	44 619,73 €	267 718,36 €
Inžinierska činnosť k územnému a k stavebnému konaniu	50 293,20 €	10 058,64 €	60 351,84 €
Dokumentácia pre ponuku a výkon autorského dozoru	150 265,66 €	30 053,13 €	180 318,79 €
Spolu	641 585,57 €	128 317,11 €	769 902,68 €
Majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie	47 935,00 €	9 587,00 €	57 522,00 €
Celková cena (pre účel vyhodnotenia súťaže - kritérium)	689 520,57 €	137 904,11 €	827 424,68 €

Stavba: Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná  
 Špecifikácia ceny prác spolu
