

DODATOK č. 1

k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov medzi:

Názov:	Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Sídlo:	Winterova 66, 921 63 Piešťany
IČO:	36 084 221
DIČ:	20 2170 4685
IČ DPH:	SK20 2170 4685
Zastúpená:	MUDr. Miroslav Jaššo, riaditeľ
Bankové spojenie (názov banky):	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK73 0900 0000 0051 3006 7177

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno:	ENERGOTEL a.s.
Sídlo:	Miletičova 7, Bratislava – Ružinov 821 08
IČO:	35 785 217
IČ DPH:	2020256315
Osoba oprávnená konať:	Ing. Martin Klamo, člen predstavenstva Peter Gálik, člen predstavenstva
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sa, vložka č. 2404/B
Bankové spojenie (názov banky):	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2624191924
Kód banky:	1100
IBAN/SWIFT:	SK55 1100 0000 0026 2419 1924

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že:

- Objednávateľ a Zhotoviteľ dňa 27.06.2023 uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo, ktorá bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 30.06.2023, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa dodať dielo a to riešenie podľa zámeru opísaného vo Výzve na predkladanie ponúk zákazky Objednávateľa s názvom: „Rozvoj governance a úrovne IKB v NAW – technická časť“, vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2023 dňa 24.04.2023 pod značkou: 14985-WNS (ďalej len „Zmluva o dielo“) a zároveň
- Zmluva o dielo je uzatvorená s odkladacou podmienkou účinnosti uvedenou v bode 23.1. Zmluvy o dielo s nasledovným znením: „23.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na predmet tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku, t. j. Objednávateľovi bude zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto Zmluvy. Ak Objednávateľovi nebude zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto Zmluvy, účinnosť tejto Zmluvy nenastane.“.

Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku číslo: NFP311071CBX6 zo dňa 07.02.2023 bola medzi Nemocnicou Alexandra Wintera n.o. ako prijímateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: Z311071CBX6 (ďalej len „**Zmluva o poskytnutí NFP**“). Predmet Zmluvy o dielo je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci projektu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a rozpočtu Nemocnice Alexandra Wintera n.o.

Cieľom uzatvorenia tohto Dodatku 1 je skutočnosť, že Nemocnica Alexandra Wintera n.o. musí v zmysle podmienok programového obdobia 2014-2020 vyčerpať schválený nenávratný finančný príspevok, to znamená do 31.12.2023 ukončiť fyzickú realizáciu predmetu Zmluvy o dielo a uhradiť Zhotoviteľovi Cenu za zrealizované Dielo. Nemocnica Alexandra Wintera n.o. ako verejný obstarávateľ má na zreteľ lehotu dodania predmetu Zmluvy o dielo, ktorá je v zmysle bodu 4.2. Zmluvy o dielo v dĺžke najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.10.2023, podľa toho, ktorá lehota nastane skôr a teda s ohľadom na formuláciu odkladacej podmienky podľa bodu 23.1. Zmluvy o dielo tu vzniká riziko, že predmet Zmluvy o dielo nebude možné zo strany Zhotoviteľa do konca kalendárneho roka 2023 dodať a vyúčtovať tak, aby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. ako verejný obstarávateľ stihol podať všetky žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a to z dôvodu doručenej Správy z kontroly verejného obstarávania dňa 03.10.2023.

Zmluva je výsledkom verejného obstarávania realizovaného postupom zákazka s nízkou hodnotou, § 117 ods. 6 ZVO.

V Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole verejného obstarávania pre programové obdobie 2014-2020 (ďalej Príručka), verzia 3.0, bod 4.3 – Lehoty na výkon kontroly verejného obstarávania má Poskytovateľ NFP vykonať kontrolu procesu verejného obstarávania realizovaného postupom zákazka s nízkou hodnotou v lehote:

Druh kontroly VO	Lehota na vykonanie kontroly/finančnej kontroly (v pracovných dňoch)	Poznámka
<i>Štandardná ex post kontrola</i>	15	Vzťahuje sa na všetky zákazky, pri ktorých nebola vykonaná druhá ex ante kontrola.

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. odoslala Žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom ITMS2014+ dňa 26.07.2023. V súlade s lehotou stanovenou v Príručke, mala byť kontrola ukončená do 16.8.2023. Vysvetlenie, resp. doplnenej dokumentácie bolo Nemocnici Alexandra Wintera n.o. doručené dňa 17.09.2023. Nemocnica Alexandra Wintera n.o. doručila vysvetlenie, resp. doplnenie dokumentácie Poskytovateľovi NFP dňa 20.09.2023. Správa z kontroly procesu verejného obstarávania bola Nemocnici Alexandra Wintera n.o. doručená dňa 03.10.2023.

Článok I.

Predmet dodatku

1.1 Vzhľadom k omeškaniu sa s doručením Správy z kontroly procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP nastala skutočnosť, že Zmluva o dielo so Zhotoviteľom nadobudla účinnosť dňa 04.10.2023.

Na základe objektívnej skutočnosti, omeškanie sa s vydaním Správy z kontroly procesu verejného obstarávania (bez ktorej nie je možné pripustiť výdavky projektu do financovania) o nezavinenej Objednávateľom a ani Zhotoviteľom sa zmluvné strany dohodli, že Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zmenia bod 4.2 Zmluvy o dielo a to nasledovne:

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať Dielo najneskôr do 15.11.2023 odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo Objednávateľovi v nasledovných etapách:

a) Nainštalovanie HW zariadenia a SW vybavenia (týka sa všetkých modulov) a to najneskôr do 15.11.2023.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dodací list k dodanému HW a SW vybavenia, vrátane návodov, záručných listov a ďalšej potrebnej dokumentácie.

b) Etapa analýza a dizajn (týka sa všetkých modulov) a to najneskôr do 15.11.2023 od nadobudnutia účinnosti Zmluvy (ďalej len „Etapa analýzy a dizajnu“).

Etapa analýzy a dizajnu je ukončená podpisom dokumentov zmysle článku 5 tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentami v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnostiach v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny pracovný výkaz.

c) Etapa implementácia a testovanie (týka sa všetkých modulov) a to najneskôr do 15.11.2023 (ďalej len „Etapa implementácie a testovania“).

Etapa implementácie a testovania je ukončená podpisom dokumentov zmysle článku 5 tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentami v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnostiach v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny pracovný výkaz.

d) Etapa nasadenia (týka sa všetkých modulov) ,ktorá bude vykonaná najneskôr do 15.11.2023 (ďalej len „Etapa nasadenia“).

Etapa nasadenia je ukončená podpisom dokumentov v zmysle článku 5 tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentami v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnostiach v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny pracovný výkaz.

e) Etapa začatia ostrej prevádzky systému (týka sa všetkých modulov) začína riadnym ukončením a včasným splnením všetkých povinností Zhotoviteľa od ukončenia Etapy nasadenia.

f) Jednotlivé lehoty uvedené v rámci bodu 4.2. tohto článku Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné; osobitne sa Zhotoviteľ zaväzuje jednotlivé Etapy vykonávať a odovzdávať Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol prevziať riadne predmet diela a to najneskôr do 15.11.2023 dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy. Za nedodržanie lehoty podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje dodanie Diela, jednotlivých jeho častí alebo iného výstupu Zmluvy v skoršej lehote ako je príslušná lehota dohodnutá v bode 1. tohto článku Zmluvy.

Zmena lehoty dodania na 15.11.2023 nepredstavuje podstatnú zmenu Zmluvy o dielo a nie je v rozpore s § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. a to princípu nediskriminácie, transparentnosti a proporcionality. Zhotoviteľ, v zmysle tohto Dodatku č. 1 je povinný zrealizovať Dielo v lehote 43 kalendárnych dní namiesto pôvodne stanovenej lehoty 90 kalendárnych dní.

1.2 V nadväznosti na zmenu lehoty dodania v zmysle tohto Dodatku č. 1 Zhotoviteľ upravuje Prílohu č. 2 – Doba plnenia Diela, časový harmonogram a Prílohu č. 5 – Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1. Účastníkom Zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by im v čase uzatvorenia tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo bránili dosiahnuť účel sledovaný dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo.
- 2.2. Tento Dodatok 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 psím. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú Dodatkom 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.4. Tento Dodatok 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva o dielo.
- 2.5. Tento Dodatok 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 2.6. Tento Dodatok 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis.
- 2.7. Účastníci Zmluvy o dielo a tohto Dodatku 1 čestne vyhlasujú, že si Dodatok 1 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, jeho obsahu a účelu porozumeli, že Dodatok 1 nebol podpísaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 2.8 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 2 – Doba plnenia Diela, časový harmonogram
Príloha č. 5 – Zoznam osôb zodpovedných za poskytovanie služby

za Objednávateľa:

Pieš

MUDr. Miroslav Jaššo, riaditeľ
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

za Zhotoviteľa:

Bratislava, dňa

Ing. Martin Klamo, člen predstavenstva
ENERGOTEL, a.s.

Peter Gálik, člen predstavenstva
ENERGOTEL, a.s.


Príloha č. 2 Nemocnica A. Wintera

Rozvoj governance a úrovne IKB v NAW- technická časť

Harmonogram - aktualizácia



Začiatok aktivity Analýza a dizajn je „dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy“

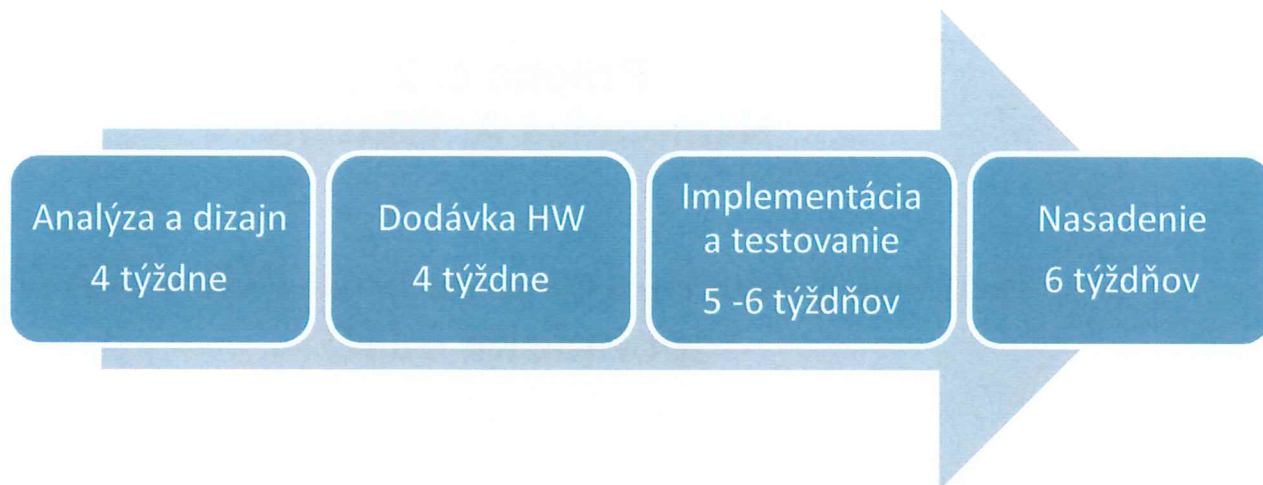

Činnosti budú vykonávané v rozsahu MD uvedených v dokumente „POLOZKOVITY ROZPOCET_NAW“.

Dátumy budú primerane posunuté v súlade s dátumom začiatku platnosti zmluvy:

	Aktivita	Začiatok aktivity	Koniec aktivity
		Mesiac/rok	Mesiac/rok
Bezpečnostný monitoring	Analýza a dizajn	3.10.2023	31.10.2023
	Dodávka technológií	3.10.2023	31.10.2023
	Implementácia a testovanie	6.10.2023	15.11.2023
	Nasadenie	6.10.2023	15.11.2023

Príloha č. 5: Menný zoznam zamestnancov spoločnosti Energotel, a. s. podľa priradenej role

Odborník	Rola v projekte	Meno a priezvisko zamestnanca
Odborník č. 1	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	Ing. Martin Hudák David Holec
Odborník č. 2	IT analytik – Expert pre IT riešenia	Ing. Matúš Čakloš – garant Ing. Michal Bartoš Mgr. Marek Galbavý
Odborník č. 3	IT architekt	Ing. Radovan Šulek
Odborník č. 4	IT/IS konzultant	Bc. Michal Lonček – garant Ing. Andrej Veselovský Ing. Marián Janec Ing. Michal Kalavský Avram Gaidos
Odborník č. 5	Projektový manažér IT projektu	Ing. Vladimír Šišák
Odborník č. 6	IT tester	Ing. Marek Makva
Odborník č. 7	Školiteľ pre IT systémy	Ing. Matej Čech
Odborník č. 8	Špecialista pre bezpečnosť IT – Expert pre Kybernetickú bezpečnosť	Ing. Miloslava Gábrišová
Odborník č. 9	Špecialista pre bezpečnosť IT- Expert pre oblasť LMS alebo SIEM	Miroslav Kučavík

V Bratislave, dňa 19.10.2023



Ing. Peter Flesar, obchodný riaditeľ
na základe plnomocenstva zo dňa 22.11.2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' and 'F' combined.

