

ZMLUVA O DIELO č. 12/02/2024/TV

Výmena vodovodného a plynového potrubia v areáli strediska SC KSK Trebišov
*uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

sídlo:

korešpondenčná adresa:

zastúpený:

osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických:

osoba zodpovedná za

odovzdanie staveniska

a prevzatie diela:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.crz.gov.sk

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

Ing. Peter Vaľko, poverený riadením organizácie SC KSK

riaditeľ prevádzkového úseku

Ing. Michal Sasák

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

osoba konajúca v mene

spoločnosti:

stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

právna forma:

kontakt:

KABYS s.r.o

Okružná 11, 076 13 Byšta

Kamil Fedor

Vojtech Bodnár

43 837 476

2022517167

SK2022517167

ČSOB, a.s.,

SK24 7500 0000 0040 3004 9399, Swift/BIC: CEKOSKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným

tel.: 0903 625 448, e-mail: kabyssro@gmail.com

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

ČASŤ 1.

Úvodné ustanovenia

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii diela s názvom **Výmena vodovodného a plynového potrubia v areáli strediska SC KSK Trebišov** (ďalej aj len ako „*predmet zmluvy*“).
2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto zmluve a odovzdá ho objednávateľovi, ktorý sa zaväzuje dielo vykonané riadne a včas prevziať a zaplatiť zaň dojednanú cenu podľa tejto zmluvy.

Článok II.

Dielo

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie odstránenie havarijného stavu vodovodného a plynového potrubia v areáli strediska SC KSK Trebišov výmenou predmetného potrubia a to v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou VKP PROJEKT, s.r.o., Trebišov, v 03/2023 (ďalej ako „*projektová dokumentácia*“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou ako aj v súlade s požiadavkami a záväzkami v zmysle tejto zmluvy (ďalej ako „*dielo*“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce (obstaranie, doprava, manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela), ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou v rozsahu prác označených v projektovej dokumentácii v časti výkaz výmer.
3. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „*príloha č. 2 zmluvy*“ alebo aj „*opis predmetu zákazky*“) a to riadne, včas a bez väd. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety a projektovou dokumentáciou riadne oboznámil a potvrdzuje ich spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre objednávateľa súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve a to najmä:
 - a) inžiniersku činnosť v rozsahu všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu diela a uvedeniu do prevádzky (záväzné stanoviská, žiadosti, povolenia, posúdenia, vyjadrenia), ako aj splniť ďalšie záväzky v rozsahu a spôsobom uvedeným v opise predmetu zákazky,
 - b) realizovať akékoľvek stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto sietí, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ, zabezpečiť stanoviská všetkých správcov k existencii podzemných sietí, zrealizovať zameranie a vytýčenie všetkých podzemných vedení v dotknutom území pred začatím zemných prác,
 - c) zabezpečiť:
 - predrealizačné zameranie, aj počas realizácie prác, porealizačné zameranie,
 - odstránenie krytu z kameniva, z asfaltového betónu,
 - výkop rýh a uloženie potrubí,
 - pod cestou a spevnenou plochou parkoviska: riadená podvrtávka vrátane štartovacej a cieľovej jamy,
 - lôžko pod potrubie, obsyp a zásyp potrubia,
 - uloženie/montáž potrubí,
 - umiestnenie vyhľadávacieho/signalizačného vodiča,
 - všetky predpísané skúšky predmetných potrubí a revízne správy (viď Technická správa PD),
 - d) vykonať všetky búracie, montážne a demontážne práce súvisiace s realizáciou diela,

Článok III. Prehlásenia zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi akokoľvek sa vzťahujúcimi na predmet zmluvy a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že:
 - a) prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených s odstraňovaním väd;
 - c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, na ktoré súťažné podklady odkazujú a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,
 - d) skontroloval projektovú dokumentáciu podľa čl. II. bodu 1 zmluvy k vykonaniu diela bez zistenia akýchkoľvek väd, nedostatkov alebo nedorobkov brániacich realizácii diela,
 - e) na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez právnych väd. V prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.
7. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v zmysle Zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch).

Článok IV. Cena diela

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky zhotoviteľa, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.
2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom. Ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje, zhotoviteľ náklad na chýbajúcu položku zahrnie do jestvujúcich položiek výkazu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 3.
3. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Výmena vodovodného a plynového potrubia v areáli strediska SC KSK Trebišov	súbor	
Celková cena spolu v EUR bez DPH:			20 805,55
20% DPH v EUR:			4 161,11
Celková cena spolu v EUR s DPH:			24 966,66

4. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
5. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.
6. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mala byť zrejmalá za účelom žiadania zvýšenia ceny.
7. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 3 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela.
8. Cena diela podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemôhol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyše prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2023“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu zmluvy.

Článok V. Miesto a termíny plnenia

1. Miestom realizácie prác je areál strediska Správy ciest KSK v Trebišove, Ruskovská 3, 07501 Trebišov, bližšie špecifikovaný v opise predmetu zákazky.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote **10 pracovných dní** od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. zmluvy. S realizáciou prác je zhotoviteľ povinný začať do 3 dní od odovzdania staveniska.
3. Skutočný termín začatia a ukončenia prác si zmluvné strany písomne dohodnú minimálne 2 dni vopred s osobou zodpovednou za odovzdanie staveniska a prevzatie diela uvedenou v záhlaví tejto zmluvy - adresa: Ing. Michal Sasák, SC KSK Ostrovskeho 1, Košice, tel: [REDACTED], email: michal.sasak@scsk.sk.
4. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku X. zmluvy.
5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok uvedených v tejto zmluve.
6. Termín realizácie diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:
 - a) prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 7 a 8 tohto článku tejto zmluvy,
 - b) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,
 - c) existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.
7. Objávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.
8. V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, t. j. najmä došlo k vzniku:
 - a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu),
 - b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať)
 - c) existencia mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú najmenej 5 dní za sebou a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela,
 - d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového alebo mimoriadneho stavu,je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela riadne a včas súčasne písomne požiadať objednávateľa o predĺženie termínu dohodnutého na ukončenie diela s uvedením dôvodov, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o uzatvorení dodatku o úprave termínu realizácie diela. Akékoľvek náklady spojené s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy znáša zhotoviteľ.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak pre ktorýkoľvek zo záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh nie je určená osobitná lehota na plnenie, je zhotoviteľ povinný a zaväzuje sa plniť tento záväzok vždy na výzvu objednávateľa a v lehote ním určenej.

ČASŤ 2

REALIZÁCIA DIELA

Článok VI.

Odovzdanie staveniska

1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do **5 pracovných dní od účinnosti zmluvy**, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenu termínu odovzdania staveniska je možné dojednať iba písomnou formou s odôvodnením a táto bude tvoriť prílohu dokumentu: **Odovzdanie staveniska**, pričom za písomnú formu sa považuje aj mailová komunikácia. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa tohto bodu tohto článku zmluvy v trvaní viac ako 5 dní sa toto omeškanie považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy s okamžitým účinkom odstúpiť.
3. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplýnú pre zmluvné strany povinnosti nevyplyývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenajú pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávateľ. Uvedené je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených zamestnancov objednávateľa, osôb poverených objednávateľom a kontrolným orgánom na stavenisko.
6. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 15 pracovných dní po odovzdaní diela podľa tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nesplní napriek výzve objednávateľa a v lehote ním určenej, je objednávateľ oprávnený stavenisko vypratať na náklady zhotoviteľa.
7. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách.

Článok VII.

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávateľa.
2. V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje:
 - a) zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela (priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela formou fotodokumentácie v etapách (pred zásypom potrubia)) a to odo dňa začatia prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi bez väd (fotodokumentáciu diela je potrebné doručiť obstarávateľovi priebežne v mailovej forme)
 - b) denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami,

- c) prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň,
 - d) zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času,
 - e) zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, ktorými je výsledok preukazovaný,
 - f) pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
3. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.
 4. Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávateľovi na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať objednávateľa, zástupcov dotknutých orgánov a organizácií a tretie osoby podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávateľa alebo ním poverenej osoby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolného dňa. Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb o ktorých prítomnosť požiada objednávateľ.
 5. V prípade, ak by sa množstvo potrebných prác nezhodovalo s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním takejto práce upozorniť objednávateľa. V prípade vykonania takýchto prác bez stanoviska objednávateľa, znáša náklady s tým súvisiace zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo.
 6. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon kontroly v súvislosti s tou časťou/časťami diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ bez nároku zhotoviteľa na úhradu s tým spojených nákladov právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil za účelom vykonania kontroly v lehote určenej objednávateľom a príslušnú časť diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú fotodokumentáciu.

Článok VIII. Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 je zhotoviteľ povinný minimálne dva (2) pracovné dni vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady

preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.
7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definíčné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.

Článok IX.

Povinnosti zhotoviteľa

A. VŠEOBECNÉ

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami (projektová dokumentácia), na ktoré súťažné podklady odkazujú a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
2. Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky povolenia, licencie a oprávnenia (podľa platnej legislatívy, predpisov a zákonmi SR) potrebné k riadnej realizácii diela podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie preukázať doklady, preukazujúce kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela pre potreby čoho si zabezpečí všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie.
5. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení neskorších predpisov.
6. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ.
7. Objednávateľ a stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác aj v počte skúšok presahujúcom počet uvedený v predchádzajúcom bode. Takto vzniknuté náklady si objednávateľ hradí sám, okrem prípadu, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti schváleným technologickým postupom. V takom prípade zhotoviteľ uhradí všetky takto vzniknuté náklady za vykonané skúšky objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto článku ohľadom povinností zhotoviteľa platí pre tento postup primerane.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele najmä, no nie výlučne, zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich

vyhlášok, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, súvisiacich vyhlášok a dodržiavanie všetkých povinností v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

9. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela riadne povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.
11. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.
13. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.
14. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb (najmä no nie výlučne dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a iných). V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo k uloženiu akejkoľvek sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči objednávateľovi, zaväzuje sa túto v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy objednávateľa uhradiť zhotoviteľ.

B. BOZP a ochrana ŽP

15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
 - b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a PO,
 - c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a

ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,

- d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy,
 - e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v mieste realizácie diela,
 - f) bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. Zamestnanec zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa, alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.
17. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
- a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb,
 - b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi,
 - c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykoná a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela,
 - e) zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,
 - f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, ako by tieto škody spôsobil sám. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené objednávateľom.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.

20. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia ako aj jeho poškodzovaniu a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí a takéto udalosti sa zaväzuje bezodkladne oznamovať objednávateľovi.
21. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela. V takomto prípade sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným požiadavkám na vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu zmluvy a dohodnutú dobu realizácie diela.
22. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za (i) vlastné určenie a vedenie pracovného postupu pri realizácii diela, (ii) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a ním ustanovených alebo poverených osôb, (iii) sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarom, a to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom ale aj osobám, ktoré poveril realizáciou čiastkových plnení.

C. STAVBYVEDÚCI

23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto článku zmluvy len prostredníctvom osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, teda osobami s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.
24. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom; ak o to objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiadá, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do dvoch (2) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne nepretržite prítomný tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiadá, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný aj v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, dní pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.
26. Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom;

dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.

27. V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa súčasne zmluvné strany dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady spojené s prerušením a obnovením prác.

ČASŤ 3

POREALIZAČNÉ VZŤAHY

Článok X.

Protokolárne odovzdanie diela

1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 2 pracovných dní vopred.
2. Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, je objednávateľ povinný prevziať.
3. Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 1 tohto článku je možné, ak objednávateľ so skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a tento určí náhradný termín preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.
4. Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných väd a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obojma zmluvnými stranami.
5. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto článku zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky odstrániť, prípadne doplniť chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
6. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nesťažujú účel, ktorému slúži, je oprávnením avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak objednávateľ dielo v dôsledku drobných väd odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo stanovenom objednávateľom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento účel spíšu. Ak objednávateľ dielo napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom odstránené v lehote požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa článku XIII bod 7 tejto zmluvy.
7. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať najmä:
 - a) identifikačné údaje o diele;

- b) potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;
 - c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového označenia;
 - d) súpis prípadných väd a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto závady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;
 - e) prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá;
 - f) zoznam príloh podľa tejto zmluvy,
 - g) dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa.
8. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi:
- a) doklady, protokoly, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela ako aj originály na nich sa vzťahujúcich záručných listov, revízne správy, návody na používanie, dodacie listy a vážne lístky použitých materiálov, ako aj všetky ostatné dokumenty preukazujúce dodanie použitých materiálov a ich množstvo,
 - b) dokumentáciu o vykonaných revíziách a kontrolách, protokoly o vykonaných skúškach,
 - c) všetky iné dokumenty potrebné pre riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku,
 - d) fotodokumentáciu v zmysle tejto zmluvy,
 - e) ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu zo zmluvy alebo jej príloh.
9. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvy na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.

Článok XI. Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe **súpisu** skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, v súlade s položkami cenovej ponuky, ktorá je prílohou/podkladom k obstaraniu predmetu zákazky. Súpis musí byť prílohou každej faktúry. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že objednávateľ nie je povinný súpis prác potvrdiť a zhotoviteľ tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa tohto bodu nebudú predložené všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t.j. preukázané skúšky, certifikáty, výsledky kontrolných skúšok. Prílohou poslednej faktúry musí byť okrem vyššie uvedených podkladov aj Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a potvrdenie zhotoviteľa, že úhradou faktúry považuje všetky svoje nároky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že výška poslednej faktúry musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela s DPH.
2. Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, podlieha odsúhlaseniu objednávateľom. Objednávateľ povinný vyjadriť sa k súpisu vykonaných prác a dodávok do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. V prípade, ak sa objednávateľ k súpisu v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, platí, že so súpisom súhlasí.
3. Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od podkladov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
 - názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
 - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
 - číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,

- dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo k nej nebudú priložené požadované doklady je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
 6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
 7. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.
 8. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
 9. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obolhatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.
 10. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.
 11. V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

Článok XII.

Vady diela a záruka za akosť diela

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).
3. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými zástupcami.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.
5. Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozorniť. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.
7. V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevezme, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s

odstránením drobných väd a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom.

8. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezplatne.
9. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ **bezodkladne** po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok z väd podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia väd nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.
10. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9 tohto článku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.
11. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej objednávateľom podľa bodu 10 tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7 tohto článku sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane.
12. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a väd ohrozujúcich riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť ich čo v najkratšom čase.
13. O odstránení reklamovaných porúch a väd bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných väd a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
15. V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ popri nárokoch z väd podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.
16. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy vyzvať objednávateľa na ohliadku diela o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady odstrániť sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou.

ČASŤ 4

Záverčné ustanovenia

Článok XIII.

Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vadu v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
4. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
5. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý deň a to aj začatý deň omeškania.
6. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania.
7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ku ktorým sa zaviazal podľa opisu predmetu zákazky a ani napriek predchádzajúcej výzve objednávateľa nevykoná nápravu v lehote objednávateľom určenej, prípadne poruší povinnosti podľa článku IX. bod 6,7 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi, výkopovou suťou prípadne vybúraným materiálom podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
9. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
10. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak objednávateľ zistí, že stavbyvedúci nie je na stavenisku prítomný v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto zmluve alebo bol nahradený inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktorý prípad vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každé takéto porušenie a to aj opakovane.
11. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
12. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa článku XI. bod 9 vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania.
13. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany zhotoviteľa v dôsledku ktorého objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH.

14. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené porušenie nasledovne, a to aj opakovane:
- a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok,
 - b) za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca,
 - c) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie,
 - d) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca.
15. V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
16. Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.
17. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XIV.

Trvanie a zánik zmluvy

1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch alebo v zmluve.
2. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
- a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné,
 - b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
 - c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie povinností najmä v prípade, ak zhotoviteľ:
- a) v prípade porušenia zmluvy, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva,
 - b) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informácie,
 - c) z dôvodov uvedených v Zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 - d) zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,
 - e) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela alebo iných povinností ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohách,
 - f) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,

- h) v prípade insolvenzie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
 - i) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII zmluvy,
 - j) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávatel' poskytne,
 - k) neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy,
 - l) zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia dokumentácie podľa tejto zmluvy,
 - m) napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatíu zásielky, uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním kuriérskej služby.
 5. Objednávatel' je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní porušenie povinnosť zakladajúcu právo na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto skutočnosti správu.
 6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávatel'ovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávatel' je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
6. Prílohou tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou je:
 - a) Projektová dokumentácia (ako príloha č.1),
 - b) opis predmetu zákazky (ako príloha č. 2),
 - c) ocenený výkaz výmer (ako príloha č.3),

- d) vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 4),
e) plnomocenstvo (ako príloha č. 5),
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazal svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznáma s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
 9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenie dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielaťovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenie tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
 10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
 11. Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
 12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa: 19. FEB. 2024

V Košiciach, dňa:

Správa ciest
Košického samosprávneho kraja
N

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Ing. Peter Vaľko
Poverený riadením organizácie SC KSK

Za zhotoviteľa:

V Byšte, dňa: 13.02.2024

PROJEKT STAVBY

Stavba: *VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO
POTRUBIA SPRÁVA - CIEST TREBIŠOV*

Miesto : *TREBIŠOV*

Investor: *Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Košice*

Diel: **SO 01 VODOVODNÁ PRÍPOJKA**

Zodp. proj. prof.: *ŠTAUDNEROVÁ
VKP-PROJEKT s.r.o.
L. Podjavorinskej 2119/1
075 01 Trebišov*

Zoznam príloh :

<u>Č. prílohy</u>	<u>Názov prílohy</u>	<u>Počet A 4</u>
-------------------	----------------------	------------------

A. Textová časť :

1.	Technická správa	2
----	------------------	---

B. Výkresová časť

1.	Situácia	8
2.	Pozdĺžny rez vodovodnej prípojky	5
3.	Kladačský plán	2
4.	Uloženie potrubia v teréne - súbeh	2
5.	Uloženie potrubia v chráničke	1
6.	Uloženie potrubia v teréne	2
7.	Začiatok a ukončenie vodiča	2

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Č. j. T2-250/2002

OSVEDČENIE

VYDANÉ PODĽA § 43c ZÁKONA NR. SR č. 138/1992 Zb.
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Helena ŠTAUDNEROVÁ

Technická správa

SO 01 Vodovodná prípojka

Stavba: *VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO
POTRUBIA - SPRÁVA CIEST TREBIŠOV*
Miesto : *TREBIŠOV*
Investor: *Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Košice*

Všeobecne :

Na základe objednávky investora bol vypracovaný projekt výmeny havarijného vodovodného a plynového potrubia pre Správu ciest Trebišov pre č. parcely 3307/1.

Vodovodná prípojka pre daný areál napojená na verejný vodovod. Projektová dokumentácia rieši časť vodovodnej prípojky v havarijnom stave, ktorú je potrebné vymeniť. Dimenzia vodovodnej – areálovej prípojky sa nemení.

Pre meranie spotreby vody slúži jestvujúca vodomerná šachta umiestnená na parcele investora.

Zemné práce :

Zemné práce pre vodovodnú - areálovú prípojku začíname od miesta napojenia v AB budove smerom k objektu skladu po vytýčení trasy jestvujúcich podzemných vedení. Po vykopaní ryhy pre vodovodnú prípojku je potrebné upraviť dno ryhy a to štrkopieskom hr. 150 mm. Rýhu nad 1,30 m pažíme prílohným pažením. Na takto upravené dno ukladáme polyetylénové rúry DN 32. Po úspešnom prevedení tlakovej skúšky vodovodného potrubia môžeme ryhu zasypávať a to tak, že do výšky 300 mm nad vrcholom hrdla rúra prevedieme obsyp potrubia triedeným materiálom a zvyšok ryhy zasypávame po vrstvách 200 mm už netriedeným materiálom za súčasného odstraňovania paženia. Po ukončení zemných prác upraviť do pôvodného stavu prekopané plochy.

Pod cestou a pod spevnenou plochou parkoviska doporučujem riešiť riadenú podvrťávkou.

Trasa navrhovanej vodovodnej prípojky bude križovať spevnenú plochu parkoviska a vjazd do areálu firmy. Križovanie doporučujem riešiť riadenou bezvýkopovou technológiou – mikrotunelovaním popod cestu.

Pred začatím prác je potrebné dôkladne naštudovať vlastnosti a zloženie pôdy, rozmiestnenie podzemných inžinierskych sietí. Samotné riadenie horizontálne riadenia sa vykonáva v troch fázach: vŕtanie pilotného otvoru, rozšírenie otvoru a zaťahovanie potrubia.

Vŕtanie pilotného otvoru sa vykonáva pomocou vŕtnej hlavy a sondy so vstavaným vysielacom. Poloha vŕtnej hlavy je v každom momente posunu kontrolovaná pomocou navigačného systému a sondy. Navigačné zariadenia umožňuje vedenie vrtu. Poloha vŕtnej hlavy je počas celého vŕtania kontrolovaná pomocou elektronického riadiaceho systému. Samotná vŕtná hlava je umiestnená na ohybe vŕtnej kolóny s vysokotlakovými dýzami. Zemina sa rozrušuje reznými nožmi na riadenej hlave a prúdom vŕtnej kvapaliny striekajúcej z dýz. Po navŕtaní na druhú stranu do bodu vopred určeného sa vŕtná hlava pilotného vrtu vymení za rozširovaciu hlavu. Celý vrt je neustále naplnený stabilizujúcou suspenziou. V poslednej fáze sa zatiahne potrubie.

Vodovod :

Pre novonavrhovanú vodovodnú prípojku spoločnú sú navrhnuté polyetylénové rúry tlakové DN 32 v dĺžke 168,00 m. Napojenie vodovodnej prípojky bude na jestvujúcej - areálovej vodovodnej prípojke pomocou príslušnej tvarovky. Spájanie polyetylenových rúr a tvaroviek je príslušnými spojovacími tvarovkami.

Každé vodovodné potrubie musí byť pred uvedením do prevádzky podrobené skúške vodou podľa STN 75 5911:1995-08. Konce skúšaného úseku, otvory pre odbočky musia byť riadne zaslepené.

Množstvo spotreby vody pre areál sa nemení, nakoľko sa jedná o výmenu vodovodného potrubia z dôvodu havarijného stavu jestvujúcej areálovej prípojky.

Poznámka :

Pri súbehu a križovaní vodovodnej prípojky s inými podzemnými vedeniami dodržať vzdialenosti podľa STN 73 6005.


Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe, ale aj samotnej prevádzky je bezpodmienečne potrebné dodržať všetky zákonné ustanovenia, normy, predpisy a ustanovenia vyhlášky č.147/2013, účinnej od 1.7.2013.

Pri montáži jednotlivých materiálov a technológií dodržať technologický popis výrobcu.

Nad vodovodnú prípojku umiestniť vyhľadávací vodič CY 6

Pred začatím zemných prác vytýčiť všetky podzemné vedenia !


SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Č. j. T2-250/2002
OSVEDČENIE
VYDANÉ PODEĽA § 43c ZÁKONA NR SR č. 138/1992 Zb.
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
Helena ŠTAUDNEROVÁ

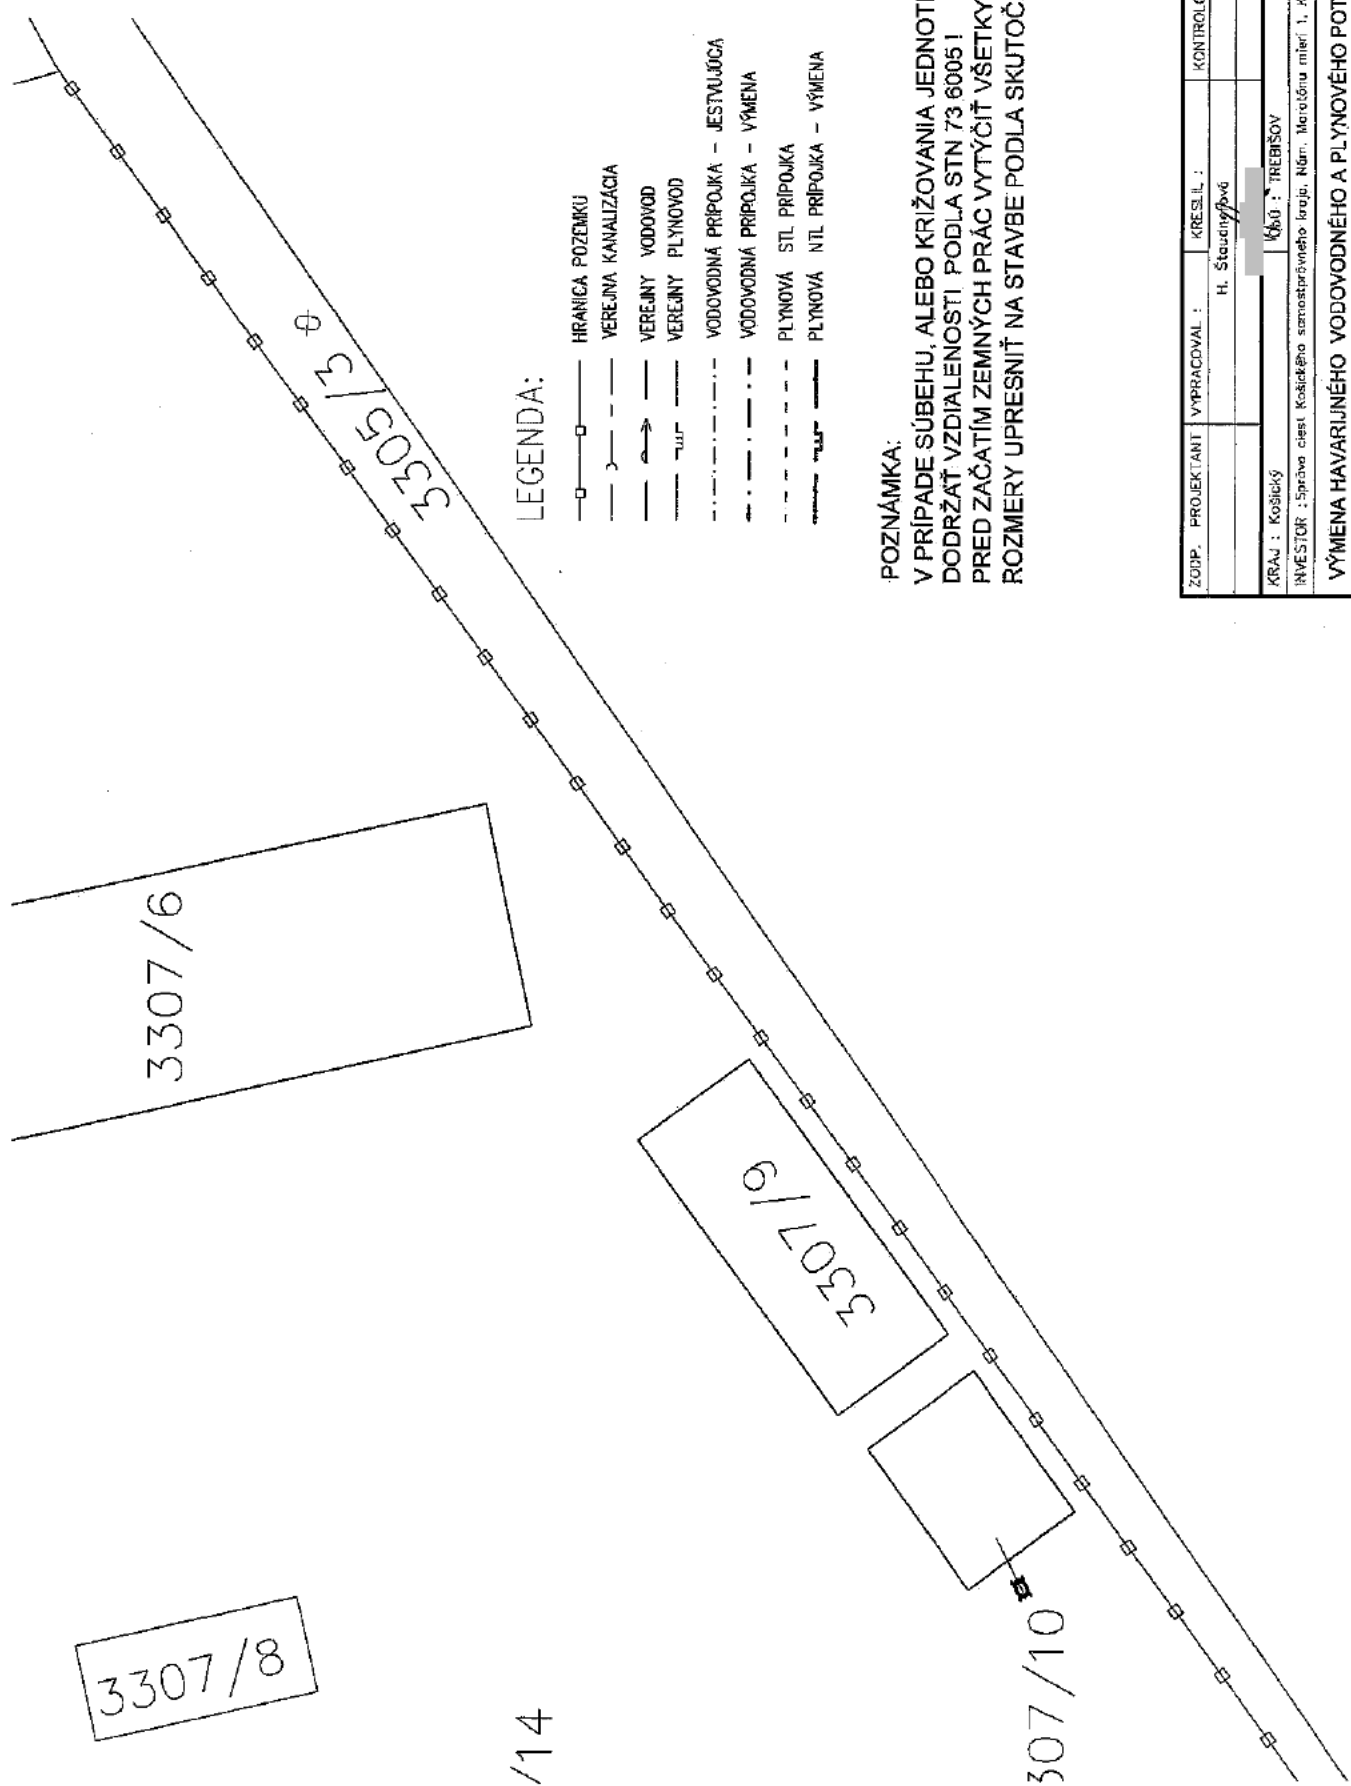

114

LEGENDA:

- HRANICA POZEMKU
- - - - - VEREJNA KANALIZÁCIA
- VEREJNY VODOVOD
- ~— VEREJNY PLYNOVOD
- - - - - VODOVODNÁ PRÍPOJKA - JEŠTĽAVÚCA
- - VODOVODNÁ PRÍPOJKA - VÝMENA
- - - - - PLYNOVÁ STL PRÍPOJKA
- ~— PLYNOVÁ NTL PRÍPOJKA - VÝMENA



POZNÁMKA:








V PRÍPADE SÚBEHU, ALEBO KRIŽOVANIA JEDNOTLIVÝCH POTRUBÍ
DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005 !
PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA!
ROZMERY UPRESNIŤ NA STAVBE PODĽA SKUTOČNOSTI !

2

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Č. I. 72/95/2002
Č. SVEDČENÍ E
vydane podľa § 43a zákona NR SR č. 131/1992 Zb.
v znení nariadení vlády SR
HELENA STAUDNEROVÁ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁV	KRESIL	KONTROLOVAL	WKP PROJEKT s.r.o. L. PODJAVORINSKEJ 2119/1 075 01 Trebišov
KRAJ : Košický	H. Staudnerová			FORMÁT B x A4
INVESTOR : Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Mieru 1, Košice				DAŤUM 03 / 2023
VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA				ÚČEL SP
SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV				ČÍSLO KÓPIE
SO 01 VODOVODNÁ PRÍPOJKA				MIERKA 1 : 250
				VÝKRES ČÍSLO 1
SITUÁCIA				

11

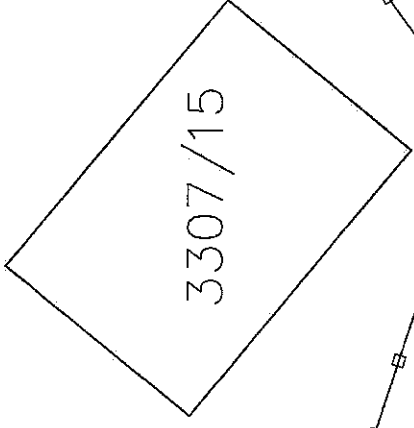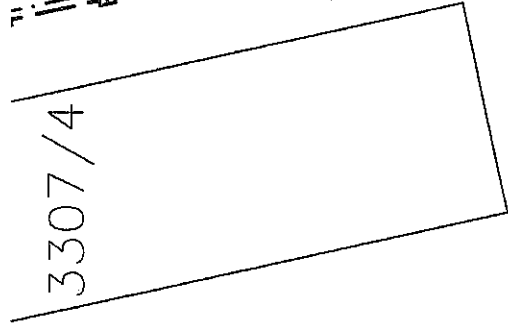

3308/3

Ruskovská

STL PLYNOVOD

JESTVUJÍCÁ
PLYNOVÁ PRIPOJKA

PE DN 80, DL 32,60 m
2000

JESTVUJÍCCE POTRUBIE
PLYNOVEJ NTL PRIPOJKY
PE DN 40, DL 4,50 m

TRAFO

JESTVUJÍCCE POTRUBIE
PLYNOVEJ STL PRIPOJKY
PE DN 40

RTP

3307/5


VÝMENA POTRUBIA
VODOVODNEJ PRIPOJKY
PE DN 32, DL 46,60 m

330

Okračná čisla



SPEVNENÁ PLOCHA – P.č. 3307/1
55,60 m

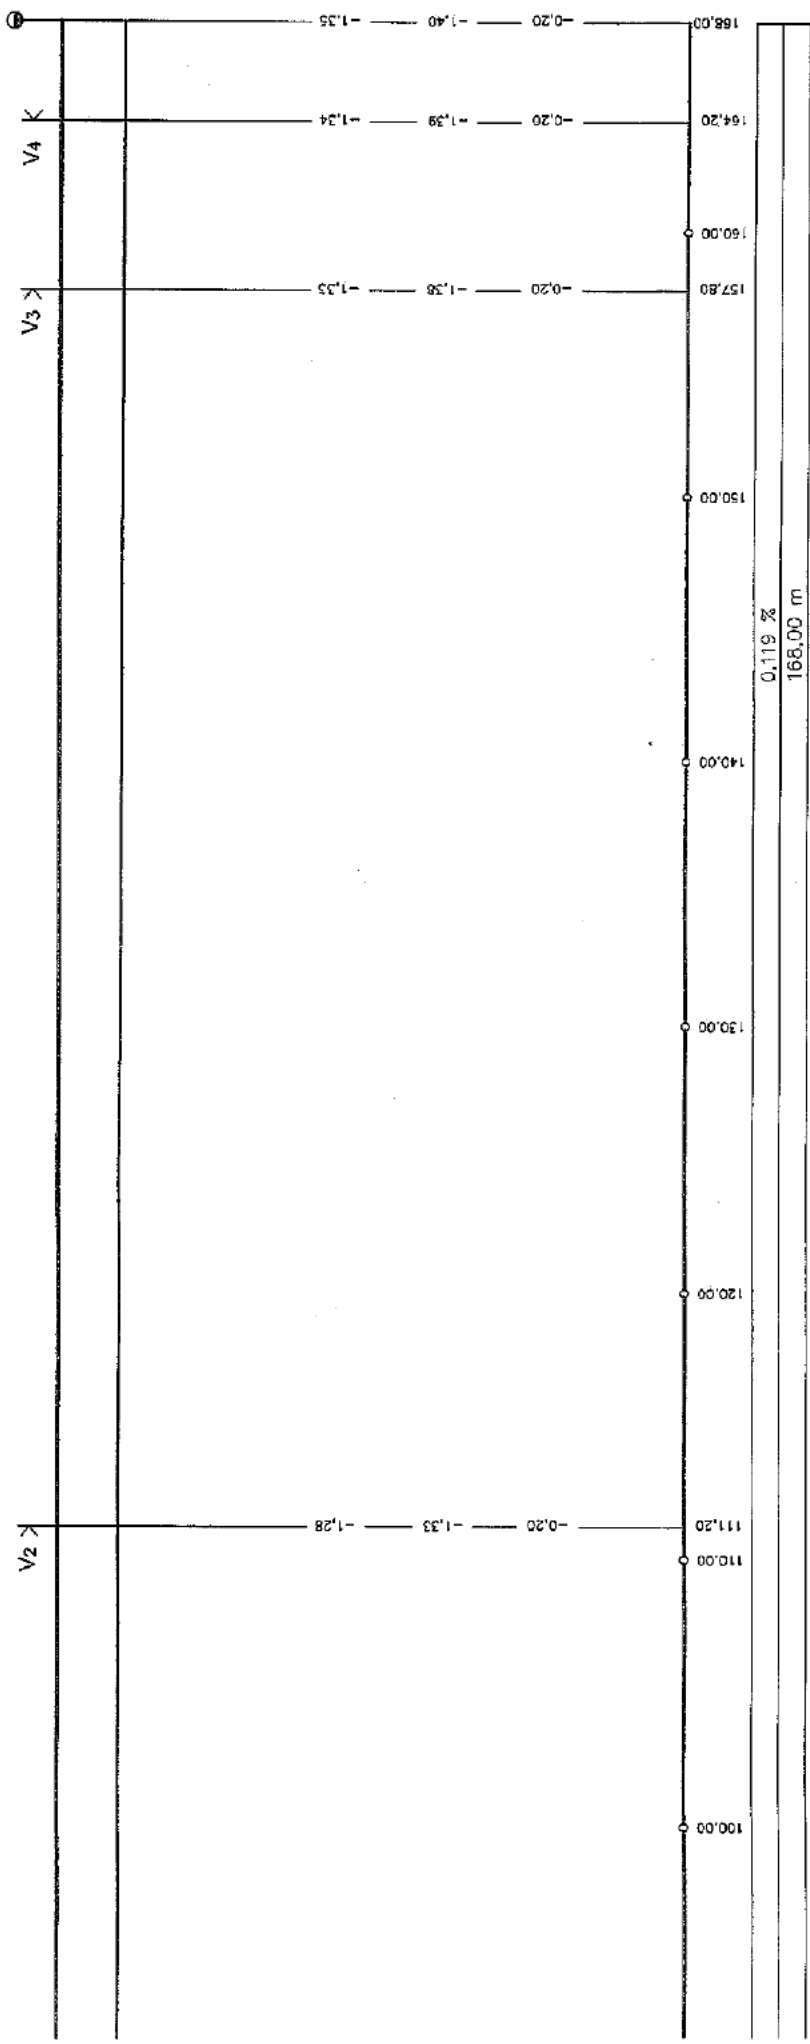

LEGENDA

- KONIEC PRIPOJKY
- ZAČIATOK PRIPOJKY
- V 14 VRCHOLOVÝ BOD

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Č. J. 12-2/202002
O S V E D Č E N Í E
vydané podľa § 63a zákona NR SR č. 130/1997 Zb.
v znení neskorších predpisov
HELENA STAČNEROVÁ


ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	KRESIL :	KONTROLOVAL :	VKP PROJEKT s.r.o.
	H. Stačnerová			L. PODJAVORSKEJ 2119/1
KRAJ : Košický	OBJ. : TREBIŠOV			075 01 Trebišov
INVESTOR : Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Moravčáku miera 1, Košice				FORMÁT : 5 x A4
VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA				DAŤUM : 03 / 2023
SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV				OCIEL : SP
VODOVODNÁ PRIPOJKA				ČÍSELNÉ KÓPIE
				MIERKA : VÝKRES ČÍSLO
				1 : 2000/100


POZNÁNKY REZ VODOVODNEJ PRIPOJKY

POZDLŽNY REZ VODOVODNEJ PRÍPOJKY

M 1:200/100

ZEMIE LŽKA	SPEVNENÁ PLOCHA – P.č. 3307/1		ZELENÝ PAS – P.č.	
	33,60 m		78,80 m	

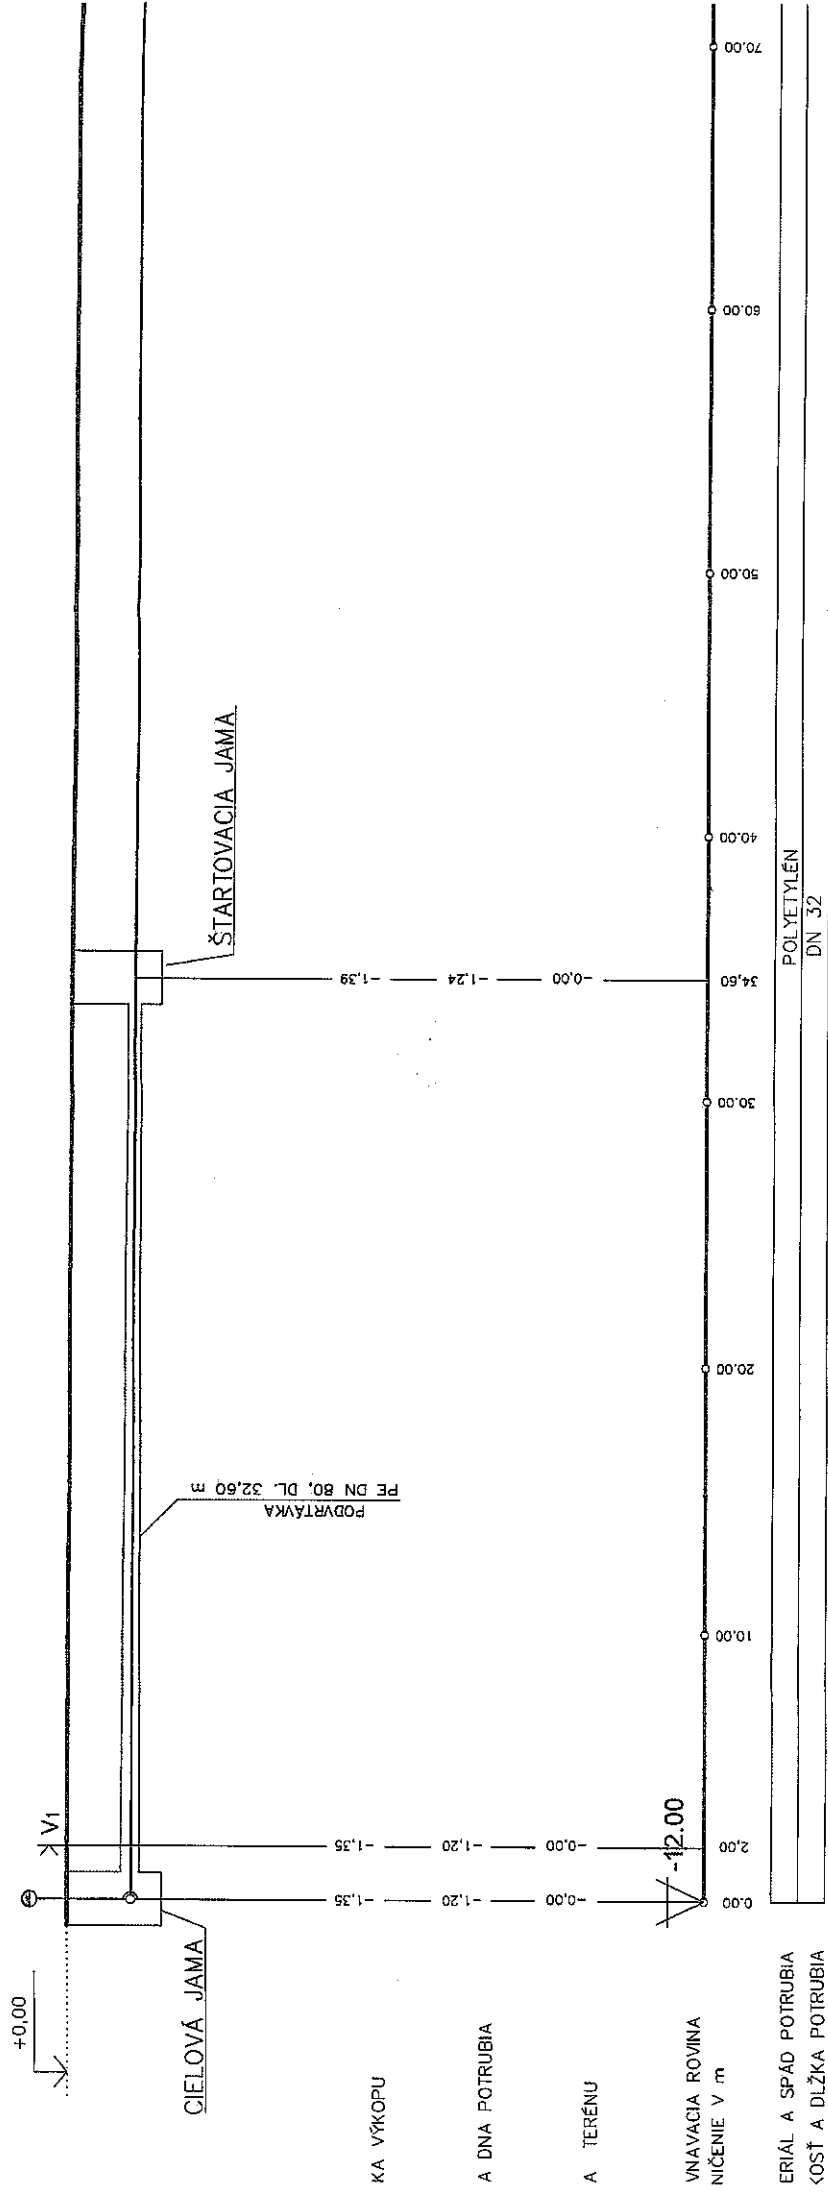

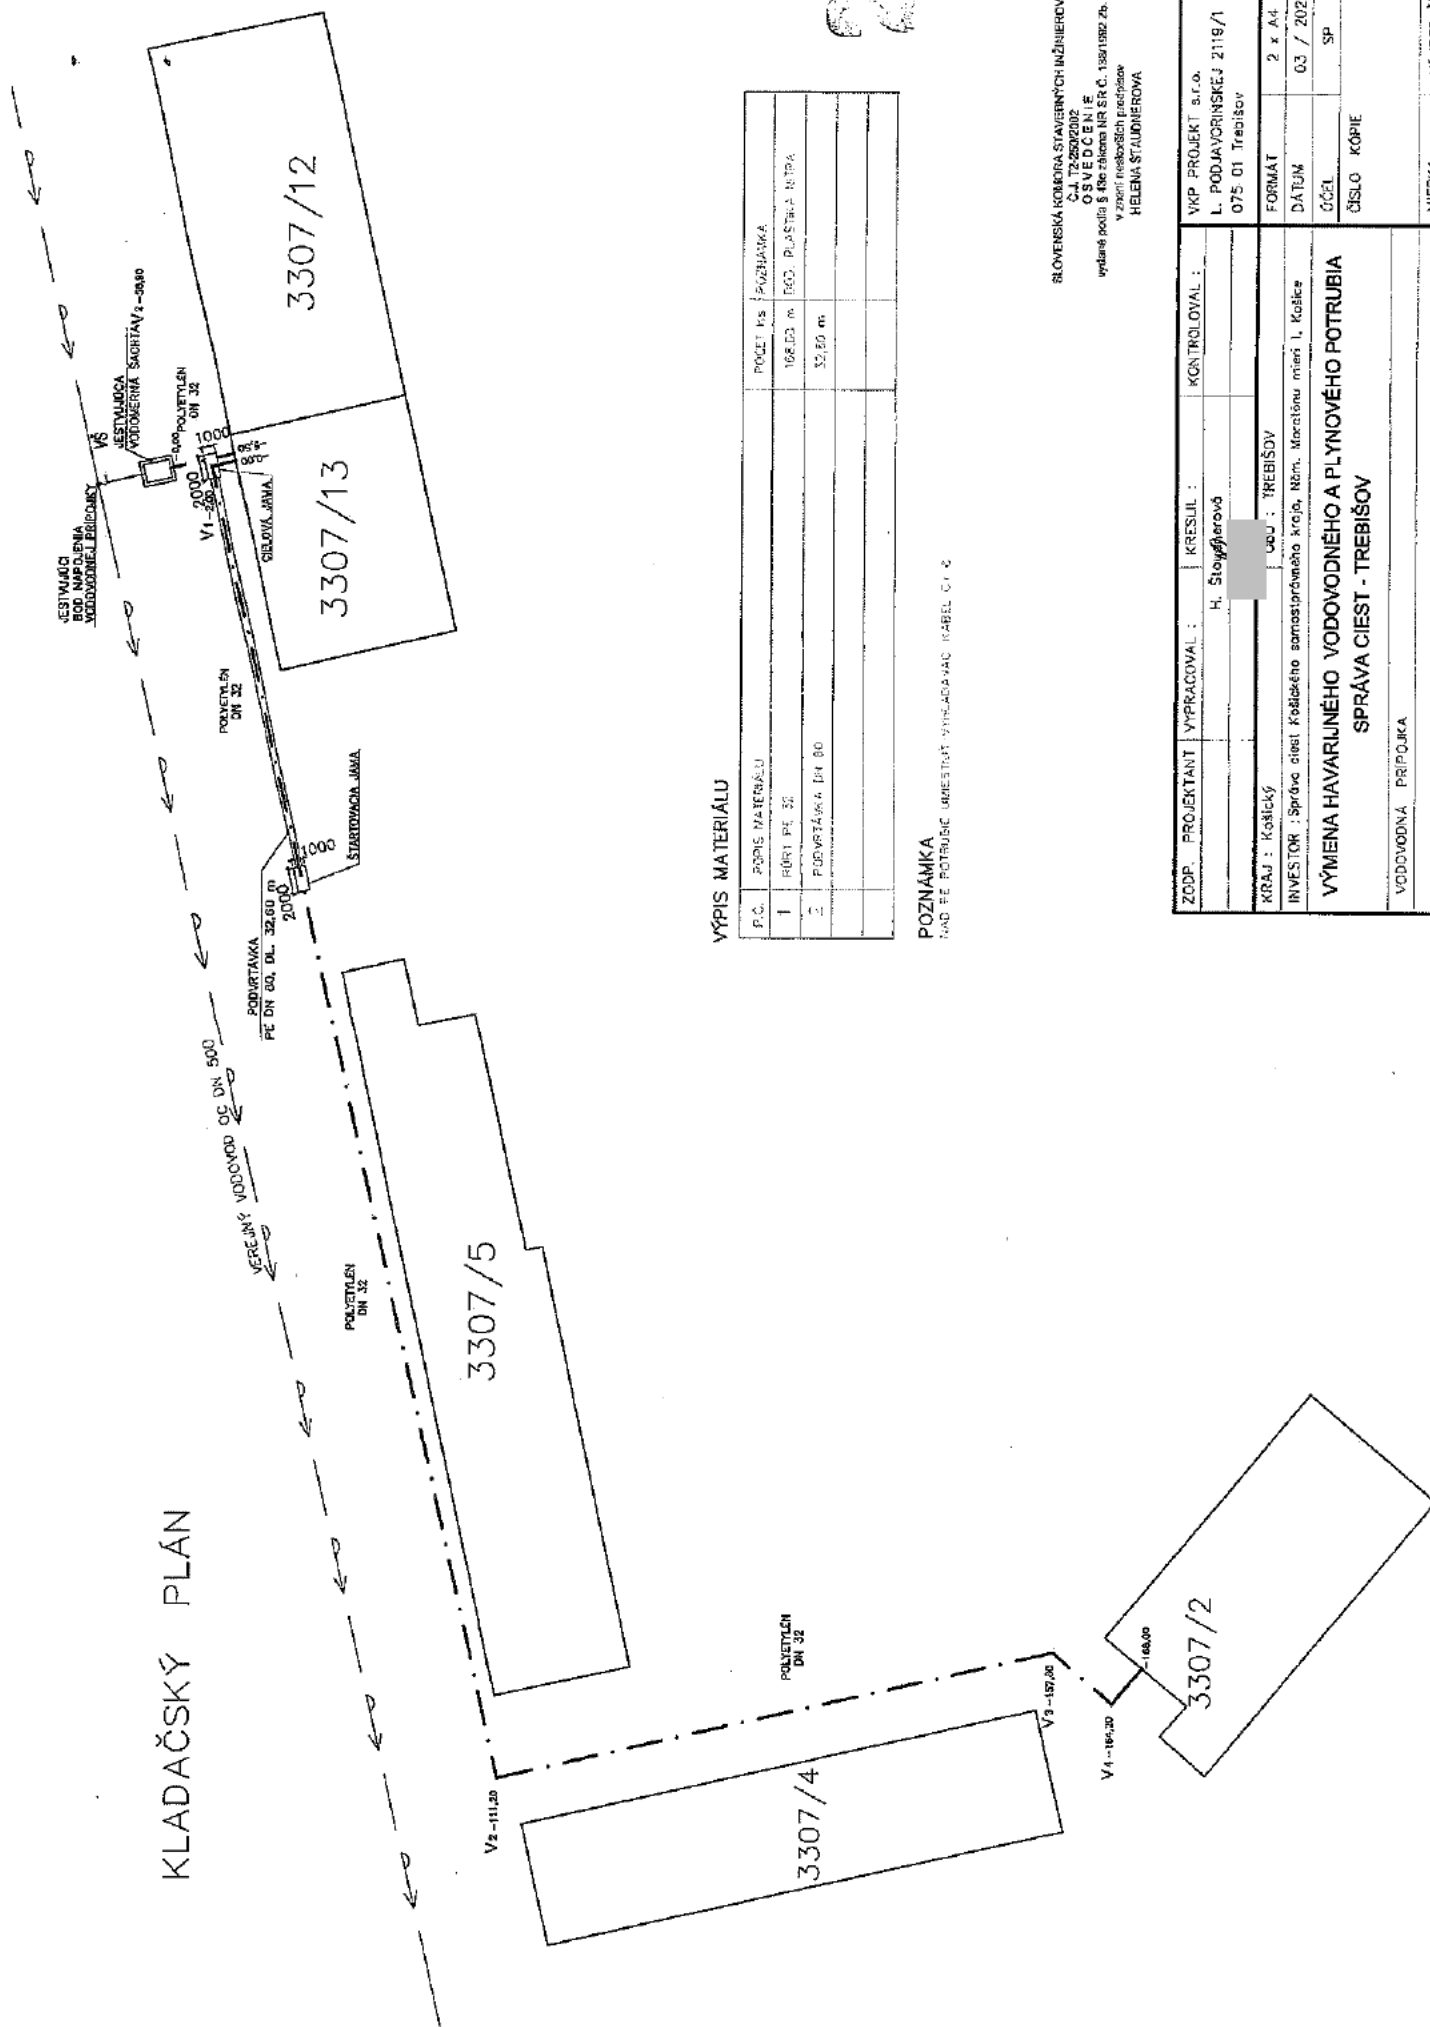

POZNÁMKA

HAD THE POTENTIAL QUESTIONS REGARDING KAPLAN'S

P.O.	PODS MARINARU	PODET IS	POZNAJKA
1	HORI PT 32	108.02 m	ECO. PLASTIC NITRA
2	PUSVATARA PT 80	32.80 m	

POZNÁMKA


HAD THE POTENTIAL QUESTIONS REGARDING KAPLAN'S

SLOVENSKÁ KOMORA STAVBYNNÝCH INŽINIEROV
Č.j. T2-250/2002
OSVIEDČENIE
vydané podľa § 43e zákona NR SR č. 135/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
HELENA STAUDNEROVÁ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAV : H. Stojanová	KRESIL : [redacted]	KONTROLOVAL :
KRAJ : Košický	OBJ : TREBIŠOV		
INVESTOR : Správa ciest	Kódového samosprávneho kraja, Nám. Mestského miesta 1, Košice		
VÝMENA HAVARIJNEHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV			
VODOVODNÁ PRÍPOJKA			
VÝKRES ČÍSLO			3

ULOŽENIE POTRUBIA V TERÉNE – SÚBEH


REZ A-A'

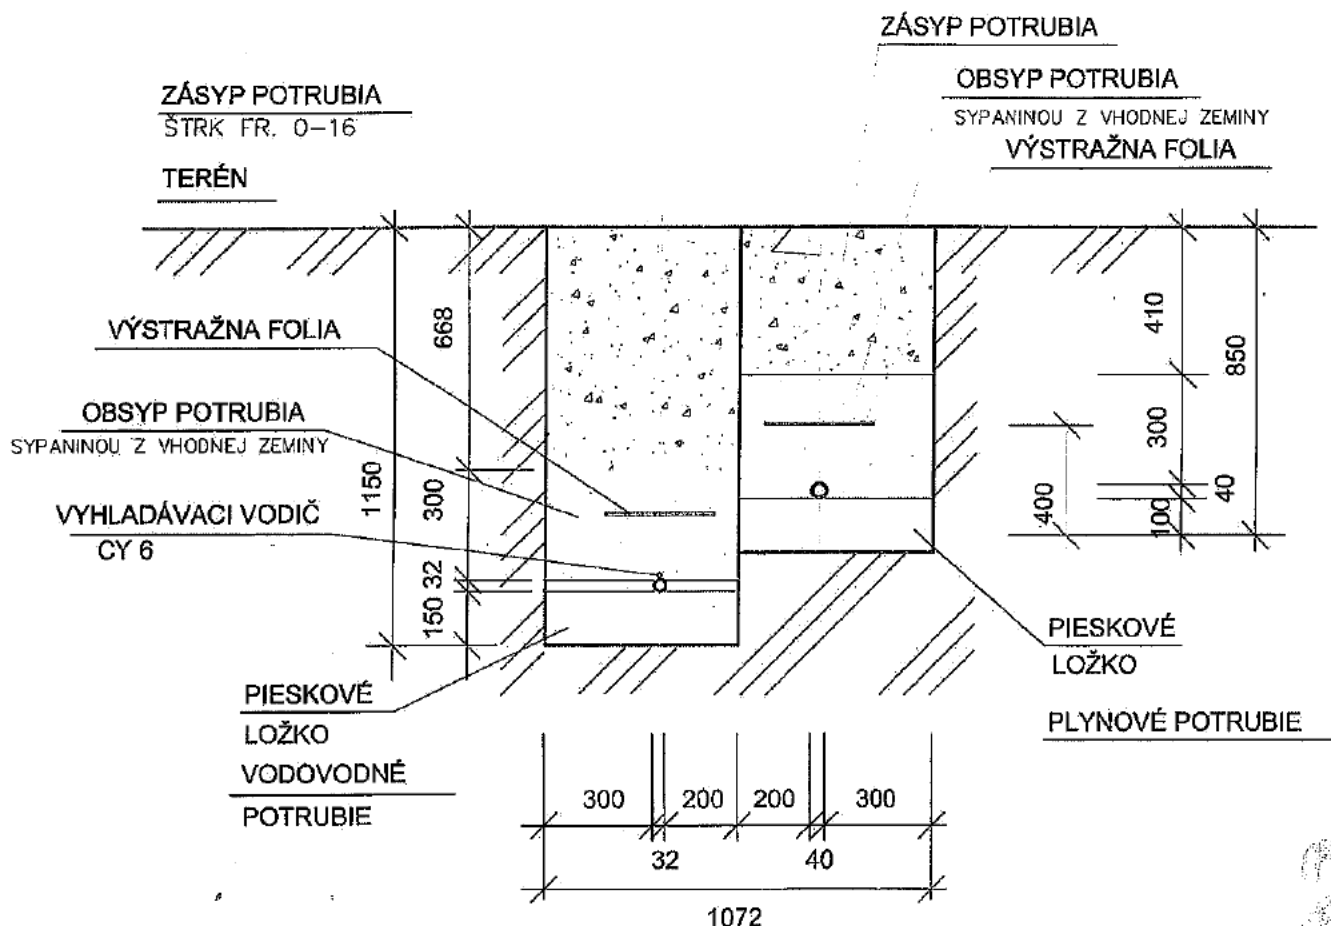

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Č.J. T2-250/2002
OSVEDČENIE
vydané podľa § 43c zákona NR SR Č. 138/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
HELENA ŠTAUDNEROVA

ZODP. PROJEKTANT : VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTRÓLOVAL :	VKP PROJEKT s.r.o. L. PODJAVORINSKEJ 2119/1 075 01 Trebišov	
	H. Štaudnerová			
KRAJ : Košický		ObÚ : TREBIŠOV		FORMÁT
INVESTOR : Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Moratónu mier 1, Košice				1x A4
VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA				DÁTUM
SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV				03 / 2023
VODOVODNÁ PRÍPOJKA				ÚČEL
				SP
				ČÍSLO KÓPIE
				MIERKA
				1 : 20
				VÝKRES ČÍSLO
				4

ULOŽENIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE

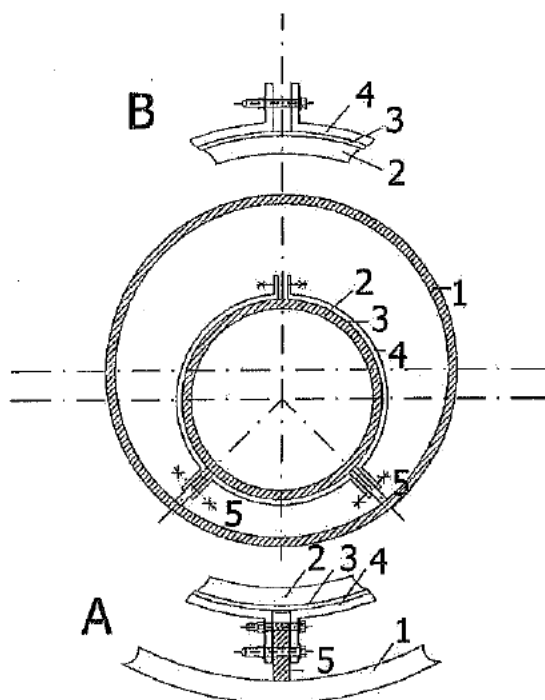

ULOŽENIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE

A - DETAIL POJAZDNÉHO SEDLA S KOLIESKOM

B - DETAIL SPOJA

1 - CHRÁNIČKA

2 - POTRUBIE

3 - IZOLAČNÝ GUMOVÝ PÁS

4 - POJAZDNÉ SEDLO

5 - OCEĽOVÉ KOLIESKO


2

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Č.J. T2-250/2002
O S V E D Č E N I E
vydané podľa § 43c zákona NR SR č. 138/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
HELENA ŠTAUDNEROVÁ

ZODP.	PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :	VKP PROJEKT s.r.o.
			H. Štaudnerová		L. PODJAVORINSKEJ 2119/1
					075 01 Trebišov
KRAJ : Košický					ObČ : TREBIŠOV
INVESTOR : Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Morotínu mieri 1, Košice					FORMÁT
VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA					1 x A4
SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV					DÁTUM
					03 / 2023
					ÚČEL
					SP
					ČÍSLO KÓPIE
VODOVODNÁ PRIPOJKA					
ULOŽENIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE					MIERKA
					VÝKRES ČÍSLO
					5

ZAČIATOK A UKONČENIE VODIČA

UKONČENIE VODIČA V POKLOPE

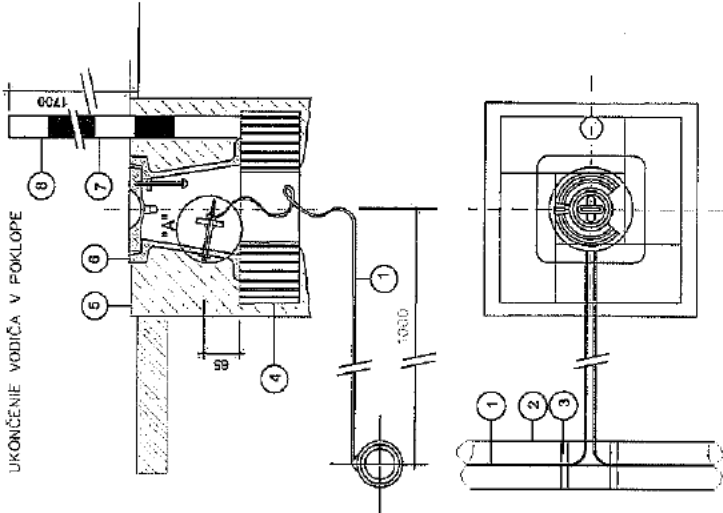


LEGENDA

NOVÝ MATERIÁL	POSL. ROZMERA
1. KABEL	1.15
2. KABEL	1.15
3. KABEL	1.15
4. KABEL	1.15
5. KABEL	1.15
6. KABEL	1.15
7. KABEL	1.15
8. KABEL	1.15
9. KABEL	1.15
10. KABEL	1.15
11. KABEL	1.15
12. KABEL	1.15
13. KABEL	1.15
14. KABEL	1.15
15. KABEL	1.15


LEGENDA

NOVÝ MATERIÁL	POSL. ROZMERA
1. KABEL	1.15
2. KABEL	1.15
3. KABEL	1.15
4. KABEL	1.15
5. KABEL	1.15
6. KABEL	1.15
7. KABEL	1.15
8. KABEL	1.15

ZAČIATOK VODIČA V ŠACHTE

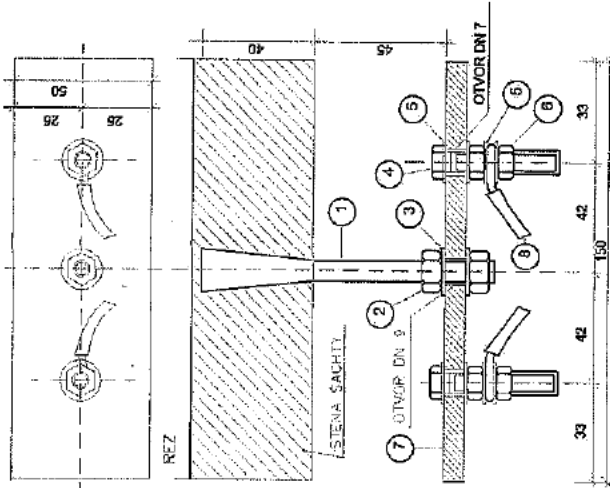

DETAIL "A"

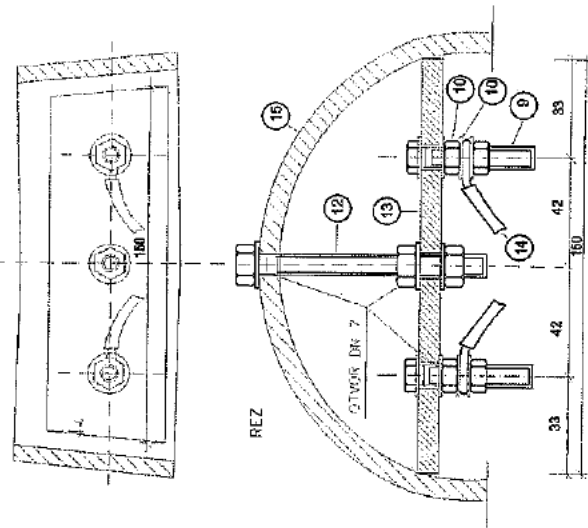

SLOVENSKÁ KOMORA STAVBYNÝCH INŽINIEROV
ČJ 12-250/2002
O SVETLO
vydanie podľa § 40c zákona NR SR č. 136/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
HELENA STAUDNEROVÁ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	KRESIL :	KONTROLOVAL :	VAP PROJEKT s.r.o.
	H. Štancigrová			L. PODJAVSKÉJ 2119/1
KRAJ : Košický				075 01 Trebišov
INVESTOR : Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Jurečtenu mládež 1, Košice				FORMÁT 2 x A4
VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA				DATUM 03 / 2023
SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV				ÚČEL SP
VODOVODNÁ PRÍPOJKA				ČÍSLO KÓPIE
ZAČIATOK A UKONČENIE VODIČA				MIERA
				VÝKRES ČÍSLO 7

PROJEKT STAVBY

Stavba: **VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO
POTRUBIA SPRÁVA - CIEST TREBIŠOV**

Miesto : **TREBIŠOV**

Investor: *Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Košice*

Diel: **SO 02 PLYNOVÁ PRÍPOJKA**

Zodp. proj. prof.: **ŠTAUDNEROVÁ**
VKP-PROJEKT s.r.o.
E. Podjavorinskej 2119/1
075 01 Trebišov

Z o z n a m p r í l o h :

Č. prílohy	Názov prílohy	Počet A 4
-------------------	----------------------	------------------

A. Textová časť :

1.	Technická správa	2
----	------------------	---

B. Výkresová časť

1.	Situácia	8
2.	Pozdĺžny rez plynovej NTL prípojky - výmena	2
3.	Nadzemný prechod plynovodu	1
4.	Uloženie potrubia v teréne - súbeh	1

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Č. j. T2-250/2002

OSVEDČENIE

VYDANÉ PODĽA § 43c ZÁKONA NR SR č. 138/1992 Zb.

V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Helena ŠTAUDNEROVÁ

Technická správa
SO 02 Plynová prípojka

Stavba: **VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO**
POTRUBIA - SPRÁVA CIEST TREBIŠOV
Miesto : **TREBIŠOV**
Investor: *Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Košice*

Všeobecne:

Na základe objednávky investora bol vypracovaný projekt výmeny havarijného vodovodného a plynového potrubia pre Správu ciest Trebišov pre č. parcely 3307/1.

Na parcele č. 3307/1 sa nachádza pripojovací NTL plynovod, napojený na verejný NTL plynovod, ktorého časť je v havarijnom stave a preto je potrebná jeho výmena. Výmena sa rieši od jestvujúceho RTP po jestvujúci plynomer pri budove – p.č. 3307/2.

NTL parametre jestvujúceho pripojovacieho plynovodu výmena:

Technické údaje:

Celková dĺžka	59,40 m
Dimenzia potrubia d	D 40 x 3,7
Materiál potrubia	PE rúry - SDR 11
Prepravované médium	zemný plyn naftový
Prenášaný hodinový výkon prípojky sa nemení.	

Pripojovací jestvujúci NTL plynovod:

NTL pripojovací plynovod pre daný objekt je jestvujúci napojený na uličnú distribučnú sieť. Nakoľko jestvujúci NTL rozvod plynu s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 2,1 kPa, je v havarijnom stave je potrebná jeho výmena.

Trasa navrhovanej prípojky - výmeny bude vedená od bodu napojenia – pri RTP v zemi, v hĺbke min. 1m, smerom k skrinke s plynomerom pri objekte s p.č. 3307/2. Prípojka bude prepojená prechodkou oceľ / PE 50/40 pred uzáverom plynu GU25, ktorý je osadený pred plynomerom a RTP, v skrinke,

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia podľa vyhlášky 147/2013

Jestvujúce plynové zariadenie je odberným plynovým zariadením s pretlakom do 0,4 MPa a podľa vyhlášky 147/2013 je zaradené do skupiny „B“ písmeno „g“. Z toho vyplýva povinnosť prevádzkovateľa tohto zariadenia prevádzať každé 3 roky odbornú prehliadku a každých 6 rokov odbornú skúšku, ktorú musí previesť spôsobilý odborný pracovník.

Kovové časti plynovodu vybaviť izoláciou proti korózii. Kvalitu izolácie skontrolovať podľa STN EN 12007-1:2013-07. Nadzemné časti rozvodu chrániť základným a dvojnásobným krycím syntetickým náterom žltej farby.

Tlakové skúšky

Po skončení montáže plynovodu musí dodávateľ vykonať tlakovú skúšku. Tlaková skúška vzduchom sa vykonáva podľa STN EN 12327 na zasypanom potrubí pričom armatúry nesmú byť

zasypané. Technologický postup skúšok spracúva dodávateľ potrubnej časti plynovodu. Tlakovú skúšku nového vykoná dodávateľská organizácia oprávneným pracovníkom v zmysle vyhl. č. 147/2013 Zb a zodpovedného zástupcu budúceho prevádzkovateľa /napr. SPP distribúcia a.s./

Skúšobný pretlak potrubia plynovodu je 600 kPa. Podľa uvedenej STN sa prevádzajú aj tlakové skúšky potrubí z polyetylénu vid' TPP 702 02 bod 8 Skúšanie potrubia. V priebehu tlakovej

skúšky sa nesmú na potrubí vykonávať žiadne práce alebo zásahy, ktoré by mohli ovplyvniť jej priebeh a výsledok. Pri tlakovej skúške plynového potrubia uloženého v zemi, musí byť toto potrubie zasypané okrem armatúr a rozoberateľných spojov. Voľné konce skúšaného úseku plynovodu musia byť uzatvorené zaslepovacími prírubami, resp. privarovacími dnami alebo zátkami. Nadzemná časť potrubí nesmie byť zamurovaná a ani opatrená ochranným náterom. Tlaková skúška bude stlačeným vzduchom alebo inertným plynom. Pred tlakovou skúškou je potrebné 24 -hodinové ustálenie pretlaku v plynovode. Zvyšovanie skúšobného pretlaku v potrubí musí byť realizované plynulo. Kontrola pretlaku sa vykonáva deformačným tlakomerom s rozsahom 0÷1 MPa, s triedou presnosti min. 2,5 % a s priemerom púzdra 160 mm. Zmeny pretlaku pri tlakovej skúške možno sledovať deformačným tlakomerom s triedou presnosti min. 2,5%, alebo diferenčným tlakomerom oproti nádobe, alebo inými schválenými prístrojmi.

Doba trvania tlakovej skúšky je:

a/ min. 4 h pri použití deformačného tlakomeru; po 4 h sa skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 h U-tlakomerom.

b/ min. 1 h pri použití diferenčného tlakomeru, alebo inej schválenej meracej techniky

Tesnosť armatúr a rozoberateľných spojov sa overuje penotvorným roztokom, alebo detektorom.

Tesnosť plynovodu je vyhovujúca, ak v priebehu tlakovej skúšky:

- nenastala zmena pretlaku vplyvom úniku skúšobného média
- neboli zistené netesnosti na rozoberateľných spojoch, alebo tieto netesnosti boli odstránené.

Tesnosť armatúr a rozoberateľných spojov sa overuje penotvorným roztokom pri začatí a ukončení tlakovej skúšky.

Všetky armatúry a meracie prístroje musia byť počas skúšky zabezpečené proti manipulácii nepovoleným osobám.

V prípade, ak skúška nie je úspešná, musí byť po odstránení nedostatkov zopakovaná. Pre možnosť zistenia miest netesnosti pri opakovanej skúške, je potrebné použiť odorant. O vykonanej skúške musí byť spísaný zápis podľa TPP 702 01 a účastníci skúšky musia svojim podpisom zápis potvrdiť.

Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak sa dovtedy plynovod neuvedie do prevádzky, skúška sa musí zopakovať.

Dodávateľ je povinný vypracovať podrobný technologický postup pre tlakovú skúšku a ten dať odsúhlasiť užívateľom plynovodu.

Hlavný uzáver:

Je ním jestvujúce šupátko DN 25 umiestnené pred plynomerom. Pre objekt je HUP umiestnený pred plynomerom.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné aby dodávateľ – realizátor prác plne rešpektoval požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č.147/2013 Zb. a zabezpečil jej aplikáciu na podmienky stavby. Počas prác sa musia dodržiavať platné normy, predpisy a ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pred začatím prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení v súbehu a v mieste križovania s navrhnutými rozvodmi, aby nedošlo k ich prípadnému porušeniu pri výkope. Obzvlášť dbať pri VN a NN vedení.

Záver:

Pri montáži jednotlivých zariadení dodržať technické a technologické postupy výrobcu zariadenia.

Poznámka:

Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe, ale aj samotnej prevádzky je bezpodmienečne potrebné

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV


Č. j. T2-250/2002

OSVEDČENIE

VYDANÉ PODĽA § 43c ZÁKONA NR SR č. 138/1992 Zb.

V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Helena ŠTAUDNEROVÁ

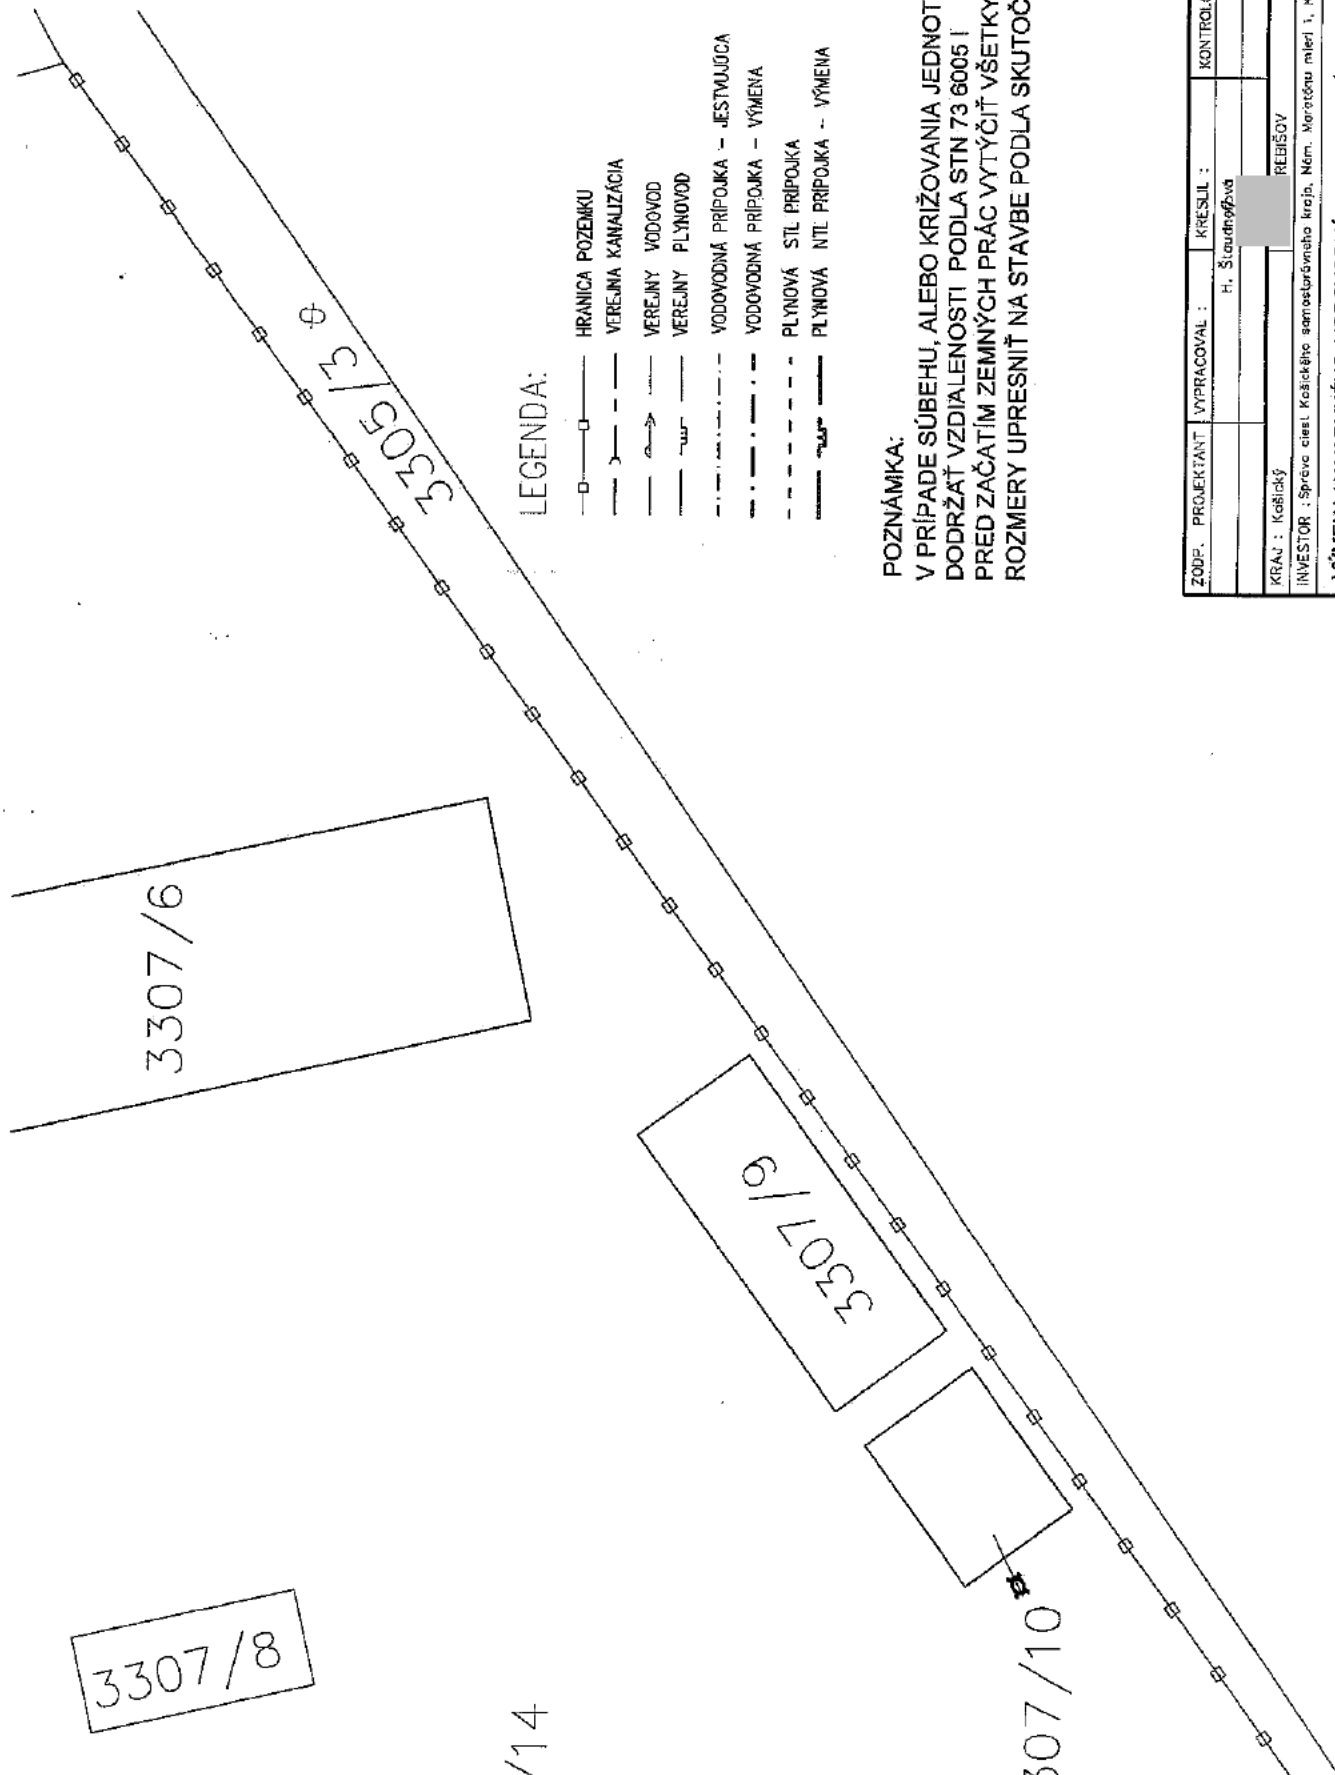

LEGENDA:

- HANICA POZENKU
-) VEREJNA KANALIZACIA
- > VEREJNY VODOVOD
- ~ VEREJNY PLYNOVOD
- VODOVODNÁ PRÍPOJKA -- JESTVUJÚCA
- VODOVODNÁ PRÍPOJKA -- VÝMENA
- PLYNOVÁ STL PRÍPOJKA
- PLYNOVÁ NTL PRÍPOJKA -- VÝMENA

POZNÁMKA:

V PRÍPADE SÚBEHU, ALEBO KRIŽOVANIA JEDNOTLIVÝCH POTRUBÍ
DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005 I
PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA!
ROZMERY UPRESNIŤ NA STAVBE PODĽA SKUTOČNOSTÍ!




2

SLOVENSKÁ KONGORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Č. J. 12 2002002
O S V E D Č E N Í E
vydané podľa § 46 zákona NR SR č. 138/1992 Zb.
v znení nariadení vlády SR
HELENA ŠTAUDINIEROVA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESIL	KONTROLOVAL
	H. Štaudinierova		
KRAJ : Košický			
INVESTOR : Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Moravského národa 1, Košice			
VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA			
SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV			
SÚ OT VODOVODNÁ PRÍPOJKA			
FORMÁT			
DATUM			
ÚČEL			
ČÍSLO KÓPIE			
MIERKA			
VÝKRES ČÍSLO			
1 : 250			
1			

SITUÁCIA

11

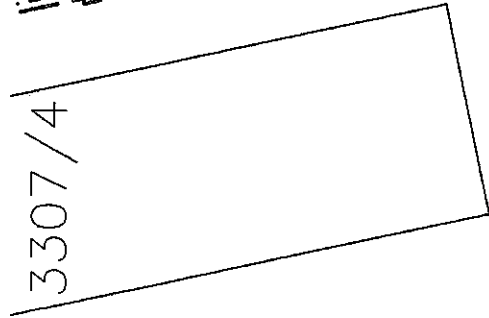

VÝMENA POTRUBIA
PLYNOVEJ NTL PRIPOJKY
PE DN 40, DL. 46,80 m


VÝMENA POTRUBIA
VODOVODNEJ PRIPOJKY
PE DN 32, DL. 6,40 m

VÝMENA POTRUBIA
VODOVODNEJ PRIPOJKY
PE DN 32, DL. 3,80 m


VÝMENA POTRUBIA
PLYNOVEJ NTL PRIPOJKY
PE DN 40, DL. 6,60 m

VÝMENA POTRUBIA
PLYNOVEJ NTL PRIPOJKY
PE DN 40, DL. 1,90 m
PE DN 40, DL. 4,30 m


PLYNOMER

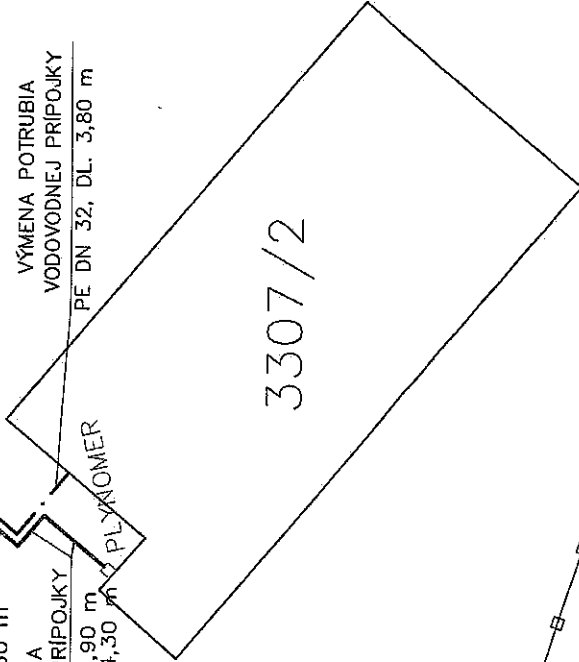

3307/2

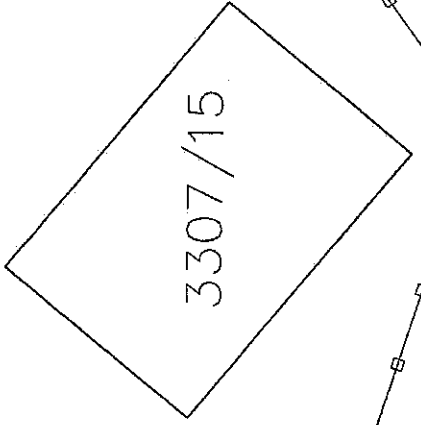


3307/15

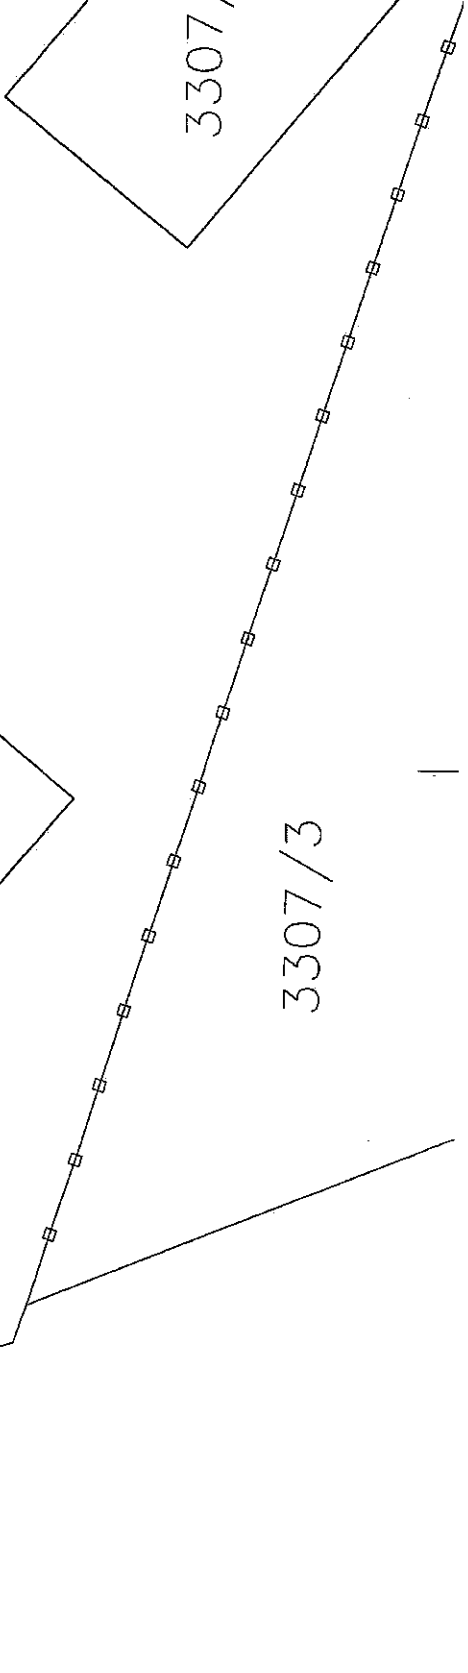


3307/3


d
3307/1

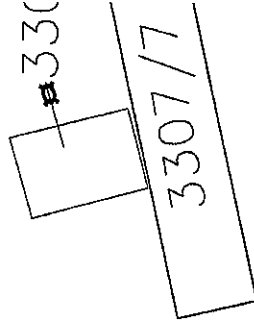

3307/7

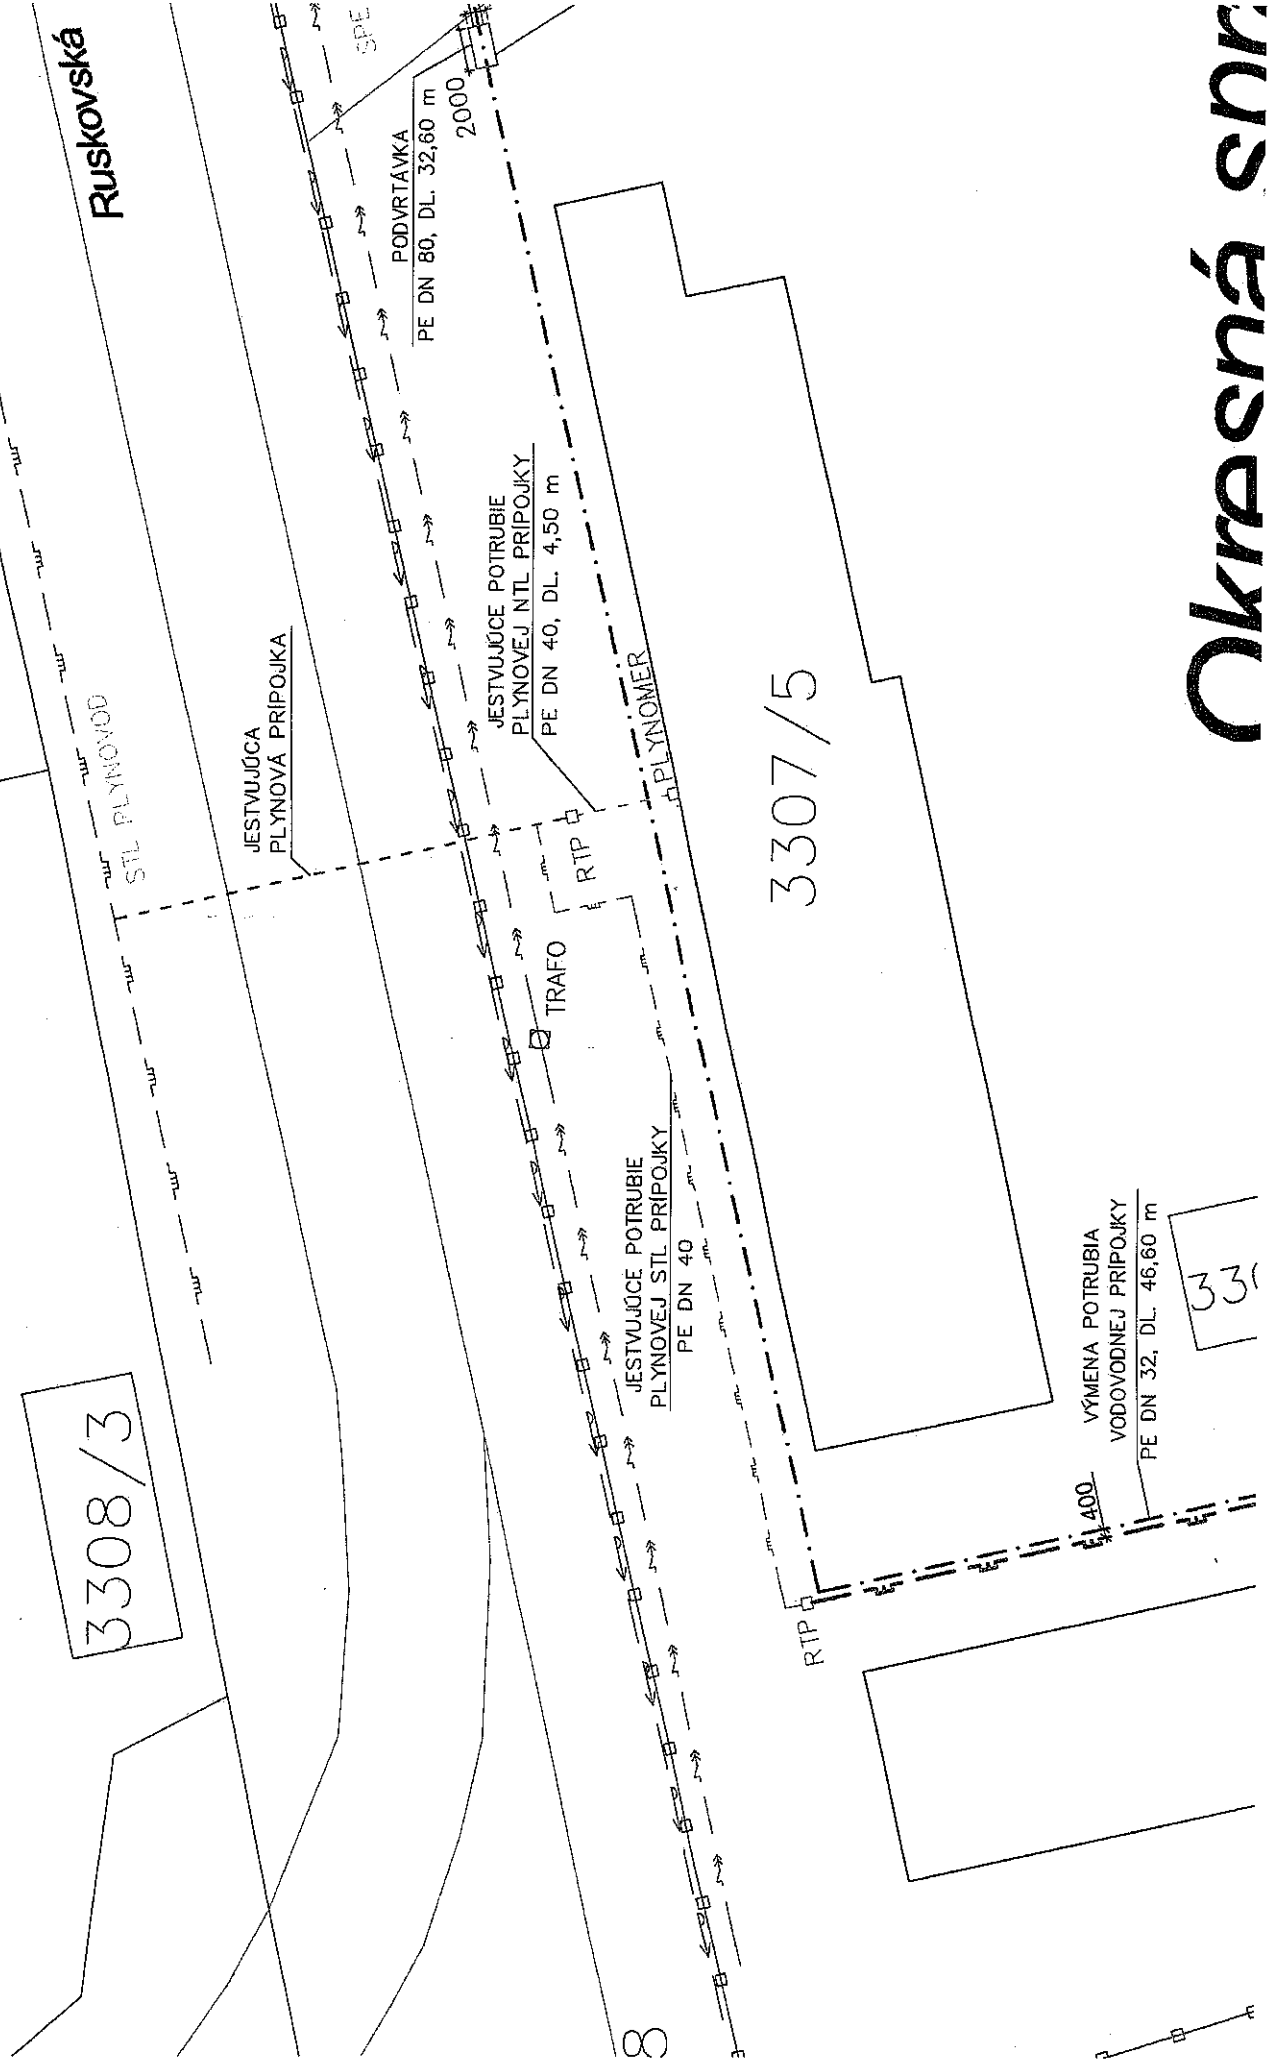


Okračná snr

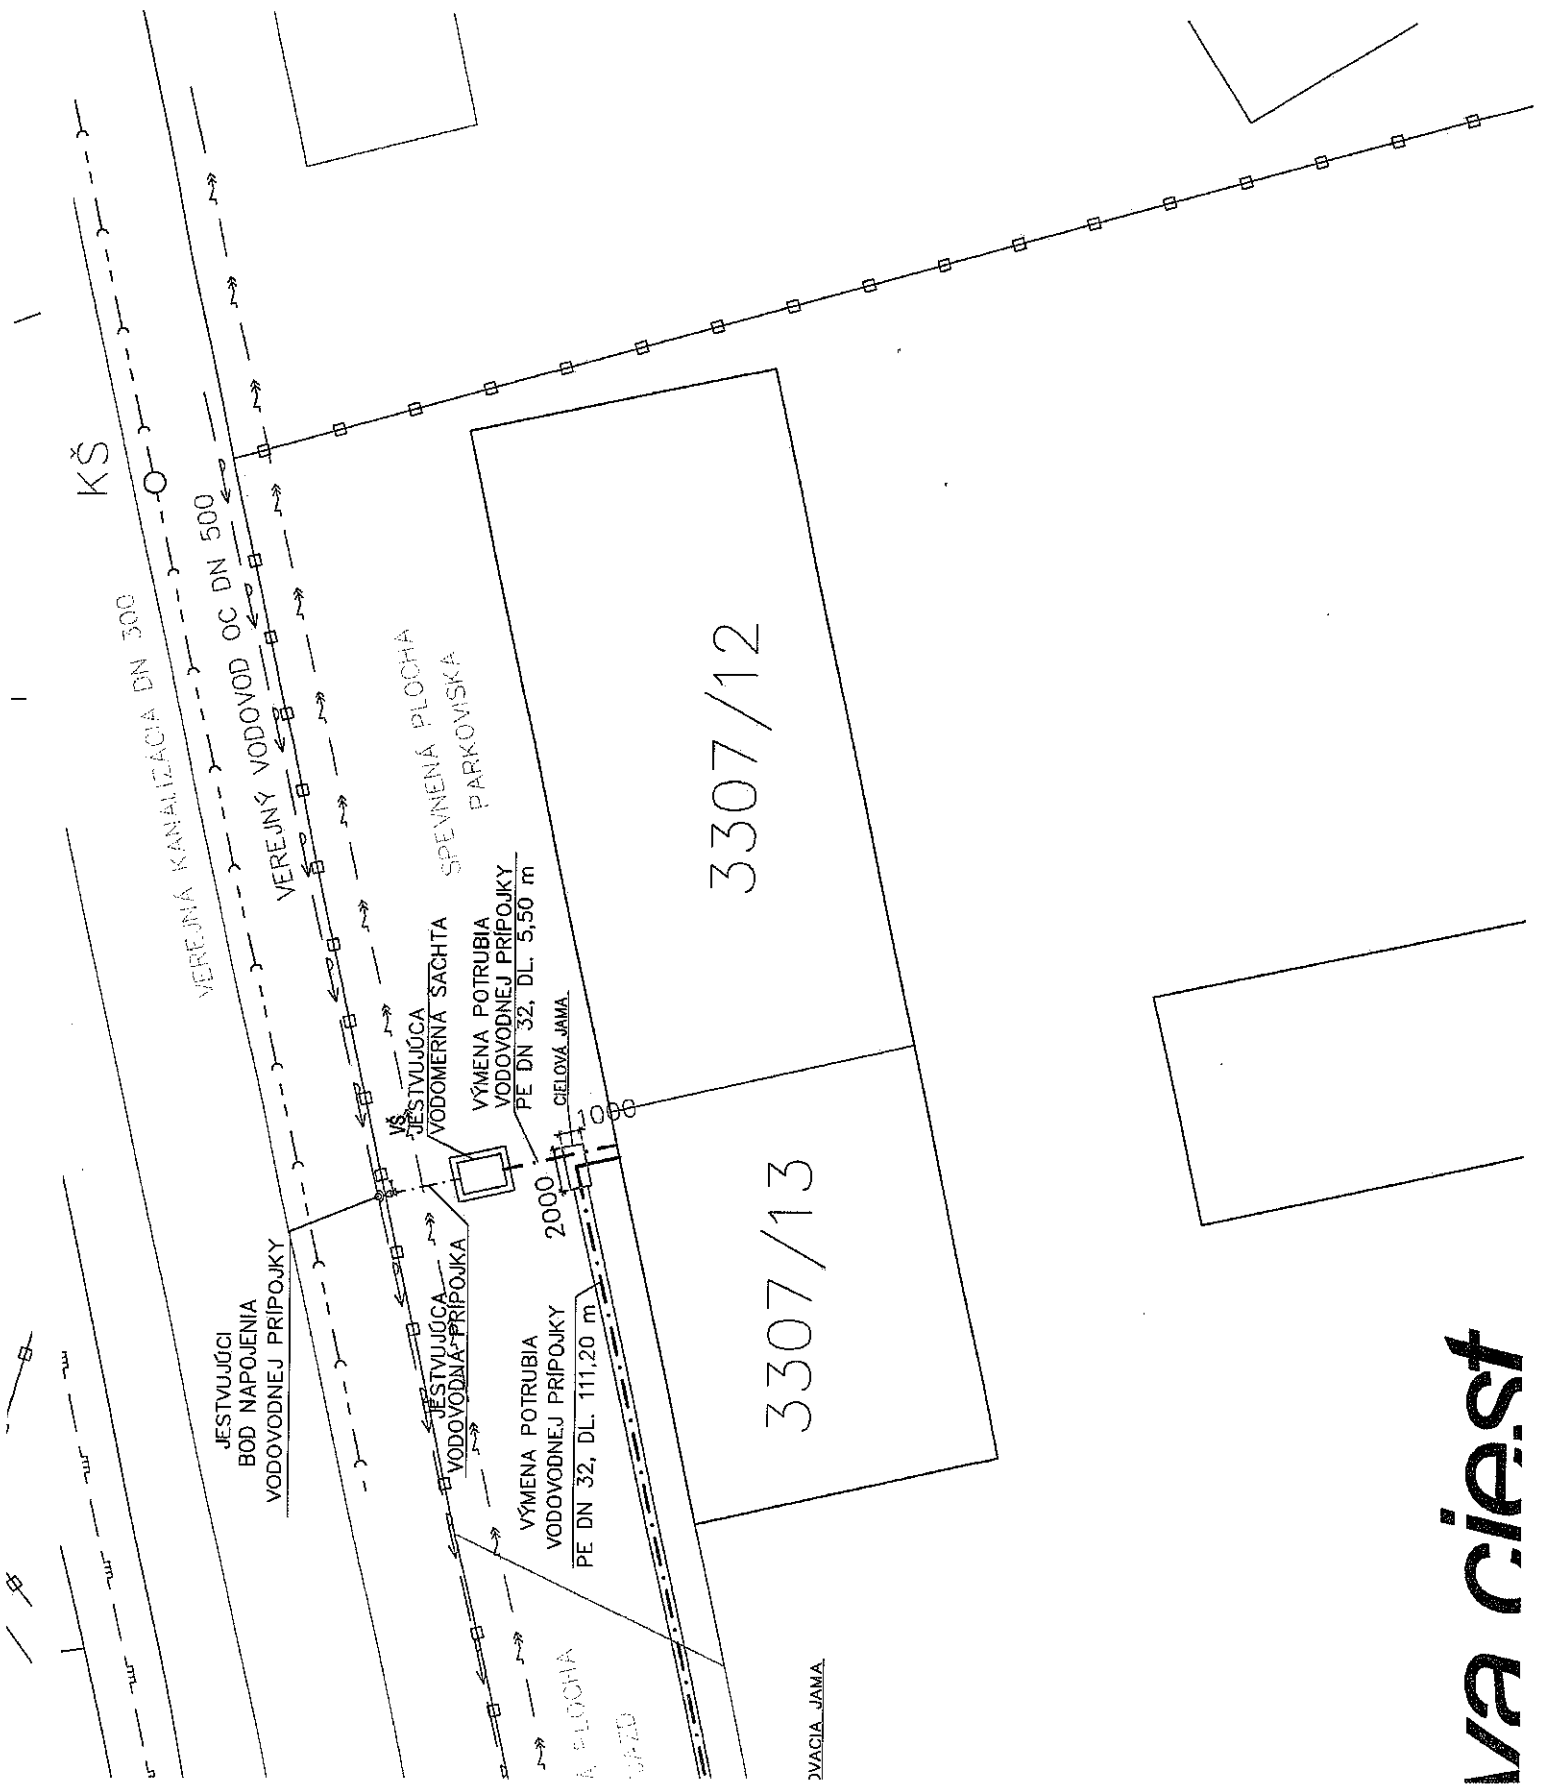

va ciest

M 1:200/100

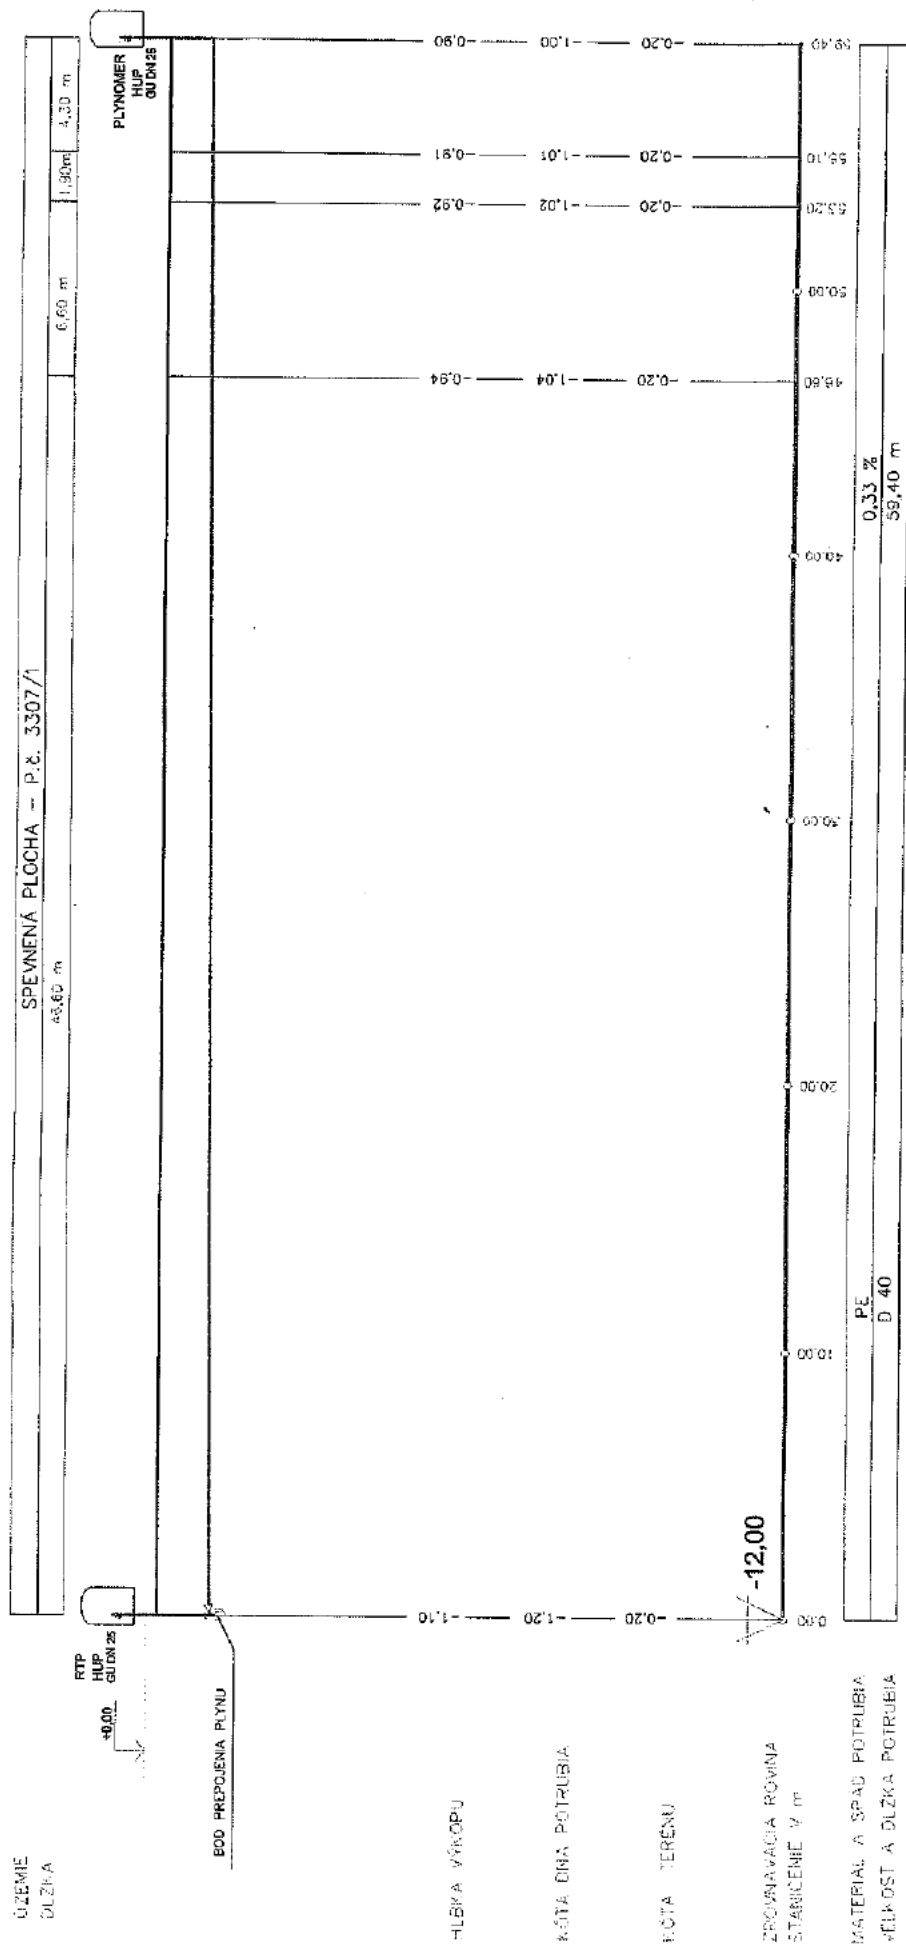

SLÓVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

CA 12-2502002

OSVEDČENIE

PLANO DEBATE 54 DE ZILSONA NE BR C, 13/01/92 20.


www.elsevier.com/locate/jmb

ZODP. PROJEKTANT :		VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :
			H. Šlaugžarskas	
KRAJ : Kašický		OBJ : TREBIŠOV		
INVESTOR : Správa ciest, Košického samosprávneho kraja, Nám. Vratkúnu miera 1, Košice				
VÝMENA HAVARIJNEHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV				
SO 02 PLYNOVÁ PRÍPOJKA				
POZDĽŽNY REZ PLYNOVEJ NTL PRIPOJKY-VÝMENA				

POZDOLŽNY REZ PLYNOVEJ NTL PR/POUKY-VÝMENA

NADZEMNÝ PRECHOD PLYNOVODU

PRECHOD PODLA STN 38 6415 A TPP 702 01

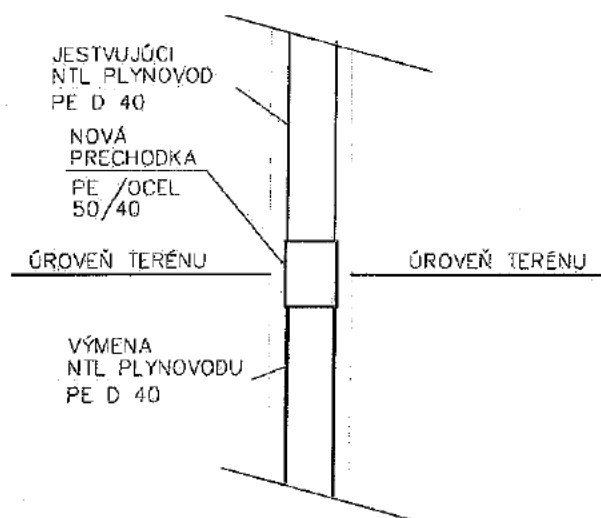


2

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Č.j. T2-250/2002
OSVEDČENIE
vydané podľa § 43a zákona NR SR č. 138/1992 Zb.
v znení nariadení štátnej správy
HELENA ŠTAUDNEROVÁ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :	VKP PROJEKT s.r.o. L. PODJAVORINSKEJ 2119/1 075 01 Trebišov	
		H. Štaudnerová		FORMÁT	1x A4
KRAJ : Košický		Obč : TREBIŠOV		DÁTUM	03 / 2023
INVESTOR : Správa ciest Košického samostatného kraja, Nám. Morálona mieri 1, Košice				ÚČEL	SP
VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV				ČÍSLO KÓPIE	
SO 02 PLYNOVÁ PRÍPOJKA				MIERKA	VÝKRES ČÍSLO
NADZEMNÝ PRECHOD PLYNOVODU				1 : 20	3

ULOŽENIE POTRUBIA V TERÉNE – SÚBEH

REZ A-A'

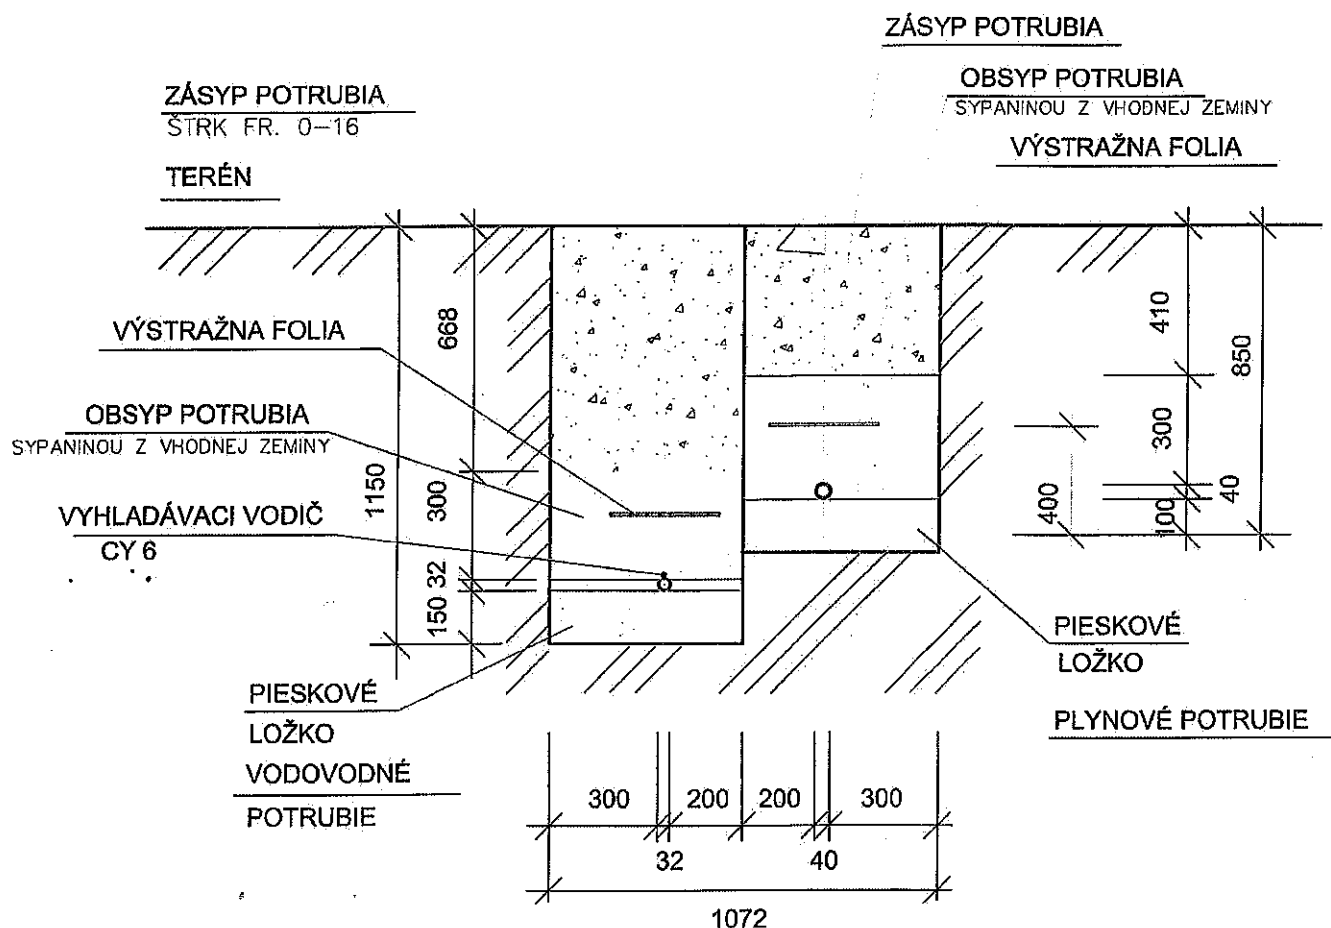

2

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Č.J. T2-250/2002
OSVEDČENIE
vydané podľa § 43c zákona NR SR Č. 138/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
HELENA ŠTAUDNEROVA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :	VKP PROJEKT s.r.o.	
		H. Štaudnerová		L. PODJAVORINSKEJ 2119/1	
				075 01 Trebišov	
KRAJ : Košický	ObÚ : TREBIŠOV			FORMÁT	1x A4
INVESTOR : Správa ciest Košického samostatného kraja, Nám. Maratónu mier 1, Košice				DÁTUM	03 / 2023
VÝMENA HAVARIJNÉHO VODOVODNÉHO A PLYNOVÉHO POTRUBIA SPRÁVA CIEST - TREBIŠOV				ÚČEL	SP
				ČÍSLO KÓPIE	
SO 02 PLYNOVÁ PRÍPOJKA				MIERKA	VÝKRES ČÍSLO
ULOŽENIE POTRUBIA V TERÉNE - SÚBEH				1 : 20	4

Verejný obstarávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Názov predmetu zákazky: **Výmena vodovodného a plynového potrubia
v areáli strediska SC KSK Trebišov**

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

- Predmetom zákazky je odstránenie havarijného stavu vodovodného a plynového potrubia v areáli strediska SC KSK Trebišov.
Havarijný stav bude odstránený výmenou predmetného potrubia podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VKP PROJEKT, s.r.o.
- Kontaktná osoba za obstarávateľa: Gejza Tóth, vedúci strediska SC KSK Trebišov

Opis prác

Vodovodná prípojka

▪ **Jestvujúci stav:**

Jestvujúca vodovodná prípojka sa nachádza na parcele č. C 3307/1 v k.ú. Trebišov.

Je napojená na verejný vodovod. Projektová dokumentácia rieši časť prípojky v havarijnom stave, ktorú treba vymeniť.

Dimenzia vodovodnej prípojky v areáli ostane nezmenená

▪ **Návrh podľa PD:**

Množstvo spotreby vody pre areál sa nemení, nakoľko sa jedná o výmenu vodovodného potrubia z dôvodu havarijného stavu jestvujúcej areálovej prípojky.

Pre novonavrhovanú vodovodnú prípojku o dĺžke 168 m sú navrhnuté polyetylénové rúry tlakové DN 32

Každé vodovodné potrubie musí byť pred uvedením do prevádzky podrobené skúške vodou podľa STN 75 5911:1995-8

Plynová prípojka

▪ **Jestvujúci stav:**

Na parcele C 3307/1, k.ú. Trebišov sa nachádza pripojovací NTL plynovod, napojený na verejný NTL plynovod.

Jestvujúci NTL rozvod plynu s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 2,1 kPa je v havarijnom stave, preto je potrebná jeho výmena.

Výmena bude realizovaná od jestvujúceho RTP po jestvujúci plynomer pri budove na parcele C 3307/2

NTL parametre jestvujúceho pripojovacieho plynovodu:

Celková dĺžka: 59,40 m

Dimenzia potrubia: D 40 x 3,7

Materiál potrubia: PE rúry – SDR 11

Prepravované médium: zemný plyn naftový

Prenášaný hodinový výkon prípojky ostane nezmenený

▪ **Návrh podľa PD:**

Trasa navrhovanej prípojky – výmeny bude vedená od bodu napojenia – pri RTP v zemi, v hĺbke min. 1 m, smerom k skrinke s plynomerom pri objekte s p.č. 3307/2.

Prípojka bude prepojená prechodkou oceľ/PE 50/40 pred uzáverom plynu GU25, ktorý je osadený pred plynomerom a RTP, v skrinke

Zhotoviteľ zabezpečí:

- Realizáciu stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie VKP PROJEKT, s.r.o., Trebišov z 03/2023 (dodávka, montáž, presun), obstaranie, doprava, manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela
- Inžiniersku činnosť v rozsahu všetkých úkonov potrebných k riadnemu vyhotoveniu diela a uvedeniu do prevádzky (záväzné stanoviská, žiadosti, povolenia, posúdenia, vyjadrenia)
V prípade potreby objednávateľ poskytne zhotoviteľovi plnomocenstvo na vykonávanie inžinierskej činnosti
- Stanovisko všetkých správcov k existencii podzemných sietí
- Zameranie a vytýčenie všetkých podzemných vedení v dotknutom území pred začatím zemných prác
- Predrealizačné zameranie, aj počas realizácie prác, porealizačné zameranie
- Odstránenie krytu z kameniva, z asfaltového betónu
- Výkop rýh a uloženie potrubí
- Pod cestou a spevnenou plochou parkoviska: riadená podvrtávka vrátane štartovacej a cieľovej jamy
- Lôžko pod potrubie, obsyp a zásyp potrubia
- Uloženie/montáž potrubí
- Umiestnenie vyhládavacieho/signalizačného vodiča
- Všetky predpísané skúšky predmetných potrubí a revízne správy (viď Technická správa PD)
- Pri súbehu a križovaní vodovodnej prípojky s inými podzemnými vedeniami je nutné dodržať vzdialenosti podľa STN 73 6005
- Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe, ale aj samotnej prevádzky je bezpodmienečne potrebné dodržať všetky zákonné ustanovenia, normy, predpisy a vyhlášky č. 147/2013 a zabezpečiť jej aplikáciu na podmienky stavby.
- Pri montáži jednotlivých materiálov a technológií je nutné dodržať technologický popis výrobcu.
- Všetky práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VKP PROJEKT, s.r.o., Trebišov z 03/2023

Povinnosťou zhotoviteľa je

- Na požiadanie preukázať doklady, preukazujúce kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov
- Vedenie stavebného denníka v zmysle platných predpisov
- Priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela formou fotodokumentácie v etapách (pred zásypom potrubia)
- Fotodokumentáciu diela je potrebné doručiť obstarávateľovi priebežne v mailovej forme
- Zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť odborne spôsobilej osoby na stavbe
- Zhotoviteľ je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách
- Zhotoviteľ zrealizuje stavebné práce vlastnými kapacitami s odbornou starostlivosťou, bude postupovať v súlade s platnými zákonmi a predpismi BOZP, PO a životného prostredia, ako aj platnými predpismi BOZP a PO platných pre objekty a areál objednávateľa
- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že disponuje všetkými platnými licenciami, povoleniami, oprávneniami a živnostenskými oprávneniami podľa platnej legislatívy, predpisov a zákonmi SR potrebnými pre vykonávanie prác v súvislosti s plnením predmetu zákazky.
- Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za všetku ním spôsobenú škodu na majetku, zdraví a živote osôb.
- Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za konanie všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov.

Fakturácia

Fakturácia prebehne na základe skutočne vykonaných prác v súlade s položkami cenovej ponuky, ktorá je prílohou/podkladom k obstaraniu predmetu zákazky
Prílohou faktúry bude Súpis vykonaných prác a Protokol o prevzatí prác podpísaný obidvoma zmluvnými stranami

Miesto predmetu zákazky:

- Areál strediska Správy ciest KSK v Trebišove, Ruskovská 3

Termín uskutočnenia:

- Odovzdanie staveniska: do 5 pracovných dní od účinnosti ZoD, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zmena termínu odovzdania staveniska je možná iba písomnou formou.
Za písomnú formu je možné považovať aj mailovú komunikáciu.
Do požiadavky na zmenu termínu je potrebné uviesť dôvod
Zmena termínu na základe dohody obidvoch zmluvných strán bude prílohou dokumentu: Odovzdanie staveniska
- Začiatok prác: do 3 dní od odovzdania staveniska
- Termín plnenia: do 10 pracovných dní od prevzatia staveniska zhotoviteľom

Práce budú vykonávané v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Skutočný termín odovzdania a prevzatia predmetu plnenia si zmluvné strany písomne dohodnú minimálne dva dni vopred v rámci uvedených lehôt.

Záručná doba:

- 60 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky
- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zákazky bude zhotovený v súlade s PD vypracovanou spoločnosťou VKP PROJEKT, s.r.o., Trebišov z 03/2023, ktorý je zahrnutý v podkladoch pre obstaranie realizácie predmetu zákazky

Reklamácia:

- V prípade nedodržania kvality predmetu zákazky je dodávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradné plnenie na vlastné náklady do 5 (piatich) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa

Prílohy opisu predmetu zákazky - podklad k realizácii predmetu zákazky:

- Projektová dokumentácia predmetu zákazky vypracovaná spoločnosťou: VKP PROJEKT, s.r.o., Trebišov z 03/2023
- Rozpočet pre výmenu vodovodného potrubia
- Rozpočet pre výmenu plynového potrubia

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena vodovodného a plynového potrubia	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Areál strediska SC KSK Tre
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SC KSK Trebišov		
Projektant			
Zhotoviteľ	KABYS, s.r.o., Byšta	43 837 476	SK 2022517167
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	07.12.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	2 610,89	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	16 805,49	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	123,86				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	349,57				18 VRN z rozpočtu		708,38
7 ZRN (r. 1-6)		19 889,81	12 DN (r. 6-11)			19 VRN (r. 13-18)		708,38
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		207,36
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22		20 805,55
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 20 805,55		4 161,11
						25 Cena s DPH (r. 23-24)		24 966,66
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ			KABYS s.r.o.			26 Dodávky zadávateľa		0,00
			IČO: 43 837 476			27 Kľzáva doložka		0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výmena vodovodného a plynového potrubia

Objednávateľ: SC KSK Trebišov

Zhotoviteľ: KABYS, s.r.o., Byšta

Miesto: Areál strediska SC KSK Trebišov

Spracoval:
Dátum: 7. 12. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17202	Výmena vodovodného a plynového potrubia	20 805,55	4 161,11	24 966,66	207,36	19 889,81	0,00	708,38	0,00
01	Výmena vodovodného potrubia	14 456,00	2 891,20	17 347,20	0,00	13 747,62	0,00	708,38	0,00
02	Výmena plynového potrubia	6 349,55	1 269,91	7 619,46	207,36	6 142,19	0,00	0,00	0,00

Celkom 20805,55 4161,11 24 966,66 207,36 19 889,81 0,00 708,38 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena vodovodného a plynového potrubia	JKSO	
Názov objektu	Výmena vodovodného potrubia	EČO	
		Miesto	Areál strediska SC KSK Tre
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SC KSK Trebišov		
Projektant			
Zhotoviteľ	KABYS, s.r.o., Byšta	43 837 476	SK 2022517167
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	07.12.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 013,75	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	11 733,87	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	708,38
7	ZRN (r. 1-6)	13 747,62	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	708,38	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	14 456,00	
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 14 456,00	2 891,20	
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	17 347,20	
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ			KABYS s.r.o. 3		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
			Ok 167		27 Kľúčová doložka	0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Výmena vodovodného a plynového potrubia

Objekt: Výmena vodovodného potrubia

Objednávateľ: SC KSK Trebišov

Zhotoviteľ: KABYS, s.r.o., Byšta

Miesto: Areál strediska SC KSK Trebišov

Spracoval:

Dátum: 7. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 747,62 0,000

1 Zemné práce 10 165,84 0,000

1	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	46,800	8,61	402,95	0,000
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	46,800	3,74	175,03	0,000
3	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	13,80	124,20	0,000
4	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,000	1,04	9,36	0,000
5	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	120,600	38,67	4 663,60	0,000
6	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	120,600	10,93	1 318,16	0,000
7	141721112.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 63 do 90mm	m	33,600	42,97	1 443,79	0,000
8	141110009300.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 89 mm, hr. steny 5 mm, ozn. 11 353.0.	m	32,600	26,05	849,23	0,000
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,420	4,24	396,10	0,000
10	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,120	32,48	783,42	0,000

4 Vodovodné konštrukcie 745,91 0,000

11	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,060	61,85	745,91	0,000
----	-------------	--	----	--------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 1 652,24 0,000

12	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	168,000	2,96	497,28	0,000
13	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťažkové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	168,000	0,91	152,88	0,000
14	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri ťažkových skúškach DN do 300	ks	2,000	249,88	499,76	0,000
15	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	168,000	2,02	339,36	0,000
16	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	168,000	0,97	162,96	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 330,86 0,000

17	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	93,200	3,55	330,86	0,000
----	-------------	--	---	--------	------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV 852,77 0,000

18	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,249	36,68	852,77	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 708,38 0,000

19	000300014.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	236,12	236,12	0,000
----	-------------	---	-----	-------	--------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	472,26	472,26	0,000

Celkom

14 456,00

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena vodovodného a plynového potrubia	JKSO	
Názov objektu	Výmena plynového potrubia	EČO	
		Miesto	Areál strediska SC KSK Tre
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SC KSK Trebišov		
Projektant			
Zhotoviteľ	KABYS, s.r.o., Byšta	43 837 476	SK 2022517167
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	07.12.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	597,14	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 071,62	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	123,86				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	349,57				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 142,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	207,36
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22			6 349,55		
				24 DPH 20,00 % z 6 349,55			1 269,91		
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			7 619,46		
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka	E Prípochty a odpočty					
Dátum a podpis			Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa			0,00		
				27 Kľzavá doložka			0,00		
				28 Zvýhodnenie + -			0,00		

ROZPOČET

Stavba: Výmena vodovodného a plynového potrubia

Objekt: Výmena plynového potrubia

Objednávateľ: SC KSK Trebišov

Zhotoviteľ: KABYS, s.r.o., Byšta

Miesto: Areál strediska SC KSK Trebišov

Spracoval:

Dátum: 7. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 668,76 0,000

1 Zemné práce 4 127,10 0,000

1	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	46,800	8,61	402,95	0,000
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	46,800	3,74	175,03	0,000
3	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	13,80	124,20	0,000
4	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,000	1,04	9,36	0,000
5	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	83,400	20,56	1 714,70	0,000
6	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	83,400	10,93	911,56	0,000
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,380	4,24	247,53	0,000
8	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,680	32,48	541,77	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 515,83 0,000

9	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,340	61,85	515,83	0,000
---	-------------	--	----	-------	-------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 446,07 0,000

10	871188088.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	59,400	0,74	43,96	0,000
11	286130026800.S	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 40x3,7 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	m	59,400	3,44	204,34	0,000
12	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	3,000	6,72	20,16	0,000
13	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	59,400	2,02	119,99	0,000
14	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	59,400	0,97	57,62	0,000

99 Presun hmôt HSV 579,76 0,000

15	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,806	36,68	579,76	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

M Práce a dodávky M 473,43 0,000

23-M Montáže potrubia 473,43 0,000

16	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	128,96	128,96	0,000
17	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	59,400	0,40	23,76	0,000
18	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	15,99	31,98	0,000
19	286220031200.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	2,000	54,97	109,94	0,000
20	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	59,400	3,01	178,79	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 207,36 0,000

21	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	25,92	207,36	0,000
----	-------------	--	-----	-------	-------	--------	-------

Celkom 6 349,55 0,000

Čestné vyhlásenie

V súvislosti s využitím, subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky

Obchodné meno/ názov: KABYS, s.r.o., Okružná 11, 076 13 Byšta
IČO: 43 837 476

ako uchádzač predkladajúci ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) s názvom „Výmena vodovodného a plynového potrubia v areáli strediska SC KSK Trebišov“ (ďalej len „Súťaž“), vyhláseným verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (ďalej len „Verejný obstarávateľ“), týmto

čestne vyhlasujem, že

nebudem využívať služby subdodávateľov

Okru
IČO:438 3

VEC: Plnomocenstvo

Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777, konajúca Ing. Petrom Valčkom, povereným riadením organizácie SC KSK (ďalej len „splnomocniteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť

Obchodné meno: KABYS, s.r.o.,
 Sídlo: Okružná 11, Byšta
 IČO: 43 837 476
 DIČ: 2022517167
 Osoba konajúca v mene spoločnosti:
 (ďalej len „splnomocnenec“)

aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúcom sa stavby – **Výmena vodovodného a plynového potrubia v areáli strediska SC KSK Trebišov** (ďalej len „stavba“), a aby v súvislosti s uvedeným a v súlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocniteľa vykonal všetky úkony smerujúce k obstaraniu súvisiacich vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj všetky ostatné úkony smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a ktoré súvisia s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu v rozsahu podľa Zmluvy o dielo č. 12/02/2024/TV zo dňa _____.

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou najmä: zúčastňovať sa na rokovaníach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči vydaným rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani scudzovať nehnuteľnosti v mene splnomocniteľa.

Udelené plnomocenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení predmetnej stavby. Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca.

V Košiciach, dňa 19. FEB 2024

Správa ciest
 Košického samosprávneho kraja
 miestu 1
 Košice

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
 Ing. Peter Valčko
 Poverený riadením organizácie SC KSK

Udelené plnomocenstvo bez výhrad prijímam.

V Byšte, dňa 13. 02. 2024

Splnomocnenec:

OK
 IČO:43
