

Zmluva o dielo

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „**Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Diakovce**“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Diakovce

Sídlo objednávateľa: Diakovce 118, 925 81 Diakovce
Štatutárny zástupca: Ing. Kristína Jakóbcsová
IČO: 00305898
DIČ: 2021023994

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK56 5600 0000 0008 1037 5007

Tel.: 031/771 20 22
e-mail: starosta@diakovce.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

PLQ DEVELOPMENT s.r.o.

Sídlo zhotoviteľa: P. Pázmaňa 915/9 927 01 Šaľa
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Kovács
IČO: 47910003
DIČ: 2024141603
IČ DPH: SK2024141603

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK9075000000004028334318

Tel.: 
e-mail: kovacs@plq.sk

Zapísaný:
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom obstarávania na predmet zákazky „**Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Diakovce**“. Objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.
Zmluvné strany sa dohodli podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo za nižšie uvedených podmienok:

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa ...14.10.2024... spracovaná v súlade s výzvou na predkladanie ponúk v rámci procesu obstarávania.
2. Východiskové údaje:
Názov stavby: „**Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Diakovce**“
2.1 Miesto stavby: K.ú. Diakovce pč.: 440/1
2.2 Investor: Obec Diakovce, Diakovce 118, 925 81 Diakovce

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Diakovce“

v zmysle a rozsahu výkazu výmer, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná vo výzve na predkladanie ponúk.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok tejto zmluvy dielo prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie diela tak ako je to uvedené v čl. 6 tejto zmluvy.
3. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
4. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD), t.j. zhotovenia diela podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
 - a) Lehota začatia realizácie: do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe čl. 8 bod 3.1 tejto zmluvy
 - b) Termín ukončenia a odovzdania stavby: najneskôr do 31.12.2025
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávatelom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
- a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatelom
 - b) ak objednávatel oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávatelom
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávatel po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 122 593,01 EUR, slovom: stodvadsaťdvatisíc päťstodeväťdesiattri tisíc EUR jeden eurocent
DPH: 24 518,60 EUR, slovom: dvadsaťštyritisíc päťstoosemnásť EUR šesťdesiat eurocentov
Cena s DPH: 147 111,61 EUR, slovom: stoštyridsaťsedemtisíc stojedenásť EUR šesťdesiatjeden eurocentov
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.

4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyše prác požadovaných objednávatelom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so zákonom. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyše prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyše práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávatel zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví, a to nasledovne:

a) Dohodnutú cenu za zhotovenie diela v sume eur, uhradí objednávatel' na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:

1.1. Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávatel'om odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

1.2. Overenie vykonaných prác vykoná objednávatel' do 5 pracovných dní od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

1.3. Zhotoviteľ môže vystaviť čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu.

2. Zmeny vo výmerách:

2.1. Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávatel'om a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so zákonom.

2.2. Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réží, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.

2.3. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávatel'om, na nedostatky na strane zhotoviteľa.

3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.

5. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávatel'ovi.

Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.

4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávatel'om.

- 4.1 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie väd:
- 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
- 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
- 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
- 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
- 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
- 3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do **5 kalendárnych dní** od účinnosti zmluvy.

- 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
- 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela,

pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávatel' so zhotoviteľom spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Objednávatel' zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

12.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe.

12.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávatela a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávatel'om a projektantom, požiadavky

objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

- 12.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávatelovi.
- 12.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávatelovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 12.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávatel'a a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 12.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so zákonom.

13. Ukončenie prác

- 13.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávatelovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 13.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 13.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

- 1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

ČI. 10. VYŠŠIA MOC

- 1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
- 2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávatel' v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávatelom na stavbe:

- 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
- 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

ČI. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

- 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.

- 2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Úhrada škôd a nákladov
Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom
Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.
5. Zmeny a doplnky
- 5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
 - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
 - zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
 - zmeniť postup vykonávania prác,
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.
- 5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.
6. Plnenie povinností

- 6.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.
- 6.2. V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 6.3. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 6.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
 - a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
7. Odstúpenie od zmluvy
 - 7.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
 - 7.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
 - 7.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 - § 351 Obchodného zákonníka.
 - 7.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy
 - 8.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
 - d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
 - e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

 - 8.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.
 - 8.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.
9. Platby pri odstúpení od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

9.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku v rámci programu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ."


ČI. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutie príspevku v rámci programu : „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov“ číslo 2024/001. V prípade ak zmluva uvedená v predchádzajúcej vete nebude uzavretá, nenadobudne účinnosť alebo následne bude zrušená, kupujúci je oprávnený od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
č. 2 Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Diakovce dňa 22.10.2024

Zhotoviteľ




PLO EQUIPMENT s.r.o.
Hlavná 15/9, 927 01 Šaľa
DIČ: 2024141603


PLO EQUIPMENT, s.r.o
Ing. Peter Kovács, konateľ

V Diakovce, dňa 22.10.2024

Objednávateľ



Diakovce
Jolana Jakócsová, starostka obce

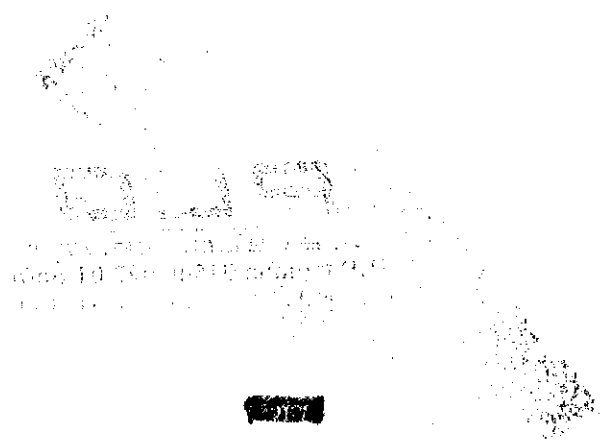

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_S_527
Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Diakovce

JKSO:
Miesto: Diakovce

Objednávateľ:
Obec Diakovce

Zhotoviteľ:
PLQ Development, s.r.o.

Projektant:
HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:
Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.10.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47910003
IČ DPH: SK2024141603

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			122 593,01
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	122 593,01	24 518,60
Cena s DPH v EUR			147 111,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

00000000

00000000

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2024 S 527

Stavba:

Výstavba multifunkčného ihriska v obci Diakovce

Miesto:

Diakovce

Dátum:

14.10.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.


Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		122 593,01	147 111,61
01	Výstavba multifunkčné ihrisko	122 593,01	147 111,61

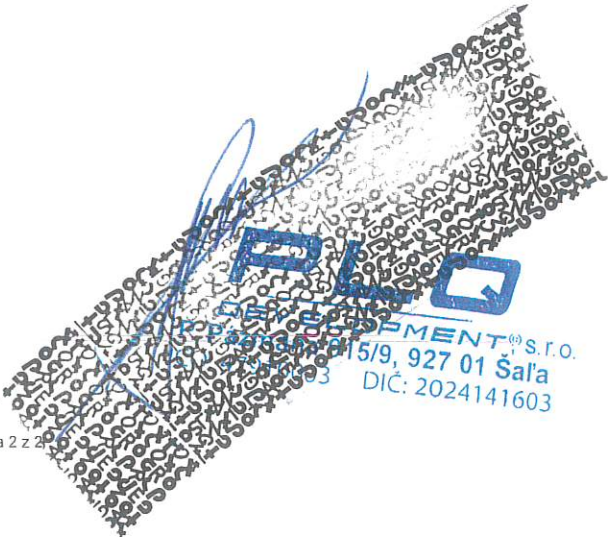

1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba multifunkčného ihriska v obci Diakovce

Objekt:

01 - Výstavba multifunkčné ihrisko

JKSO:

Miesto: Diakovce

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.10.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47910003

IČ DPH:

SK2024141603

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

122 593,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	122 593,01	20,00%	24 518,60

Cena s DPH

v EUR

147 111,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Strana



1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba multifunkčného ihriska v obci Diakovce

Objekt:

01 - Výstavba multifunkčné ihrisko

Miesto:

Diakovce

Dátum:

14.10.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

122 593,01

HSV - Práce a dodávky HSV

108 431,06

1 - Zemné práce

13 120,86

2 - Zakladanie

5 529,92

5 - Komunikácie

63 528,32

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 387,88

8 - Rúrové vedenie

4 206,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 443,13

99 - Presun hmôt HSV

4 214,02

PSV - Práce a dodávky PSV

2 892,06

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 910,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

981,50

M - Práce a dodávky M

6 469,89

21-M - Elektromontáže

5 570,79

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

899,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

600,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

4 200,00

VP - Práce navyše

0,00



11

11

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba multifunkčného ihriska v obci Diakovce

Objekt:

01 - Výstavba multifunkčného ihrisko

Miesto:

Diakovce

Dátum:

14.10.2024

Objednávateľ:

Obec Diakovce

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

PLQ Development, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

122 593,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

108 431,06

D 1

Zemné práce

13 120,86

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	168,138	4,25	714,59
	WV		Výmera				
	WV		0,2*(35,155*22,775)*1,05		168,138		
	WV		Súčet		168,138		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	168,138	1,09	183,27
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,969	13,20	303,19
	WV		Výmera vsak				
	WV		2,5*3,5*2,5*1,05		22,969		
	WV		Súčet		22,969		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,969	0,65	14,93
5	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,945	63,12	627,73
	WV		Výmera				
	WV		0,4*0,4*0,65*1,05*(19+16+19+4+4)		6,770		
	WV		0,6*0,6*0,9*1,05*4		1,361		
	WV		1,2*0,8*0,9*1,05*2		1,814		
	WV		Súčet		9,945		
6	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,945	13,00	129,29
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,981	32,46	616,12
	WV		Výmera obrubník				
	WV		0,2*0,2*(18*2+1,1*4+31+33+1,76*2+1,62*2)		4,446		
	WV		Výmera drenáž				
	WV		(8*16+3,5+30)*0,3*0,3		14,535		
	WV		Súčet		18,981		
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,981	8,21	155,83
9	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	220,033	1,15	253,04
	WV		Výmera				
	WV		168,138+22,969+9,945+18,981		220,033		
	WV		Súčet		220,033		
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	187,028	2,31	432,03
	WV		Výmera				
	WV		220,033-33,005		187,028		
	WV		Súčet		187,028		
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 049,756	0,20	1 009,95
	WV		187,028*27 'Prepočítané koeficientom množstva		5 049,756		
12	K	166101101.S	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	33,005		7,93
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	187,028		19,70
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t			6 528,83

100-100

100-100


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	187,028*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		353,483		
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pôvodný výkop	m3	33,005	3,77	124,43
		VV	Výmera - odhad 15%				
		VV	220,033*0,15		33,005		
		VV	Súčet		33,005		
16	K	181101105.S	Úprava terénu po realizácii	súb.	1,000	1 800,00	1 800,00
D 2			Zakladanie				5 529,92
17	K	211561115.R	Výplň vsakovacej jamy kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	10,369	53,18	551,42
		VV	Výmera vsak				
		VV	-2*3*2*1,05		-12,600		
		VV	2,5*3,5*2,5*1,05		22,969		
		VV	Súčet		10,369		
18	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	137,275	1,24	170,22
		VV	Výmera drenáž				
		VV	161,500*0,85		137,275		
		VV	Súčet		137,275		
19	M	693110002700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2	m2	140,021	1,26	176,43
		VV	137,275*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		140,021		
20	K	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	14,535	42,12	612,21
		VV	Výmera drenáž				
		VV	(161,5)*0,3*0,3		14,535		
		VV	Súčet		14,535		
21	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	161,500	2,87	463,51
		VV	Výmera				
		VV	(8*16+3,5+30)		161,500		
		VV	Súčet		161,500		
22	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	840,688	0,23	193,36
		VV	Výmera				
		VV	35,155*22,775*1,05		840,688		
23	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	12,735	133,41	1 698,98
		VV	Výmera				
		VV	0,4*0,4*0,85*1,05*(19+16+19+4+4)		8,854		
		VV	0,6*0,6*1,1*1,05*4		1,663		
		VV	1,2*0,8*1,1*1,05*2		2,218		
		VV	Súčet		12,735		
24	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	26,864	24,55	659,51
		VV	Výmera				
		VV	0,4*4*0,2*1,15*(19+16+19+4+4)		22,816		
		VV	0,6*4*0,2*1,15*4		2,208		
		VV	(1,2*2+0,8*2)*0,2*1,15*2		1,840		
		VV	Súčet		26,864		
25	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	26,864	7,50	201,48
26	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,446	1 800,00	802,80
		VV	Výmera 35kg/m3				
		VV	12,735*0,035		0,446		
		VV	Súčet		0,446		
D 5			Komunikácie				63 528,32
27	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	680,972	5,96	4 058,59
		VV	Výmera				
		VV	619,925+61,047		680,972		
		VV	Súčet		680,972		
28	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	61,047	9,71	592,77
29	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	619,925	8,46	5 244,57




2



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	619,925	9,16	5 678,51
	VV		Výmera				
	VV		607,77*1,02		619,925		
	VV		Súčet		619,925		
31	K	564801110.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm veľ. 0-4 mm	m2	619,925	1,52	942,29
32	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm veľ. 4-16 mm	m2	619,925	1,52	942,29
33	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	61,047	1,87	114,16
	VV		Výmera				
	VV		59,850*1,02		61,047		
	VV		Súčet		61,047		
34	K	589100008.R	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy vr. čiarovania	m2	607,770	16,15	9 815,49
35	M	284170005210.S	Umelá tráva viacúčelová, výška vlasu 20 mm ± 2 mm	m2	607,770	14,75	8 964,61
36	M	284170007200.S	Podleповacia páska pre umelú trávu 40 mm, PP + PE, PP - 120 g, PE - 50 g	m	1 823,310	0,50	911,66
	VV		607,77*3 'Prepočítané koeficientom množstva		1 823,310		
37	M	311490005555.R	Gumový granulát	t	18,233	270,73	4 936,22
	VV		607,77*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva		18,233		
38	M	581530000525.S	Piesok kremičitý	t	18,233	74,55	1 359,27
	VV		607,77*0,03 'Prepočítané koeficientom množstva		18,233		
39	K	589100017.R	Montáž a dodávka mantinelového systému - mantinelová doska PP 1000x2000 mm, konštrukcia oceľová pozinkovaná, viď poznámka	m	100,760	181,75	18 313,13
	P		Poznámka k položke: rozmery mantinellovej dosky PP min. výška 1000 mm - dĺžka 2000mm - hrúbka mantinellovej dosky PP min. 10 mm - hustota mantinellovej dosky min. 90g/cm3 - pružnosť mantinellovej dosky v ťahu min. 1000 MPa - materiál konštrukcie : oceľ pozinkovaná žiarovým zinkovaním, hrúbka pozinku min. 50um - nosné stĺpiky - pozinkované min. profil 60x2/3mm - horizontálne profily min. 40x20/30x2/3mm v troch radoch - horné madlo - pozinkované komb. s komaxitom s min. šírkou x výškou 70x50mm, predpružený materiál madla a vodiacej lišty pre zabezpečenie tepelnej rozťažnosti materiálu mantinellovej dosky. - po stranách otváracie vstupné dvere				
	VV		Výmera				
	VV		(18*2+31+33+1,76*2+1,62*2-3*2)		100,760		
	VV		Súčet		100,760		
40	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	59,850	16,00	957,60
41	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	61,047	11,42	697,16
	VV		59,85*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		61,047		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 387,88
42	K	631571018.R	Násyp - z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu	m3	10,676	130,00	1 387,88
	VV		Výmera				
	VV		(0,53*2,34+34,03*0,53+20,8*0,53+20,43*0,53-0,53*0,53*3+1,14*0,53*4)*0,25		10,676		
	VV		Súčet		10,676		
	D	8	Rúrové vedenie				4 206,93
43	K	895970000.R	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	12,000	30,00	360,00
	VV		Výmera				
	VV		2*3*2		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
44	M	286650001212.S	Vsakovací blok 600x600x6 mm, pre vsakovanie dažďovej vody DB60	ks	55,440	52,61	2 916,70
	VV		12*4,62 'Prepočítané koeficientom množstva		55,440		





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	895970100.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	50,00	50,00
46	M	286610047800.S	Filtračná šachta priemer 425 mm pre vsakovací box, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	1,000	848,61	848,61
47	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	1,000	31,62	31,62

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 443,13

48	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	113,383	9,11	1 032,92
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

VV

Výmera obrubník

VV

(111,160)*1,02

113,383

VV

Súčet

113,383

49	M	15632	Premac obrubník parkový so skosením 100x8x25 cm	ks	114,517	4,31	493,57
----	---	-------	---	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Pohľadová hrana so skosením. Rozmery: 100 x 25 x 8 cm, hmotnosť:

47 kg/ks (1435 kg/paleta), množstvo na palete: 30 ks. Farba: sivá.

113,383*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

114,517

VV

50	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	122,890	9,11	1 119,53
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

VV

Výmera

VV

27,84+6,95+1,67+3,66+0,16+20,43+1,14*4+20,8+2,34+34,03

122,890

VV

+0,45

VV

Súčet

122,890

51	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	124,119	2,50	310,30
----	---	----------------	--	----	---------	------	--------

VV

122,89*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva

124,119

52	K	936106113.R	Montáž športových prvkov	súb.	1,000	650,00	650,00
----	---	-------------	--------------------------	------	-------	--------	--------

53	M	5535700.R	Stĺpy pre volejbal a nohejbal vrátane sietí a sady na napínanie sietí	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

54	M	5535701.R	Futbalové brány 3x2x1,5 m	ks	2,000	1 300,00	2 600,00
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------

55	M	5535706.R	Basketbalový board vr. oceľového stĺpa	ks	2,000	1 780,00	3 560,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

56	M	5535707.R	PE Sieť, bezuzlová, oko 50 x 50 mm, hr. 3,0 mm, zelenej farby vr. konštrukcie na uchytenie ZN	ks	2,000	2 400,00	4 800,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

57	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,305	13,21	4,03
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

58	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,845	0,35	3,10
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

VV

0,305*29 'Prepočítané koeficientom množstva

8,845

59	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,305	10,54	3,21
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

60	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,305	54,00	16,47
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 99

Presun hmôt HSV

4 214,02

61	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	818,256	4,50	3 682,15
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

62	K	998222199.S	Príplatok za zväčšený presun (8233.8235) na spevnených plochách s krytom z kameniva za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	818,256	0,65	531,87
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 892,06

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 910,56

63	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	682,996	1,25	853,75
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV

Výmera ihrisko

VV

607,770*1,05

638,159

VV

Výmera okap.chodník

VV

(0,53*2,34+34,03*0,53+20,8*0,53+20,43*0,53-

VV

0,53*0,53*3+1,14*0,53*4)*1,05

44,837

VV

Súčet

682,996


64	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	785,445	1,25	981,81
----	---	----------------	--	----	---------	------	--------

VV

682,996*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva

785,445

65	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	5,00	75,00
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				981,50
66	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	305,000	3,00	915,00
	VV		Výmera pôvodné brány				
	VV		305		305,000		
	VV		Súčet		305,000		
67	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,000	9,50	66,50

D M Práce a dodávky M 6 469,89

D 21-M			Elektromontáže				5 570,79
68	K	210011444	Chránička	m	81,000	4,56	369,36
69	M	002440	Chránička 25 FXP	m	81,000	1,34	108,54

P Poznámka k položke:
Vinitá plastová pancierová hadica priemeru 25 mm pre stredné mechanické zaťaženie s vodiacími drážkami, samozhášavá. Materiál: plast PVC - Hrúbka: 25 cm - Váha: 0,09 kg - Farba: siva - Certifikácia: CE

70	K	210193010.R	M+D Ovládacia skriňa s vypínačom 32A/40V	ks	1,000	95,61	95,61
71	K	210201831.R	Montáž 6m stožiara s prírubou pre svetidlá	ks	4,000	50,00	200,00
72	M	348370003216.R	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 6,0 m nad zemou, D 76/60 mm, s výzbrojou	ks	4,000	154,61	618,44
73	K	210201966.S	Montáž svetidla na stožiar do 3 kg	ks	4,000	22,50	90,00
74	M	91140184.R	LED reflektor pre multifunkčné ihriská 400 W/230V	ks	4,000	398,16	1 592,64

P Poznámka k položke:
Svetelný tok 1100 lm, farba svetla 3000 K, životnosť 50000 hodín, Lux L70

75	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	54,000	2,55	137,70
76	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	51,300	2,61	133,89
77	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,48	9,92
78	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
79	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,52	14,08
80	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	0,90	3,60
81	K	210411149.R	Montáž a dodávka kamier a príslušenstva	ks	2,000	754,37	1 508,74
82	K	210800188.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4	m	71,000	0,54	38,34
83	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	71,000	1,53	108,63
84	K	210902380.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	10,000	1,84	18,40
85	M	341110033900.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x16 mm2 RE	m	10,000	2,15	21,50
86	K	210902999.S	Prípojka napojená pôvodnú rozvodnú skriňu	kpl	1,000	120,00	120,00
87	K	PM	Podružný materiál	%	25,000	4,50	112,50
88	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	59,000	4,50	265,50


D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 899,10


89	K	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	81,000	6,54	529,74
	VV		Výmera				
	VV		27*2+17+10		81,000		
	VV		Súčet		81,000		
90	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	81,000	2,41	195,21
91	K	460560133.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	81,000	2,15	174,15

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 600,00

92	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	25,00	600,00
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 4 200,00





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia (rôzne nešpecifikované práce)	%	1 200,000	3,50	4 200,00

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV (čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: PLQ Development, s.r.o., so sídlom P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa, IČO: 47 910 003 týmto vyhlasujem, že v zákazke na dodanie tovaru - predmet zákazky: „**Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Diakovce**“

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám¹**

~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:¹~~

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.€ s DPH

2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľ'a	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V Šaľa dňa 14.10.2024

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

