

**Príloha č. 1 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok**

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v členení:

A/ Priami Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 Osobitných zmluvných podmienok

B/ Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov)

C/ Dodávatelia Zhotoviteľa

A/

| p.č. | Priami Podzhotovitelia<br>(obchodné meno/názov,<br>sídlo/miesto podnikania, IČO,<br>štát)                                 | Údaje o osobe<br>oprávnenej konať<br>za subdodávateľa<br>(meno a priezvisko,<br>adresa pobytu, dátum<br>narodenia) | Predmet<br>subdodávky                               | Podiel subdodávok |                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|      |                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                     | v %               | v EUR s<br>DPH      |
| 1.   | CB – MONT, s.r.o.,<br>Poľovnícka 41, Banská<br>Bystrica, 36 017 469, SR                                                   |                                                                                                                    | Dodávka a<br>montáž PHS                             | 2,31 %            | 652 748,70          |
| 2.   | TRADETECH, s.r.o., Stará<br>prešovská 10, Košice –<br>mestská časť Staré mesto,<br>36 179 418, SR                         |                                                                                                                    | Dodávka a<br>montáž<br>zvodidiel                    | 1,15 %            | 324 105             |
| 3.   | GEART, s.r.o.,<br>P.O.Hviezdoslavova 42, 010<br>01 Žilina, 36 814 571, SR                                                 |                                                                                                                    | Špeciálne<br>zakladanie –<br>piloty +<br>štetovnica | 4,68 %            | 1 323 647,28        |
| 4.   | VALBEK SK, spol.<br>s.r.o.,Eurovea Central 1,<br>Pribinova 4, Bratislava –<br>mestská časť Staré Mesto,<br>17 314 569, SR |                                                                                                                    | Projektová<br>dokumentácia                          | 1,02 %            | 287 820             |
| 5.   | MENARD zakladání staveb<br>SK, s.r.o., Zahradnická 10,<br>Komárno, 53 265 998, SR                                         |                                                                                                                    | Prefabrikovaná<br>vertikálne<br>drény               | 0,50 %            | 115 767,60          |
| 6.   | HYDROTUNEL, s.r.o.,<br>Mojmírova 14, Bojnice,<br>36 297 429, SR                                                           |                                                                                                                    | Bezvýklopové<br>technológie,<br>sanácie<br>potrubí  | 0,96 %            | 271 875,51          |
| 7.   | GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.<br>Bojnická 3, Bratislava ,<br>35 859 890, SR                                                      |                                                                                                                    | Geodetické<br>práce                                 | 0,47 %            | 108486,00           |
|      |                                                                                                                           |                                                                                                                    | <b>Súhrn podielu<br/>subdodávok</b>                 | <b>11,09 %</b>    | <b>3 084 450,09</b> |

B/

| p.č. | Podzhotovitelia (s výnimkou<br>Priamych Podzhotoviteľov)<br>(obchodné meno/názov,<br>sídlo/miesto podnikania, IČO,<br>štát) | Údaje o osobe<br>oprávnenej<br>konať za<br>subdodávateľa<br>(meno a<br>priezvisko, adresa | Predmet<br>subdodávky | Podiel subdodávok |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|      |                                                                                                                             |                                                                                           |                       | v %               | v EUR s<br>DPH |

|  |  |                          |                          |  |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
|  |  | pobytu, dátum narodenia) |                          |  |  |
|  |  |                          |                          |  |  |
|  |  |                          |                          |  |  |
|  |  |                          |                          |  |  |
|  |  |                          | Súhrn podielu subdodávok |  |  |

C/

| p.č. | Dodávateľia Zhotoviteľ'a<br>(obchodné meno/názov,<br>sídlo/miesto podnikania, IČO,<br>štát) | Údaje o osobe oprávnenej<br>konat' za subdodávateľ'a<br>(meno a priezvisko, adresa<br>pobytu, dátum narodenia) | Predmet subdodávky       | Podiel subdodávok |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
|      |                                                                                             |                                                                                                                |                          | v %               | v EUR s<br>DPH |
|      |                                                                                             |                                                                                                                |                          |                   |                |
|      |                                                                                             |                                                                                                                |                          |                   |                |
|      |                                                                                             |                                                                                                                |                          |                   |                |
|      |                                                                                             |                                                                                                                | Súhrn podielu subdodávok |                   |                |

V ..... dňa .....

Za EUROVIA SK a.s.

Ing. Róbert Šinály,  
podpredseda predstavenstva

Ing. Daniel Hanko,  
člen predstavenstva

Za SMS a.s.

Ing. Róbert Šinály,  
Predseda predstavenstva

Ing. Eva Fízel'ová,  
Podpredseda predstavenstva

Za EUROVIA CZ a.s.

Ing. Martin Borovka,  
predseda správnej rady

Paul Scippa,  
podpredseda správnej rady

Príloha č. 2 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe

| Funkcia                  | Meno a priezvisko      |
|--------------------------|------------------------|
| Vedúci stavby            | Ing. Ján Sasák         |
| Zástupca vedúceho stavby | Ing. Samuel Trojanovič |
| Koordinátor BOZP         | Ing. Alžbeta Fedáková  |
| geodet                   | Ing. Marek Matiaš      |
|                          |                        |

V ..... dňa .....

Za ~~EUR~~OVIA SK a.s.

Ing. Róbert Šinály,  
podpredseda predstavenstva

Ing. Daniel Haničko,  
člen predstavenstva

Za ~~SM~~MS a.s.

Ing. Róbert Šinály,  
Predseda ~~pred~~stavenstva

Ing. Eva Fizeľová,  
Podpredseda predstavenstva

Za ~~EURO~~OVIA CZ a.s.

Ing. Martin Borovka,  
predseda správnej rady

Paul Scippa,  
podpredseda správnej rady

**Príloha č. 3 k Zmluvným dojednaniám - Harmonogram prác (tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)**

- Vecný harmonogram, Milníky a Fakturačný harmonogram spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.

**časť 3.1 Vecný harmonogram**

- tzv. Ganttov graf - grafická časť vypracovaná vo formáte \*.pdf s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej dokumentácie.

**časť 3.2 Milníky**

- Zhotoviteľ musí počas výstavby dodržať 3 milníky:
1. Požadovaná lehota výstavby objektov SO 201 a SO 202 - časť vysoké násypy pred a za mostami, od km 0,45 po km 1,0, zhotovený po pláň vozovky, je 180 dní od Dátumu začatia prác (v zmysle podčl. 8.1 Osobitných zmluvných podmienok)
  2. Požadovaná lehota výstavby objektu SO 201 - časť nosná konštrukcia mosta je 450 dní od Dátumu začatia prác (v zmysle podčl. 8.1 Osobitných zmluvných podmienok)
  3. Požadovaná lehota výstavby objektu SO 101 - časť konštrukčná vrstva vozovky s cementom stmelenej zmesi je 720 dní od Dátumu začatia prác (v zmysle podčl. 8.1 Osobitných zmluvných podmienok)

**časť 3.3 Fakturačný harmonogram**

- vyhotovený podľa Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S-krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka).
- Fakturačný harmonogram zhotoviteľa musí spĺňať milníky čast' 3.2 bod 1, 2 a 3.

| Identifikácia SO | Názov úlohy                                                                                              | Trvanie | Začiatok    | Dokončenie  | Š-1 | Š-1 | Š-1 | Š-2 | Š-3 | Š-4 | Š-5 | Š-6 | Š-7 | Š-8 | Š-9 | Š-10 | Š-11 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 0                | PROJEKT „Obchvat mesta Prievidza I. Etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“                          | 879 dní | Ut 1.4.25   | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 1                | predpokladaný začiatok výstavby = odovzdanie/prevzatie staveniska                                        | 0 dní   | Ut 1.4.25   | Ut 1.4.25   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 2                | predpokladaná príprava na odovzdanie do predčasného užívania                                             | 30 dní  | Št 29.7.27  | Pi 27.8.27  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 27.8 |
| 3                | predpokladaný dátum odovzdania do predčasného užívania                                                   | 0 dní   | Pi 27.8.27  | Pi 27.8.27  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 27.8 |
| 4                | predpokladaný koniec výstavby                                                                            | 0 dní   | Pi 27.8.27  | Pi 27.8.27  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 27.8 |
| 5                | MILNÍKY                                                                                                  | 540 dní | So 27.9.25  | Ne 21.3.27  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 6                | Milník č.1 - Lehota výstavby objektov SO 201 a SO 202 - časť vysoké násypy pred a za mostami             | 0 dní   | So 27.9.25  | So 27.9.25  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 21.3 |
| 7                | Milník č.2 - Lehota výstavby objektu SO 201 - časť nosná konštrukcia mosta                               | 0 dní   | Št 24.6.26  | Št 24.6.26  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 8                | Milník č.3 - Lehota výstavby objektu SO 101 - časť konštrukčná vrstva vozovky s cementom stmelenej zmesi | 0 dní   | Ne 21.3.27  | Ne 21.3.27  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 21.3 |
| 9                | Realizačná fáza projektu - LEHOTA VÝSTAVBY                                                               | 879 dní | Ut 1.4.25   | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 10               | Geotechnický prieskum                                                                                    | 879 dní | Ut 1.4.25   | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 11               | Archeologický prieskum                                                                                   | 143 dní | Ut 1.4.25   | Št 21.8.25  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 12               | Pyrotechnický prieskum                                                                                   | 143 dní | Ut 1.4.25   | Št 21.8.25  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 13               | Projektová dokumentácia                                                                                  | 857 dní | Ut 1.4.25   | Št 5.8.27   | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 14               | PD v stupni DRS                                                                                          | 91 dní  | Ut 1.4.25   | Po 30.6.25  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 15               | PD v stupni DSR                                                                                          | 100 dní | Št 28.4.27  | Št 5.8.27   | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 16               | 010-00 Príprava územia a pŕoch zariadenia staveniska                                                     | 879 dní | Ut 1.4.25   | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 17               | 010-00 Príprava územia a pŕoch zariadenia staveniska - zriadenie                                         | 50 dní  | Ut 1.4.25   | Ut 20.5.25  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 18               | 010-00 Príprava územia a pŕoch zariadenia staveniska - odstránenie                                       | 50 dní  | Pi 9.7.27   | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 19               | 011-00 Demolácie objektov                                                                                | 90 dní  | Ut 1.4.25   | Ne 29.6.25  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 20               | 011-00 Demolácie objektov                                                                                | 90 dní  | Ut 1.4.25   | Ne 29.6.25  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 21               | 012-00 Zrušenie úseku MK pri moste č. 1778-001                                                           | 300 dní | Št 21.5.25  | Po 16.3.26  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 22               | 012-00 Zrušenie úseku MK pri moste č. 1778-001                                                           | 300 dní | Št 21.5.25  | Po 16.3.26  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 23               | 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých pŕoch                                                              | 150 dní | Št 31.3.27  | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 24               | 020-00 Rekultivácia dočasne zabratých pŕoch                                                              | 150 dní | Št 31.3.27  | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 25               | 101-00 Cesta I/64                                                                                        | 814 dní | Št 5.6.25   | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 26               | 101-00 Cesta I/64 - realizácia náspu                                                                     | 540 dní | Št 5.6.25   | Št 26.11.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 27               | 101-00 Cesta I/64 - realizácia konštrukčných vrstiev                                                     | 325 dní | Pi 1.5.26   | Ne 21.3.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 28               | Milník č.3 - Lehota výstavby objektu SO 101 - časť konštrukčná vrstva vozovky s cementom stmelenej zmesi | 0 dní   | Ne 21.3.27  | Ne 21.3.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 29               | 101-00 Cesta I/64 - realizácia obrusných vrstiev                                                         | 355 dní | Ne 31.5.26  | Št 20.5.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 30               | 101-00 Cesta I/64 - realizácia príslušenstva a dokončovacích pŕac                                        | 160 dní | Ne 31.5.26  | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 31               | 101-00-01 Náhradná výsadba                                                                               | 150 dní | Št 31.3.27  | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 32               | 101-00-01 Náhradná výsadba                                                                               | 150 dní | Št 31.3.27  | Pi 27.8.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 33               | 101-01 Cesta I/64 a I/9 - MÚK                                                                            | 500 dní | Po 30.6.25  | Št 11.11.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 34               | 101-01 Cesta I/64 a I/9 - MÚK                                                                            | 500 dní | Po 30.6.25  | Št 11.11.26 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 35               | 102-00 Miestna komunikácia                                                                               | 300 dní | Ut 21.10.25 | Ne 16.8.26  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 36               | 102-00 Miestna komunikácia                                                                               | 300 dní | Ut 21.10.25 | Ne 16.8.26  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 37               | 103-00 Prístupová komunikácia k ČOV                                                                      | 150 dní | Št 13.8.25  | Pi 9.1.26   | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 38               | 103-00 Prístupová komunikácia k ČOV                                                                      | 150 dní | Št 13.8.25  | Pi 9.1.26   | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 39               | 104-00 Prístupový chodník pre záhradkársky areál                                                         | 300 dní | Pi 26.9.25  | Št 22.7.26  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 40               | 104-00 Prístupový chodník pre záhradkársky areál                                                         | 300 dní | Pi 26.9.25  | Št 22.7.26  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 41               | 105-00 Vetva okružnej križovatky na ceste III/1778                                                       | 439 dní | Pi 26.9.25  | Št 22.7.26  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 42               | 105-00 Vetva okružnej križovatky na ceste III/1778                                                       | 439 dní | Št 7.1.26   | Ne 21.3.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 43               | 106-00 Chodník a vetva okružnej križovatky na MK Košovská cesta                                          | 579 dní | Št 7.1.26   | Ne 21.3.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 44               | 106-00 Chodník a vetva okružnej križovatky na MK Košovská cesta                                          | 579 dní | Št 7.1.26   | Ne 21.3.27  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |
| 45               | 108-00 Prístupová rampa na toku Handľovka                                                                | 200 dní | Po 20.4.26  | Št 5.11.26  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4  | 1.4  |

|                |                  |                       |                 |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Súhrn projektu | Kritická úloha   | Presmerovanie dopravy | Neaktívny súhrn |
| Súhrn          | Milník           | Neaktívna úloha       | Priebeh         |
| Úloha          | Milník - splnený | Neaktívny medzník     |                 |
| 1 / 3          |                  |                       |                 |


| Identifikácia SO | Názov úlohy                                                                                               | Trvanie | Začiatok    | Dokončenie  | Š-1 | Š1 | Š2 | Š3 | Š4 | Š5 | Š6 | Š7 | Š8 | Š9 | Š10 | Š11 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 46               | 108-00 Prístupová rampa na toku Handlovka                                                                 | 200 dní | Po 20.4.26  | Ši 5.11.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 47               | 201-00 Most nad nákladnou stanicou Prievidza                                                              | 655 dní | Ši 5.6.25   | Ne 21.3.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 48               | 201-00 zemná práca                                                                                        | 115 dní | Ši 5.6.25   | So 27.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 49               | <b>M1</b> M111111 - Lehota výstavby objektov SO 201 a SO 202 - časť vysoké násypy pred 0 dňi a za mostami |         | So 27.9.25  | So 27.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 50               | 201-00                                                                                                    | 160 dní | Po 1.9.25   | So 7.2.26   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 51               | 201-00                                                                                                    | 220 dní | Ši 1.10.25  | Ši 8.5.26   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 52               | 201-00                                                                                                    | 212 dní | Út 25.11.25 | Ši 24.6.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 53               | <b>M2</b> M111111 - Lehota výstavby objektu SO 201 - časť nosná konštrukcia mosta                         | 0 dňi   | Ši 24.6.26  | Ši 24.6.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 54               | 201-00                                                                                                    | 300 dní | Út 25.5.26  | Ne 21.3.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 55               | 202-00                                                                                                    | 509 dní | Ne 15.6.25  | Ši 5.11.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 56               | 202-00                                                                                                    | 105 dní | Ne 15.6.25  | So 27.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 57               | <b>M1</b> M111111 - Lehota výstavby objektov SO 201 a SO 202 - časť vysoké násypy pred 0 dňi a za mostami |         | So 27.9.25  | So 27.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 58               | 202-00                                                                                                    | 80 dní  | Ne 28.9.25  | Út 16.12.25 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 59               | 202-00                                                                                                    | 130 dní | Ši 27.11.25 | Ne 5.4.26   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 60               | 202-00                                                                                                    | 110 dní | So 7.3.26   | Ši 24.6.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 61               | 202-00                                                                                                    | 164 dní | Út 26.5.26  | Ši 5.11.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 62               | 203-00                                                                                                    | 370 dní | Ne 2.11.25  | Ši 6.11.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 63               | 203-00                                                                                                    | 370 dní | Ne 2.11.25  | Ši 6.11.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 64               | 204-00                                                                                                    | 430 dní | So 18.10.25 | Po 21.12.26 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 65               | 204-00                                                                                                    | 430 dní | So 18.10.25 | Po 21.12.26 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 66               | <b>291-00</b> 291-00 Kofajové úpravy-Prievidza nákl. stanica                                              | 100 dní | Ši 5.6.25   | Ši 12.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 67               | <b>291-00</b> 291-00 Kofajové úpravy-Prievidza nákl. stanica                                              | 100 dní | Ši 5.6.25   | Ši 12.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 68               | <b>292-00</b> 292-00 Kofajové úpravy-odvzd. kofajisko Baňa Cigeľ                                          | 100 dní | Ši 5.6.25   | Ši 12.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 69               | <b>292-00</b> 292-00 Kofajové úpravy-odvzd. kofajisko Baňa Cigeľ                                          | 100 dní | Ši 5.6.25   | Ši 12.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 70               | 301-00                                                                                                    | 60 dní  | Ši 23.7.26  | Ne 20.9.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 71               | 301-00                                                                                                    | 60 dní  | Ši 23.7.26  | Ne 20.9.26  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 72               | 302-00                                                                                                    | 60 dní  | Ši 12.11.26 | Ne 10.1.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 73               | 302-00                                                                                                    | 60 dní  | Ši 12.11.26 | Ne 10.1.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 74               | 303-00                                                                                                    | 60 dní  | Ši 12.11.26 | Ne 10.1.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 75               | 303-00                                                                                                    | 60 dní  | Ši 12.11.26 | Ne 10.1.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 76               | 351-00                                                                                                    | 415 dní | Ši 1.4.26   | Ši 20.5.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 77               | 351-00                                                                                                    | 415 dní | Ši 1.4.26   | Ši 20.5.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 78               | 352-00                                                                                                    | 90 dní  | Po 17.8.26  | So 14.11.26 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 79               | 352-00                                                                                                    | 90 dní  | Po 17.8.26  | So 14.11.26 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 80               | 501-00                                                                                                    | 400 dní | Út 29.4.25  | Út 2.6.26   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 81               | 501-00                                                                                                    | 400 dní | Út 29.4.25  | Út 2.6.26   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 82               | 502-00                                                                                                    | 30 dní  | Ši 21.5.25  | Ši 19.6.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 83               | 502-00                                                                                                    | 30 dní  | Ši 21.5.25  | Ši 19.6.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 84               | 503-00                                                                                                    | 545 dní | Ne 1.3.26   | Ši 27.8.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 85               | 503-00                                                                                                    | 545 dní | Ne 1.3.26   | Ši 27.8.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 86               | 503-11                                                                                                    | 180 dní | Po 17.8.26  | Ši 12.2.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 87               | 503-11                                                                                                    | 180 dní | Po 17.8.26  | Ši 12.2.27  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 88               | 521-00                                                                                                    | 150 dní | Út 29.4.25  | Ši 25.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 89               | 521-00                                                                                                    | 150 dní | Út 29.4.25  | Ši 25.9.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 90               | 522-00                                                                                                    | 60 dní  | So 21.6.25  | Út 19.8.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 91               | 522-00                                                                                                    | 60 dní  | So 21.6.25  | Út 19.8.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 92               | 601-00                                                                                                    | 30 dní  | Ši 21.5.25  | Ši 19.6.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 93               | 601-00                                                                                                    | 30 dní  | Ši 21.5.25  | Ši 19.6.25  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |

|                |                  |                       |                 |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Súhrn projektu | Kritická úloha   | Presmerovanie dopravy | Neaktívny súhrn |
| Súhrn          | Milník           | Neaktívna úloha       | Priebeh         |
| Úloha          | Milník - splnený | Neaktívny medzník     |                 |

| Identifikačný SO | Názov úlohy                                                                       | Trvanie | Začiatok   | Dokončenie  | Š1   | Š2    | Š3 | Š4 | Š5 | Š6 | Š7 | Š8 | Š9 | Š10 | Š11  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| 94               | 603-00 Prekládka VN vedenia v km 0,025                                            | 153 dni | Sr 21.5.25 | Po 20.10.25 | 21.5 | 20.10 |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 95               | 603-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 96               | 604-00 Prekládka VN vedenia v km 0,025                                            | 153 dni | Sr 21.5.25 | Po 20.10.25 | 21.5 | 20.10 |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 97               | 604-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 98               | 610-00 Prekládka VN prípojky pre Aerospool                                        | 153 dni | Sr 21.5.25 | Po 20.10.25 | 21.5 | 20.10 |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 99               | 610-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 100              | 610-00 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu                                           | 153 dni | Sr 21.5.25 | Po 20.10.25 | 21.5 | 20.10 |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 101              | 611-00 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu                                           | 153 dni | Sr 21.5.25 | Po 20.10.25 | 21.5 | 20.10 |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 102              | 611-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 103              | 612-00 Prípojka NN pre meteorostanicu                                             | 60 dni  | Po 30.6.25 | Št 28.8.25  | 30.6 | 28.8  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 104              | 612-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 105              | 613-00 Rekonštrukcia NN prípojok pre garáže                                       | 120 dni | Št 1.5.25  | Št 28.8.25  | 1.5  | 28.8  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 106              | 613-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 107              | 613-00 Rekonštrukcia NN prípojky pre záhradkársky areál                           | 120 dni | Št 1.5.25  | Št 28.8.25  | 1.5  | 28.8  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 108              | 613-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 109              | 621-00 Rekonštrukcia NN prípojky pre záhradkársky areál                           | 60 dni  | Št 1.5.25  | Ne 29.6.25  | 1.5  | 29.6  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 110              | 621-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 111              | 621-00 Rekonštrukcia a dostavba verejného osvetlenia                              | 60 dni  | Št 1.5.25  | Ne 29.6.25  | 1.5  | 29.6  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 112              | 621-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 113              | 621-00 Rekonštrukcia a dostavba verejného osvetlenia                              | 829 dni | Sr 21.5.25 | Pi 27.8.27  | 21.5 |       |    |    |    |    |    |    |    |     | 27.8 |
| 114              | 621-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     | 27.8 |
| 115              | 622-00 Osvetlenie chodníka pri záhradkárskej osade                                | 829 dni | Sr 21.5.25 | Pi 27.8.27  | 21.5 |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 116              | 622-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 117              | 622-00 Osvetlenie chodníka pri záhradkárskej osade                                | 90 dni  | So 4.4.26  | Št 2.7.26   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 118              | 622-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 119              | 623-00 Osvetlenie chodníka pri záhradkárskej osade                                | 90 dni  | So 4.4.26  | Št 2.7.26   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 120              | 623-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 121              | 623-00 Úpravy vonkajšieho osvetlenia v kolajisku                                  | 45 dni  | Št 14.8.25 | So 27.9.25  | 14.8 | 27.9  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 122              | 623-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 123              | 631-00-01 Meteorostanica v km 0,470 - stavebná časť                               | 45 dni  | Pi 6.11.26 | So 27.9.25  | 14.8 | 27.9  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 124              | 631-00-01                                                                         |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 125              | 631-00-01 Meteorostanica v km 0,470 - stavebná časť                               | 120 dni | Pi 6.11.26 | Pi 5.3.27   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 126              | 631-00-01                                                                         |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 127              | 631-00-02 Meteorostanica v km 0,470 - technologická časť časť                     | 120 dni | Ut 5.1.27  | Ut 4.5.27   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 128              | 631-00-02                                                                         |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 129              | 631-00-02 Meteorostanica v km 0,470 - technologická časť časť                     | 90 dni  | Ut 1.4.25  | Ne 29.6.25  |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 130              | 631-00-02                                                                         |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 131              | 651-00 Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom                                   | 90 dni  | Ut 1.4.25  | Ne 29.6.25  |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 132              | 651-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 133              | 652-00 Preložka MOK SSE-D                                                         | 153 dni | Sr 21.5.25 | Po 20.10.25 | 21.5 | 20.10 |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 134              | 652-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 135              | 653-00 Úpravy vzdušného oznamovacieho vedenia ZSR                                 | 45 dni  | Št 14.8.25 | So 27.9.25  | 14.8 | 27.9  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 136              | 653-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 137              | 653-00 Úpravy vzdušného oznamovacieho vedenia ZSR                                 | 45 dni  | Št 14.8.25 | So 27.9.25  | 14.8 | 27.9  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 138              | 653-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 139              | 671-00 Úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia - Prievidza nákladná stanica | 133 dni | Sr 21.5.25 | Ut 30.9.25  | 21.5 | 30.9  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 140              | 671-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 141              | 671-00 Úprava ZAB ZAR - dočasný stav počas výstavby                               | 133 dni | Sr 21.5.25 | Ut 30.9.25  | 21.5 | 30.9  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 142              | 671-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 143              | 672-00 Úprava zabezpečovacieho zariadenia - odovzd. kolajisko Baňa Gigeľ          | 133 dni | Sr 21.5.25 | Ut 30.9.25  | 21.5 | 30.9  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 144              | 672-00                                                                            |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 145              | 701-00.1 Križovanie VTL plynovodu, DN300 s obj. 102-00, ckm 0,009                 | 45 dni  | Ne 29.6.25 | Ut 12.8.25  | 29.6 | 12.8  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 146              | 701-00.1                                                                          |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 147              | 701-00.2 Križovanie VTL plynovodu, DN300 s obj. 103-00, ckm 0,020                 | 45 dni  | Ne 29.6.25 | Ut 12.8.25  | 29.6 | 12.8  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 148              | 701-00.2                                                                          |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 149              | 701-00.3 Križovanie VTL plynovodu, DN300 s obj. 103-00, ckm 0,020                 | 45 dni  | Ne 29.6.25 | Ut 12.8.25  | 29.6 | 12.8  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 150              | 701-00.3                                                                          |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 151              | 701-00.4 Križovanie VTL plynovodu, DN100 s obj. 101-00, ckm 1,040                 | 61 dni  | Sr 21.5.25 | Ne 20.7.25  | 21.5 | 20.7  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 152              | 701-00.4                                                                          |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 153              | 701-00.4 Križovanie VTL plynovodu, DN100 s obj. 101-00, ckm 1,040                 | 61 dni  | Sr 21.5.25 | Ne 20.7.25  | 21.5 | 20.7  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 154              | 701-00.4                                                                          |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 155              | 701-00.4 Križovanie VTL plynovodu, DN100 s obj. 101-00, ckm 1,415                 | 61 dni  | Sr 21.5.25 | Ne 20.7.25  | 21.5 | 20.7  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 156              | 701-00.4                                                                          |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 157              | 702-00.1 Ochrana STL plynovodu v km 0,396                                         | 45 dni  | Ne 29.6.25 | Ut 12.8.25  | 29.6 | 12.8  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 158              | 702-00.1                                                                          |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 159              | 702-00.2.1 Preložka STL plynovodu v km 1,867 (preložka PZ)                        | 61 dni  | Sr 21.5.25 | Ne 20.7.25  | 21.5 | 20.7  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 160              | 702-00.2.1                                                                        |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 161              | 702-00.2.1 Preložka STL plynovodu v km 1,867 (preložka PZ)                        | 61 dni  | Sr 21.5.25 | Ne 20.7.25  | 21.5 | 20.7  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 162              | 702-00.2.2                                                                        |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 163              | 702-00.2.2 Preložka STL plynovodu v km 1,867 (chránička)                          | 61 dni  | Sr 21.5.25 | Ne 20.7.25  | 21.5 | 20.7  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 164              | 702-00.2.2                                                                        |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 165              | 702-00.3 Preložka prípojovacieho plynovodu v km 1,867                             | 61 dni  | Sr 21.5.25 | Ne 20.7.25  | 21.5 | 20.7  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 166              | 702-00.3                                                                          |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 167              | 702-00.3 Preložka prípojovacieho plynovodu v km 1,867                             | 61 dni  | Sr 21.5.25 | Ne 20.7.25  | 21.5 | 20.7  |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 168              | 702-00.3                                                                          |         |            |             |      |       |    |    |    |    |    |    |    |     |      |

| Súhrn projektu | Kritická úloha   | Presmerovanie dopravy | Neaktívny súhrn |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Súhrn          | Milník           | Neaktívna úloha       | Priebeh         |
| Úloha          | Milník - splnený | Neaktívny medzník     |                 |
| 3 / 3          |                  |                       |                 |

POJISKY „Obchod města Převládra I. Etapa, 2. stavba – MZ v trase budovy 1/63”

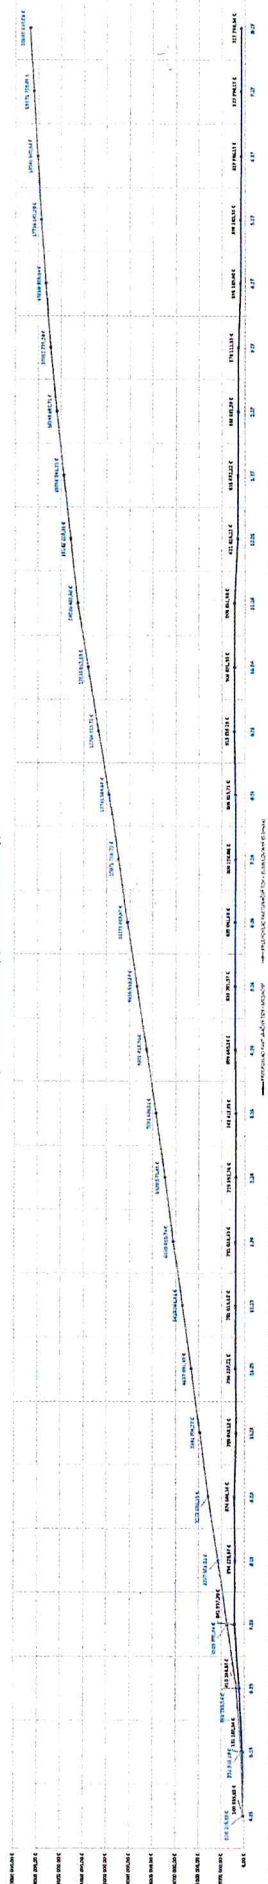

## Podmienky BOZP na stavenisku

### Čl. 1

#### Úvodné ustanovenia

1. Týmito podmienkami sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Objednávateľ.
2. Určuje povinnosti Zhotoviteľa stavby, resp. Priamych Podzhotoviteľov, Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa (ďalej len "subdodávateľa"):
  - a) pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách Objednávateľa;
  - b) pri kontrole dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách Objednávateľa;

Povinnosti stavebníka, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri zabezpečení splnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách Objednávateľa sú zabezpečované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.“).

### Čl. 2

#### Základné pojmy

Koordinátorom bezpečnosti sa rozumie:

- a) fyzická osoba - zamestnanec Zhotoviteľa, resp. osoba, ktorá má so Zhotoviteľom pracovno-právny, alebo iný zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je na základe predložených dokladov uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke), ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na stavenisku; Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; a v plnom rozsahu zodpovednou za BOZP na predmetnom stavenisku Objednávateľa;
- b) fyzická osoba - zamestnanec Objednávateľa, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke);
- c) fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, avšak Objednávateľ s ňou má uzavretý zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke).

Základnými opatreniami na zaistenie BOZP na stavenisku sa rozumejú:

- a) bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko ustanovené v Prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- b) bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku ustanovené v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci;
- c) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacimi, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami

ustanovené v Prílohe č. 1 až 9 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

**Práce s osobitným nebezpečenstvom** sú najmä práce uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., pri ktorých sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia.

**Všeobecné zásady prevencie** sú požiadavky na zaistenie BOZP uvedené v §7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

### **Čl. 3**

#### **Povinnosti stavebníka (Objednávateľa)**

1. Stavebník je povinný :

- a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu;
- b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie alebo môžu spôsobiť značné národnohospodárske škody.

### **Čl. 4**

#### **Povinnosti Zhotoviteľa (realizátora)**

1. Zhotoviteľ je povinný plniť opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rozsahu stanovenom príslušnou Zmluvou o dielo a jej nedeliteľných súčasti a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku aj zo strany subdodávateľov, ktorí sú uvedení v príslušnej Zmluve o dielo.

### **Čl. 5**

#### **Organizačné zložky**

**Organizačná zložka Objednávateľa - Oddelenie investičnej výstavby IVSC Žilina:**

**zabezpečuje** spoluprácu s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátmi práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri oznamovaní a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách;

**koordinuje** spôsob vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane Plánu BOZP pre konkrétne stavenisko;

**zabezpečuje** vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie DSP/DP a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľa alebo tretej strany;

**vykonáva kontrolu** dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

## SANKČNÝ PORIADOK

Porušenie povinností BOZP a OPP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom)

### 1. NAPOMENUTIE (porušenie povinností zistené prvý krát):

- nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinností udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinností uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- nesprávne postavenie rebríka pre výkon práce
- lešenie bez bezpečnostného štítka
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - pracovník nemá osvedčenie pri sebe na stavenisku
- neoznačenie elektrických rozvádzačov, umiestnenia požiarneho zariadenia a prostriedkov prvej pomoci
- nesprávne vedenie rozvodných elektrických káblov
- fajčenie na stavenisku v blízkosti horľavého materiálu
- nevyhovujúce ukladanie stavebného materiálu
- na stavenisku nájdené obaly z alkoholických nápojov
- manipulácia s chemikáliami do objemu 1 litra v rozpore s inštrukciami od výrobcu

**2. ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinností opakované (aspoň 2 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinností uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí vyššie, považuje sa takéto porušenie za závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)**

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 30,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakované
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinností udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinností uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie nevyhovujúceho rebríka
- nezabezpečenie revízie lešenia v stanovených termínoch
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky zistené opakované
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - zhotoviteľ nevie preukázať osvedčenie pracovníka
- zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- ukladanie materiálu na rozvodné elektrické káble, prechádzanie po nich vozíkmi, motorovými vozidlami a pod.
- vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bez požadovaného zabezpečenia
- používanie nevhodného spôsobu viazania bremien
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade

podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa

- manipulácia s chemikáliami do objemu 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

**3. OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakovane (aspoň 3 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí a v Závažnom porušení BOZP a OPP vyššie, považuje sa takéto porušenie za Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)**

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 500,- EUR za každé zistené porušenie povinnosti zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakovane; alebo ak pracovníci nemajú požadované OOPP vôbec k dispozícii na stavenisku
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie rebríka nebezpečným spôsobom (ako podpera, prechodový mostík a pod.) bez určenia výrobcom
- používanie lešenia bez ochranných prvkov, zábradlí a pod.
- vykonávanie práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia proti pádu z výšky a do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, viazač, ...) pri ktorej sú zároveň porušené aj iné požiadavky na bezpečnú prácu
- opakované zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- práca s poškodeným ručným elektrickým náradím
- vykonávanie činností s otvoreným ohňom bez požadovaného zabezpečenia
- používanie poškodeného viazacieho prostriedku pri prenášaní bremena
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami v objeme nad 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu.

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA**

NÁZOV ZÁKAZKY: „OBCHVAT MESTA PRIEVIDZA I. ETAPA, 2. STAVBA – CESTA  
V TRASE BUDÚCEJ I/64, STAVEBNÉ PRÁCE“

**Identifikácia uchádzača: EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CZ, a.s., SMS, a.s**

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Obchodné meno, sídlo a IČO uchádzača :

1. **EUROVIA SK, a.s.,** vedúci člen skupiny dodávateľov, so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO 31 651 518
2. **EUROVIA CZ, a.s.,** člen skupiny dodávateľov, so sídlom U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, Česká republika, IČO : 45 274 924
3. **SMS, a.s.,** člen skupiny dodávateľov, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 35 727 951

**Návrh na plnenie kritéria:**

| Kritériá       | Hodnotené kritérium                                                                               | Návrh na plnenie kritéria |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kritérium č. 1 | <b>Celková cena za predmet zákazky</b><br>vyjadrená v eurách bez DPH                              | <b>18 699 537,03</b>      |
| Kritérium č. 2 | <b>Lehota výstavby</b><br>vyjadrená v celých dňoch odo dňa<br>odovzdania staveniska zhotoviteľovi | <b>879</b>                |

**Stanovenie kritéria č. 1:**

| Celková cena za predmet zákazky<br>v EUR bez DPH | Výška DPH v eur | Celková cena za predmet zákazky<br>v EUR s DPH |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 18 699 537,03                                    | 4 300 893,52    | 23 000 430,55                                  |

Ako uchádzač prehlasujem, že \* SOM / NIE-SOM platiteľom DPH

V Banskej Bystrici, dňa.....

.....  
Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED,  
konajúci na základe plnej moci

<sup>1</sup>Upozornenie:

Uchádzač uvedie v ponuke ceny v EUR bez DPH a s DPH zaokrúhlené na 2 (dve) desatinné miesta.

<sup>1</sup> Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – cesta v trase budúcej I/64, stavebné práce  
Nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - uskutočnenie stavebných prác

| Číslo časti stavby | Klasifikácia stavieb | Názov časti stavby                                                                | Cena bez DPH  | DPH 23%      | Cena s DPH    |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 000-00             | 2111                 | 000-00 Všeobecné položky                                                          | 1 018 941,77  | 234 356,61   | 1 253 298,38  |
| 010-00             | 2111                 | 010-00 Príprava územia a plôch zariadenia staveniska                              | 192 777,50    | 44 338,83    | 237 116,33    |
| 011-00             | 2111                 | 011-00 Demolácie objektov                                                         | 111 445,46    | 25 632,46    | 137 077,92    |
| 012-00             | 2111                 | 012-00 Zrušenie úseku MK pri moste č. 1778-001                                    | 59 853,21     | 13 766,24    | 73 619,45     |
| 020-00             | 2111                 | 020-00 Rekonštrukcia dočasne zabratých plôch                                      | 82 442,30     | 18 961,73    | 101 404,03    |
| 101-00             | 2111                 | 101-00 Cesta I/64                                                                 | 5 496 946,29  | 1 264 297,65 | 6 761 243,94  |
| 101-00-01          | 2111                 | 101-00-01 Náhradná výsadba                                                        | 35 366,69     | 8 134,34     | 43 501,03     |
| 101-01             | 2111                 | 101-01 Cesta I/64 a I/9 - MÚK                                                     | 911 040,00    | 209 539,20   | 1 120 579,20  |
| 102-00             | 2111                 | 102-00 Miestna komunikácia                                                        | 547 548,30    | 125 936,11   | 673 484,41    |
| 103-00             | 2111                 | 103-00 Prístupová komunikácia k ČOV                                               | 275 552,96    | 63 377,18    | 338 930,14    |
| 104-00             | 2111                 | 104-00 Prístupový chodník pre záhradkársky areál                                  | 22 635,80     | 5 206,23     | 27 842,03     |
| 105-00             | 2111                 | 105-00 Vetva okružnej križovatky na ceste III/1778                                | 51 571,88     | 11 861,53    | 63 433,41     |
| 106-00             | 2112                 | 106-00 Chodníky a vetva okružnej križovatky na MK Košovská cesta                  | 238 033,39    | 54 747,68    | 292 781,07    |
| 108-00             | 2112                 | 108-00 Prístupová rampa na toku Handlovka                                         | 134 179,26    | 30 861,23    | 165 040,49    |
| 201-00             | 2141                 | 201-00 Most nad nákladnou stanicou Prievídza                                      | 3 860 174,32  | 887 840,09   | 4 748 014,41  |
| 202-00             | 2141                 | 202-00 Most nad riekou Handlovka                                                  | 1 303 621,62  | 299 832,97   | 1 603 454,59  |
| 203-00             | 2141                 | 203-00 Rekonštrukcia mosta nad potokom Moštenica                                  | 297 388,82    | 68 399,43    | 365 788,25    |
| 204-00             | 2141                 | 204-00 Demolácia mosta č. 1778-001 v km 2,098                                     | 72 156,28     | 16 595,94    | 88 752,22     |
| 291-00             | 2121                 | 291-00 Kolajové úpravy-Prievídza nákl. stanica                                    | 64 579,68     | 14 853,33    | 79 433,01     |
| 292-00             | 2121                 | 292-00 Kolajové úpravy-odovzd. kolajisko Baňa Cígeľ                               | 64 579,68     | 14 853,33    | 79 433,01     |
| 301-00             | 2111                 | 301-00 Oplotenie v záhradkárskej osade SNP                                        | 36 806,68     | 8 465,54     | 45 272,22     |
| 302-00             | 2111                 | 302-00 Oplotenie v záhradkárskej osade Sad stavbárov                              | 75 177,24     | 17 290,77    | 92 468,01     |
| 303-00             | 2111                 | 303-00 Oplotenie v km 2,150 a km 2,300 vľavo                                      | 15 550,01     | 3 576,50     | 19 126,51     |
| 351-00             | 2111                 | 351-00 Protihlukové stena v km 0,375 obj. 101-00                                  | 742 174,82    | 170 700,21   | 912 875,03    |
| 352-00             | 2111                 | 352-00 Protihluková stena obj. 102-00                                             | 484 812,80    | 111 506,94   | 596 319,74    |
| 501-00             | 2223                 | 501-00 Rekonštrukcia kanalizačných zberačov v súbehu obj. 101-00 a 102-00         | 489 057,97    | 112 483,33   | 601 541,30    |
| 502-00             | 2223                 | 502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,982                                             | 60 989,21     | 14 027,52    | 75 016,73     |
| 503-00             | 2223                 | 503-00 Cestná kanalizácia na ceste I/64                                           | 590 765,00    | 135 875,95   | 726 640,95    |
| 503-11             | 2223                 | 503-11 Čerpacia stanica v km 0,090 vľavo                                          | 51 420,86     | 11 826,80    | 63 247,66     |
| 521-00             | 2222                 | 521-00 Ochrana vodovodu v km 0,394                                                | 9 278,23      | 2 133,99     | 11 412,22     |
| 522-00             | 2222                 | 522-00 Preložka vodovodu v km 2,021                                               | 26 578,16     | 6 112,98     | 32 691,14     |
| 601-00             | 2214                 | 601-00 Prekládka VN vedenia v km 0,940                                            | 66 240,01     | 15 235,20    | 81 475,21     |
| 603-00             | 2214                 | 603-00 Prekládka VN vedenia v km 0,025                                            | 31 547,68     | 7 255,97     | 38 803,65     |
| 604-00             | 2214                 | 604-00 Prekládka VN prípojky pre Aerospool                                        | 16 461,82     | 3 786,22     | 20 248,04     |
| 610-00             | 2224                 | 610-00 Prípojka NN pre čerpaciu stanicu                                           | 13 742,35     | 3 160,74     | 16 903,09     |
| 611-00             | 2224                 | 611-00 Prípojka NN pre meteostanicu                                               | 9 373,76      | 2 155,96     | 11 529,72     |
| 612-00             | 2224                 | 612-00 Rekonštrukcia NN prípojok pre garáže                                       | 37 948,62     | 8 728,18     | 46 676,80     |
| 613-00             | 2224                 | 613-00 Rekonštrukcia NN prípojky pre záhradkársky areál                           | 9 137,93      | 2 101,72     | 11 239,65     |
| 621-00             | 2224                 | 621-00 Rekonštrukcia a dostavba verejného osvetlenia                              | 491 714,40    | 113 094,31   | 604 808,71    |
| 622-00             | 2224                 | 622-00 Osvetlenie chodníka pri záhradkárskej osade                                | 19 448,73     | 4 473,21     | 23 921,94     |
| 623-00             | 2224                 | 623-00 Úpravy vonkajšieho osvetlenia v kolajisku                                  | 51 943,32     | 11 946,96    | 63 890,28     |
| 631-00-01          | 2112                 | 631-00-01 Meteostanica v km 0,470 - stavebná časť                                 | 21 840,09     | 5 023,22     | 26 863,31     |
| 631-00-02          | 2112                 | 631-00-02 Meteostanica v km 0,470 - technologická časť časť                       | 61 491,83     | 14 143,12    | 75 634,95     |
| 651-00             | 2224                 | 651-00 Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom                                   | 64 211,83     | 14 768,72    | 78 980,55     |
| 652-00             | 2224                 | 652-00 Preložka MOK SSE-D                                                         | 1 796,90      | 413,29       | 2 210,19      |
| 653-00             | 2121                 | 653-00 Úpravy vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR                                 | 23 782,97     | 5 470,08     | 29 253,05     |
| 671-00             | 2121                 | 671-00 Úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia - Prievídza nákladná stanica | 88 606,95     | 20 379,60    | 108 986,55    |
| 672-00             | 2121                 | 672-00 Úprava zabezpečovacieho zariadenia -odovzd. kolajisko Baňa Cígeľ           | 100 492,09    | 23 113,18    | 123 605,27    |
| 701-00.1           | 2211                 | 701-00.1 Križovanie VTL plynovodu, DN300 s obj. 102-00, ckm 0,009                 | 33 186,89     | 7 632,98     | 40 819,87     |
| 701-00.2           | 2211                 | 701-00.2 Križovanie VTL plynovodu, DN300 s obj. 103-00, ckm 0,020                 | 20 701,60     | 4 761,37     | 25 462,97     |
| 701-00.3           | 2211                 | 701-00.3 Križovanie VTL plynovodu, DN100 s obj. 101-00, ckm 1,040                 | 38 250,83     | 8 797,69     | 47 048,52     |
| 701-00.4           | 2211                 | 701-00.4 Križovanie VTL plynovodu, DN100 s obj. 101-00, ckm 1,415                 | 27 984,11     | 6 436,35     | 34 420,46     |
| 702-00.1           | 2221                 | 702-00.1 Ochrana STL plynovodu v km 0,396                                         | 17 104,45     | 3 934,02     | 21 038,47     |
| 702-00.2.1         | 2221                 | 702-00.2.1 Preložka STL plynovodu v km 1,867 (preložka PZ)                        | 13 004,73     | 2 991,09     | 15 995,82     |
| 702-00.2.2         | 2221                 | 702-00.2.2 Preložka STL plynovodu v km 1,867 (chránička)                          | 9 109,67      | 2 095,22     | 11 204,89     |
| 702-00.3           | 2221                 | 702-00.3 Preložka prípojovacieho plynovodu v km 1,867                             | 6 967,28      | 1 602,47     | 8 569,75      |
| Celkový súčet      |                      |                                                                                   | 18 699 537,03 | 4 300 893,52 | 23 000 430,55 |
