

ZMLUVA O DIELO

ČASŤ I ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa: 502/5120/2025
evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku **podlimitnej zákazky nadlimitným postupom** na predmet obstarávania

I/65 Stará Kremnička – rekonštrukcia mostov
(most ev. č. 65-059, most ev. č. 65-060)

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „Zmluva“)

medzi zmluvnými Stranami

1. Objednávateľ

Sídlo: Slovenská správa ciest
Štatutárny orgán: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ
DIČ: 000 033 28
Bankové spojenie: 2021067785
IBAN: Štátna pokladnica
Telefón:
e-mail:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Miloš Kreth
- vo veciach technických: Ing. Rastislav Pisarčík
- vo veciach realizačných: Ing. Ladislav Štulajter
- kontroly kvality materiálov a prác: Ing. Pavol Oravec

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M 95 zo dňa 07.12.1995

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: Metrostav DS a.s.
Štatutárny orgán: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Bankové spojenie: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Číslo účtu: Ing. Martin Máté, člen predstavenstva
IČO: UniCredit Bank CR and Slovakia, pobočka ZB
IČ DPH: 46 120 602
Tel.: SK2023231892

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh
 - vo veciach technických: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh
 - vo veciach realizačných: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh
- Právna forma: akciová spoločnosť

(ďalej len „Zhotoviteľ“)(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Diele sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:

- (a) Zmluvné dojednania
(Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
- (b) Ponukový list (Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií hodnotenia ponúk, časť 1.5 Prílohy a formuláre, Zväzok 1 súťažných podkladov tak, ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)
- (c) Príloha k ponuke
(Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
- (d) Osobitné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
- (e) Všeobecné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
- (f) Technické špecifikácie
(Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
- (g) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
(Zväzok 5 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
- (h) Cenová časť
(Zväzok 4 súťažných podkladov)
- (i) Ponuka Zhotoviteľa
(neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
- (j) Vzorové tlačivá
(Zväzok 2 Časť 4¹ až 9 súťažných podkladov)
- (k) Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu²

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov uvedené v Profile verejného obstarávateľa-Objednávateľa, v Zákazke, v časti Dokumenty. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo „I/65 Stará Kremnička – rekonštrukcia mostov (most ev. č. 65 – 059, most ev.č. 65-060)“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.
8. Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH 1.106.098,01 EUR
DPH 23% 254.402,54 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela s DPH 1.360.500,55 EUR
(slovom Jeden milión tristošesťdesiatštyri tisíc päťsto EUR päťdesiatpäť eurocentov)
9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumejú všetci účastníci Zmluvy na

¹ Vzorové tlačivá zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby budú nahradené po predložení originálov zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby.

1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.
2. Plná moc v zmysle bodu 10 Zmluvných dojednaní.
3. Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy).

strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Zmluvných podmienok.

10. V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti na predmet zákazky „1/65 Stará Kremnička – rekonštrukcia mostov (most ev. č. 65 – 059, most ev.č. 65-060)“ („kľúčoví a nekľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Zmluvných podmienok. Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.
13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
14. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Vzhľadom na skutočnosť, že v deň platnosti tejto Zmluvy nemá Objednávateľ ešte zabezpečené financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa zmluvné Strany na tejto odkladacej podmienke účinnosti Zmluvy: Zmluva nadobudne účinnosť deň potom, ako bude Zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie Objednávateľa (SSC) o tom, že Objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy a zároveň Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi svoju pripravenosť zahájiť plnenie v zmysle Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi svoju pripravenosť na plnenie v zmysle Zmluvy, táto nadobúda účinnosť na 60 deň od doručenia oznámenia Objednávateľa o zabezpečení financovania.
Táto Zmluva zanikne a bude sa na ňu hľadieť ako keby k jej uzavretiu nikdy nedošlo v prípade, ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi písomné oznámenie o zabezpečení financovania predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 2 a to ani najneskôr do konca rozpočtového roka nasledujúceho po rozpočtovom roku v ktorom nadobudla platnosť táto Zmluva.
15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
 - Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 - Príloha č. 2 Zoznam kľúčových a nekľúčových odborníkov na stavbe
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác - tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa
 - časť 3.1 Vecný harmonogram
 - časť 3.2 Míľniky
 - časť 3.3 Fakturačný harmonogram
 - Príloha č. 4 Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok
16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č. 3 týchto Zmluvných dojednaní, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie

- je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.
17. Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prílohy č. 1 sa realizuje postupom v zmysle podčlánku 4.4b Zmluvných podmienok. Zmena Prílohy č. 3 sa realizuje postupom v zmysle podčl. 13.3 Zmluvných podmienok, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných Strán uzavrieť písomný dodatok podľa bodu 16 týchto Zmluvných dojednaní.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej Únie,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej Únie,
 - h) Úrad pre verejné obstarávanie
20. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, ak nie je v rozpore so zákonom č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodari urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
22. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky,

Odtlačok pečiatky

Ing. Paľol Hruzík, predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ
Slovenská správa ciest

Ing. Martin Máte, člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Príloha č. 1 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v členení:

A/ Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok

B/ Menovaní Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 a podčlánku 5.1 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Podzhotoviteľov)

C/ Dodávateľia Zhotoviteľa

A/

p.č.	Podzhotoviteľia (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
1.	CiDeCo, s.r.o., SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom, SR, IČO: 54 079 420		Projektové práce- DVP, DSRS	4,96	67 417,64 €
2.	„Neznámy“		Inžinierska činnosť – diagnostika prepínacích káblov	0,09	1 212,66 €
			Súhrn podielu subdodávok	5,05	68 630,30 €

B/

p.č.	Menovaní Podzhotoviteľia (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
			Súhrn podielu subdodávok	/	/

C/

p.č.	Dodávateľia Zhotoviteľa (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/
			Súhrn podielu subdodávok	/	/

V Bratislave/dňa,

Ing. Pavol Hřůžik, predseda predstavenstva
Ing. Martin Máté, člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Príloha č. 2 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam kľúčových a neklúčových odborníkov na stavbe

Funkcia	Meno a priezvisko
Kľúčový odborník 1 – hlavný stavbyvedúci	Branislav Bireš, Ing.
Kľúčový odborník 2 – zástupca hlavného stavbyvedúceho	Ivan Koles, Ing.
Nekľúčový odborník 1 - geodet	Miloš Novák, Ing.
Nekľúčový odborník 2 – koordinátor BOZP	Ján Jakubovie, Bc.

V Bratislave dňa .

Ing./Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
Ing./ Martin Maté, člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.


Príloha č. 3 k Zmluvným dojednaniám - Harmonogram prác (tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa)

Samostatná príloha

Fakturačný harmonogram

Stavovské objekty	Číslo štátu a názov štátu	Fakturačná imedž						Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH	
		1	2	3	4	5	6				
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-599											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-510											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	7738,38	7738,38	7738,38	7738,38	7738,38	53 972,72	12 321,27	65 894,99	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-400											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-401											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-402											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-403											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-404											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-405											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-406											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-407											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-408											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-409											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-410											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-411											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-412											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-413											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-414											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-415											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-416											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-417											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-418											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-419											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-420											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-421											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-422											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98	11 276,61	60 326,41	
100-00	100-00 Úprava cesty I/65	4399,02	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	43 99,02	10 123,75	14 522,77	
200-00	200-00 Úprava cesty I/65	15164,88	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	12178,68	43 99,02	10 123,75	56 502,45	
Príloha č. 1, strana 6 z 6-5-423											
000-00	000-00 Všeobecná publikácia	13259,52	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	8819,11	49 860,98			

Indice	Fabricata	Fabricata restituita
1	148 316,78 €	148 516,28 €
2	162 027,13 €	310 953,91 €
3	277 794,09 €	588 246,00 €
4	126 034,99 €	716 784,99 €
5	147 390,11 €	464 172,10 €
6	241 922,88 €	1 108 091,01 €

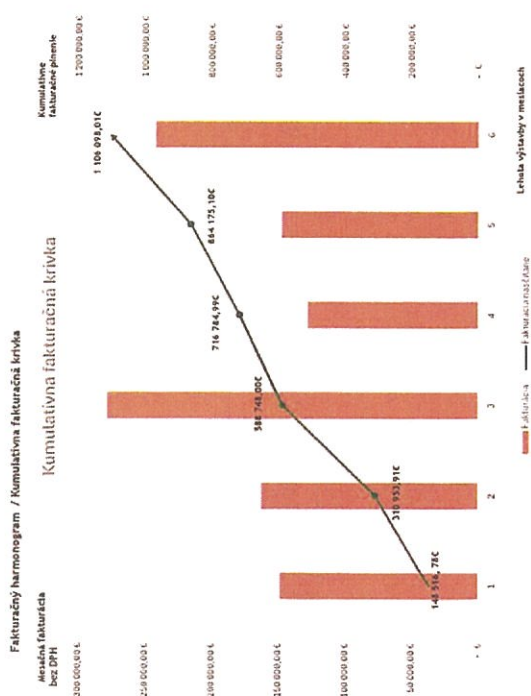


Podpis:

Fakturačný harmonogram

Číslo časti a názov časti stavby	1	2	3	4	5	6	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
000-00 Všeobecná stavba	12053,48	7778,38	7778,38	7778,38	7778,38	10553,38	53 170,72	12 211,27	65 881,99
001-00 Úprava cesty I/45	938,48	3771,20	3868,02	5997,40	3233,38	3015,38	87 241,82	20 065,62	107 307,44
001-00 - kobercová maza ev.č. 65-000	1827,66	7801,56	8392,19	17579,87	77877,71	49956,12	387 807,11	88 895,63	366 702,74
Celkový súčet častí stavby	38 276,38 €	90 471,14 €	100 736,59 €	34 916,05 €	48 639,67 €	85 579,80 €	438 619,65 €	100 682,32	539 301,97
Fakturačné mesiace SO	38 276,38 €	128 747,32 €	229 484,11 €	264 400,16 €	353 039,83 €	438 619,65 €			
Fakturačné mesiace SO naštudované									

Datum	Fakturačná mesačná	Fakturačná naštudované
1	38 276,38 €	38 276,38 €
2	90 471,14 €	128 747,32 €
3	100 736,59 €	229 484,11 €
4	34 916,05 €	264 400,16 €
5	48 639,67 €	353 039,83 €
6	85 579,80 €	438 619,65 €

Fakturačný harmonogram / Kumulatívna fakturačná krivka

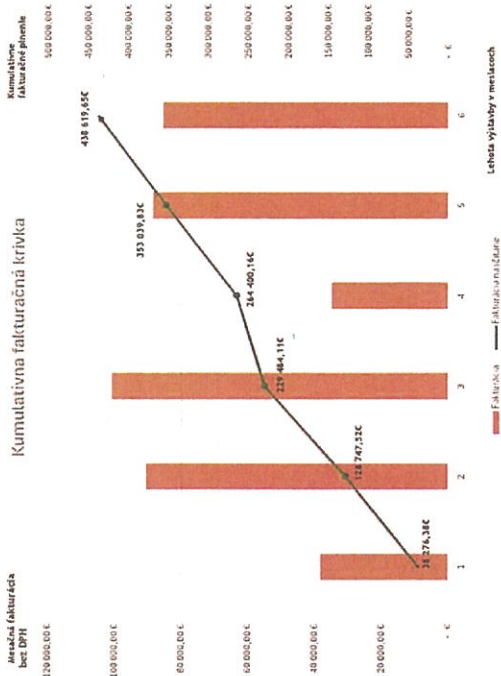

Podmienky BOZP na stavenisku

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Týmito podmienkami sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Objednávateľ.
2. Určuje povinnosti Zhotoviteľa stavby, resp. Podzhotoviteľov, Menovaných Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa (ďalej len "subdodávateľa"):
 - a) pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách Objednávateľa;
 - b) pri kontrole dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách Objednávateľa;

Povinnosti stavebníka, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri zabezpečení splnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách Objednávateľa sú zabezpečované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.“).

Čl. 2

Základné pojmy

Koordinátorom bezpečnosti sa rozumie:

- a) fyzická osoba - zamestnanec Zhotoviteľa, resp. osoba, ktorá má so Zhotoviteľom pracovno-právny, alebo iný zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je na základe predložených dokladov uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke), ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na stavenisku; Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; a v plnom rozsahu zodpovednou za BOZP na predmetnom stavenisku Objednávateľa;
- b) fyzická osoba - zamestnanec Objednávateľa, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke);
- c) fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, avšak Objednávateľ s ňou má uzavretý zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke).

Základnými opatreniami na zaistenie BOZP na stavenisku sa rozumejú:

- a) bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko
ustanovené v Prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- b) bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku
ustanovené v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci;
- c) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacimi, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami
ustanovené v Prílohe č. 1 až 9 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä práce uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., pri ktorých sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia.

Všeobecné zásady prevencie sú požiadavky na zaistenie BOZP uvedené v §7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

Čl. 3

Povinnosti stavebníka (Objednávateľa)

1. Stavebník je povinný :

- a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu;
- b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie alebo môžu spôsobiť značné národnohospodárske škody.

Čl. 4

Povinnosti Zhotoviteľa (realizátora)

1. Zhotoviteľ je povinný plniť opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rozsahu stanovenom príslušnou Zmluvou o dielo a jej nedeliteľných súčasti a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku aj zo strany subdodávateľov, ktorí sú uvedení v príslušnej Zmluve o dielo.

Čl. 5

Organizačné zložky

Organizačná zložka Objednávateľa - Oddelenie investičnej výstavby IVSC Banská Bystrica:

zabezpečuje spoluprácu s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátmi práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri oznamovaní a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách;

koordinuje spôsob vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane Plánu BOZP pre konkrétne stavenisko;

zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie DSP/DP a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľa alebo tretej strany;

vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

SANKČNÝ PORIADOK

Porušenie povinností BOZP a OPP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom)

1. **NAPOMENUTIE** (porušenie povinností zistené prvý krát):

- nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinností uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- nesprávne postavenie rebríka pre výkon práce
- lešenie bez bezpečnostného štítka
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky

- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - pracovník nemá osvedčenie pri sebe na stavenisku
- neoznačenie elektrických rozvádzačov, umiestnenia požiarnych zariadení a prostriedkov prvej pomoci
- nesprávne vedenie rozvodných elektrických káblov
- fajčenie na stavenisku v blízkosti horľavého materiálu
- nevyhovujúce ukladanie stavebného materiálu
- na stavenisku nájdené obaly z alkoholických nápojov
- manipulácia s chemikáliami do objemu 1 litra v rozpore s inštrukciami od výrobcu

2. ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakovane (aspoň 2 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí vyššie, považuje sa takéto porušenie za závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 30,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakovane
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie nevyhovujúceho rebríka
- nezabezpečenie revízie lešenia v stanovených termínoch
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky zistené opakovanie
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - zhotoviteľ nevie preukázať osvedčenie pracovníka
- zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- ukladanie materiálu na rozvodné elektrické káble, prechádzanie po nich vozíkmi, motorovými vozidlami a pod.
- vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bez požadovaného zabezpečenia
- používanie nevhodného spôsobu viazania bremien
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami do objemu 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

3. OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakovane (aspoň 3 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinností uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí a v Závažnom porušení BOZP a OPP vyššie, považuje sa takéto porušenie za Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 500,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakovane; alebo ak pracovníci nemajú požadované OOPP vôbec k dispozícii na stavenisku
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie rebríka nebezpečným spôsobom (ako podpera, prechodový mostík a pod.) bez určenia výrobcom
- používanie lešenia bez ochranných prvkov, zábradlí a pod.
- vykonávanie práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia proti pádu z výšky a do hĺbky

- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvarač, strojník, viazač, ...) pri ktorej sú zároveň porušené aj iné požiadavky na bezpečnú prácu
- opakované zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- práca s poškodeným ručným elektrickým náradím
- vykonávanie činností s otvoreným ohňom bez požadovaného zabezpečenia
- používanie poškodeného viazacieho prostriedku pri prenášaní bremena
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami v objeme nad 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu.

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

Názov zákazky

**I/65 Stará Kremnička – rekonštrukcia mostov
(most ev. č. 65-059, most ev. č. 65-060)**

Uchádzač / skupina dodávateľov

**METROSTAV DS A.S.
KOŠICKÁ 17180/49
821 08 BRATISLAVA**Je uchádzač platiteľom DPH?¹**ÁNO****NIE**

Kritérium	Návrh na plnenie kritéria	
Kritérium č. 1 Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH	cena celkom v EUR bez DPH	1 106 098,01
	DPH 23%	254 402,54
	cena celkom v EUR s DPH	1 360 500,55
Kritérium č. 2 Lehota výstavby vyjadrená v celých dňoch odo dňa začatia prác	počet dní	180

V Bratislave, dňa .

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Martin Máté, člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

¹ Nehodí sa preškrtnúť

**ČASŤ 3
ZMLUVA O DIELO**

PRÍLOHA K PONUKE

**PRE ZMLUVU O DIELO
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁČ**

**Názov diela: I/65 Stará Kremnička – rekonštrukcia mostov
(most ev. č. 65 – 059, most ev. č. 65 – 060)**

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa		Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa		Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Meno a adresa Stavebnotechnického dozoru	1.1.2.4	Bude oznámený
Koordinátor bezpečnosti	1.1.2.12	Bude oznámený
Bezpečnostný technik Objednávateľa	1.1.2.14	Ing. Peter Pazírík
Záručná doba	1.1.3.10	trvanie: Stavebná časť: 60 mesiacov
Akceptovaná zmluvná hodnota	1.1.4.1	1.106.098,01 € bez DPH <i>(Výška Akceptovanej zmluvnej hodnoty je uvedená v bode 8. zmluvných dojednaní)</i>
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu; Bude sa viesť elektronický stavebný denník
Použité právne predpisy	1.1.6.5	Právne predpisy Slovenskej republiky, právo EÚ
Termín predloženia „Sprievodca stavby (manuál stavby)“	1.1.6.12	Do 30 dní od podpisu ZoD
Rozhodujúci jazyk	1.3	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.3	Slovenský
Sociálne hľadisko	1.17	Nevyžaduje sa
Environmentálny plán výstavby	4.1	Nevyžaduje sa
Povodňový plán zabezpečovacích prác	4.1 g)	Vyžaduje sa (most ev. č. 059), Nevýžaduje sa (most ev. č. 060)
Monitorovanie stavby	4.1 h)	Vyžaduje sa
Počet samostatne stojacich kamier	4.1. h)	4 ks (2 ks pre každý most zvlášť)
Archeologický výskum	4.1 j)	Nevyžaduje sa
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	Vo výške 16.500,- € bez DPH Výška Zábezpeky na vykonanie prác bude 1,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH. Zábezpeka na vykonanie prác bude zaokrúhlená nadol na celé stovky EUR (konkrétna výška bude vypočítaná v súlade s nižšie uvedeným a doplnená úspešným uchádzačom ako Zhotoviteľom v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy).

Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a	20 % z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa
Správy o postupe prác	4.21	Vyžaduje sa
Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	4.28	30 dní od Dátumu začatia prác

Vyššia trieda presnosti bodov vytyčovacej siete a pevné zaistenie ich polohy	4.7	Nevyžaduje sa
Lehota výstavby v zmysle projektovej dokumentácie	8.2	240 dní od Dátumu začatia prác (v zmysle podčl. 8.1)
Lehota výstavby v zmysle ponuky Zhotoviteľa (v prípade ak jedným z hodnotiacich kritérií bola aj dĺžka lehoty výstavby)	8.2	180 dní od Dátumu začatia prác (v zmysle podčl. 8.1)
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,1 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty v EUR za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby v prípade, ak hodnotiacim kritériom je aj dĺžka lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty v EUR za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná Zmluvná cena
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného harmonogramu)	8.7 & 14.15 (b)	Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 8.7 Odškodnenie za oneskorenie Osobitných zmluvných podmienok
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Míľníku)	8.7 & 14.15 (b)	0,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie – nesplnenie Lehoty výstavby	8.7	50 % z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH
Geometrický plán	10.1 & 17.7	Vyžaduje sa GP
Zábezpeka na záručné opravy	11.13	3 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Tabuľka údajov o úpravách
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zdržaných platieb	14.3 (c)	5 % zo zmluvnej ceny vrátane DPH
Limit zdržaných platieb	14.3 (c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehota na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18.1	a) 14 dní od účinnosti Zmluvy b) 14 dní od účinnosti Zmluvy
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2 (d)	Neuplatňuje sa
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	50 000 EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť
Sankcie:		
Dôverné podrobnosti – sankcia za porušenie povinnosti	1.12	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.12 Osobitných zmluvných podmienok
Spoločná a nerozdielna zodpovednosť - sankcia za porušenie povinnosti	1.14	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.14 Osobitných zmluvných podmienok
Konflikt záujmov – sankcia za porušenie povinnosti	1.16	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.16 Osobitných zmluvných podmienok

Sociálne hľadisko – sankcia za porušenie povinnosti	1.17	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 1.17 Osobitných zmluvných podmienok
Pravidelné pracovné rokovania - sankcia za porušenie povinnosti	3.6	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 3.6 Osobitných zmluvných podmienok
Environmentálny plán výstavby - sankcia za porušenie povinnosti	4.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok
Evidencia strojov a zariadení – sankcia za porušenie povinnosti	4.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok
Regiter partnerov verejného sektora - sankcia za porušenie povinnosti	4.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.1 Osobitných zmluvných podmienok
Predloženie technologického postupu - sankcia za porušenie povinnosti	4.1 e)	250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Preloženie týždenného plánu prác - sankcia za porušenie povinnosti	4.1 f)	250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Predloženie povodňového plánu - sankcia za porušenie povinnosti	4.1 g)	250,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Monitorovanie stavby - sankcia za nesplnenie povinnosti	4.1 h)	500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Sankcia za nesprávdzkovanie kamier do 24 hodín od vzniku poruchy	4.1 i)	200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
Zábezpeka na vykonanie prác - sankcia za porušenie povinnosti (Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku)	4.2	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok
Zábezpeka na vykonanie prác - sankcia za porušenie povinnosti (Zhotoviteľ nepredlí platnosť Zábezpeky)	4.2	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok
Sankcia za porušenie podmienky podľa § 34 ods. 1. písmeno g) zákona o verejnom obstarávaní	4.3	20 000,- EUR za každé nesplnenie podmienky § 34 ods. 1. písmeno g) zákona o verejnom obstarávaní
Predstaviteľ Zhotoviteľa - sankcia za porušenie povinnosti	4.3	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.3 Osobitných zmluvných podmienok
Podzhotoviteľia, Menovaní Podzhotoviteľia a Dodávateľia Zhotoviteľa - sankcia za porušenie povinnosti	4.4	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.4 Osobitných zmluvných podmienok
Zabezpečenie kvality - sankcia za porušenie povinnosti	4.9	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.9 Osobitných zmluvných podmienok
Ochrana životného prostredia - sankcia za porušenie povinnosti	4.18	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 4.18 Osobitných zmluvných podmienok
Pracovno – právne vzťahy - sankcia za porušenie povinnosti	6.4	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.4 Osobitných zmluvných podmienok
Pracovná doba - sankcia za porušenie povinnosti	6.5	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.5 Osobitných zmluvných podmienok
Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7	500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
BOZP – sankcie za porušenie povinností	6.7	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.7 Osobitných zmluvných podmienok
Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa - sankcia za porušenie povinnosti	6.10	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 6.10 Osobitných zmluvných podmienok
Spôsob vykonávania prác - sankcia za porušenie povinnosti	7.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 7.1 Osobitných zmluvných podmienok
Skúšky - sankcia za porušenie povinnosti	7.4	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 7.4 Osobitných zmluvných podmienok
Začatie prác - sankcia za porušenie povinnosti	8.1	0,05% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty za každý aj začatý deň omeškania so začatím prác
Harmonogram prác - sankcia za porušenie povinnosti	8.3	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok
Sankcia za Opustenie Diela	8.14	Zmluvná pokuta vo výške Zábezpeky na vykonanie prác
Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád – sankcia za porušenie	11.1	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 11.1 Osobitných zmluvných podmienok

Odstraňovanie väd po vydaní protokolu o vyhodnotení Diela / v Záručnej dobe - sankcia za porušenie povinnosti	11.12	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 11.12 Osobitných zmluvných podmienok
Oceňovanie - nedodanie požadovaných dokladov - sankcia za porušenie povinnosti	12.3	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 12.3 Osobitných zmluvných podmienok
Platba zádržného - sankcia za porušenie povinnosti	14.9	Výška zmluvnej pokuty je uvedená v podčlánku 14.9 Osobitných zmluvných podmienok

V Bratislave dňa

Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Martin Máte, člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

PRÍLOHA K PONUKE
TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH
 (podčlánok 13.8)

Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov podľa podčlánku 13.8 slúži ako **VZOR** pre vyhľadanie zdrojov pre výpočet indexov

Koeficient; rozsah indexu	Ukazova teľ	Krajina pôvodu mena indexu	Zdroj indexu; názov/definícia	Hodnota v uvedenom termíne *	
				Hodnota	Dátum
0,10			Pevný koeficient, ktorý reprezentuje časť nákladov, ktoré nepodliehajú úprave.		
0,20	HICP	SR; EUR	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2021 = 100) Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Spotrebiteľské ceny úhnom	(122,06+123,82+125,21)/3=123,670	Apríl až Jún 2022
0,08	D	SR; EUR	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Priemerné ceny pohonných látok v SR Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien pohonných látok v SR (Nafta v %)	(1,713+1,785+1,868)/3=1,789	Apríl až Jún 2022
0,62	CMI	SR; EUR	Zdroj indexu: Štatistický úrad Slovenskej republiky Názov tabuľky: Indexy cien stavebných prác a materiálov (2021=100) Weblink: http://slovak.statistics.sk Sledovaný index: Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)	152,8	2.Q.2022

V Bratislave dňa

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
 Ing. Martin Máté, člen predstavenstva
 Metrostav DS a.s.

Pozn. * Tieto hodnoty a dátumy potvrdzujú definíciu každého indexu, ale nedefinujú indexy k referenčnému obdobiu "to", kvartál do ktorého spadá deň, v ktorý ulynula lehota na prekladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

I/65 Stará Kremnička - rekonštrukcia mostov (most ev.č. 65-059, most ev.č. 65-060)			Rekapitulácia stavby	
Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH	
Most ev. č. 65-059	667 478,36	153 520,02	820 998,38	
Most ev. č. 65-060	438 619,65	100 882,52	539 502,17	
Celkový súčet	1 106 098,01	254 402,54	1 360 500,55	

V Bratislave

Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Martin Máte, člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Číslo části stavby	Klasifikační stavieb	Název části stavby	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
SO 000-00		Všeobecné položky	49 040,98	11 279,43	60 320,41
SO 101-00		Úprava cesty I/65	204 531,08	47 042,15	251 573,23
SO 201-00		Rekonstrukcia mosta ev. č. 65-059	413 906,29	95 198,45	509 104,74
Celkový súčet			667 478,36	153 520,02	820 998,38

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
SO 000-00		Všeobecné položky	53 570,72	12 321,27	65 891,99
SO 101-00		Úprava cesty I/65	87 241,82	20 065,62	107 307,44
SO 201-00		Rekonštrukcia mosta ev. č. 65-060	297 807,11	68 495,63	366 302,74
Celkový súčet			438 619,65	100 882,52	539 502,17
