TECHNOLOGICKÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC
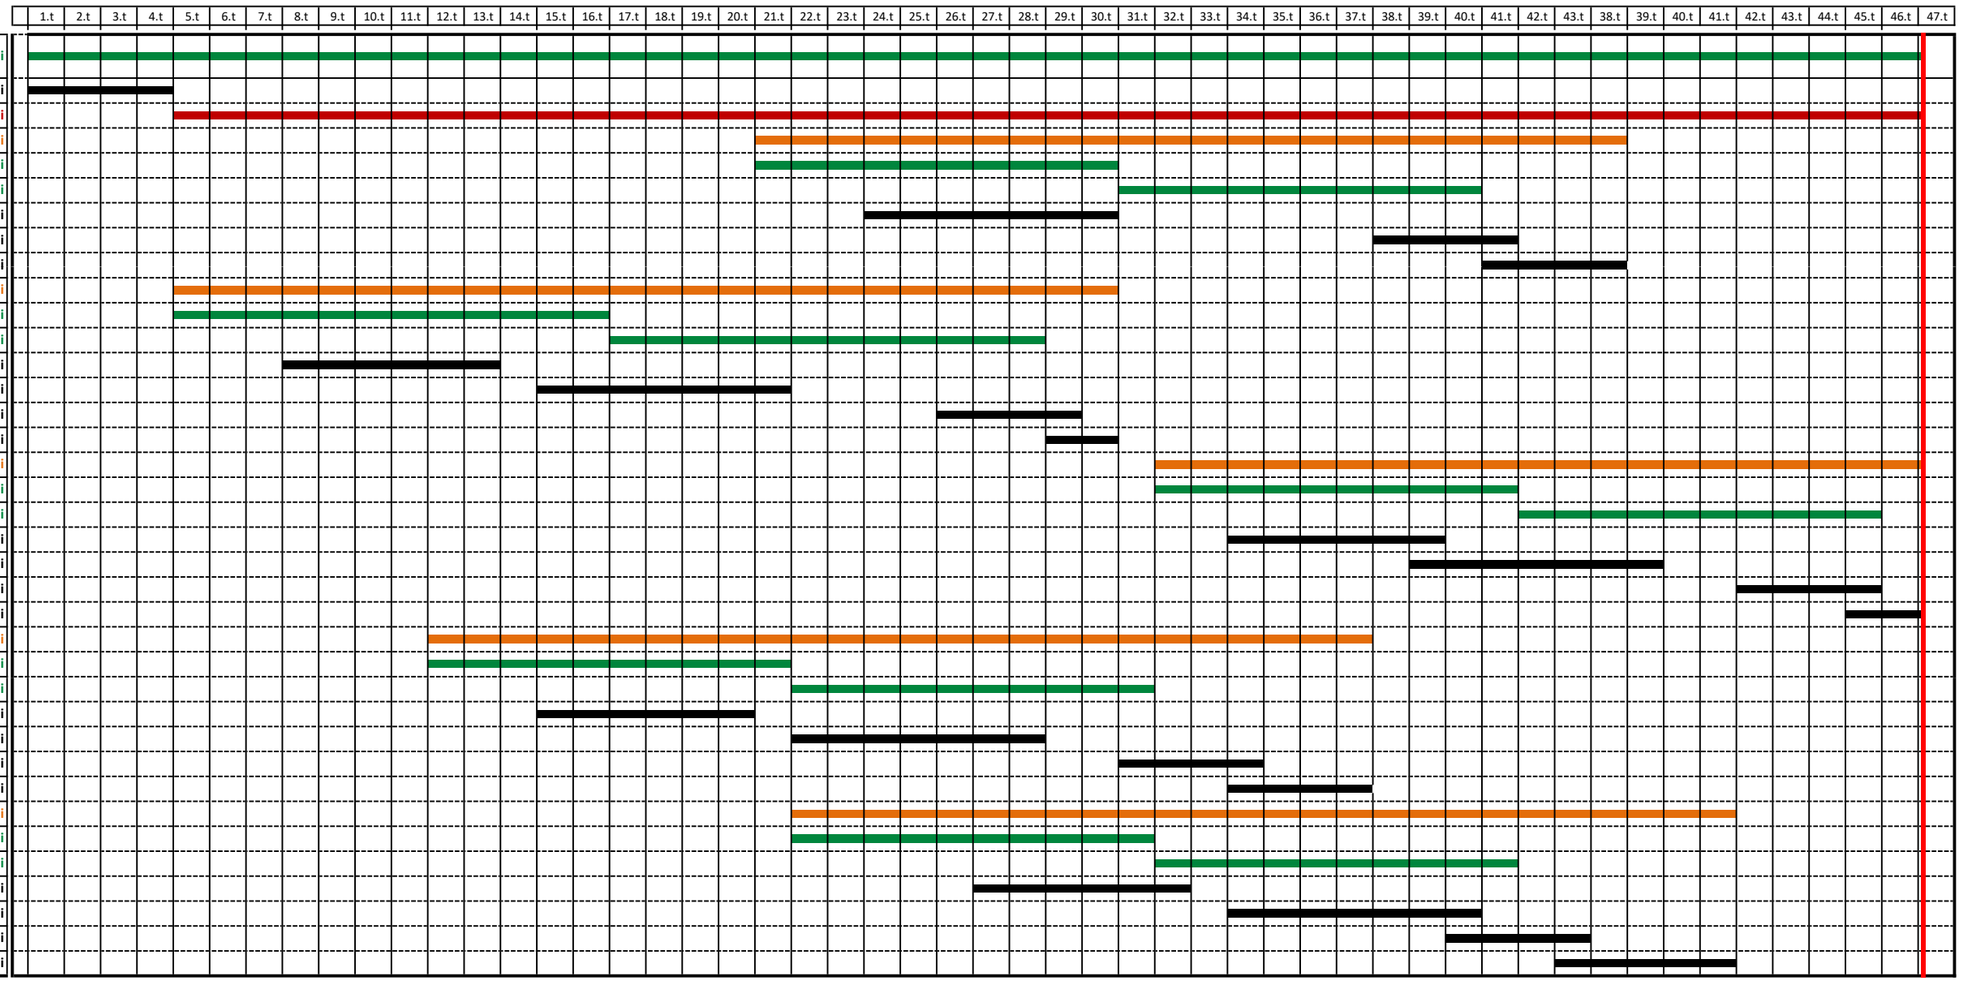
1	ID R001 II-547 Hranica okresu Košice-Košice - okolie - Spišské Vlachy II. etapa , časť 2 rekonštrukcia mostov	365 dni
5	vytýčenie, vybavenie povolení a osadenie DDZ	28 dni
6	201-00.. Rekonštrukcia mostov	337 dni
7	201-00-01.. Most 547-023	168 dni
8	I. etapa	70 dni
14	II. etapa	70 dni
20	úprava vodného toku	49 dni
21	sanácia nosnej konštrukcie	28 dni
22	dokončovacie práce	28 dni
23	201-00-02.. Most 547-028	182 dni
24	I. etapa	84 dni
30	II. etapa	84 dni
36	stabilizácia spodnej stavby	42 dni
37	úprava vodného toku	49 dni
38	sanácia nosnej konštrukcie	28 dni
39	dokončovacie práce	14 dni
40	201-00-03.. Most 547-036	148 dni
41	I. etapa	70 dni
47	II. etapa	70 dni
53	stabilizácia spodnej stavby	42 dni
54	úprava vodného toku	49 dni
55	sanácia nosnej konštrukcie	28 dni
56	dokončovacie práce	15 dni
57	201-00-04.. Most 547-037	182 dni
58	I. etapa	70 dni
64	II. etapa	70 dni
70	stabilizácia spodnej stavby	42 dni
71	úprava vodného toku	49 dni
72	sanácia nosnej konštrukcie	28 dni
73	dokončovacie práce	28 dni
74	201-00-05.. Most 547-038	182 dni
75	I. etapa	70 dni
81	II. etapa	70 dni
87	stabilizácia spodnej stavby	42 dni
88	úprava vodného toku	49 dni
89	sanácia nosnej konštrukcie	28 dni
90	dokončovacie práce	35 dni
