ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1				
2	**podpis zmluvy**	0 days	Mon 6.1.20	Mon 6.1.20
3	**právoplatné stavebné povolenie (investor)**	0 days	Mon 6.1.20	Mon 6.1.20
4	**mobilizácia**	5 days	Mon 6.1.20	Fri 10.1.20
5				
6	**SO 01 - Stavebné úpravy v kotolni a EO K1**	**30 days**	**Mon 13.1.20**	**Fri 21.2.20**
7	búracie práce	5 days	Mon 13.1.20	Fri 17.1.20
8	realizácia základov	10 days	Mon 20.1.20	Fri 31.1.20
9	realizácia jímky	25 days	Mon 20.1.20	Fri 21.2.20
10				
11	**SO 01 - Stavebné úpravy v kotolni a EO K2**	**30 days**	**Mon 13.1.20**	**Fri 21.2.20**
12	búracie práce	5 days	Mon 13.1.20	Fri 17.1.20
13	realizácia základov	10 days	Mon 20.1.20	Fri 31.1.20
14	realizácia jímky	25 days	Mon 20.1.20	Fri 21.2.20
15				
16	**SO 02 Stavebné úpravy pre skladovcie silo**	**67 days**	**Mon 13.1.20**	**Tue 14.4.20**
17	zemné práce	5 days	Mon 13.1.20	Fri 17.1.20
18	piloty	20 days	Mon 27.1.20	Fri 21.2.20
19	základové pásy, oporná stena	15 days	Mon 24.2.20	Fri 13.3.20
20	štrkový násyp	7 days	Mon 16.3.20	Tue 24.3.20
21	základová doska	15 days	Wed 25.3.20	Tue 14.4.20
22	podporné konštrukcie pre rozvody stl. Vzduchu	30 days	Mon 3.2.20	Fri 13.3.20
23				
24	**SO 04.1 - Komunikácie**	**166 days**	**Mon 13.1.20**	**Mon 31.8.20**
25	demontáž koľajníc	5 days	Mon 13.1.20	Fri 17.1.20
26	montáž koľajníc	10 days	Wed 5.8.20	Tue 18.8.20
27	zabetónovanie prejazdu	9 days	Wed 19.8.20	Mon 31.8.20
28				
29	**PS 01 Odber škváry z kotlov K1,K2**	35 days	Fri 24.7.20	Thu 10.9.20
30	**PS 02a Pneumatická doprava popola**	100 days	Mon 4.5.20	Fri 18.9.20
31	odstavenie alebo obmedzenie kotlov pre napojenie	0 days	Mon 4.5.20	Mon 4.5.20
32	**PS03 Skladovacie silo popola**	**80 days**	**Wed 15.4.20**	**Tue 4.8.20**
33	oceľová konštrukcia pod silom	40 days	Wed 15.4.20	Tue 9.6.20
34	oceľová konštrukcia sila	40 days	Wed 10.6.20	Tue 4.8.20
35	**PS 04 Rozvod stlačeného vzduchu**	30 days	Mon 13.4.20	Fri 22.5.20
36	**PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu**	37 days	Wed 22.7.20	Thu 10.9.20
37	**PS 06 Meranie a regulácia**	37 days	Wed 22.7.20	Thu 10.9.20
38				
39	**skúšky**	18 days	Mon 7.9.20	Wed 30.9.20
40	**ukončenie**	0 days	Wed 30.9.20	Wed 30.9.20

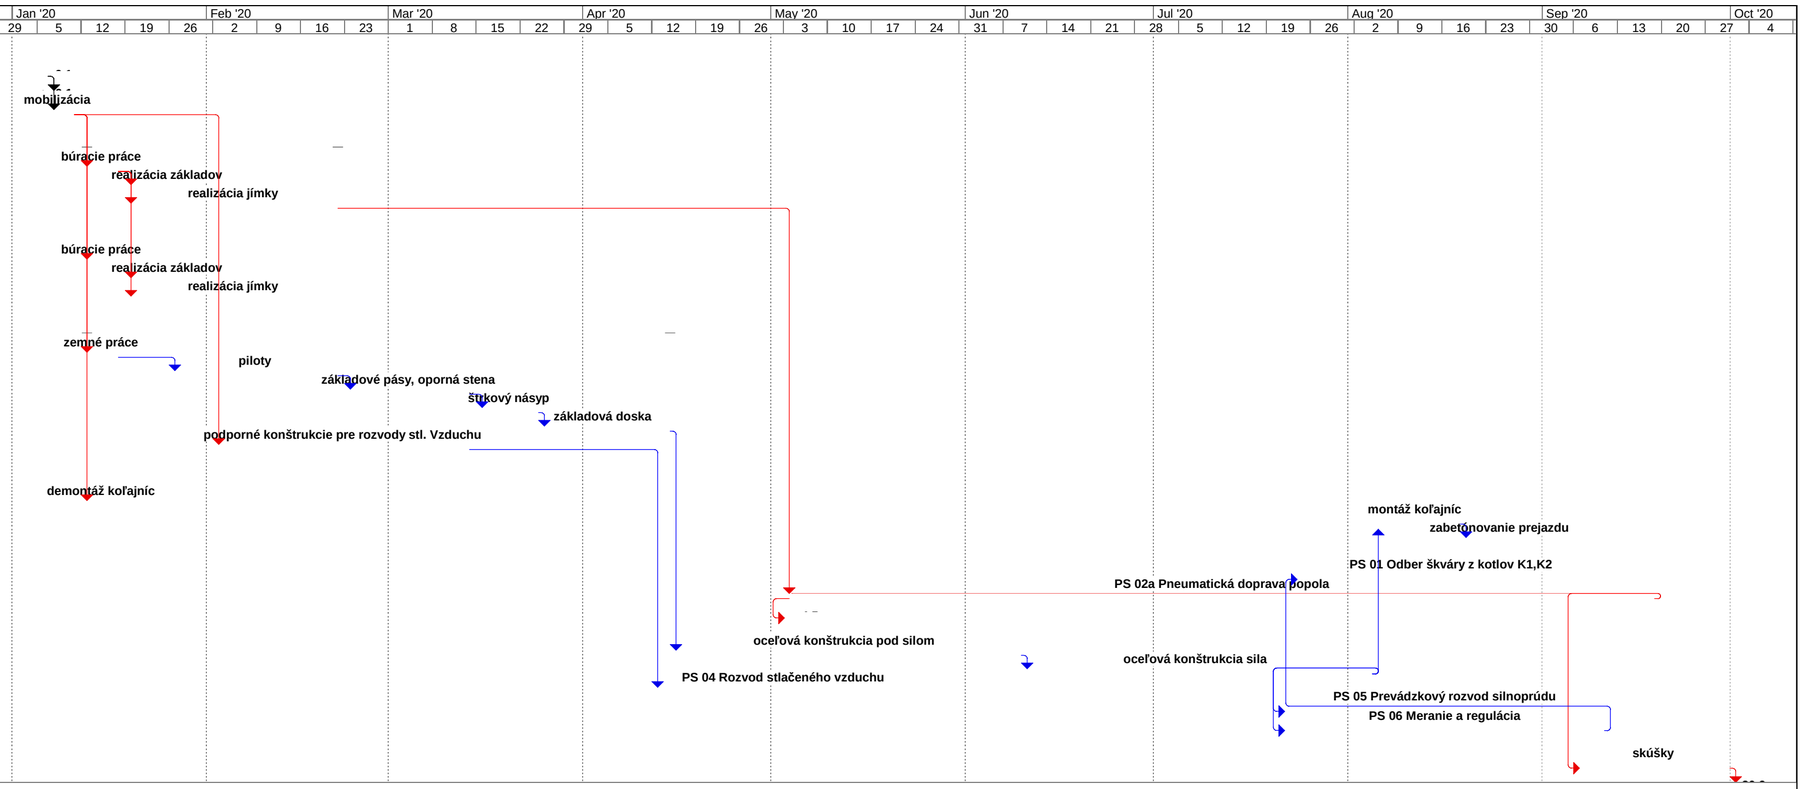

Project: MSProj11
Date: Mon 11.11.19

Task	Progress	Summary	Rolled Up Critical Task	Rolled Up Progress	External Tasks	Group By Summary
Critical Task	Milestone	Rolled Up Task	Rolled Up Milestone	Split	Project Summary	Deadline
