TECHNOLOGICKÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC
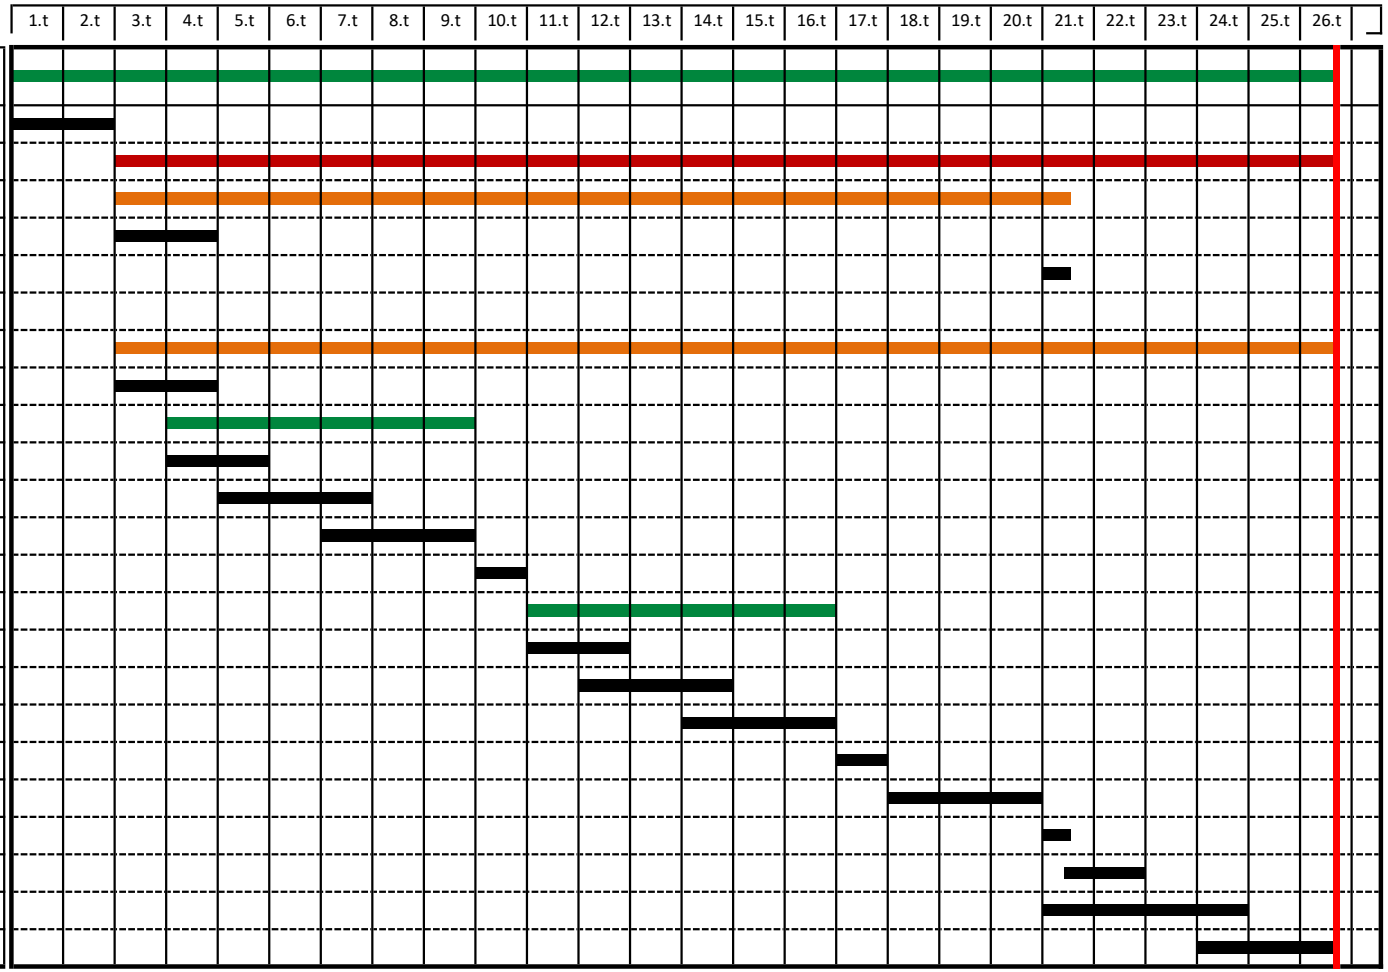
1	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3541, Ladomírová - Šemetkovce	180 dni
2	vytýčenie, vybavenie povolení a osadenie DDZ	14 dni
3	STAVEBNÉ PRÁCE	166 dni
4	SO 01 - Cesta III/3541	130 dni
5	prípravné práce	14 dni
6	pokládka asfaltových vrstiev	4 dni
7	dokončovacie práce	0 dni
8	SO 02 - Sanácia mostného objektu na ceste III/3541	166 dni
9	prípravné práce	14 dni
10	I. etapa	42 dni
11	búracie a demontážne práce	14 dni
12	úprava podložia	21 dni
13	nosná konštrukcia s čelom priepustu	21 dni
14	predpolia mosta	7 dni
15	II. etapa	42 dni
16	búracie a demontážne práce	14 dni
17	úprava podložia	21 dni
18	nosná konštrukcia s čelom priepustu	21 dni
19	predpolia mosta	7 dni
20	mostné rímsy	21 dni
21	pokládka asfaltových vrstiev	4 dni
22	bezp.zariadenia a príprava na presmerovanie	11 dni
23	úprava vodného toku	28 dni
24	dokončovacie práce	19 dni
