

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u objednávateľa:

Číslo zmluvy u zhotoviteľa:

Objednávateľ:

Sídlo: Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Zastúpený: MUDr. Boris Hanuščák, primátor mesta
IČO: 00321842
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK36 0200 0000 0039 0379 7958
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Vladimír Dušenka
vo veciach zmluvných: MUDr. Boris Hanuščák

Zhotoviteľ:

Sídlo: SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:22408/P
Zastúpená: Ing. Miroslav Dorin - konateľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných Ing. Miroslav Dorin - konateľ
vo veciach technických Miroslav Dorin - konateľ
IČO: 45342024
DIČ: 2022945452
IČ DPH: SK2022945452
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK38 0900 0000 0004 5285 0997

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba, 1. Časť - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA – SÍDLISKO DRUŽBA realizované k projektu Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ v rámci realizovaného verejného obstarávania, predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre nepeňažné výberové kritériá:
 - a. lehota plnenia predmetu zmluvy pre 1.časť (počítané v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi) 170 dníZhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoje záväzky v zmysle nižšie uvedených ustanovení v súlade s hodnotami pre nepeňažné výberové kritériá.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba, 1. Časť - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA – SÍDLISKO DRUŽBA a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č.1 a č.6 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 221 797,59 €, DPH predstavuje sumu 44 359,52 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 266 157,11 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za dielo ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.

4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami (fotodokumentácia, súpis vykonaných prác, kópia stavebného denníka), je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 10-tich kalendárnych dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.
10. Porovnávanie aktuálneho indexu bude vykonávané k indexu cien stavebných prác a materiálov za 4. štvrtrok 2022 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotoviteľ nemá právo na zvýšenie ceny takých prác, s vykonaním ktorých sa dostal do omeškania z dôvodov na jeho strane. Návrh na úpravu ceny diela indexáciou s odôvodnením oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomne v lehote do 7 dní od jej vyhotovenia. Úprava ceny diela indexáciou sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa objednávateľ po verifikácii indexácie zaväzuje podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie. Návrh na úpravu ceny diela indexáciou musí obsahovať súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po jednotlivých stavebných objektoch, pričom takto ocenený súpis bude preindexovaný indexom Štatistického úradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis vyhotovený podľa vyššie uvedeného princípu.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: Katastrálne územie Bardejov, sídlisko Družba, parcely: 6505, 6506, 6507, 6508, 6522/1, 6525/1, 6541.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 170 kalendárnych dní.
3. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.

4. Časový plán výstavby vypracovaný Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný do 10 dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľom a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy
5. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 4 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
7. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl.II. tejto zmluvy.
 - c) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

- d) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- e) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- f) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- g) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- h) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- i) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa. Po ukončení stavebných prác bude stavebný denník v originálnom vyhotovení archivovaný u objednávateľa.
- j) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.

- l) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- n) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- o) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- p) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- q) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- r) Zhotoviteľ je povinný vyzývať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min.2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- s) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- t) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- u) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podklad na uplatnenie pokuty.
- v) Stavebný dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského

- správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- w) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
 - x) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
 - y) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrolných dní na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
 - z) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
 - aa) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší budúci pracovný deň.
 - bb) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
 - cc) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľia/zhotoviteľia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: +421 902 158 088
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3. tohto článku alebo;
 - b) nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c) neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať

orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.3 - Časový plán výstavby.

8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Stavebný dozor, stavbyvedúci a stavebný denník

1. Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Milan Kapec, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného dozora č.: 09171,
2. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Miroslav Lissý, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 04694*10*
4. Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
6. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

VIII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom pláne výstavby alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- € za každý aj začatý deň omeškania pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávatel'a, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom pláne výstavby o viac ako 10 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní,

- d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku IV., bod 3., písm. e) tejto zmluvy,
- e) porušenie povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku III., bod 2. tejto zmluvy,
- f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernú akýkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

XI.

Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2: Poistná zmluva
Príloha č. 3: Časový plán výstavby
Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
Príloha č. 5: Informácie o subdodávateľoch
Príloha č. 6: Projektová dokumentácia na CD/DVD
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením diela.
3. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly:
 - ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi; alebo
 - ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO a
 - b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.V prípade neukončenia finančnej kontroly (neschválenia procesu verejného obstarávania) poskytovateľom NFP, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

9. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, týmto Objednávateľ ako prevádzkovateľ GDPR uvádza, že účelom spracúvania osobných údajov dotknutých fyzických osôb – zástupcovia Zhotoviteľa je uzatvorenie a plnenie tejto zmluvy, pričom na dosiahnutie tohto účelu je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné, t. j. bez ich spracúvania by nemohlo dôjsť k platnému uzatvoreniu Zmluvy. S cieľom naplnenia tohto účelu, Objednávateľ spracováva iba osobné údaje, ktoré na dosiahnutie predmetného účelu potrebuje. Osobné údaje sa uchovávajú podľa platného registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku, t. j. 10 rokov. Osobné údaje sa poskytujú rôznym príjemcom alebo kategóriám príjemcov iba v prípade plnenia povinností v zákonom ustanovených prípadoch (napr. Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, orgánom činným v trestnom konaní, ako aj iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis). Zároveň Objednávateľ poukazuje na to, že prenos osobných údajov do tretej krajiny sa nebude realizovať a taktiež sa z jeho strany neuskutočňuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú; má právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má taktiež právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie o GDPR môže dotknutá osoba získať na webovej stránke www.bardejov.sk, na e-mailovej adrese zodpovedna.osoba@bardejov.sk alebo osobne na Mestskom úrade Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov.
10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch ako originál, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy a Objednávateľ 3 rovnopisy.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
12. Zmluva bola pred podpísaním prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

Ing. Miroslav Dorin
Konateľ SK JULIO s.r.o.

V Bardejove dňa 13.3. 2023

za Objednávateľa

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

v Bardejove dňa 14.3.2023

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba VODOZADRŽNÉ OPATRENIA - SÍDLISKO DRUŽBA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - PARKOVISKO	221 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	221 797,59
Celkom bez DPH	221 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	221 797,59
DPH 20% z	221 797,59					44 359,52
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						266 157,11

Krycí list rozpočtu

Stavba VODOZADRŽNÉ OPATRENIA - SÍDLISKO DRUŽBA

Objekt SO 01 - PARKOVISKO

Miesto: Bardejov

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ing. Miroslav Dorin

Dňa

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO: 45342024

DIČ: 2022945452

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	221 797,59	11 729,44	221 797,59	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			221 797,59	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	221 797,59
				DPH 20% z	221 797,59
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	266 157,11

Odberateľ

Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Strana 1 z 7

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval: Ing. Miroslav Dorin

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:

Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 10.01.2023

Stavba VODOZADRŽNÉ OPATRENIA - SÍDLISKO DRUŽBA
Objekt SO 01 - PARKOVIŠKO

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel			Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)		
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE			20 361,85	63,36	20 361,85	0,0100	568,4600		
ZÁKLADY			13 293,98	7 160,00	13 293,98	0,9500	0,0000		
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			60,00	0,00	60,00	0,2200	0,0000		
SPEVNEÉ PLOCHY			147 057,98	1 336,08	147 057,98	964,1300	0,0000		
POTRUBNÉ ROZVODY			810,50	0,00	810,50	2,3200	0,0000		
OSTATNÉ PRÁCE			37 760,86	3 170,00	37 760,86	98,6400	0,0000		
PRESUNY HMÔT			2 452,42	0,00	2 452,42	0,0000	0,0000		
Práce HSV			221 797,59	11 729,44	221 797,59	1 066,2700	568,4600		
Celkom v EUR			221 797,59	11 729,44	221 797,59	1 066,2700	568,4600		

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval: Ing. Miroslav Dorin

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o., Prešov

Ks:
Datum:
10.01.2023

Dodávateľ: SK JULIO s.r.o.

Zákazka VODOZADRŽNÉ OPATRENIA - SÍDLISKO DRUŽBA

Objekt SO 01 - PARKOVISKO

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101121	Odstránenie ornice do 100 m3 s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	35,200	2,30	80,96		0	
		"odhumusovanie výkaz PD							
		176*0.2		35,200					
2	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	447,000	1,90	849,30		0	
		"výkaz od projektanta							
		447		447,000					
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	134,100	1,35	181,04		0	
		"výkaz od projektanta							
		447*0.3		134,100					
4	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,400	60,00	24,00		0	
		"značky							
		2*0.5*0.5*0.8		0,400					
5	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,120	7,20	0,86		0	
		"značky							
		2*0.5*0.5*0.8*0.3		0,120					
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	134,000	2,25	301,50		0	
		"výkaz od projektanta - násyp							
		134		134,000					
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	304,000	5,20	1 580,80		0	
		"z výkopu- násyp							
		447-143		304,000					
8	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	651,400	0,80	521,12		0	
		"z výkopov							
		447		447,000					
		"na spätné zahumusovanie							
		352*0.1		35,200					
		"odhumusovanie							
		35.2		35,200					
		"násyp							
		134		134,000					
9	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	134,000	4,35	582,90		0	
		"projektant výkaz							
		134		134,000					
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	482,200	0,75	361,65		0	
		"z výkopov							
		35.2+447		482,200					
11	171209011	Poplatok za skládku zeminy	t	486,400	3,90	1 896,96		0	
		"z výkopu- násyp							
		(447-143)*1.6		486,400					
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 842,000	2,95	5 433,90		0	
		"zahumusovanie - výkaz projektant							
		352		352,000					
		"plocha komunikácie a parkoviska - výkaz projektant							
		1490		1 490,000					

Rozpočet VODOZADRŽNÉ OPATRENIA - SÍDLISKO DRUŽBA / SO 01 - PARKOVISKO

13	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	352,000	1,20	422,40		0	
		"výkaz od projektanta - zahumusovanie							
		352		352,000					
14	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,15400t	m2	2,500	2,20	5,50		0	0,650
		"výkaz od projektanta - preskladanie							
		2.5		2,500					
15	113107141	Odstránenie krytú ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	65,000	3,60	234,00		0	6,370
		"výkaz od projektanta - chodník							
		65		65,000					
16	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	65,000	4,20	273,00		0	14,625
		"výkaz od projektanta - chodník							
		65		65,000					
17	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 540,000	3,85	5 929,00		0	486,640
		"výkaz od projektanta - asfalt. vozovka							
		1540		1 540,000					
18	113206101	Vytrhanie obrúb betónových zo stojatých obrubníkov	m	415,000	2,80	1 162,00		0	60,175
		"výkaz projektant - cestný obrubník							
		415		415,000					
19	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	352,000	1,30	457,60		0	
		"výkaz od projektanta - zahumusovanie							
		352		352,000					
20	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,040	9,00	63,36	0,001	0,007	
		"výkaz od projektanta - zahumusovanie							
		352/50		7,040					
1	ZEMNÉ PRÁCE					20 361,85		0,01	568,46
2	ZÁKLADY								
21	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 6 do 8,5 m	m2	3 280,000	0,94	3 083,20	0,000	0,098	
		"konštrukcia č.1+ č.2 - výkaz projektant (separ.)							
		1490		1 490,000					
		"konštrukcia č.1+ č.2 - výkaz projektant (PET vlákna)							
		1790		1 790,000					
22	693110002900	Geotextília polypropylénová hmotnosť 24 g/m2	m2	1 564,500	1,95	3 050,78	0,000	0,313	
		"konštrukcia č.1+ č.2 - výkaz projektant (separ.)							
		1490*1.05		1 564,500					
23	693167010102	Tkaná geotextília z vysokopevnostného PETvlákna s plošnou hmotnosťou min. 200g/m2 CBR vpichový odpor min. 2.8 kN	M2	1 790,000	4,00	7 160,00	0,000	0,537	
		"konštrukcia č.1+ č.2 - výkaz projektant (PET vlákna)							
		1790		1 790,000					
2	ZÁKLADY					13 293,98		0,95	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
24	338171122	Osadzovanie oceľových stĺpikov do 2,6 m so zabetonovaním	kus	2,000	30,00	60,00	0,111	0,222	
		"značky - výkaz projektant							
		2		2,000					
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					60,00		0,22	0
5	SPEVNEJ PLOCHY								
25	564571111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hrúbky 250 mm	m2	1 475,840	3,96	5 844,33		0	
		"Podkladná vrstva " ŠD fr. 0-32 60% + ornica 40% - konštrukcia č.2							
		919.61		919,610					
		"Podkladná vrstva " ŠD fr. 0-32 60% + ornica 40% - konštrukcia č.1							
		556.23		556,230					
26	564762115	Podklad z kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm hrúbky 240 mm	m2	65,000	13,00	845,00	0,578	37,569	
		"chodník - výkaz projektant							
		65		65,000					
27	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	67,500	4,45	300,38	0,080	5,402	
		"chodník - výkaz projektant							
		65		65,000					
		"preskladanie dlažby							
		2.5		2,500					

Rozpočet VODOZADRŽNÉ OPATRENIA - SÍDLISKO DRUŽBA / SO 01 - PARKOVISKO

28	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	2,500	22,50	56,25	0,112	0,28	
		"preskladanie dlažby							
		2.5		2,500					
29	596911215_1	Kladenie betónovej dlažby pre peších hrúbky 8 cm nad 10 m2 do lôžka z kameniva ťažného, vrátane vyšpárovania antracitovým čadičovým štrkom fr. 2-5 mm (pozdižná špára š=10mm, priečná špára = 10 mm)	m2	64,150	15,50	994,33	0,010	0,642	
		"chodník - výkaz projektant							
		64.15		64,150					
30	599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	28,000	7,50	210,00	0,002	0,063	
		"zarezanie pre napojenie cesta - výkaz projektant							
		28		28,000					
31	103110000100	Rašelina zahradná kompostová	t	9,832	90,00	884,85	0,800	7,865	
		"Výplň komôr " preosiata ornica 50% + praný piesok 20% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1							
		(818.395)*0.06*0.1*0.8		3,928					
		"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2							
		(556.23+919.61)*0.05*0.8*0.1		5,903					
32	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	236,134	13,30	3 140,59	1,000	236,134	
		č.1+č.2							
		(556.23+919.61)*0.25*1.6*0.40		236,134					
33	103640000101	Zemina pre terénne úpravy - preosiata ornica	t	74,703	22,00	1 643,47	1,000	74,703	
		"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2							
		(556.23+919.61)*0.05*1.6*0.3		35,420					
		"Výplň komôr " preosiata ornica 50% + praný piesok 20% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1							
		(818.395)*0.06*1.6*0.5		39,283					
34	564581110	Ložná vrstva zo sypaniny, po zhutnení hr.50 mm	m2	1 475,840	2,20	3 246,85		0	
		"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.2							
		919.61		919,610					
		"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1							
		556.23		556,230					
35	581510000610	Zeolit - ZeoWater 2,5-5mm	t	39,327	90,00	3 539,40	1,000	39,327	
		"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2							
		(556.23+919.61)*0.05*1.6*0.2		23,613					
		"Výplň komôr " preosiata ornica 50% + praný piesok 20% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1							
		(818.395)*0.06*0.2*1.6		15,713					
36	583410001100	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-5 mm	t	53,130	25,00	1 328,26	1,000	53,13	
		"Ložná vrstva " ŠD fr. 2-5 mm 40% + ornica 30% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1+č.2							
		(556.23+919.61)*0.05*1.8*0.4		53,130					
37	583410004300	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	398,477	17,00	6 774,11	1,000	398,477	
		č.1+č.2							
		(556.23+919.61)*0.25*1.8*0.6		398,477					
38	59651000r	AS-TTE rošty montáž a dodávka	m2	1 475,840	55,00	81 171,20	0,027	39,848	
		"konštrukcia č.2 - cesta plocha z pc							
		919.61		919,610					
		"konštrukcia č.1 - parkoviská plocha z pc							
		(103.49+80.5+92.03+46+34.49+153.72+46)		556,230					
39	59661001r	AS-TTE - vyplň zeleň do roštov - zatravnenie na mieste (cena vrátane stratného)	m2	818,395	10,00	8 183,95		0	
		"konštrukcia č.1 - parkoviská plocha z pc							
		(103.49+80.5+46+92.03+34.49+153.72+46)		556,230					
		"Medzisúččet		556,230					
		"odpočet konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - A							
		-(22.5*0.2+4.4*0.2*8)		- 11,540					
		"odpočet konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - B							
		-(17.5*0.2+4.4*0.2*6)		- 8,780					
		"odpočet konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - C							
		-(10*0.2+4.4*0.2*3)		- 4,640					
		"odpočet konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - D							

Rozpočet VODOZADRŽNÉ OPATRENIA - SÍDLISKO DRUŽBA / SO 01 - PARKOVISKO

		-(20*0.2+4.4*0.2*7)		- 10,160					
		"odpočet konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - E							
		-(7.5*0.2+4.4*0.2)		- 2,380					
		"odpočet konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - F							
		-(33.5*0.2+4.4*0.2*12)		- 17,260					
		"odpočet konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - G							
		-(10*0.2+4.4*0.2*3)		- 4,640					
		"Medzisúččet		- 59,400					
		"konštrukcia č.2 - cesta plocha z pc-dlažba /50%							
		(919.61-276.48)/2		321,565					
40	59661002r	AS-TTE - vyplíť bet. kocky do roštov sivé - polozenie a dodávka (cena vrátane stratiného)	m2	657,445	28,80	18 934,42	0,061	40,104	
		" konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - A							
		(22.5*0.2+4.4*0.2*8)		11,540					
		" konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - B							
		(17.5*0.2+4.4*0.2*6)		8,780					
		" konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - C							
		(10*0.2+4.4*0.2*3)		4,640					
		" konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - D							
		(20*0.2+4.4*0.2*7)		10,160					
		" konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - E							
		(7.5*0.2+4.4*0.2)		2,380					
		" konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - F							
		(33.5*0.2+4.4*0.2*12)		17,260					
		" konštrukcia č.1 - plocha vymedzenia parkovacích miest - G							
		(10*0.2+4.4*0.2*3)		4,640					
		"konštrukcia č.2 - cesta plocha z pc							
		276.48		276,480					
		"konštrukcia č.2 - cesta plocha z pc-dlažba /50%							
		(919.61-276.48)/2		321,565					
41	p96	Miešanie podkladových vrstiev + ložnej vrstvy + výplňová vrstva podľa zloženia vid. PD	t	829,280	10,40	8 624,51		0	
		" rašelina (kompost)							
		9.832		9,832					
		" ornica							
		236.134		236,134					
		" preosiata ornica							
		74.703		74,703					
		" zeolit							
		39.327		39,327					
		"SD fr. 2-5 mm							
		53.13		53,130					
		"SD fr. 0-32							
		398.477		398,477					
		"praný piesok							
		17.677		17,677					
42	5839501600	Praný piesok	t	17,677	17,70	312,89	1,000	17,677	
		"Výplň komôr " preosiata ornica 50% + praný piesok 20% + zeolit 20% + kompost 10% konštrukcia č.1							
		818.395*0.06*1.8*0.2		17,677					
43	592036013610	Dlažba typ ako SIKO, hrúbka 8 cm, 20 x 20 cm, farba sivá	M2	70,565	14,50	1 023,19	0,183	12,913	
		"chodník - výkaz projektant							
		64.15*1.1		70,565					
5		SPEVNENÉ PLOCHY				147 057,98		964,13	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
44	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm	kus	6,000	120,00	720,00	0,330	1,98	
		"výkaz od projektanta - vpust							
		6		6,000					
45	899332111_1	Výšková úprava šachty	kus	1,000	90,50	90,50	0,336	0,336	
		"výkaz od projektanta - šachta							
		1		1,000					
8		POTRUBNÉ ROZVODY				810,50		2,32	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
46	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	568,460	11,00	6 253,06		0	
47	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 116,140	1,75	8 953,25		0	
		568.46*9		5 116,140					

Rozpočet VODOZADRŽNÉ OPATRENIA - SÍDLISKO DRUŽBA / SO 01 - PARKOVISKO

48	979089601	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - asfalt	t	493,010	17,70	8 726,28		0	
		"asf.plochy							
		0.098*65		6,370					
		0.316*1540		486,640					
49	979089611	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb	t	75,450	13,00	980,85		0	
		"zbytok							
		568.46-493.01		75,450					
50	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	568,460	4,40	2 501,22		0	
51	916561111	Osadenie betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého	m	417,000	9,90	4 128,30	0,098	40,849	
		"cestný - výkaz projektant							
		351		351,000					
		"cestný bez skosenia - výkaz projektant							
		66		66,000					
52	917831622	Osadenie betónovej palisády, výška 60 cm do betónu	kus	34,000	8,20	278,80	0,049	1,655	
		"výkaz projektant - palisády (5,5m)							
		34		34,000					
53	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	8,670	190,00	1 647,30	2,201	19,083	
		"cestný - výkaz projektant							
		351*0.1*0.2		7,020					
		"cestný bez skosenia - výkaz projektant							
		66*0.1*0.2		1,320					
		"výkaz projektant - palisády (5,5m)							
		5.5*0.3*0.2		0,330					
54	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	28,000	14,60	408,80	0,000	0,002	
		"zarezenie pre napojenie cesta - výkaz projektant							
		28		28,000					
55	404410126600	Dopravná značka 272 (Parkovanie),	ks	2,000	125,00	250,00		0	
		"272							
		2		2,000					
56	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	425,00	425,00		0	
57	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	4,000	9,50	38,00		0	
		"272							
		2		2,000					
		"506							
		2		2,000					
58	4044722081_1	Dopravná značka 506 (Dodatková tabuľka platí pre vodičáka)i)	ks	2,000	105,00	210,00	0,002	0,003	
		"506							
		2		2,000					
59	592036040401	Obrubník cestný so skosením 12/4 cm, 100 x 15 x 26 cm, farba sivá	KUS	354,510	6,10	2 162,51	0,085	30,133	
		"cestný - výkaz projektant							
		351*1.01		354,510					
60	592036040501	Obrubník cestný bez skosenia 100 x 15 x 26 cm, farba sivá	KUS	66,660	6,20	413,29	0,090	5,999	
		"cestný bez skosenia - výkaz projektant							
		66*1.01		66,660					
61	592036058401	PREMAC City palisáda, výška 60 cm, 12 x 16,5 cm, farba sivá, alebo jeho ekvivalent	KUS	34,000	11,30	384,20	0,027	0,918	
		"výkaz projektant - palisády (5,5m) - 6,06ks/m							
		34		34,000					
9		OSTATNÉ PRÁCE				37 760,86		98,64	0
99		PRESUNY HMÔT							
62	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 066,271	2,30	2 452,42		0	
		(115.3+119.9)*0.84		197,568					
99		PRESUNY HMÔT				2 452,42		0,000	0
		Práce HSV				221 797,59		1 066,270	568,46
		Celkom v EUR				221 797,59		1 066,270	568,46



9870119509



Číslo
návrhu

Súhrnný návrh poisťnej zmluvy

Poisťná zmluva je uzavretá podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami

☒ Nová poisťná zmluva

☐ Zmena poisťnej zmluvy

číslo

☐ Náhrada poisťnej zmluvy

Nahrádzaná poisťná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poisťnej zmluve.

Dôvod

zmeny/náhrady:

Poisťovateľ

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,

Dostojevského rad 4,

815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

Poisťník

Obchodné meno: **SK JULIO s.r.o.**

ICO: **45342024**

Zapísaná

☒ v Obchodnom registri SR

☐ v Živnostenskom registri SR

☐ iné

DIČ:

Vedenom kým

OS Prešov

Číslo

22408/P

Sídlo

Ulica a popisné č. **205**

PSČ:

08604

Sídlo

Gerlachov

Zastúpený oprávnenou osobou č. 1

Meno: **Miroslav**

Titul

Ing.

Prezvisko:

Dorin

Funkcia

konateľ

Zastúpený oprávnenou osobou č. 2

Meno:

Titul

Prezvisko

Funkcia

Korešpond. adresa

Ulica a popisné č.

Telefonický kontakt

+421902158088

PSČ

Obec/ mesto

Email

skjulio@centrum.sk

Poisťený (vyplňte, ak sa líši od poisťníka)

Obchodné meno

ICO/ IČ

Zapísaná

☐ v Obchodnom registri SR

☐ v Živnostenskom registri SR

☐ iné

DIČ

Vedenom kým

Číslo

č bank. účtu

Sídlo

Ulica a popisné č.

PSČ

Sídlo

Vyhlasenie poisťníka

- Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poisťnej zmluvy a prílohách.
- Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poisťnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
- Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé.
- Svojim podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto poisťnej zmluvy. Uvedené informácie sú v úplnom znení uvedené na webovom sídle poisťovateľa. Pre prípad, že som uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzujem, že táto osoba mi udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a som si vedomý toho, že som povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponujem uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.
- Poisťnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: ☒ ANO, ak ☐ NIE, v tom prípade je súčasťou poisťnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti
- Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poisťnej zmluve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poisťného).
- Pokiaľ je táto poisťná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poisťnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z.z. Cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z.

Sankčná doložka

Poisťovateľ na základe tejto poisťnej zmluvy neposkytne poisťnú ochranu (poisťné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poisťnej ochrany (poisťného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poisťné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by (i) takáto poisťná ochrana (poisťné krytie) a/alebo (ii) takáto podnikateľské alebo iné aktivity alebo (iii) takáto poisťné plnenie alebo iné plnenie alebo iná výhoda poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.



A 2 C C 2 2 5 9 0 2 D

Verzia AMC: 2022.06.07.1833.D11 (22.06.2022 13:34)

TL č. 2259 / AMC / II. 2019



9870119509

strana 2/2

Rekapitulácia
a poistného

Počet

príloh

Druh poistenia

Poistné pred zľavou

Poistné po zľave

1	Poistenie majetku.....	18,30	EUR	10,98	EUR
0	Poistenie strojov - technické riziká.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie prerušenia prevádzky.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie nákladu.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie vozidiel autosalónov.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie hospodárskych zvierat.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie plodín.....	0,00	EUR	0,00	EUR
1	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.....	4 041,15	EUR	2 424,69	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - IT.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie bytových domov.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Stavebné poistenie.....	0,00	EUR	0,00	EUR

Výpočet
poistného

Obchodná zľava:

15

% + Bonus*:

25

% =

40

Celkové poistné s daňou**:

2 435,67

EUR

Minimálne poistné s daňou**:

100,00

EUR

Bežné
poistné☐ ročná splátka ☐ polročné splátky ☒ štvrťročné splátky

Poistné (splátka) + Daň z poistenia (splátka)**: 563,81 EUR + 45,11 EUR

Jednorazové
poistné☐ splátka naraz

Poistné (splátka) s daňou k úhrade**:

608,92

EUR

* V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom období tejto poistnej zmluvy má poisťovateľ právo odobrať bonus na nasledujúce poistné obdobie.
** Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poistné obdobie: ☒ bežný rok ☐ kalendárny rok

Výročný deň (deň a mesiac):

23

06

Ak nie je vyplnený, výročným dňom je prvý deň dojednaného poistného obdobia

Vznik
/zmena
a zánik
poistenia

Vznik poistenia / Zmena poistenia od 23.06.2022 00:00 hodín

☒ Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok.) ☐ Poistenie je na dobu určitú do:Údaje pre
platbu
poistného

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu následného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačíve Poistka. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných/štvrťročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásteho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splatné v dohodnutých termínoch splatnosti.

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Bardejov

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

22.06.2022



A 2 C C 2 2 5 9 0 3 E

poisťník
oprávnená osoba č. 1
Miroslav Dorinpoisťník
oprávnená osoba č. 2

Allianz-um
Mgr. Martin M. Gajdošová
Hurbanova 17, 065 01 Bardejov
Mobil: +421 905 136 185

POISTKA č. 511127780

Číslo návrhu: 9870119509



Komplexné poistenie podnikateľov

Poistovateľ: **Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.**
IČO: 00 151 700
Dostojského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205
086 04 Gerlachov

Poistník: **SK JULIO s.r.o.**
IČO: 45342024
Gerlachov 205, 08604 Gerlachov

Poistený: **SK JULIO s.r.o.**
IČO: 45342024
Gerlachov 205, 08604 Gerlachov

Dátum dojednávania: 22.06.2022	Začiatok poistenia: 23.06.2022	Výročný deň: 23.06.	Poistná zmluva je dojednaná ako: dlhodobá na dobu neurčitú
--	--	-------------------------------	--

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
Poistenie hnutelných vecí	2 000,00 EUR	10,98 EUR
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	2 000 000,00 EUR	2 424,69 EUR


Lehota splatnosti: štvrtročne	Spolu poistné: 2 435,67 EUR	Lehotné poistné + Daň z poistenia: 563,81 EUR + 45,11 EUR	Lehotné poistné s daňou na úhradu: 608,92 EUR
---	---------------------------------------	---	---

Poznámka: Daň z poistenia vo výške 8 % je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy **511127780**. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Bankové spojenie: **TATRA BANKA, a. s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, VS: 511127780**

Kontakt: obchodný zástupca Mgr. Martina Gajdošová, tel. +421905136185, Slovenská 1539/13, 085 01 Bardejov



Ing. Jozef Paška
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Juraj Dlhopolček, MSc.
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 24.06.2022

Časový plán výstavby - harmonogram .


Stavba VODOZADRŽNÉ OPATRENIA - SÍDLISKO DRUŽBA


Názov objektu	počet dní		1	2	3	4	5	6	7	8
SO 01 - PARKOVIŠKO	170	doba výstavby v kal.dňoch								
Stavebné diely :										
ZEMNÉ PRÁCE	50									
Odstránenie ornice do 100 m ³ s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť do 100 m	9									
Odkopávky a prekopávky nezapažené	10									
Výkop šachty zapaženej	1									
Vodorovné premiestnenie výkopku	6									
Úprava pláne v zárezoch	6									
Odstránenie krytu asfaltového	12									
Odstránenie krytu v ploche z betónu prostého	4									
Vytrhanie obrúb betónových zo stojatých obrubníkov	3									
Založenie parkového trávniku výsevom	2									
ZÁKLADY	12									
Zhotovenie vrstvy z geotextílie	12									
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1									
Osadzovanie oceľových stĺpikov	1									
SPEVNENÉ PLOCHY	80									
Zhotovenie podsypu alebo podkladu	24									
Podklad z kameniva hrubého drveného	4									
Kladenie betónovej dlažby	15									
Ložná vrstva zo sypaniny	18									
AS-TTE rošty montáž a dodávka + podklad	26									
POTRUBNÉ ROZVODY	5									
Výšková úprava uličného vstupu a šachty	5									
OSTATNÉ PRÁCE	32									
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	7									
Nakladanie na dopravný prostriedok	7									
Osadenie betónového obrubníka	20									
Osadenie betónovej palisády	6									
PRESUNY HMÔT	90									

Poznámka:

Pracovná doba : 7:00 - 18:00

práce nebudú realizované - počas sviatkov a dní pracovného pokoja

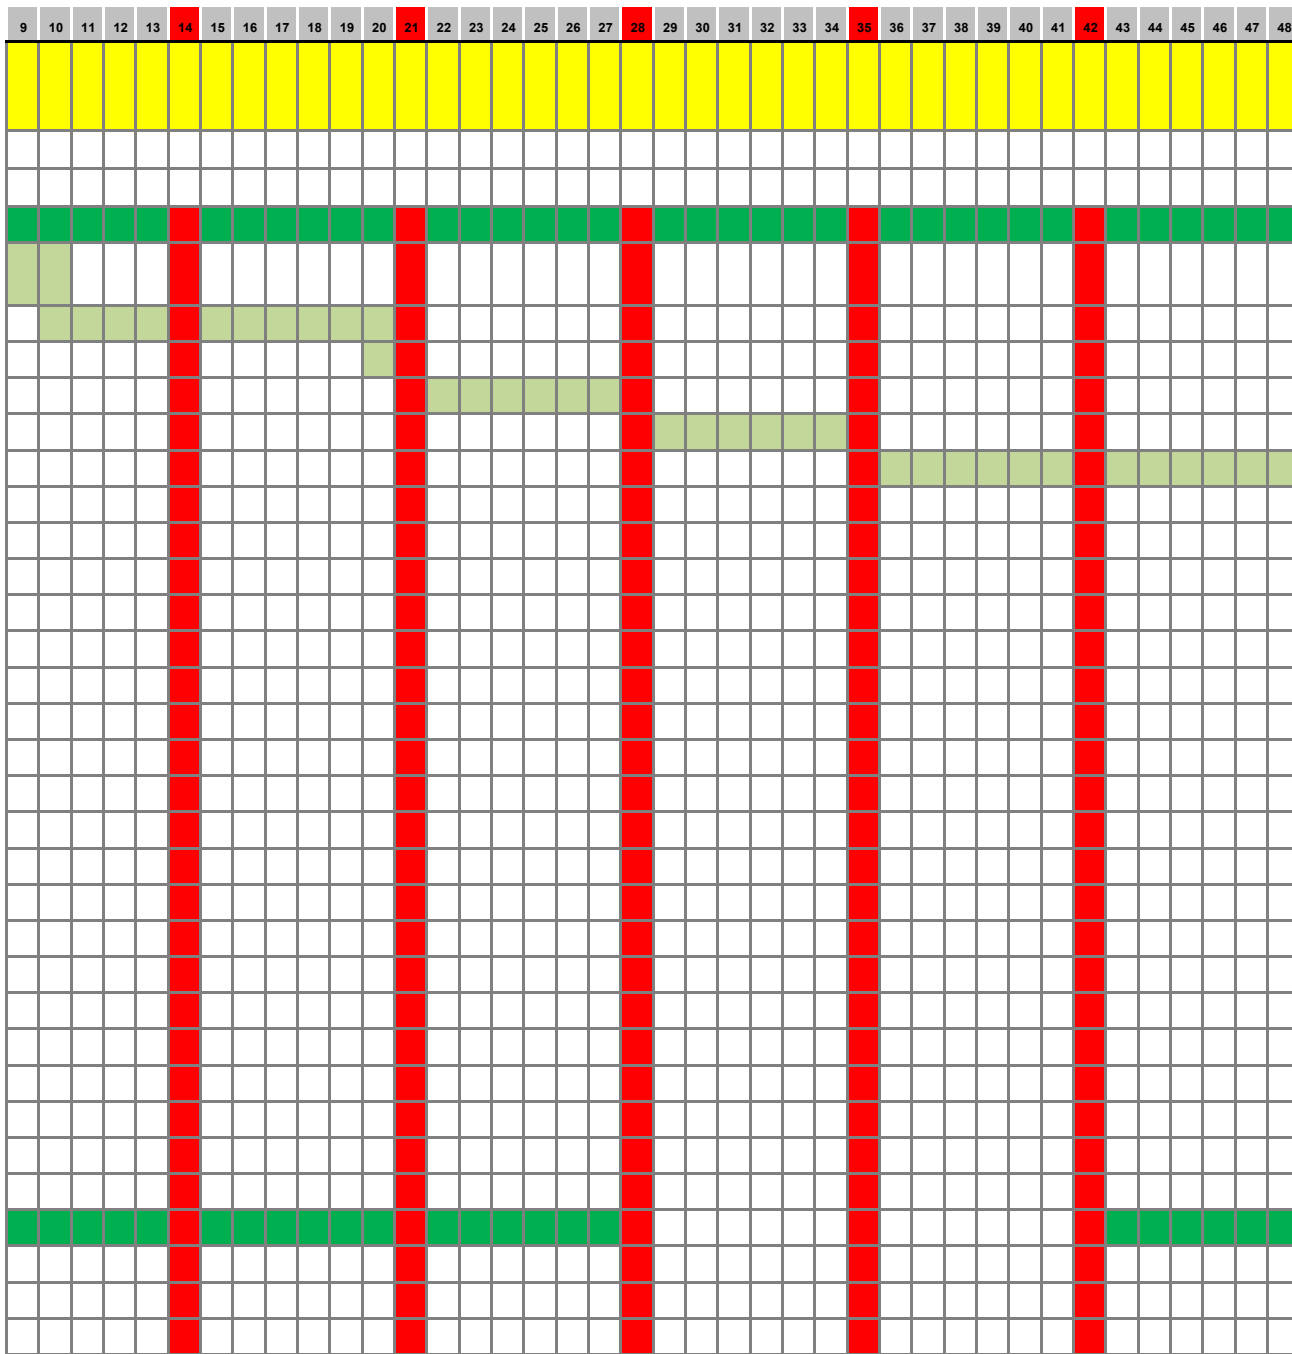

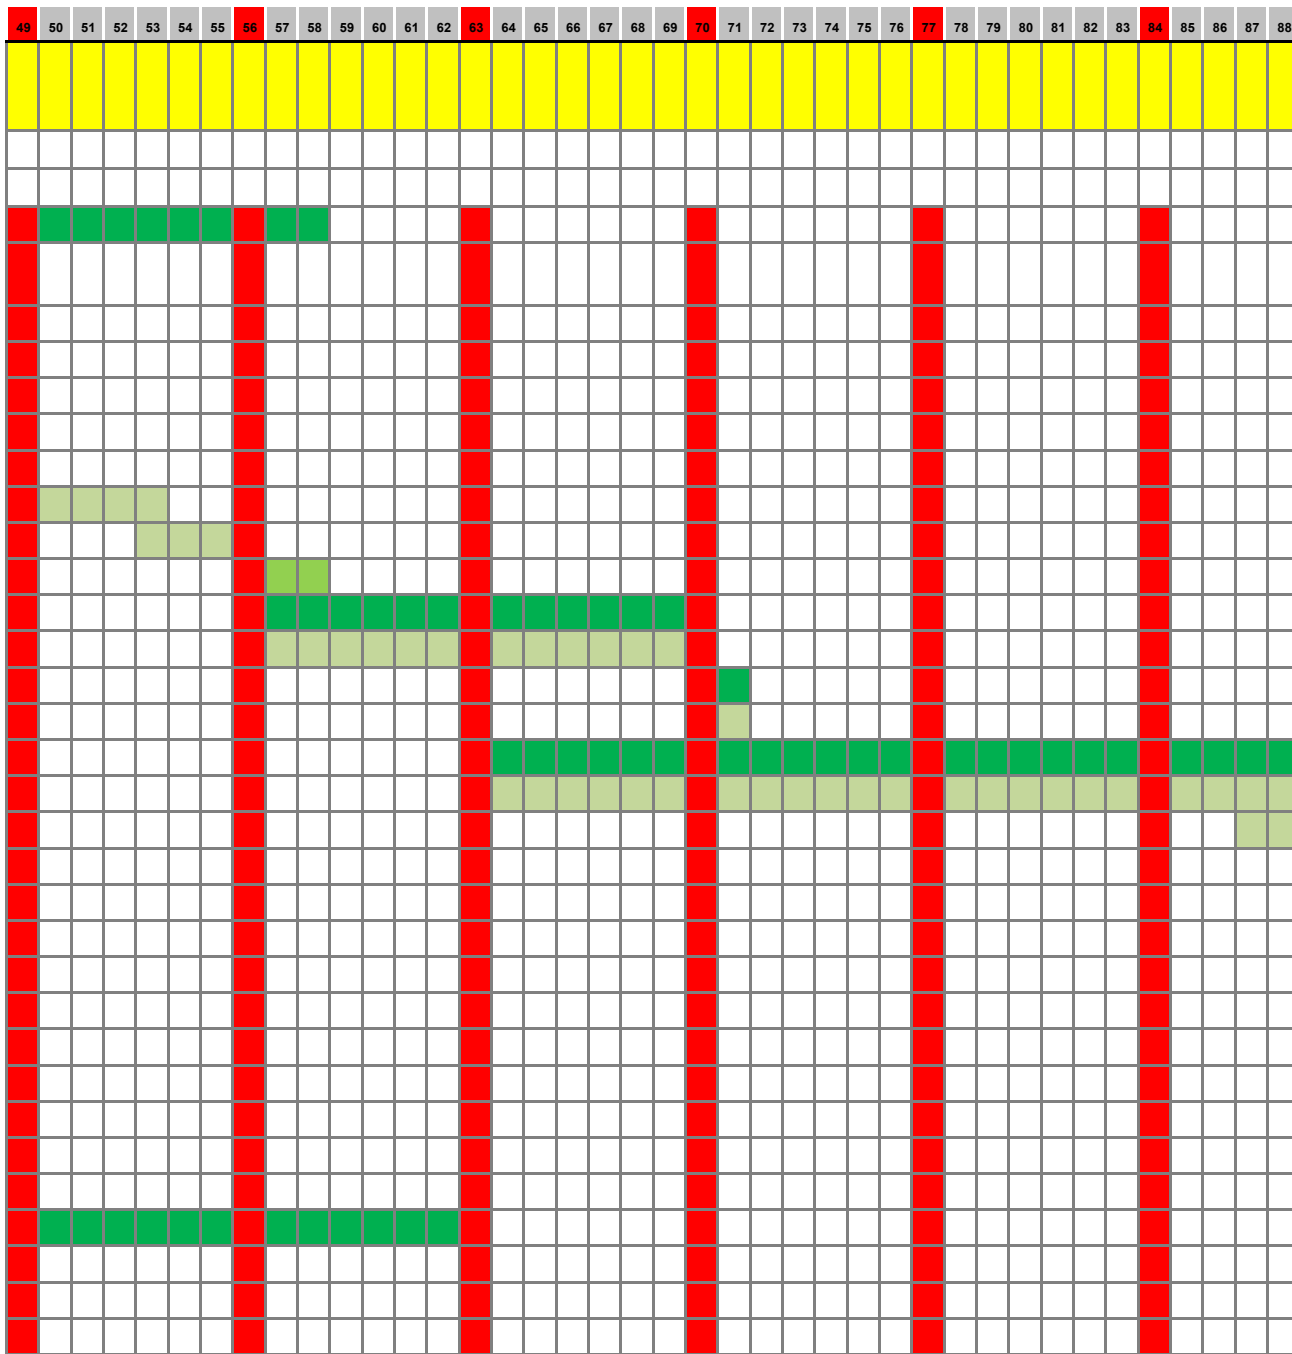

[illegible]

[illegible]

 Verbatim

CD-R

COMPACT
disc
RECORDABLE

700 MB

52x speed
vitesse
velocidad

80 min

Príloha č. 4 Elektronické verzie roz
počty. Adaptácie na zmenu klím
v meste Bardejov - sídlisko
Vinbary a Družba

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba
1. časť - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA – SÍDLISKO DRUŽBA

Názov uchádzača: SK JULIO s.r.o.

Zoznam subdodávateľov: BEZ SUBDODÁVATEĽOV

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

V, dňa.....

otlačok pečiatky uchádzača

.....
Ing. Miroslav Dorin
Konateľ SK JULIO s.r.o.*

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok

 Verbatim™

CD-R

compact
disc
recordable

700 MB

52x
speed
vitesse
velocidad

80 min

Príloha č. 6 Projektová dokumentácia
Adaptácia na zmeny klímy v
meste Bardejov - sídlisko
Vinbarg a Družba
