



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

Názov zákazky: „Asfaltovanie miestnych komunikácií v meste Kolárovo”

ZMLUVA O DIELO NA STAVEBNÉ PRÁCE

Č. Objednávateľa: 3185/2023

Č. Zhotoviteľa: 23040396

(ďalej len „zmluva“) uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Kolárovo
Sídlo: Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
Zástupca: Ing. Béla Halász, primátor mesta
IČO: 00306517
Bankové spojenie: SLSP Kolárovo
Číslo účtu, IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy: Ing. Imrich Mészáros
Kontakt: +421 905 935 829, meszaros@mestokolarovo.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Metrostav DS a.s.
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava- Ružinov
Zástupca: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sa, Vložka č. 7059/B
Kontaktná osoba, tel., email: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok č. I PREAMBULA

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Asfaltovanie miestnych komunikácií v meste Kolárovo“



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

Článok č. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie novej asfaltovej krytiny v súlade Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií. na Brnenskom námestí od križovatky s ulicou Remeselnícka až po križovatku s ulicou Kostolné námestie - Viktora Palkovicha. Stavebné práce budú pozostávať m.i. z hotovenia zápichov, aplikácie asfaltového postreku a vyhotovenie asfaltového betónu obrusnej zhutnením 60 mm, výšková úprava uličného vstupu pre zrážkové vody.
V mieste napojení na existujúcu asfaltovú miestnu komunikáciu ako i na komunikáciu II/573 bude komunikácia pripojená preplátovaním asfaltových vrstiev na šírku 0,50 m. Víťazný uchádzač zabezpečí zhotovenie diela v rozsahu podľa rozpočtu stavby. Práce budú realizované na celý predmet obstarávania.
- 2.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženým rozpočtom stavby a podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo Objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotoviteľa, ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).
- 2.3 Súčasťou diela sú aj doklady o vykonaných skúškach, atesty a certifikáty, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal Objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.
- 2.5 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť predmet diela na taký počet stavebných objektov, na aký bude mať zabezpečené finančné prostriedky.
- 2.6 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
- 2.7 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

Článok č. III. Miesto, čas a spôsob plnenia

- 3.1 Miesto realizácie stavebných prác: na Brnenskom námestí od križovatky s ulicou Remeselnícka až po križovatku s ulicou Kostolné námestie - Viktora Palkovicha (podľa prílohy č. 6 - situácia, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy)
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce v lehote podľa vecného a časového



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

harmonogramu odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

- 3.3 Nedodržanie termínov v súlade s vecným a časovým harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť Objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 3.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela Objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané
- 3.6 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.7 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať Objednávateľa. V prípade, ak Objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, Zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
- 3.8 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené vo vecnom a časovom harmonograme sa predlžujú o dobu oprávneného prerušenia prác na diele Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, formou písomného dodatku v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok č.IV.

Cena za dielo

- 4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

celková zmluvná cena bez DPH:	39 789,92 eur
sadzba 20 % DPH:	7 957,98 eur
celková zmluvná cena vrátane DPH:	47 747,90 eur

- 4.2 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné.. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.
- 4.3 Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
- 4.4 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

- 4.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych režii Zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a režii, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

Článok č. V.

Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak zástupca Objednávateľa - resp. stavebný dozor - nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia Zhotoviteľom; ak Objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí Zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by Objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou Objednávateľa a Zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek Objednávateľa.
- 5.2 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom Objednávateľ prevezme dielo od Zhotoviteľa bez väd a nedorobkov.
- 5.3 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
- 5.4 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených Objednávateľom, na Zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 5.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 5.6 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
- 5.7 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne Zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry Objednávateľovi.

Článok č. VI.

Zmluvné záruky

- 6.1. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej Objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny Objednávateľa.
- 6.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti Objednávateľa.

- 6.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
- 6.4 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.5 Počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy Objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, Zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi Objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

Článok č. VII.

Postup a organizácia práce

- 7.1 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 7.2 O dobu omeškania Objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzдание diela tak, že za každý deň omeškania Objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.
- 7.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, plánom organizácie výstavby, koordinácie prác s tretími osobami.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť potrebnú pre realizáciu diela.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od Objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

- 7.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.11 Všetky zmeny je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.12 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne oznámiť Objednávateľovi každé prerušenie prác a výskyt každej prekážky, ktorá ohrozuje dodržiavanie vecného a časového harmonogramu.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať schválený plán organizácie dopravy a podmienky uzávierok. Zabezpečenie obmedzenia dopravy, návrh a schválenie uzávierok, návrh a schválenie dočasného dopravného značenia si zabezpečí Zhotoviteľ sám v spolupráci s Objednávateľom pred začatím prác a budú súčasťou vecného a časového harmonogramu.



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

Náklady na dočasné dopravné značenie znáša Zhotoviteľ. Pri všetkých činnostiach Zhotoviteľa na stavbe musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti práce. Zhotoviteľ znáša taktiež všetky náklady súvisiace s projektom dočasného dopravného značenia, ako aj umiestnením príslušných dopravných značiek a je povinný zabezpečiť obstaranie príslušných povolení s tým súvisiacich.

- 7.18 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom Zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady nasledovné činnosti a dokumenty:
- Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou predmetu zákazky počas plnenia,
 - Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej aj ako „STD“), ktorá bude obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok a doklady preukazujúce poskytnutie záruk na akékoľvek a všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčasť alebo príslušenstvo Diela (ďalej aj ako „Záručné listy“). STD bude vypracovaná a dodaná v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.
 - Zabezpečenie vytyčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s príslušnými správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami, ak je to nevyhnutné pre realizáciu diela.
 - Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa. Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD.
 - Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.
 - Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných mesačných prác Zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia.
 - Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu Zmluvy dotknuté.

Článok č. VIII.

Kontrola uskutočnenia diela

- 8.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela Zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby Objednávateľa.
- 8.2 Zodpovedná osoba Objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

- 8.3 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa.
- 8.4 Tretia osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, má povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, ktoré sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní

Článok č. IX.

Poistenie a ochrana zdravia

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre Objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude Zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá Objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
- 9.4 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

Článok č. X.

Sankcie

- 10.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
- a) zaplatiť Objednávateľovi v prípade, že bude Zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je Zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká Objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,
- 10.2 V prípade, že nebude dodržaná lehota splatnosti faktúry zhotoviteľa, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi za každý deň meškania úroky z omeškania vo výške 0,01 % z celkovej fakturovanej sumy.
- 10.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

výšku zmluvnej pokuty.

Článok č. XI.

Vlastníctvo diela

- 11.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je Objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody na diele.
- 11.2 Všetky podklady, ktoré boli Objednávateľom Zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom Objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a Zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť Objednávateľovi.
- 11.3 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na Objednávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená Zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo Zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

Článok č. XII.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 12.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
- 12.2 V prípade, ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu Zhotoviteľa zaslanú Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a Zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 12.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.
- 12.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.
- 12.5 Najneskôr 3 pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.
- 12.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

Článok č XIII.

Odstúpenie od zmluvy

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,
- c) Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
- e) Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
- f) Zhotoviteľ je v likvidácii, voči Zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
- g) ak Zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nespĺní podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
- h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú,
- i) ak dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní pre účasť na verejnom obstarávaní
- j) ak dodávateľ neplní tie časti predmetu zákazky, treťou osobou, ktorá sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom obstarávaní, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť

13.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

13.3 Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej Objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela Zhotoviteľom,
- b) odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
- c) vypratať, opustiť a odovzdať Objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
- d) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

Článok č XIV.

Doručovanie

14.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

- a) v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
- b) druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu, ak bol odoslaný poštou alebo
- c) v deň e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod.,

Článok č XV.

Subdodávateľa

- 15.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (dodávateľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 15.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov dodávateľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
- 15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 15.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal Objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť Objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný Zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
- 15.5 Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri, nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
- 15.6 Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.

Článok č XVI.

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 16.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa



MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 16.4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a je potrebné ich označovať ako dodatky. Vyhotovené budú taktiež v slovenskom jazyku
- 16.5 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočiteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočiteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 16.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a
- Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram
- Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov na predmet zákazky
- Príloha č. 5 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu
- Príloha č. 6 Situácia riešeného územia

V Kolárove, dňa
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa.....
Zhotoviteľ:

.....
Mesto Kolárovo
Ing. Béla Halász
primátor mesta

.....
Metrostav DS a.s.
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Metrostav DS a.s.
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva



MESTO KOLÁROVO
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo

Názov zákazky : „Asfaltovanie miestnych komunikácií v meste Kolárovo“

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Základné údaje:

Názov, obchodné meno uchádzača: **Metrostav DS a.s.**

Sídlo uchádzača: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

IČO uchádzača: 46 120 602

Druh premetu	Cena bez DPH v €	Cena s DPH v €
<i>Celková cena za predmet zákazky konečný súčet z Výkazu výmer</i>	39 789,92	47 747,90

Platca DPH: **áno**

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnemu obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.

V Bratislave dňa 15.6.2023





Metrostav DS a.s.

Harmonogram stavby: Asfaltovanie miestnych komunikácií v meste Kolárovo

Práce	Kalendárny deň													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zhotovenie zápichov	■	■				■	■				■	■		
Aplikácia asfaltového postreku			■					■					■	
Asfaltovanie AC 11 O 50/70, II			■	■	■			■	■	■			■	■

Lehota výstavby v dňoch od prevzatia staveniska: 14 kalendárnych dní





MESTO KOLÁROVO

Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

Podmienky využitia subdodávateľov

Obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO: 46 120 602

Vyhlasujem, že ako Zhotoviteľ vo verejnej súťaži pri zadávaní zákazky na predmet zákazky „**Asfaltovanie miestnych komunikácií v meste Kolárovo**“, ktorú vo Vestníku verejného obstarávania dňa 29.05.2023 pod označením Výzva č. 469879 zverejnil Objednávateľ ako verejný obstarávateľ (ďalej aj ako „Objednávateľ“).

Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom je podľa § 41 ZVO upravené v zmluve a zoznam subdodávateľov v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, predmet a rozsah ich subdodávok, je prílohou č. 4 k zmluve vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Prehľad subdodávateľov Názov a sídlo, IČO:	Predmet subdodávok:	Podiel subdodávok v % a v EUR	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
SPOLU -----			-----

Údaje podľa predchádzajúcej vety musia byť uvedené v prílohe k zmluve najneskôr v čase jej uzavretia.

Dátum: 15.6.2023

Pojistná smlouva

Číslo: **CZCASA26385 – 123**

Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu
způsobenou vadou výrobku

CHUBB

Pojistitel:

Chubb European Group SE,

se sídlem La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France, provozující činnost v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby **Chubb European Group SE, organizační složka**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ 27893723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233

zastoupen Erikem Macalíkem, vedoucím odštěpného závodu

dále jen „pojistitel“ na straně jedné

Pojistník:

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Adresa pro doručování: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

Zastoupený: Ing. František Kočí, předseda představenstva a Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva

dále jen „pojistník“ na straně druhé

tímto uzavírají pojistnou smlouvu. Pojistitel se zavazuje v případě vzniku pojistné události vymezené touto pojistnou smlouvou poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Pojistník akceptuje návrh této pojistné smlouvy v plném rozsahu, tzn. přijetí tohoto návrhu s odchylkou nebo dodatkem (včetně odchylky nebo dodatku nepodstatného) je podle pojistných podmínek vyloučeno a za akceptaci této pojistné smlouvy se tedy nepovažuje. Za akceptaci této pojistné smlouvy se dále nepovažuje ústní oznámení o přijetí jejího návrhu anebo chování ve shodě s nabídkou bez její písemné akceptace s následující výjimkou. Za přijetí návrhu této pojistné smlouvy pojistníkem se však považuje včasné zaplacení pojistného podle § 2759 odst. 1 občanského zákoníku.

Na právní vztahy mezi pojistitelem a pojistníkem se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

Pojištění je sjednáno prostřednictvím a na základě informací poskytnutých pojišťovacím zprostředkovatelem **Pojišťovací makléřství INPOL a.s.**, se sídlem Praha 9, Zbuzkova 141/47, Vysočany, PSČ 190 00, IČ 63998599, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440

Pojištěný (firma/název, sídlo, IČ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 00014915 2. Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 45309612 3. Metrostav Polska S.A., ul. Jagiellonska 88, 43-382 Warszawa, IČ 1132888282 4. Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00, Praha 8, IČ 24204005 5. Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava-Ružinov, PSČ 821 08, Slovensko, IČ 46120602 6. Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 25021915 7. Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 09884572 8. Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, Bratislava 26, 824 77, Slovenská republika, IČ 47144190 9. Subterra – Raab Kft., Maďarsko, ID 08-09-025909 10. Metrostav Norge AS, Drammensveien 211,0281,Oslo Municipality 0301 Oslo, Norsko, IČ 924549092 11. MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 17331099 <p>Pojištění se vztahuje i na organizační složky uvedených společností.</p>
Podnikatelská činnost pojištěného	dle Výpisu z Obchodního rejstříku, který je uveden v příloze
Celkový obrat pojištěných společností	36.720.800.000 Kč během pojistné doby (předpoklad)
Územní rozsah pojištění	Svět vyjma USA/Kanada , Rusko, Bělorusko a Ukrajina
Volba "Claims Made"	Nesjednává se
Datum a čas vzniku pojištění	15.06.2023 0:00
Pojistná doba	15.06.2023 – 14.06.2024
Límit pojistného plnění	900.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 1.800.000.000 Kč pro všechny pojistné události za pojistnou dobu, avšak pro Subterra a.s., Subterra – Raab Kft.: 800.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 1.600.000.000 Kč pro všechny pojistné události za pojistnou dobu
Sub-limit: Křížová odpovědnost	Do výše limitu
Sub-limit: Škoda na pronajatém nebo propachtovaném majetku	Do výše limitu
Sub-limit: Škoda na osobním majetku zaměstnanců, členů orgánů a návštěvníků pojištěného	Do výše limitu
Sub-limit: Osobní odpovědnost při zahraniční cestě	Nesjednává se
Sub-limit: Povinnost k náhradě újmy prodejců	Nesjednává se
Sub-limit: Regresní nároky zdravotních pojišťoven ve vztahu k zaměstnancům	Do výše limitu
Sub-limit: Stažení výrobku z trhu	Nesjednává se
Sub-limit: Škody v důsledku znečištění životního prostředí	Nesjednává se
Sub-limit: Čistá finanční škoda	40.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 80.000.000 Kč pro všechny pojistné události za pojistnou dobu
Sub-limit: Montáž a demontáž	Nesjednává se
Sub-limit: Převzaté věci	20.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 40.000.000 Kč pro všechny pojistné události za pojistnou dobu

	Avšak 100.000.000 Kč na událost a agregovaně pro zakázku <i>Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce</i>
Spoluúčast pro všechny pojistné události s níže uvedenými výjimkami	100.000.000 Kč, avšak 200.000.000 Kč pro pojištěného Subterra a.s., Subterra – Raab Kft.
Spoluúčast ve vztahu k pojistným událostem podle následujících rozšiřujících ustanovení:	30.000.000 Kč Čistá finanční škoda 20.000.000 Kč Převzaté věci
Spoluúčast se vztahuje ke každé pojistné události, nese ji pojištěný a pojistitel není povinen hradit jakoukoliv částku v rámci takové spoluúčasti. Pro vyloučení pochybností se limit pojistného plnění aplikuje na újmu vzniklou nad rámec příslušné spoluúčasti.	
Sazba pojistného	Neaplikuje se
Pojistné	9.100.000 Kč, pojistná daň splatná pojistitelem za pojistníka v Maďarsku: 17.400 Kč pojistná daň splatná pojistitelem za pojistníka na Slovensku: 49.200 Kč Celkové pojistné včetně daní: 9.166.600 Kč Pojistné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách, a to následovně: 1. splátka ve výši 2.341.600 Kč (2.275.000 Kč + 66.600 Kč daně) je splatná do 15.07.2023 2. splátka ve výši 2.275.000 Kč je splatná do 15.09.2023 3. splátka ve výši 2.275.000 Kč je splatná do 15.12.2023 4. splátka ve výši 2.275.000 Kč je splatná do 15.03.2024
Druh pojistného	Jednorázové pojistné
Bankovní účet pro platby pojistného	Pojistné je splatné na účet pojišťovacího zprostředkovatele Pojišťovací makléřství INPOL a.s., č. účtu 3038-012/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného na výše uvedený účet. Variabilní symbol: 26385 Konstatní symbol: 3558
Variabilní symbol plateb	26385

Součástí této pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti verze 1/2020. Tyto podmínky mají přednost před zákonnými ustanoveními, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi touto pojistnou smlouvou a uvedenými pojistnými podmínkami mají přednost ustanovení této pojistné smlouvy.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

I.
V souvislosti se zakázkou „**REKONSTRUKCE SOUMOSTÍ LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8**“ se pojistitel vzdává práva regresi vůči objednateli.

Zhotovitel zakázky:
Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 09884572

II.
Navyšuje se sublimit plnění pro **Převzaté věci na Kč 100.000.000 na událost a agregovaně**, a to pouze v souvislosti se zakázkou *Stavba č.45029 Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce*; zhotovitel-číslo smlouvy *DIL/21/04/007193/2021*.

III.

Ujednává se, že pojišťovna neuplatní své právo dle ust. § 2820 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to vůči objednateli zakázky / díla *Stavba č. 45029 Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce*; zhotovitel – číslo smlouvy *DIL/21/04/007193/2021*, kterým je HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, Česká republika, IČO 00064581, realizované pojištěným Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00014915 a Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 25021915 (pojištěný č. 6).

Zhotovitel zakázky:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00014915

Metrostav DIZ a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 09884572

IV.

Pojištění se dále vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem vozidla sloužícího jako **pracovní stroj** včetně újmou způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Za věci třetích osob se považují i vozidla a pracovní stroje.

V.

Ujednává se, že vyluka 4.26 Pojistných podmínek neplatí.

VI.

Definice pojistné události

Odchylně od článku 1 pojistných podmínek se pojistnou událostí pro účely tohoto pojištění rozumí vznik právní povinnosti **pojištěného** nahradit třetí osobě **újmu**, kterou jí způsobil v souvislosti se svou **podnikatelskou činností**, pokud ke vzniku takové **újmou** došlo během **pojistné doby** a na **pojištěném území**, ledaže je v příslušném ustanovení pojistné smlouvy či pojistných podmínek uvedeno jinak, a za podmínky, že k porušení povinnosti **pojištěného** či jiné skutečnosti, která ke vzniku této **újmou** vedla, nedošlo dříve než 10 let před počátkem **pojistné doby** a zároveň před uplynutím **pojistné doby**.

Definice výrobku

Odchylně od článku 3.26 pojistných podmínek se ujednává, že **výrobkem** se rozumí jakýkoliv hmotný předmět, který je prodán, dodán, upraven, vytvořen, opraven, je předmětem služby, je navržen, testován, instalován nebo zpracován **pojištěným** či jeho jménem, včetně obalu, balení nebo označení, který není v držení **pojištěného** v okamžiku pojistné události. Stavební dílo se však považuje za **výrodek** výhradně tehdy, je-li zhotoveno, vytvořeno či opraveno **pojištěným** či jeho jménem, řádně ohlášeno či je u něj získáno stavební povolení, je řádně dokončeno v souladu s příslušnými právními předpisy, stavebním povolením a technickými normami a byl pro něj vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, je-li vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Rozšiřující ustanovení pro věci převzaté

Odchylně od článku 4.5 pojistných podmínek poskytne **pojistitel** pojistné plnění v rozsahu **věcné škody** na majetku, který **pojištěný** oprávněně užívá, spravuje, skladuje, přepravuje nebo ho má v řádné, poctivé a pravé držbě z jiného důvodu za účelem plnění svých smluvních závazků týkajících se tohoto majetku.

Toto pojištění se však nevztahuje na jakékoli újmu vzniklé na majetku, na kterém **pojištěný** či jakákoli osoba jednajícím jménem či pro **pojištěného** provádí jakékoli práce, opravy, instalace či jakoukoli jinou činnost.

Vyluka věcné škody na výrobcích

Odchylně od článku 4.6 pojistných podmínek se toto pojištění nevztahuje na jakoukoli ztrátu nebo poškození **výrobků** nebo jakékoliv náklady, výdaje nebo vrácení kupní ceny požadované nebo vzniklé opravou, odstraněním, výměnou, stažením z trhu,

likvidací nebo ztrátou použitelnosti jakéhokoliv **výrobku**, z něhož škoda či jiná újma vyplývá nebo v němž věcná škoda spočívá, a veškeré další nároky z práv z vadného plnění a jakékoli jiné škody vzniklé na **výrobku**.

Závěrečná ujednání

Pojmy použité v této pojistné smlouvě mají stejný význam jako pojmy definované v pojistných podmínkách.

Pojistník stvrzuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami a měl je i text této pojistné smlouvy možnost prostudovat, rozumí jim a souhlasí s nimi.

Tato smlouva je vystavená v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž pojistník obdrží 3 vyhotovení, pojistitel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení zplnomocněný makléř.

V Praze, dne

pojistitel: Chubb European Group SE, organizační složka


Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

1. Podmínky Pojištění odpovědnosti
2. Výpis pojistníka z obchodního rejstříku

Chubb. Insured.™

Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, je odštěpným závodem společnosti Chubb European Group SE, která se řídí ustanoveními francouzského zákona o pojištění, s registračním číslem 450 327 374 RCS Nanterre a sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francie. Chubb European Group SE má plně splacený základní kapitál ve výši 896,176,662€. Chubb European Group SE je ve Francii oprávněna k podnikání a regulována Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Organem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Francie.

Osobní údaje, které poskytujete nám [případně vašemu pojišťovacímu makléři] pro upisování, správu zásad, správu pohledávek a jiné účely pojištění, jak je dále popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, naleznete zde: <https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx>. Můžete nás kdykoli požádat o tištěnou verzi zásad ochrany osobních

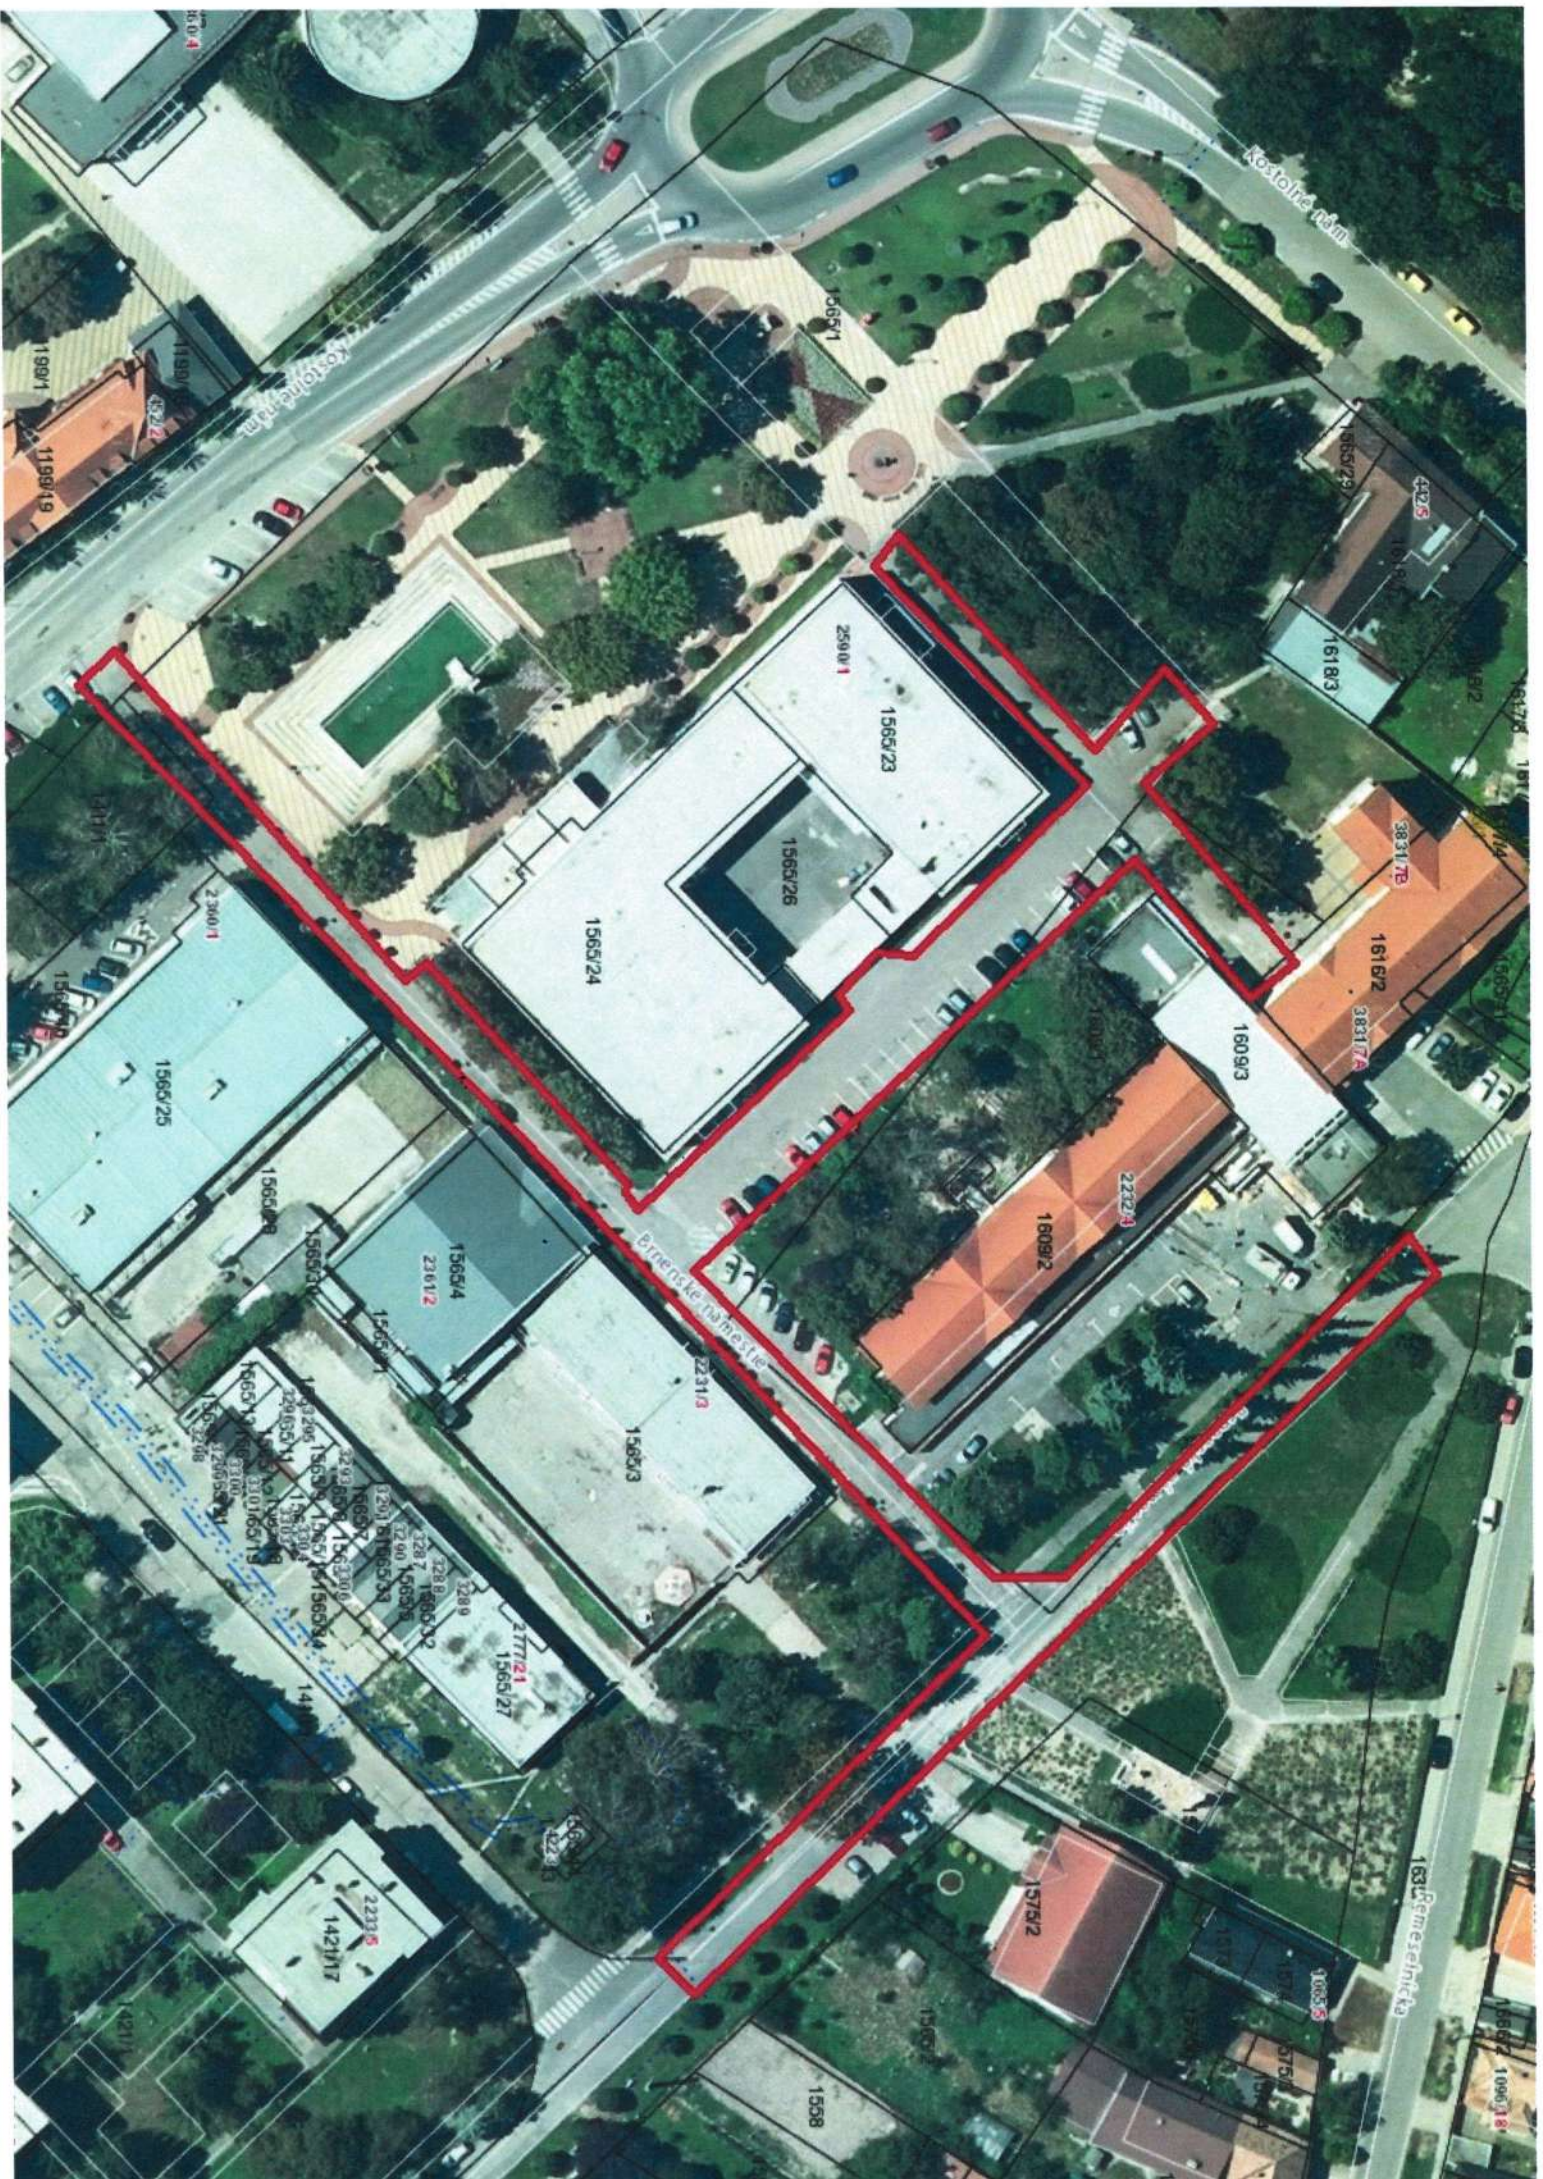

Kostofna Rd

Kostofna Rd

Brenske talaste

Pemesind

2590/1

1565/23

1565/26

1565/24

1565/25

1565/28

1565/4

2361/2

1565/3

1565/3

1565/1

1565/2

1565/3

1565/4

1565/5

1565/6

1565/7

1565/8

1565/9

1565/10

1565/11

1565/12

2231/1

2231/2

2231/3

2231/4

2231/5

2231/6

2231/7

2231/8

2231/9

2231/10

2231/11

2231/12

2231/13

2231/14

2231/15

2231/16

2231/17

2231/18

2231/19

2231/20

2231/21

2231/22

2231/23

2231/24

2231/25

1190/1

1190/2

1190/3

1190/4

1190/5

1190/6

1190/7

1190/8

1190/9

1190/10

1190/11

1190/12

1190/13

1190/14

1190/15

1190/16

1190/17

1190/18

1190/19

1190/20

1190/21

1190/22

1190/23

1190/24

1190/25

1190/26

1190/27

1190/28

1190/29

1190/30

1190/31

1190/32

1190/33

1190/34

1190/35

1190/36

1190/37

1190/38

1190/39

1190/40

1190/41

1190/42

1190/43

1190/44

1190/45

1190/46

1190/47

1190/48

1190/49

1190/50

1190/51

1190/52

1190/53

1190/54

1190/55

1190/56

1190/57

1190/58

1190/59

1190/60

1190/61

1190/62

1190/63

1190/64

1190/65

1190/66
