

01335311

Dodatok č. 4

D24/2021/0520/0004

k Zmluve o dielo: „Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzac“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha“

uzatvorenej podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: ZM/2021/0520

číslo zhotoviteľa: 21050630

(ďalej len „**dodatok č. 4**“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Stanisláv Beňo, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT kód:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 46 120 602
IČ DPH: SK2023231892

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**zmluvné Strany**“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 22.12.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie Diela - stavby „**Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač**“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha“ (ďalej len ako „**Zmluva**“).

V nadväznosti na vypuknutie pandémie COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine prijalo dňa 23.9.2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania (ďalej len ako „**MP 27/2022**“). MP 27/2022 tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 4 Zmluvy. MP 27/2022 bol vydaný v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov, a to ako reakcia na pandémiu COVID-19 a vojnový konflikt na Ukrajine. Účinnosť nadobudol dňa 23.9.2022. Rozhodnutím ministra dopravy SR číslo 52/2023 zo dňa 18.7.2023 došlo k zrušeniu MP 27/2022.

V zmysle „Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (ďalej len „**Všeobecné metodické usmernenie UVO**“) z mája 2022 č. 6/2022 má MP 27/2022 za cieľ definovať mechanizmus pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov vzhľadom na nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobeným pandémiou COVID-19 a vojnou Ruskej federácie na území Ukrajiny.

Zhotoviteľ si v zmysle podčlánku 20.1 zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha a v súlade so Zmluvou vniesol nároky, ktoré sú bližšie uvedené v čl. IV bod 1 tohto dodatku č. 4 Zmluvy.

K zmene Zmluvy pristupujú zmluvné strany z dôvodu skokového nepredvídateľného nárastu vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID – 19 a vojnou na území Ukrajiny, čo preukazuje analýza príčinných súvislostí a skutočností výrazného nárastu cien (výkyvu) vybraných komodít (Príloha č. 3 k materiálu Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 22/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania – závery k definovaniu nepredvídateľných udalostí na trhu so stavebnými materiálmi na základe vypracovanej analýzy „Vývoj cien vybraných komodít a ich dôvody“ zverejnená na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky:

Vzhľadom na znenie Všeobecného metodického usmernenia UVO, ako aj MP 27/2022 sa zmluvné strany dohodli na znení tohto dodatku č. 4 v súvislosti s uplatňovaním úpravy ceny a spôsob jej fakturácie.

Na výpočet nárastu cien vybraných stavebných materiálov plnených na základe tejto Zmluvy sa uplatní postup podľa MP č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania. Mechanizmus výpočtu v sebe zahŕňa sedem súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov (tzv. kotiev), ktoré v sebe obsahujú prislúchajúce vybrané stavebné materiály podľa členenia CPA¹ vo verzii 201, pričom zoznam týchto najvýznamnejších vybraných stavebných materiálov je určený článkom 2 bod 5 MP 27/2022 (ďalej len ako „**vybrané materiály**“ alebo „**vybrané stavebné materiály**“).

MP 27/2022 stanovuje viacero spôsobov stanovenia jednotkových cien vybraných stavebných materiálov za referenčné obdobie, pričom objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na stanovení jednotkových cien jednotlivých vybraných stavebných materiálov (označené ako „m“) za referenčné obdobie aplikáciou nasledovných spôsobov:

- (i) znaleckého posudku č. 12/2023 čl. 2 bod 6 a.) MP 27/2022 - ktorého vypracovanie bolo zabezpečené zo strany objednávateľa a je bližšie popísaný v článku I. tohto dodatku č. 4 (ďalej len ako „Znalecký posudok“). Znaleckým posudkom sa určia jednotkové ceny stavebných materiálov za referenčný kvartál (označený ako to). Materiály, ktoré sú predmetom ohodnotenia Znaleckým posudkom budú na účely tejto Zmluvy označované ako Materiály 2.
- (ii) reindexácie - čl. 2 bod 6 c.) MP 27/2022 materiály, ktoré nie sú súčasťou Znaleckého posudku podľa bodu (i), ale sú v rámci stanovených CPA kódov a to spôsobom: z predložených faktúr za jednotlivé materiály vymedzené podstatnými dodaciami a kvalitatívnymi podmienkami platnosti ceny, pričom je nutné zabudovanie týchto materiálov na stavbe podľa platnej DRS (ďalej len ako „Materiály 1“). Použije sa konkrétna faktúra dodávateľa materiálu zhotoviteľovi, ktorá bude časovo najbližšia k dňu ukončenia lehoty predkladania ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. V prípade, ak faktúra dodávateľa zahŕňa v cenách materiály a práce, prípadne iné položky, výška ceny materiálu sa určí prehlásením príslušného dodávateľa. Uvedená jednotková cena sa preindexuje späť do obdobia to použitím indexov v zmysle MP 27/2022. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady, resp. dokumenty nevyhnutné na preukázanie výpočtu jednotkovej ceny týchto stavebných Materiálov 1 použitých pri realizácii diela (napr. faktúry, dodacie listy, interné účtovné doklady a pod.)

MP 27/2022 stanovuje tri časové obdobia, a to (i) **Obdobie 0** - časový úsek od januára 2009 do decembra 2020 (ďalej len ako „Obdobie 0“), (ii) **Obdobie 1** – časový úsek od januára 2021 do decembra 2021 (ďalej len ako „Obdobie 1“) a (iii) **Obdobie 2** – časový úsek od januára 2022 do ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny (ďalej len ako „Obdobie 2“).

Zmluvné strany sa v nadväznosti na vyššie uvedené dohodli v zmysle bodu 16 Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) a c) v spojitosti s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uzavretí tohto dodatku č. 4 Zmluvy, v dôsledku zmien nákladov a z dôvodu okolností, ktoré objednávateľ nemohol v čase verejného obstarávania predvídať a v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie ÚVO k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 6/2022.

Zmluvné Strany sa dohodli na úprave Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok I. Znalecký posudok

1. Objávateľ zabezpečil vypracovanie Znaleckého posudku č. 12/2023 prostredníctvom znalcov spoločnosti Ústavu stavebnej ekonomiky, s. r. o., IČO: 36 746 916, so sídlom Miletičova 21, 821 09 Bratislava, pod vedením Ing. Juraja Nagya, PhD., znalec zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore: Stavebníctvo a odvetvia: Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo ,znalca: 912465 (ďalej len ako „znalec“).
2. Zhotoviteľ bol zo strany objednávateľa oboznámený s metódou výpočtu, ktorá bola uplatnená pri vypracovaní Znaleckého posudku podľa predchádzajúcej vety a zhotoviteľ stanovenú metódu berie na vedomie. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že sa oboznámil so znením Znaleckého posudku .
3. Zhotoviteľovi bol Znalecký posudok odovzdaný na základe Preberacieho protokolu dňa 17.03.2023.

Článok II.
Predmet Dodatku č. 4

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v podčlánku 13 osobitných zmluvných podmienok Zmluvy (ďalej len ako „OZP Zmluvy“) sa dopĺňa nový podčlánok 13.9. v nasledovnom znení:

Zmluvné strany sa dohodli, že pre účel výpočtu nárastu cien stavebných materiálov podľa tejto Zmluvy o dielo sa bude uplatňovať výpočet nárastu cien vybraných materiálov podľa MP 27/2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 4 Zmluvy a prostredníctvom ktorého sa upravia ceny vybraných stavebných materiálov (ďalej len „Index navýšenia cien“).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v podčlánku 13.9 osobitných zmluvných podmienok Zmluvy (ďalej len ako „OZP Zmluvy“) sa dopĺňa nový podčlánok 13.9.1 v nasledovnom znení:

Fakturácia za
Obdobie 2 – časť 1

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť za pomernú časť Obdobia 2 v zmysle tohto podčlánku, končiacemu ku dňu 31.12.2022 faktúru (ďalej len ako „paušálna faktúra 1“), ktorej predmetom bude vysporiadanie priebežných nárokov zhotoviteľa a/alebo ich častí v rozsahu týkajúcom sa nárastov cien za vybrané stavebné materiály uvedené v zozname vybraných zabudovaných materiálov predloženom zhotoviteľom, a to formou úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien za uvedené obdobie, a to vo forme jednorazovej paušálnej sumy (ďalej len ako „paušálna suma 1“).
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že paušálna suma 1 bude predstavovať sumu vo výške **465 954 EUR bez DPH** (slovom štyristošesťdesiatpäťtisícdeväťstopäťdesiatštyri EUR bez DPH)
 3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť paušálnu faktúru 1 až po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 4, ktorým bolo predmetné navýšenie cien upravené, a to na základe schválenia žiadosti zhotoviteľa o odsúhlasenie zoznamu všetkých vybraných zabudovaných materiálov s uvedením ich množstiev za pomernú časť Obdobia 2 v zmysle bodu 1 tohto článku a podpísania Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien za príslušné obdobie, ktorého predmetom bude odsúhlasenie úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien (ďalej len ako „Zápis o odsúhlasení výšky nárastu cien“) zo strany objednávateľa, a to po jeho predložení a odsúhlasení zo strany stavebného dozoru. Zmluvné strany sa dohodli, že o nárokoch vznesených zo strany zhotoviteľa v súvislosti s nárastom cien materiálov rozhodne stavebný dozor v súlade s podčl. 3.5. OZP Zmluvy. Rozhodnutie stavebného dozora bude tvoriť súčasť tohto dodatku č. 4 ako jeho neoddeliteľná Príloha č. 2.
 4. Na proces podania žiadosti a jej odsúhlasenia, ako aj vyhotovenia Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien sa bude aplikovať postup upravený v podčlánku 13.9.2. body 3 až 6 OZP Zmluvy.
 5. Dátum dodania na tejto paušálnej faktúre 1 bude dátum podpísania Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu cien za príslušné obdobie za ktorý sa faktúra vystavuje.
 6. Zhotoviteľ je povinný doručiť spolu s paušálnou faktúrou 1 všetky podklady súvisiace s jej vystavením vyplývajúce z ustanovení tohto článku a Zmluvy.
 7. Pokiaľ zhotoviteľ nedoručí požadované podklady spolu s paušálnou faktúrou 1 je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi paušálnu faktúru 1, a to aj opakovane, pričom lehota splatnosti dňom vrátenia faktúry zhotoviteľovi neplynie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v podčlánku 13.9 OZP Zmluvy sa dopĺňa nový podčlánok 13.9.2 v nasledovnom znení:

Fakturácia za
Obdobie 2 – časť 2

1. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť žiadosť o odsúhlasenie úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien za ďalšiu časť Obdobia 2, začínajúcu sa dňom 1.1.2023 a končiace dátumom, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi osobitným písomným oznámením zo strany objednávateľa v súlade s podčl. 1.3 Komunikácia, pričom predmetom tejto žiadosti bude vysporiadanie nárokov zhotoviteľa v súvislosti s nárastom cien za vybrané materiály, a to formou úpravy cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien za uvedené obdobie (ďalej len ako „paušálna suma 2“).
2. Paušálna suma 2 bude určená postupom popísaným v bodoch 3 až 6 tohto podčlánku a zhotoviteľ je oprávnený fakturovať paušálnu sumu 2 až po nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku, ktorého predmetom bude vysporiadanie nárokov zhotoviteľa v súvislosti s nárastom cien za vybrané materiály za príslušné Obdobie 2 v zmysle bodu 1 tohto podčlánku a ktorého prílohou bude Rozhodnutie stavebného dozora podľa podčl. 3.5. OZP Zmluvy o nároku vznesenom v súvislosti s nárastom cien materiálov ako aj oznámenie objednávateľa v zmysle bodu 1 tohto podčlánku.
3. Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru žiadosť o odsúhlasenie zoznamu všetkých vybraných zabudovaných stavebných materiálov s uvedením ich množstiev za príslušné Obdobie 2 v zmysle bodu 1 tohto podčlánku. Do zoznamu podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ oprávnený zahrnúť len vybrané materiály uvedené v MP 27/2022, pričom každému materiálu priradí CPA kód v zmysle MP 27/2022 a jeho množstvo (ďalej len ako „Zoznam“). Zhotoviteľ berie na vedomie, že na materiály, ktoré uvedie v Zozname a ktoré nie sú vybranými materiálmi v zmysle MP 27/2022 nebude stavebný dozor prihliadať a nebudú predmetom jeho schvaľovania.
4. Po kontrole a odsúhlasení druhu zabudovaného vybraného materiálu a jeho množstva za príslušné Obdobie 2 v zmysle bodu 1. tohto podčlánku zo strany stavebného dozoru je zhotoviteľ povinný vypočítať úpravu cien pre Materiály 2 uvedené v Zozname o Index navýšenia cien, a to v súlade so spracovaným Znaleckým posudkom a pre Materiály 1 uvedené v Zozname, ktoré nie sú predmetom ocenenia Znaleckého posudku použije zhotoviteľ metódu uvedenú v Preambule v bode (ii) reindexácia. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi doklady, resp. dokumenty nevyhnutné na preukázanie výpočtu jednotkovej ceny týchto stavebných Materiálov 1 použitých pri realizácii diela (napr. faktúry, dodacie listy, interné účtovné doklady a pod.).
5. Zhotoviteľ je povinný po vykalkulovaní nárastu cien pre vybrané materiály podľa bodu 4 tohto podčlánku predložiť tento spolu s vypočítaným cenovým dopadom na stavbu na schválenie stavebnému dozoru.
6. Po schválení v zmysle bodu 5 tohto podčlánku zo strany stavebného dozoru je zhotoviteľ povinný predložiť žiadosť o schválenie vypočítaného nárastu cien vybraných materiálov uvedených v Zozname a cenového dopadu na stavbu objednávateľovi, ktorý predložený výpočet a cenový dopad skontroluje a schváli, prípadne vráti zhotoviteľovi na doplnenie.
7. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na paušálnu sumu 2 v zmysle bodu 1 tohto podčlánku až po nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku, ktorého predmetom bude vysporiadanie nárokov zhotoviteľa v súvislosti s nárastom cien za vybrané materiály za príslušné Obdobie 2 v zmysle bodu 1 tohto podčlánku a prílohu takého dodatku bude tvoriť Zápis o odsúhlasení výšky nárastu za príslušné obdobie zo strany objednávateľa v zmysle bodu 6 tohto podčlánku a Rozhodnutie stavebného dozora podľa podčl. 3.5. OZP Zmluvy o nároku vznesenom v súvislosti s nárastom cien materiálov.
8. Dátum dodania na paušálnej faktúre 2 bude dátum podpísania Zápisu o odsúhlasení výšky nárastu za príslušné obdobie za ktorý sa faktúra vystavuje.
9. Zhotoviteľ je povinný doručiť spolu s paušálnou faktúrou 2 všetky podklady súvisiace s jej vystavením vyplývajúce z ustanovení tohto podčlánku.
10. Pokiaľ zhotoviteľ nedoručí požadované podklady spolu s paušálnou faktúrou 2 je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi paušálnu faktúru 2, a to aj opakovane, pričom lehota splatnosti dňom vrátenia faktúry neplynie.

Článok III.

1. Vzhľadom na týmto dodatkom č. 4 doplnené ustanovenie podčlánku 13.9 a 13.9.1 a 13.9.2. sa zmluvná cena diela mení nasledovne:

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	ZoD	Dodatok č.1	Dodatok č.2
Časti stavby	13 066 453,23	13 066 453,23	14 359 855,38
Všeobecné položky	590 108,84	590 108,84	822 845,66
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	13 656 562,07	13 656 562,07	15 182 701,04
DPH 20%	2 731 312,42	2 731 312,42	3 036 540,21
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	16 387 874,49	16 387 874,49	18 219 241,25

Súhrnný rozpočet Diela podľa uzatvorených dodatkov	Dodatok č.3	Dodatok č.4
Časti stavby	15 166 160,53	15 632 114,53
Všeobecné položky	822 845,66	822 845,66
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) bez DPH	15 989 006,19	16 454 960,19
DPH 20%	3 197 801,24	3 290 992,04
Akceptovaná zmluvná hodnota (Zmluvná cena) s DPH	19 186 807,43	19 745 952,23

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 4

1. Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že dňom účinnosti tohto dodatku č. 4 Zmluvy a úhradou paušálnej sumy 1 považujú všetky svoje nároky vzniknuté v súvislosti s pandémiou Covid – 19 a vojnou na Ukrajine uplatnené Nárokom zhotoviteľa č. 6 zo dňa 07.03.2022, prípadne inými nárokmi zhotoviteľa uplatnenými v súlade s podčl. 20.1. zmluvných podmienok Zmluvy, ktoré súvisia s navýšením cien vybraných materiálov z dôvodu pandémie Covid 19 alebo vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny v zmysle MP 27/2022 (aj ako „nároky“) za vysporiadané. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany konštatujú, že prehlásenie podľa predchádzajúcej vety sa netýka nárokov na úpravu cien vybraných materiálov o Index navýšenia cien za Obdobie 2 – v zmysle bodu 1 podčlánku 13.9.2. - paušálna suma 2, tak ako je uvedené v článku II tohto dodatku č. 4.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ berú na vedomie, že postup úpravy ceny pre vybrané stavebné materiály, ktorý je predmetom úpravy podčlánku 13.9., 13.9.1. a 13.9.2. bude

- uplatňovaný v súlade s MP č. 27/2022. Objednávateľ a Zhotoviteľ berú na vedomie, že Rozhodnutím ministra dopravy SR číslo 52/2023 zo dňa 18.7.2023 došlo k zrušeniu MP č. 27/2022.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 4 Zmluvy oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
 4. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom č. 4 Zmluvy sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti.
 5. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
 6. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
 7. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 4 je:
Príloha č.1 – MP 27/2022, Rozhodnutie ministra dopravy SR číslo 52/2023 zo dňa 18.7.2023
Príloha č. 2 – Rozhodnutie stavebného dozora č. 6314/30923/2023 (64678/2023) zo dňa 9.8.2023
Príloha č. 3 – Výpočet navýšenia cien vrátane rekapitulácie podľa MP 27/2022 za pomernú časť Obdobia 2 – I., II., III., IV. kvartál 2022

V Bratislave, dňa 1 0. OKT. 2023

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 05. OKT. 2023

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 21992/2023/IDP/61450

Stupeň dôvernosti: Interné

ROZHODNUTIE MINISTRA
číslo 52/2023

Článok I

Podľa článku 5 ods. 6 písm. a) bodu 1 Organizačného poriadku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), v súlade s článkom 4 Metodického pokynu č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania, v súlade s článkom 4 Metodického pokynu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 1/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch modernizácie a novovýrobe dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania a v súlade s článkom 4 Metodického pokynu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 6/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania

RUŠÍM

1. Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 23.9.2022 (ďalej len „metodický pokyn č. 27/2022“),
2. Metodický pokyn Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 1/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch modernizácie a novovýrobe dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 8.2.2023 (ďalej len „metodický pokyn „1/2023“),
3. Metodický pokyn Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 6/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 28.3.2023 (ďalej len „metodický pokyn č. 6/2023“).

Článok II

Všetky úkony začaté do účinnosti tohto rozhodnutia, po písomnom potvrdení doručenia kompletnej dokumentácie od investora (verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa),

sa dokončia podľa v tom čase platných a účinných metodických pokynov č. 27/2022, 1/2023 a 6/2023.

Článok III.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 16.8.2023.

V Bratislave18.7.2023.....

Pavol Lančarič
minister dopravy
Slovenskej republiky



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

23055/2023/IDP/65799

Vybavuje/linka

Bratislava

19.07.2023

Vec

Informácia o rozhodnutí ministra č. 52/2023: Zrušenie Metodického pokynu 27/2022, Metodického pokynu MD SR 1/2023 a Metodického pokynu MD SR 6/2023

Vážený pán predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
Vážený pán generálny riaditeľ,

dovoľujeme si Vám zaslať rozhodnutie ministra dopravy SR č. 52/2023 (ďalej len „rozhodnutie“) z 18.07.2023, ktorým sa zrušujú metodické pokyny:

1. Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 23.9.2022 (ďalej len „metodický pokyn č. 27/2022“),
2. Metodický pokyn Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 1/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch modernizácie a novovýrobe dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 8.2.2023 (ďalej len „metodický pokyn č. 1/2023“),
3. Metodický pokyn Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 6/2023, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby dráhových vozidiel – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania s dátumom účinnosti 28.3.2023 (ďalej len „metodický pokyn č. 6/2023“).

Rozhodnutie ministra nadobúda účinnosť dňa 16.8.2023. Zároveň Vás informujeme, že v zmysle článku II všetky úkony začaté do účinnosti tohto rozhodnutia, po písomnom potvrdení komplexnej dokumentácie od investora (verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa), sa dokončia podľa v tom čase platných a účinných metodických pokynov č. 27/2022, 1/2023 a 6/2023.

Prosíme o informovanie o danej skutočnosti Vašich obchodných partnerov a dodávateľov.

S pozdravom

Príloha: Rozhodnutie ministra dopravy SR č. 52/2023

Na vedomie:

Rozdeľovník

1. Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
2. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ, Slovenská správa ciest
3. Milošlav Havrila, generálny riaditeľ, Železnice Slovenskej republiky
4. Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Železničná spoločnosť Slovensko

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

Január 2023



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

OSNOVA

- Podnet a mandát
- Základné informácie a aplikácia podľa MP 27/2022
- Ukážka výpočtu a výpočtového súboru
- Otázky a diskusia

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

PODNET A MANDÁT

- Úrad pre verejné obstarávanie zorganizoval dňa 29. apríla 2022 na svojej pôde pracovné rokovanie za účasti Ministerstva dopravy SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu SR, Útvaru hodnoty za peniaze MF SR, Únie miest Slovenska, k návrhu riešenia predmetnej problematiky v jej medzirezortnom a nadnárodnom rozmere, ktorého závery sú aprobované aj do obsahu Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

PODNET A MANDÁT

- Bezprecedentný skokový nárast cien stavebných a výrobných materiálov v dôsledku pandémie COVID-19, narušenia dodávateľsko-odberateľských reťazcov a eskalácie a vojny na Ukrajine – zmluvné problémy
- Úloha B.1 pre ministra dopravy a výstavby UV SR č. 331/2022 k vypracovaniu analýzy a zabezpečeniu plynulej realizácie verejných stavieb v súlade s vydaným Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 16. 5. 2022

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

PODNET A MANDÁT

- Potreba navýšenia zmluvnej ceny a adekvátnej hodnoty kompenzácie pre plynulé pokračovanie zhotovovania stavieb pre súčasne prebiehajúce stavby v rezorte MD SR
- Pridelenie mandátu na riešenie problematiky na základe nezávislého analytického podkladu
- Cieľom aj možnosť využitia metodických pokynov ostatnými rezortmi a subjektami (inšpirovanie sa)

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

PRACOVNÁ SKUPINA

- Vytvorená široká pracovná skupina pre tvorbu MP 27/2022
- Zástupcovia: MDV SR, MF SR (ÚHP), ÚV SR (Sekcia Plánu obnovy), NBS, ŠÚ SR, NDS, SSC, ŽSR a stavebný sektor (zástupcovia zväzu a stavebných firiem)
- Zasadnutia pracovnej skupiny:
 - jún - september 2022
- Intenzívna diskusia a pripomienkovanie

Metodický pokyn MDV SR 27/2022


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Dátum účinnosti: 23.9.2022
- Všetky potrebné informácie: **vzorce** (dokumenty + excely na výpočet) v časti **Indexačné**
- MP 27/2022 (MP) má za cieľ riešiť vzniknutú nepredvídateľnú situáciu na trhu so stavebnými materiálmi a vhodne stanoviť výpočet adekvátnej hodnoty kompenzácie pre plynulé pokračovanie zhotovovania stavieb

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- **Nepredvídateľnosť vývoja cien na trhu so stavebnými materiálmi je viditeľná aj na grafickom znázornení rozsahu hodnôt (rozpätia) cenových indexov**

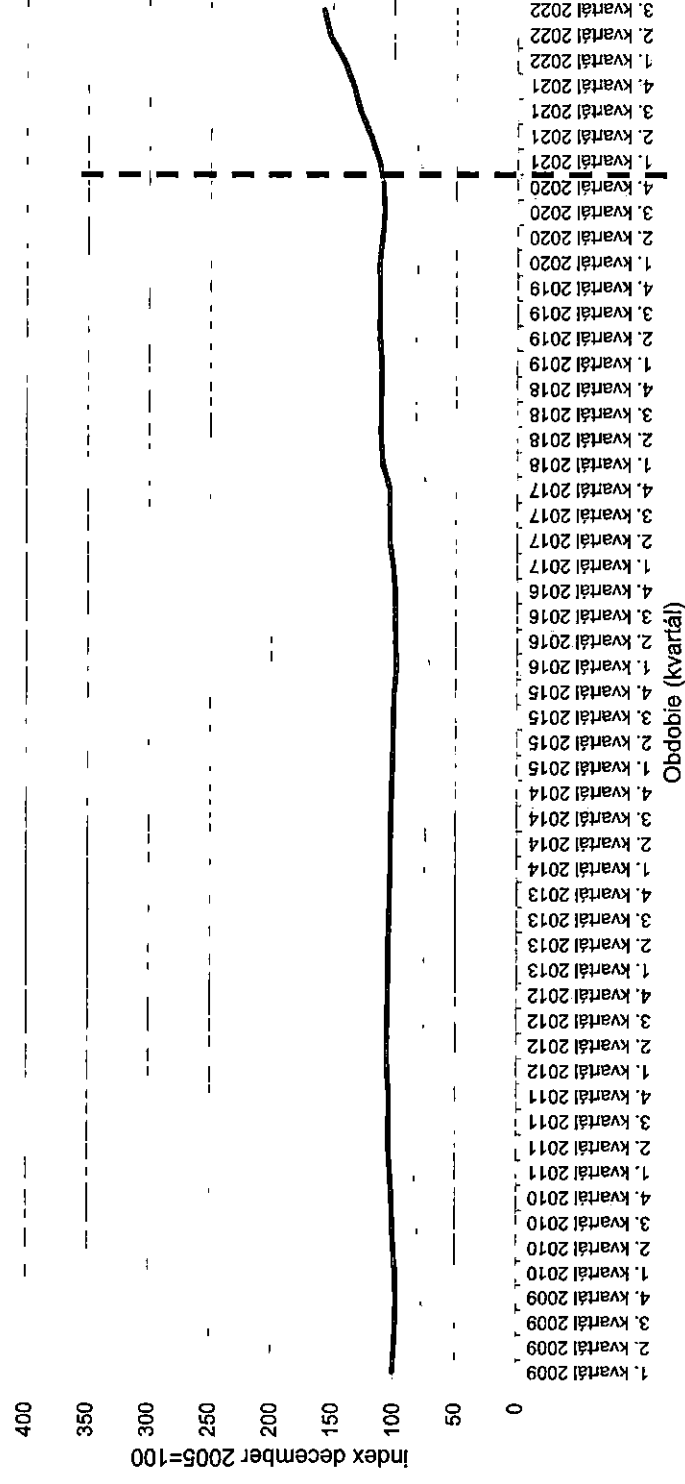

Zdroj: ŠÚ SR, spracované IDP

Rozsah hodnôt — Priemer hodnôt

Obdobie (kvartál)

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE – WEB IDP

MINISTERSTVO | **INFO PRE OBČANOV** | **MÉDIA** | **KONTAKT**

🏠 / MINISTERSTVO · DOPRAVA | [Inštitút dopravnej politiky](#) | [Indexačné vzorce](#)

Indexačné vzorce

Metodický pokyn pre súčasnú/prebiehajúce stavby

Cieľom materiálu je definovať mechanizmus pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov vzhľadom na preskúšané nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov tak, aby bola splnená podmienka prítomnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobených pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Metodický pokyn vychádza zo všeobecného metodického usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Metodický pokyn sa týka platných existujúcich zmluvných vzťahov a jeho aktualizovaná verzia je účinná od 23.9.2022.

Metodický pokyn definuje mechanizmus výpočtu nárokov v súvislosti s nárastom cien materiálov berúc do úvahy jednotlivé najvýznamnejšie materiály a ich historický vývoj.

Mechanizmus počítá nárasty a nároky medzi dvomi obdobiami (referenčné obdobie pred podaním ponuky, obdobie realizácie vzhľadom na vplyv pandémie koronavírusu a vplyv vojny na Ukrajine) na základe údajov ŠÚ SR o výrobných cenách vybraných stavebných materiálov.

- [Metodický pokyn – dokument na súhrn údajov \(docx; 41kB\)](#)
- [Metodický pokyn – súbor na výpočet navyšenia a jednotkovej ceny \(xlsx; 195kB\)](#)
- [Metodický pokyn – ukážka postupu výpočtu jednotkovej ceny na základe ŠS \(pdf; 384kB\)](#)
- [Metodický pokyn – návod na vyplnenie súboru na výpočet navyšenia a jednotkovej ceny \(pdf; 40kB\)](#)

Ďalšie údaje v Metodickom pokyne nájdete na: https://datacube.statistics.sk/tr/view/šs/šs_01823.ms_00_00_00_šs

Posledné údaje v súbore na výpočet navyšenia a jednotkovej ceny: september 2022 / Q3 2022

Na účely tvorby metodického pokynu pre prebiehajúce stavby bola Ústavom súdneho znechťania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Stavebná fakulta) vypracovaná analýza, ktorá odoborne zhodnotila a odvodnila nárast cien komodít (materiálov) v porovnaní s prchádzajúcimi obdobiami a definovala príčiny zistených zmien a vývojov cieľ.

Zo záverov analýzy vyplýva, že súčasný nárast trhovými cenami komodít (materiálov) je neočakávaný a nestabilný cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami patrí medzi nepredvídateľné okolnosti. Analýza bola viditeľou SR vzatá na vedomie dňa 13.07.2022 a je dostupná na webovej adrese Úradu vlády SR (dokument Príloha 3 a Príloha 3_graf).

- [Záverov analýzy vývoja cien vybraných komodít \(pdf; 2,74kB\)](#)
- [Záverov analýzy vývoja cien vybraných komodít: graf \(pdf; 600kB\)](#)

Metodický pokyn MDV SR 27/2022


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- MP vychádza zo Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2022 k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- V súlade s bodom E.7 (zložité stavby) metodického usmernenia 6/2022 dochádza k navýšeniu len tých položiek, pri ktorých je nárast cien preukázaný (adresné preukazovanie ich novej ceny)
- MP je platný pre organizácie spadajúce pod MDV SR a aplikuje sa na stavby u ktorých už uplynula lehota na predkladanie ponúk, v prípade verejných obstarávaní, ktoré už boli vyhlásené a v prípade verejných obstarávaní, pri ktorých už došlo k podpisu zmluvy so zhotoviteľom (t.j. momentálne už prebiehajúce stavby)
- MP a mechanizmus úpravy ceny sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia povinní uplatňovať na výpočet hodnoty dodatku zmluvy (navýšení a nárokov) v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Platnosť MP bude závisieť od ukončenia vojny na Ukrajine a/alebo rozhodnutím ministra, ukončenie vojny však neznamená okamžité uplynutie vplyvov
- Nepredvídateľnosť zmien cien stavebných materiálov bola dokázaná aj analýzou vypracovanou Ústavom súdneho znelectva STU v Bratislave (vláda SR vzala na vedomie)

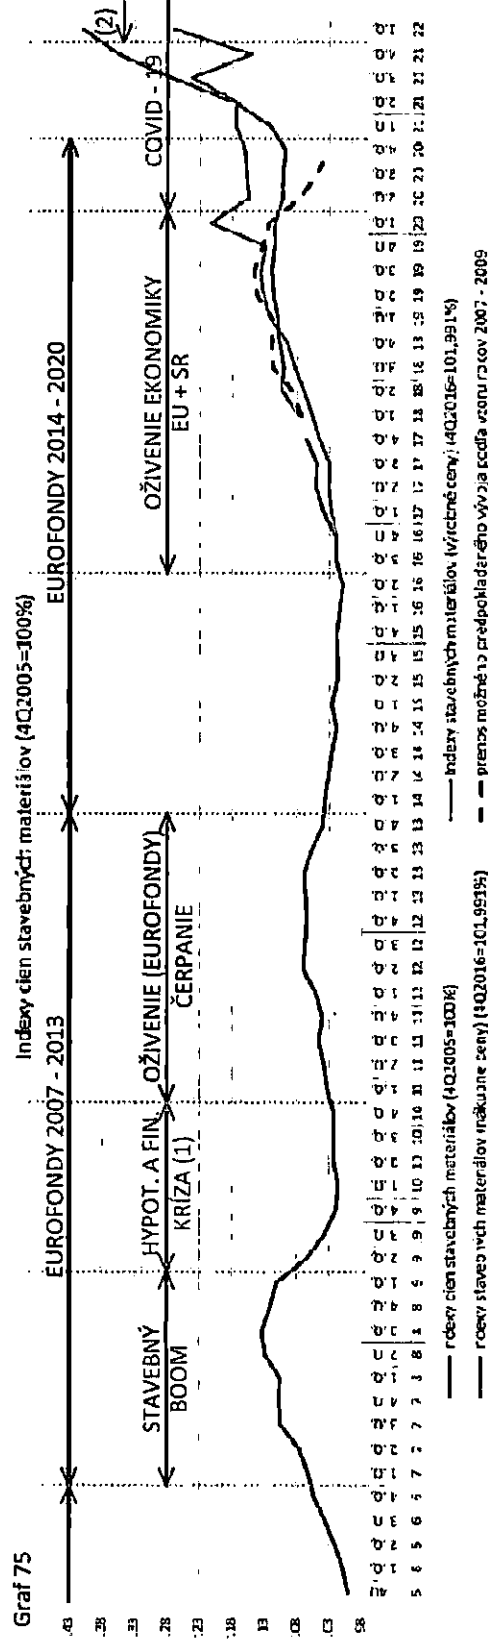

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE – PREUKÁZANIE NÁRASTU

- V zmysle bodu E.7 metodického usmernenia ÚVO 6/2022 je rast ceny (výrobných nákladov) konkrétneho stavebného materiálu a jej výška preukázaná nárastom hodnoty indexu daného stavebného materiálu (ide o využitie objektivizovaných ekonomických ukazovateľov)
- Nárast cien je vypočítaný nezávislou autoritou vydávajúcou štatistické údaje na základe medzinárodných štandardov a platných metodologických postupov, t.j. Štatistickým úradom SR
- K reálnemu navýšeniu zmluvnej ceny dôjde len na základe nárastu konkrétneho stavebného materiálu zabudovaného v konkrétnom čase na konkrétnej stavbe a v konkrétnom množstve
- Nedochoádza ku križovaniu, resp. dvojnásobnému doplatku za rovnaký stavebný materiál

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE – AVIZOVANIE NÁRASTU CIEN

- Pre aplikáciu MP je potrebné, aby zhotoviteľ počas výstavby písomne/elektronicky avizoval problémy vzniknuté navýšením cien
- Informácia, resp. avízo od zhotoviteľa, že má problém s cenami stavebných materiálov musí byť z obdobia keď došlo k ich zabudovaniu, alebo už vopred, ak vie že k tomu dôjde
- Avizovanie je potrebné vyhodnocovať špecificky vzhľadom na jeho obsah

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Výsledkom MP je postup výpočtu ku konkrétnemu dodatku pre konkrétnu stavbu a konkrétne navýšenie
- MP definuje výpočet navýšenia na základe zmeny cien medzi časovými obdobiami vybraných stavebných materiálov v členení podľa CPA, ktoré predstavujú najvýznamnejšie stavebné materiály používané na stavbách
- Nedochoádza k prekompenzácií z dôvodu výberu iba najpoužívanějších stavebných materiálov z celkových materiálov (okolo 5 tisíc položiek CPA)
- Na základe MP bola vytvorená automatizovaná kalkulačka na výpočet hodnoty navýšenia za stavebné materiály, ktorá po vyplnení príslušných kvartálov (časových období) a údajov vypočíta hodnotu navýšenia zmluvy

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Súčasťou danej kalkulačky je aj menšia kalkulačka, ktorá reverzne prevádza jednotkové ceny z obdobia faktúry do referenčného obdobia (MP Článok 2, ods. 6, písm. c))
- Automatizovaná kalkulačka počíta hodnotu navýšenia zmluvnej ceny a koeficient zmeny na základe údajov z verejne dostupných dát ukazovateľa ŠÚ SR: „Výrobné ceny vybraných materiálov používaných v stavebníctve podľa členenia CPA: index december 2005=100 [sp1823msj]“ v členení podľa materiálov medzi obdobiami

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET NAVÝŠENIA

- Na výpočet hodnoty navýšenia je potrebné určiť:
 1. Časové obdobie realizácie zabudovávania materiálu na uplatnenie MP
 2. Kvartál v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk
 3. Kvartál v ktorý prebiehala realizácia stavby
 4. Materiály podľa CPA za ktoré bude počítané navýšenie
 5. Určenie jednotkovej ceny daného konkrétneho materiálu v období predkladania ponúk („ t_0 “)
 6. Množstvo zabudovaného materiálu
 7. Informácia, či zmluva už obsahuje indexáciu a jej hodnotu

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ČASOVÉ OBDOBIA NA UPLATNENIE MP

- MP stanovuje 3 obdobia:
 - dlhodobé referenčné (január 2009 až december 2020),
 - vplyv pandémie COVID-19 (január 2021 až december 2021) a
 - vplyv eskalácie napätia a vojny na Ukrajine (od januára 2022)
- Dlhodobé referenčné obdobie: používané ako dlhodobý, približne stabilný, vývoj pre určenie tzv. rizika
- Zhotoviteľ si môže uplatniť mechanizmus výpočtu navýšenia za realizáciu v období vplyvu pandémie COVID-19 a vplyvu vojny na Ukrajine (t.j. od januára 2021)

Metodický pokyn MDV SR 27/2022


ČASOVÉ OBDOBIA NA VÝPOČET HODNOTY NAVÝŠENIA

- Pre aplikáciu mechanizmu úpravy ceny je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:
 - **referenčným kvartálom** („ t_0 “) je kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby
 - **rozhodujúcim kvartálom** („ t “), je kvartál, v ktorom prebiehala realizácia stavby a za ktorý si zhotoviteľ stavby uplatňuje mechanizmus úpravy ceny
 - **obdobím na výpočet očakávaného rizika** („ t_{riziko} “) na základe vývoja ceny konkrétneho vybraného stavebného materiálu („ m “) je obdobie 5 rokov predchádzajúce referenčnému kvartálu „ t_0 “

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

ČASOVÉ OBDOBIA NA VÝPOČET HODNOTY NAVÝŠENIA

Materiál podľa CPA:	24.42 Hliník
Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky:	t_0 3. kvartál 2018
Obdobie na výpočet očakávaného rizika:	t_{riziko} 2. kvartál 2013 - 2. kvartál 2018
Kvartál realizácie 1 za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie:	t 2. kvartál 2022

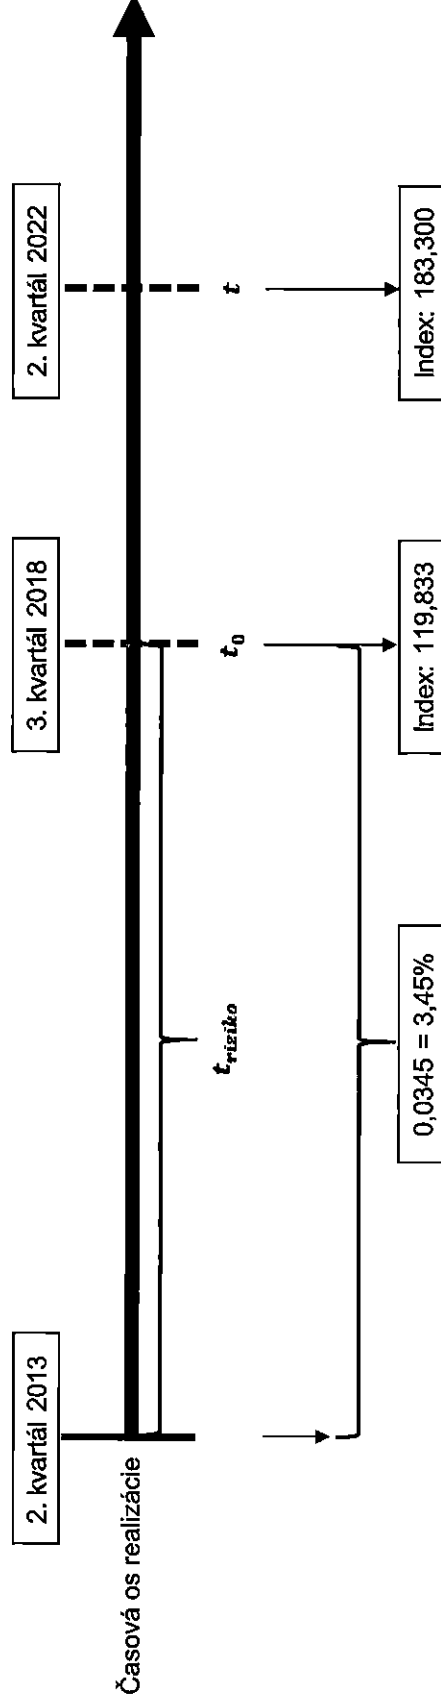

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

22 MATERIÁLOV NA UPLATNENIE VÝPOČTU NAVÝŠENIA

- **Kamene, piesky:**
 - CPA 08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica,
 - CPA 08.12 Prírodné piesky.
- **Drevo:**
 - CPA 16.10 Drevo, rezané a hobľované,
 - CPA 16.21 Dyhy a drevené panely,
 - CPA 16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva.
- **Bitúmenové zmesi:**
 - CPA 19.20 Rafinárske ropné produkty.
- **Plasty:**
 - CPA 22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov,
 - CPA 22.23 Stavebné výrobky z plastov.
- **Sklo:**
 - CPA 23.11 Ploché sklo,
 - CPA 23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla.
- **Betóny, cementy, sadry:**
 - CPA 23.51 Cement,
 - CPA 23.52 Vápno a sadra,
 - CPA 23.6 Výrobky z betónu, cementu a sadry.
- **Železo/kovy:**
 - CPA 24.10 Železo, oceľ a ferozliatiny,
 - CPA 24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele,
 - CPA 24.3 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele,
 - CPA 24.42 Hliník,
 - CPA 24.44 Meď,
 - CPA 25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcií,
 - CPA 25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny,
 - CPA 26.11 Výroba elektronických komponentov,
 - CPA 27.3 Výroba drôtov a elektroinštalčných zariadení.


Metodický pokyn MDV SR 27/2022

STANOVENIE JEDNOTKOVEJ CENY MATERIÁLU

- Jednotkové ceny (JC) vybraných stavebných materiálov je možné pre referenčné obdobie („ t_0 “) stanoviť nasledovnými spôsobmi:
 - **Znalecký posudok**, ktorý bude obsahovať jednotkové ceny pre jednotlivé materiály v období „ t_0 “ (napr. pre zložené materiály)
 - **Projektová dokumentácia**, predložená ponuka vo VO (rozbor položky alebo kalkulačný vzorec), alebo z dokumentov (napríklad výkaz výmer, dokumentácia na realizáciu stavby vrátane jej zmien a úprav) uvedených v zmluve
 - **Reverzné dopočítanie**: použije sa konkrétna faktúra dodávateľa materiálu zhotoviteľovi, ktorá je časovo najbližšia ku dňu „ t_0 “ a ktorá obsahuje jednotkovú cenu, ktorá sa následne reindexuje do obdobia „ t_0 “ (napr. ak červený FIDIC, výpočet cez excel)
- Spôsob stanovenia JC v čase „ t_0 “ určuje obstarávateľ, možná kombinácia

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

VÝPOČET JC POUŽITÍM REVERZNÉHO DOPOČÍTANIA / REINDEXÁCIA (6C)

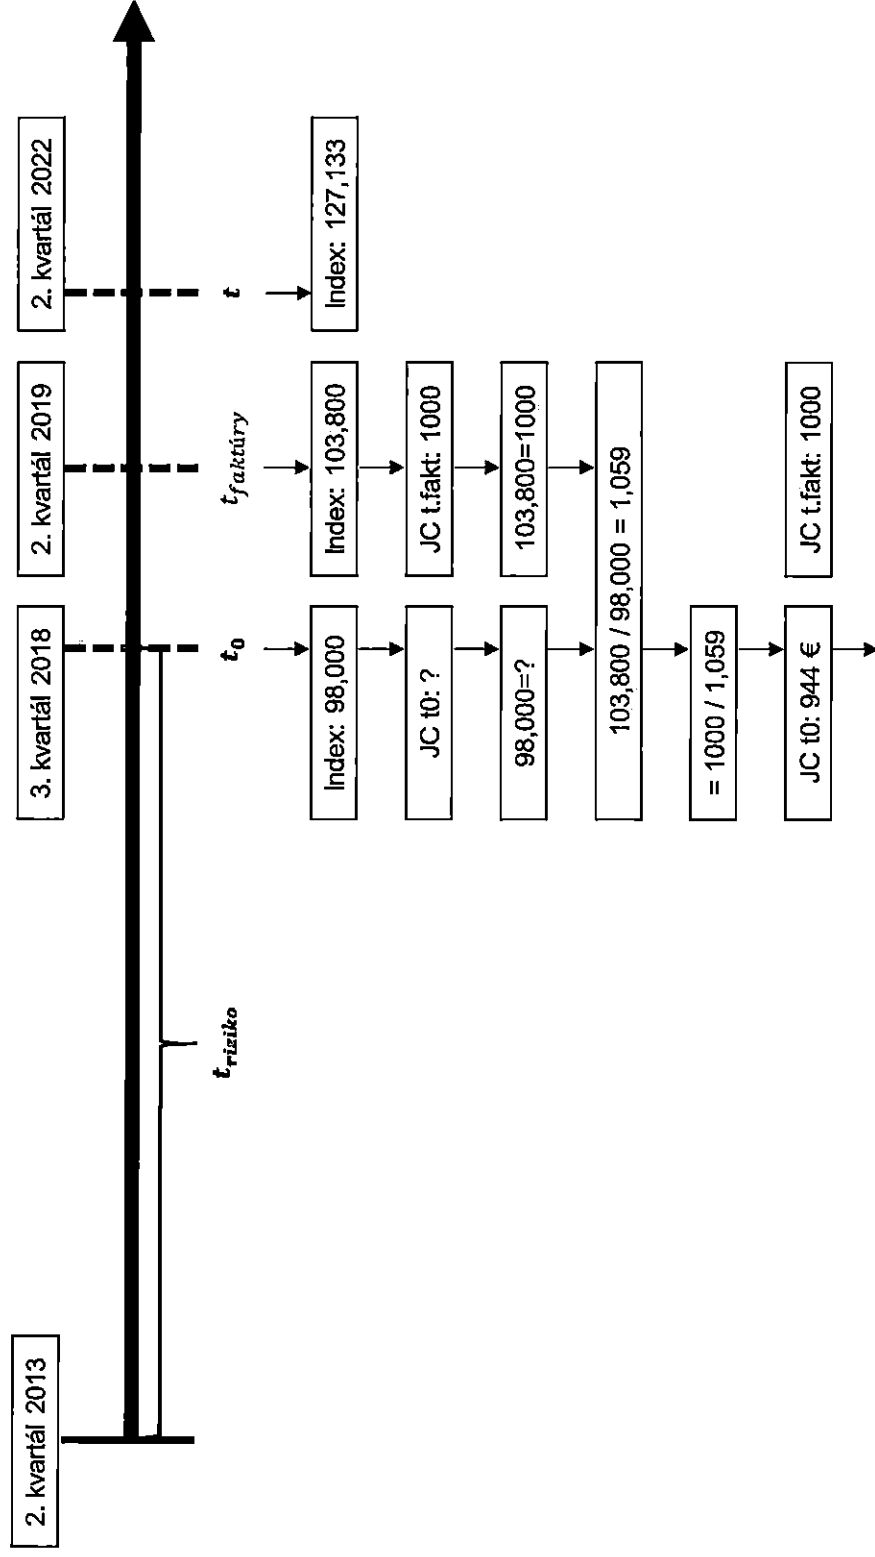

Reindexovaná JC v t_0 vstupuje do výpočtu navýšenia ako JC materiálu m v t_0

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

VÝPOČET JC POUŽÍM REVERZNÉHO DOPOČÍTANIA / REINDEXÁCIA (6C)

1. Vyplnenie kvartálu faktúry (najbližší k ponuke, bunka C4)
2. Vyplnenie kvartálu ukončenia ponuky „ t_0 “ (bunka C6)
3. Vyplnenie hodnôt JC na základe faktúry (stĺpec C)
4. Automatické pridelenie indexov a výpočet koeficientu
5. Reverzne dopočítané hodnoty JC do obdobia „ t_0 “ sú uvedené v stĺpci D

Kód	Název materiálu	JC na základe faktúry	JC prevedené do 10	Indexy	
				index v taktovke	index v taktovke
01	03.11 Detské a stavebné keramiky, výpenec, sacrovrec, krepca a briedla	100,000	98,950	100,187	101,823
02	04.12 Prírodné piesky	0,000	0,000	98,433	99,200
03	16.10 Drevo, ruzané a hobované	0,000	0,000	171,833	165,627
04	16.21 Dřevní a dřevěné pásy	0,000	0,000	160,200	150,653
05	16.23 Ostatné výrobky stavebného stromáru a tesárstva	0,000	0,000	93,333	79,333
06	19.20 Rašarínava, morská produkcia	1 100,000	870,693	108,233	98,007
07	22.21 Dossy, šité, tašky a prahy z plástov	0,000	0,000	123,887	127,400
08	22.29 Stavebné výrobky z plástov	0,000	0,000	125,100	128,800
09	23.11 Ploché stla *	0,000	0,000	125,100	128,800
10	23.19 Ostatné opracované stla vrátane technického stla	0,000	0,000	113,800	113,600
11	23.61 Cement	0,000	0,000	114,200	112,267
12	23.63 Vápno z sadra	0,000	0,000	180,900	178,033
13	23.68 Výrobky z betónu, cementu a sady	450,000	453,187	101,907	101,333
14	24.10 Železo, oceľ a železnitý	0,000	0,000	123,668	96,528
15	24.20 Rúry, rory, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,000	0,000	121,633	111,533
16	24.42 Hlink	0,000	0,000	164,867	129,900
17	24.44 Med a výrobky z medi	0,000	0,000	138,333	112,467
18	25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,000	0,000	118,907	160,667
19	26.03 Dřevěné výrobky, reťaz a prubhy	600,000	640,750	124,233	123,887
20	26.11 Výroba elektrických komponentov	0,000	0,000	121,333	108,800
21	27.30 Kábta a káblové zariadenia	0,000	0,000	123,653	120,600
22				93,187	93,900

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

VÝPOČET NAVÝŠENIA - AUTOMATIZOVANÝ SÚBOR

- Na výpočet hodnoty navýšenia za jednotlivé materiály, ako aj súhrnne, je vhodné použiť predpripravený automatizovaný výpočtový súbor excel, ktorý je dostupný na webovej stránke IDP
- V rovnakom súbore je vytvorený aj automatizovaný mechanizmus na reverzné dopočítanie jednotkovej ceny (reindexácia)
- Na webe IDP je dostupný návod na vyplnenie výpočtového súboru, ako aj ukážka postupu reverzného dopočítania

- [Metodický pokyn - dokument na stiahnutie \(.docx; 41kB\)](#)
- [Metodický pokyn - súbor na výpočet navýšenia a jednotkovej ceny \(.xlsx; 195kB\)](#)
- [Metodický pokyn - ukážka postupu prepočtu jednotkovej ceny na základe 6c \(.pdf; 384kB\)](#)
- [Metodický pokyn - návod na vyplnenie súboru na výpočet navýšenia a jednotkovej ceny \(.pdf; 440kB\)](#)

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

VÝPOČET NAVÝŠENIA - AUTOMATIZOVANÝ SÚBOR

- Vynásobenie pôvodnej hodnoty jednotkovej ceny hodnotou zmeny indexov medzi obdobiami, od ktorého je odpočítané tzv. dlhodobé riziko (na rozdelenie rizika medzi štát a podnikateľský sektor)
- Určenie hodnoty jednotkovej ceny konkrétneho materiálu v kvartáli podávania ponúk „ t_0 “
- Pridelenie hodnoty indexu tomuto obdobiu „ t_0 “ (dáta ŠÚ SR)
- Určenie kvartálu „ t “ za ktorý sa počíta navýšenie, a pridelenie hodnoty indexu tomuto obdobiu (dáta ŠÚ SR)
- Výpočet hodnoty rizika za obdobie 5 rokov predchádzajúce referenčnému kvartálu, t.j. priemerná medziročná percentuálna zmena indexu materiálu za 5 rokov (dáta ŠÚ SR)
- Výpočet koeficientu zmeny medzi obdobia: (index materiálu v období „ t “ / index materiálu v období „ t_0 “) - Riziko

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

AK UŽ ZMLUVA OBSAHUJE VALORIZÁCIU / INDEXÁCIU

- MP, vzhľadom na to že vychádza z usmernenia 6/2022 ÚVO, umožňuje navýšenie len za vybrané stavebné materiály vzhľadom na vopred nepredvídateľný nárast ich nákladov
- Tzn. ak zmluva už obsahuje indexáciu, výpočet podľa MP akoby dorovnáva nárasty za materiály, ktoré vznikli nad hodnotu valorizácie
- Indexácia / valorizácia v zmluve: za celú zmluvnú sumu
- Navýšenie podľa MP: len za vybrané stavebné materiály

ÁNO


- Výpočet navýšenia podľa MP 27/2022
- Odpočítaná hodnota indexácie / valorizácie na základe zmluvy pre každý počítaný materiál

NIE

- Výpočet navýšenia podľa MP 27/2022
- Bez ďalšieho krátania

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

VÝPOČET NAVÝŠENIA – GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE

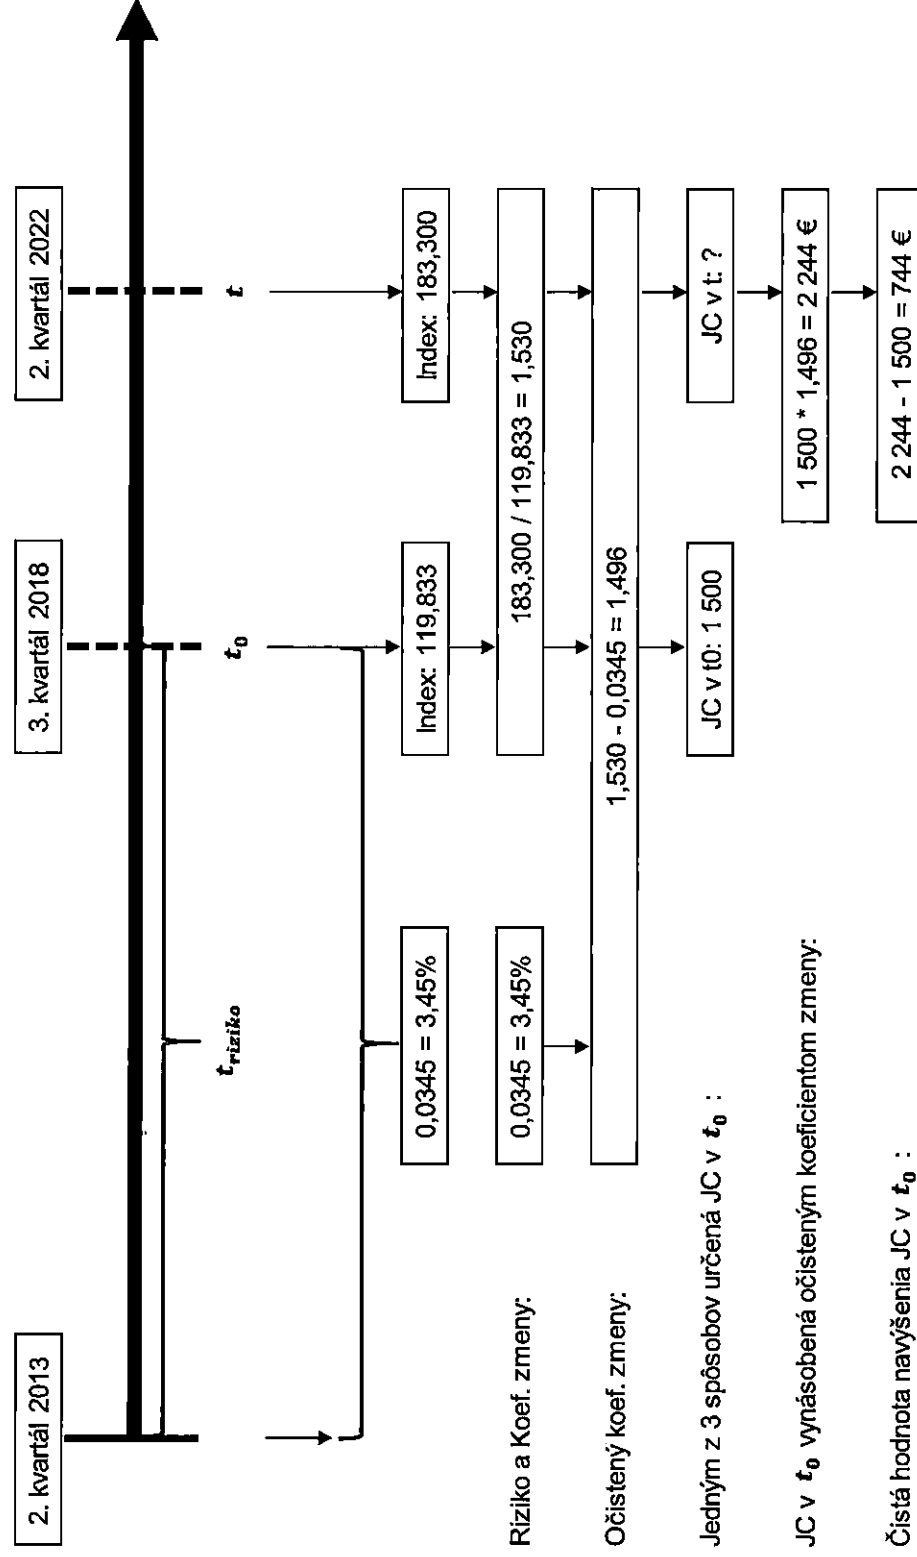

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

VÝPOČET NAVÝŠENIA – VÝPOČTOVÝ SÚBOR EXCEL

Rozhranie predpripraveného automatizovaného výpočtového súboru excel:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		3. kvantál 2021									
2	Kvantál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (M)										
3											
4	Kvantál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (I)	3. kvantál 2022									
5											
6	Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?	Nie									
7	Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)	1,150	15,0%								
8											
9	Materiál:			Hodnota navýšenia JC pôvodnej JC	Množstvo			Celkové navýšenie - Hodnota navýšenia JC * Množstvo	Pôvodná JC * Množstvo	Navýšená JC * Množstvo	
10	08.11 Dekoračné a stavebné karmeny, výpenec, sadzovec, kreda a hrádica	100,00	111,78	11,78	300		3 533	30 000	33 533	0	
11	08.12 Pôrodné piesky		0,00	0,00			0	0	0	0	
12	16.10 Drevo, rozané a hoblované		0,00	0,00			0	0	0	0	
13	16.21 Dýny a drevené panely		0,00	0,00			0	0	0	0	
14	16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesársťva		0,00	0,00			0	0	0	0	
15	19.20 Rafinované ropné produkty	1 100,00	1 958,36	858,36	150		128 754	165 000	293 754	0	
16	22.21 Dnosky, fóie, hadice a profily z plastov		0,00	0,00			0	0	0	0	
17	22.23 Stavebné výrobky z plastov		0,00	0,00			0	0	0	0	
18	23.11 Ploché sklo		0,00	0,00			0	0	0	0	
19	23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla		0,00	0,00			0	0	0	0	
20	23.51 Cement		0,00	0,00			0	0	0	0	
21	23.53 Vápnik a sady		0,00	0,00			0	0	0	0	
22	23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	450,00	492,29	42,29	800		33 829	360 000	393 829	0	
23	24.10 Železo, oceľ a ferózliatiny		0,00	0,00			0	0	0	0	
24	24.20 Rúry, rúčky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele		0,00	0,00			0	0	0	0	
25	24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele		0,00	0,00			0	0	0	0	
26	24.42 Hliník		0,00	0,00			0	0	0	0	
27	24.44 Med a výrobky z medi		0,00	0,00			0	0	0	0	
28	25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	600,00	722,11	122,11	1 000		122 107	600 000	722 107	0	
29	25.93 Dliteľné výrobky, ratáže a pružiny		0,00	0,00			0	0	0	0	
30	26.11 Výroba elektronickej komponentov		0,00	0,00			0	0	0	0	
31	27.30 Káble a káblové zariadenia		0,00	0,00			0	0	0	0	
32											
33											
									288 222	1 155 000	1 443 222

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

VÝPOČET NAVÝŠENIA ZA KONKRÉTNE MATERIÁLY

1. Vyplnenie (výber z ponuky) období „ t_0 “ a „ t “ na výpočet navýšenia
2. Vyplnenie informácie, či zmluva už obsahuje valorizáciu/ indexáciu, spolu s jej hodnotou (bunka C7)

A	B	C	D
1			
2	Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t_0)	3. kvartál 2021	
3			
4	Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)	3. kvartál 2022	
5			
6	Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?	Nie	
7	Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)	1,150	15,0%

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

VÝPOČET NAVÝŠENIA ZA KONKRÉTNE MATERIÁLY

3. Vyplnenie jednotkových cien konkrétnych materiálov v období „t₀“ (stĺpec C) a ich zabudované množstvo (stĺpec G)

A	B	C	D	E	F	G	I
9	Materiál:						
10	08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	100,00	111,78	11,78		300	
11	08.12 Prírodné piesky		0,00	0,00			
12	16.10 Drevo, rezané a hoblované		0,00	0,00			
13	16.21 Dýhy a drevené panely		0,00	0,00			
14	16.23 Ostatné výrobky stavebného stolarstva a tesárstva		0,00	0,00			
15	19.20 Rafinárske ropné produkty	1 100,00	1 958,36	858,36		150	
16	22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov		0,00	0,00			
17	22.23 Stavebné výrobky z plastov		0,00	0,00			
18	23.11 Ploché sklo		0,00	0,00			
19	23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla		0,00	0,00			
20	23.51 Cement		0,00	0,00			
21	23.52 Vápnok a sadra		0,00	0,00			
22	23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	450,00	492,29	42,29		800	
23	24.10 Železo, oceľ a ferozliatiny		0,00	0,00			
24	24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele		0,00	0,00			
25	24.30 Ostatné výrobky pivného spracovania ocele		0,00	0,00			
26	24.42 Hliník		0,00	0,00			
27	24.44 Med a výrobky z medi		0,00	0,00			
28	25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie		0,00	0,00			
29	25.93 Drôtene výrobky, reťaze a pružiny	600,00	722,11	122,11		1 000	
30	26.11 Výroba elektronických komponentov		0,00	0,00			
31	27.30 Káble a káblové zariadenia		0,00	0,00			

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

VÝPOČET NAVÝŠENIA ZA KONKRÉTNE MATERIÁLY

4. Systém následne automaticky vyhledá a pridělí jednotlivé potrebné hodnoty podľa vyplnených časových období, hodnoty valorizácie, materiálov a ich jednotkových cien (dáta hodnôt indexov materiálov od ŠÚ SR)

I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
		Pôvodná JC * Množstvo	Navýšená JC * Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Koeficient zmeny (KZ) indexov medzi obdobiami	Priemerná TR (medzi: ročné dáta)	Riziko	Upravená: zmena medzi obdobiami = KZ - Riziko	Hodnota valorizácie/ indexácie do výpočtu, JC	Výsledný KZ pre navýšenie, JC					
3 533	0	30 000	33 533	136,167	155,167	1,140	2,178%	0,02178	1,118	0,000	1,116					
0	0	0	0	98,833	113,633	1,150	-0,407%	0,00000	1,150	0,000	1,150					
0	0	0	0	171,833	175,900	1,024	1,737%	0,01737	1,006	0,000	1,006					
0	0	0	0	160,200	161,700	1,009	10,185%	0,10185	1,000	0,000	1,000					
0	0	0	0	93,333	121,700	1,304	-2,146%	0,00000	1,304	0,000	1,304					
128 754	0	165 000	293 754	106,733	199,433	1,834	5,383%	0,05383	1,780	0,000	1,780					
0	0	0	0	123,667	149,033	1,205	3,757%	0,03757	1,168	0,000	1,168					
0	0	0	0	130,100	208,167	1,600	5,862%	0,05862	1,541	0,000	1,541					
0	0	0	0	120,600	155,600	1,290	12,467%	0,12467	1,166	0,000	1,166					
0	0	0	0	113,600	113,600	1,000	3,191%	0,03191	1,000	0,000	1,000					
0	0	0	0	114,200	130,600	1,145	3,322%	0,03322	1,112	0,000	1,112					
0	0	0	0	160,900	259,800	1,615	1,853%	0,01853	1,596	0,000	1,596					
33 829	0	360 000	393 829	101,067	114,400	1,132	3,796%	0,03796	1,094	0,000	1,094					
0	0	0	0	153,600	164,233	1,069	9,163%	0,09163	1,000	0,000	1,000					
0	0	0	0	121,633	193,067	1,587	5,262%	0,05262	1,535	0,000	1,535					
0	0	0	0	184,957	236,900	1,292	3,802%	0,03802	1,254	0,000	1,254					
0	0	0	0	136,033	177,667	1,306	2,296%	0,02296	1,283	0,000	1,283					
0	0	0	0	119,067	127,033	1,076	6,066%	0,06066	1,015	0,000	1,015					
122 107	0	600 000	722 107	124,233	154,100	1,240	3,590%	0,03590	1,204	0,000	1,204					
0	0	0	0	121,333	124,600	1,027	1,505%	0,01505	1,012	0,000	1,012					
0	0	0	0	123,633	124,933	1,011	3,046%	0,03046	1,000	0,000	1,000					
0	0	0	0	93,167	105,500	1,132	2,926%	0,02926	1,103	0,000	1,103					
288 222		1 155 000	1 443 222													

Metodický pokyn MDV SR 27/2022

KONTAKT



00993334

64597/2023



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Dúbravská cesta 14
 841 04 Bratislava
 Slovenská republika

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Stavebnotechnický dozor

Duoravska cesta 14
 841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
 6314/30923/2023 (60612/2023)

Naše číslo
 6345/30301/2023

Vybavuje

Dátum
 31.7.2023

STAVBA: DIAĽNICA D3 ŽILINA (BRUDNO) - KYŠUCKÉ NOVO MĚSTO, PRIVÁDZAC
 VEC: UDELENIE SÚHLASU K VYDANIU ROZHODNUTIA STD - DODATOK Č 3
 K ZMLUVE O DIELO - MP 27/2022, OBDOBIE 1Q AŽ 4Q 2022

Zmluva o dielo („Zmluva“): ev. č. Objednávateľa ZM/2021/0520;
 ev. č. Zhotoviteľa 21050630
 Zmluvné podmienky – FIDIC: Červená kniha
 Čl. a podčl. Zmluvy o dielo: 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora
 3.5 Rozhodnutia

V nadväznosti na Vašu žiadosť z listu č. 5884/30921/2023 (60612/2023) zo dňa 26.7.2023 a v zmysle vyššie uvedených článkov Zmluvy Vám udeľujeme písomný súhlas k vydaniu Rozhodnutia podľa podčl. 3.5, vo veci Nároku č. 6 Zhotoviteľa, ktorý obsahuje rozsah na dodatočnú platbu skokovitého a nepredpokladaného nárastu cien stavebných materiálov, v súlade s metodickým pokynom č. 27/2022 MD SR, za obdobie 1Q až 4Q roku 2022.

Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, požiadanie, skúška, alebo podobný úkon Stavebnotechnického dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady.

S pozdravom

Ing. Stanislav Beňo
 člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko Ph.D., MBA
 predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ

Zapísaný v obchodnom registri
 Mestský súd Bratislava III
 oddiel Ss
 vložka číslo 3518/B


IČO 35 915 031
 DIČ 2021937775
 IČ DPH SK 2021937775



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

ZH

64 678 / 2023



Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
6314/30923/2023

Vybavuje

Dátum
9. 8. 2023

STAVBA: D3 ŽILINA (BRODNO) - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, PRIVÁDZAČ
VEC: Nárok Zhotoviteľa č.6 v zmysle MP 27/2022 za obdobie 1Q až 4.Q 2022.

Na základe ZoD, ev.č. Objednávateľa ZM/2021/0520; ev.č. Zhotoviteľa č. 21050630, v zmysle zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom (Červená kniha – FIDIC) v súlade podčl. č.3.1 povinnosti a právomoc stavebného dozora, 3.5 Rozhodnutia a v zmysle súhlasu Objednávateľa list č.6345/30301/2023, reg. č.64597/2023 **vydávam rozhodnutie vo veci Nároku Zhotoviteľa č.6** v nasledovnom znení:

Na základe podkladov predložených Zhotoviteľom schválených Objednávateľom v zmysle MP 27/2022 MD SR má Zhotoviteľ nárok na dodatočnú platbu skokovitého a nepredpokladaného nárastu cien stavebných materiálov v odsúhlasenom rozsahu za obdobie 1Q až 4Q roku 2022.

S pozdravom

Prílohy: - list č.6345/30301/2023, reg. č.64597/2023

Rozdeľovník::

HIS – NDS - bez príloh
- Predstaviteľ Zhotoviteľa - s prílohou:

Zapísaný v obchodnom registri
Mestský súd Bratislava III
oddiel Sa
vložka číslo 3518/B

IČO 35 919 001
DIČ 2021937775
IČ DPH SK 2021937775

Rekapitulácia MP MVD č.27/2022 - "OBDOBIE 2", za rok 2022Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač
Obdobie 0: I.Q.2021

METROSTAV

MP MVD č.27/2022					
Objekt	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál	Spolu 2022
SO 113	- €	15 565 €	41 056 €	38 030 €	94 651 €
SO 231	- €	21 348 €	27 856 €	22 379 €	71 584 €
SO 232	- €	- €	5 855 €	6 983 €	12 837 €
SO 246	- €	27 132 €	29 595 €	20 138 €	76 866 €
SO 276	- €	- €	- €	997 €	997 €
SO 376.1	- €	21 948 €	5 476 €	12 072 €	39 496 €
SO 524	- €	459 €	- €	- €	459 €
SO 543	623 €	88 505 €	39 389 €	- €	128 517 €
SO 591	- €	1 929 €	- €	- €	1 929 €
SO 718-01	- €	13 472 €	- €	- €	13 472 €
SO 729	- €	193 €	- €	- €	193 €
SO 747	- €	286 €	- €	- €	286 €
SO 784	- €	39 €	- €	- €	39 €
SO 790	- €	428 €	- €	- €	428 €
SO 829	- €	23 092 €	137 €	748 €	23 976 €
SO 833	- €	- €	- €	224 €	224 €
	623 €	214 396 €	149 363 €	101 572 €	465 954 €

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke materiálov, prevodmi z rozkladu položiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za Objednávateľa:

Vypracoval:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Predkladá:

Zápis o odsúhlasení nárastu cien materiálov v zmysle MP 27/2022

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

ZÁPIS ČÍSLO 4/2023

o prerokovaní a odsúhlasení nárastu vybraných materiálových komodít v zmysle MP 27/2023 zo dňa

19. 7. 2023

v budove Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Stavba: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač

Prítomní: za Zhotoviteľa -
 za Objednávateľa -

Zástupca Zhotoviteľa predložil výpočet nárastu cien vybraných materiálov v zmysle MP 27/2022 v písomnej aj digitálnej forme na prerokovanie.

Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nárast v období 2 – nárast vplyvom vojny na Ukrajine za rok 2022

Kvartál	Paušálna suma za kvartál
1.Q.2022	623 €
2.Q.2022	214 396 €
3.Q.2022	149 363 €
4.Q.2022	101 572 €

Prílohou zápisu je vyčíslený nárast po jednotlivých stavebných objektoch a kvartáloch príslušného obdobia.

Prerokované Nárasty v zmysle MP 27/2022 je možné fakturovať ~~po~~ ~~schválení~~ Dodatku k Zmluve a so súhlasom príslušných pracovníkov NDS.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

1. kvartál 2021

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

2. kvartál 2022

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Áno

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

1,158 15,8%

Materiál	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC * Množstvo	Navýšená JC * Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výšedný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08-11 Dekoračné a stavebné kameň, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	145,267	0,02322	1,000
08-12 Prírodné piesky	4,80	4,80	0,00	9 619	0	46 181	46 181	99,200	110,533	0,00000	1,000
16-10 Drevo, rezané a hoblované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	193,567	0,00000	1,574
16-21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	164,133	0,12449	1,000
16-23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesársťva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	110,033	0,00000	1,229
19-20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	190,167	0,03924	2,013
22-21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22-23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	167,433	0,06636	1,000
23-11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	155,600	0,18701	1,000
23-19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23-51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	127,133	0,02684	1,000
23-52 Vápnó a sadra	87,69	125,36	38,67	403	15 565	35 300	50 866	138,033	223,533	0,02084	1,441
23-60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	111,867	0,03559	1,000
24-10 Železo, oceľ a ferozliatiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	96,500	186,633	0,06506	1,711
24-20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim; z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	170,000	0,04289	1,324
24-30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	228,900	0,02699	1,449
24-42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,457	183,300	0,00815	1,464
24-44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	133,433	0,02445	1,143
25-11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	143,333	0,05281	1,000
25-93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	125,000	0,01749	1,000
26-11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27-30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,433	0,01177	1,087

"Navýšenie P" 15 565 € 81 482 € 97 047 €

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených množstiev, prevodní z rozkladu množstiev STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za Objednávateľa:

Vypracoval:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

1. kvartál 2021

3. kvartál 2022

Áno

1,186 18,6%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC + Množstvo	Navýšená JC + Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Rozíko	Výsledný JC pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamena, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	155,157	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	4,67	4,67	0,00	0,00	22 573	0	105 417	105 417	99,200	113,633	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	175,900	0,00000	1,479
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	161,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolarstva a lesárstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	121,700	0,00000	1,346
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	169,433	0,03924	2,082
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	149,033	0,01261	1,189
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	208,167	0,06636	1,247
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	155,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	130,800	0,02694	1,000
23.52 Vápnó a sadra	87,69	146,91	59,22	59,22	683	41 056	60 796	101 852	138,033	259,800	0,02084	1,675
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	114,400	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferózlitiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	96,500	164,233	0,06506	1,451
24.20 Rúry, ružky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	193,067	0,04289	1,502
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	238,900	0,02699	1,485
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	177,667	0,00815	1,386
24.44 Meď a výrobky z meďi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,867	127,033	0,02445	1,051
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	164,100	0,05281	1,000
25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,600	124,600	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,933	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,060

"Navýšenie P" 41 056 € 166 213 € 207 269 €

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limite schválených položiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za Objednávateľa:

Vypracoval:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Predkladá:

1. kvartál 2021

4. kvartál 2022

Áno

1,205 20,5%

Kvantál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvantál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšenie JC	Hodnota navýšenia JC	Hodnota navýšenia JC	Množstvo navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC* Množstvo	Navýšenie JC* Množstvo (t)	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
06-11 Dekoračné a stavebné kamene, vápence, sadrovec, krieda a bridlica:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	133,933	154,600	0,02322	1,000
06-12 Prírodné piesky	4,56	4,56	0,00	12,285	0	55 910	55 910	99,200	116,333	0,00000	1,000
16-10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	160,167	0,00000	1,311
16-21 Dřevy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	157,700	0,12449	1,000
16-23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesársťva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	122,267	0,00000	1,536
19-20 Ratařnske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	182,133	0,03924	1,872
22-21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	148,833	0,01261	1,168
22-23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	220,500	0,06636	1,317
23-11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	51,867	0,18701	1,000
23-19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23-51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,867	131,333	0,02694	1,000
23-52 Vápn a sadra	87,69	168,54	78,85	482	38 030	42 282	80 322	138,033	293,300	0,02084	1,889
23-60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	114,400	0,03559	1,000
24-10 Železo, oceľ a feroliatiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98,500	149,433	0,06506	1,279
24-20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	186,067	0,04289	1,421
24-30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	238,900	0,02699	1,476
24-42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	171,300	0,00815	1,310
24-44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,867	130,633	0,02445	1,068
25-11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	147,800	0,05281	1,000
25-93 Drôtané výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	123,333	0,01749	1,000
26-11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	122,167	0,03357	1,000
27-30 Káble a kábové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,041

"Navýšenie P" 38 030 € 98 202 € 136 232 €

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených množstiev a schválenia cenovým oddelením MNS

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za Objednávateľa:

Vypracoval:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Predkladáť

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,158 15,6%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (tč)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ok. áno)

Materiál	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC - Množstvo	Navýšená JC - Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t1)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
06.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenc, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	145,267	0,02922	1,000
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	110,533	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	193,667	0,00000	1,674
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	164,133	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stáročia a tesárska	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	110,033	0,00000	1,229
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	88,087	190,167	0,03924	2,013
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.29 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	197,433	0,06636	1,000
23.11 Ploché sklo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	195,600	0,16701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	127,133	0,02664	1,000
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,033	223,533	0,02084	1,441
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	111,867	0,03659	1,000
24.10 Železo, oceľ a feroliatiny	238,54	408,22	169,68	69	11,741	16,506	28,248	96,500	186,633	0,06506	1,711
24.20 Rúry, ruřny, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	27,09	35,86	8,77	1,050	9,208	28,449	37,657	111,533	170,000	0,04269	1,324
24.20 Rúry, ruřny, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	16,40	21,71	5,31	75	398	1,230	1,628	111,533	170,000	0,04269	1,324
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	228,600	0,02669	1,449
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	183,300	0,00815	1,464
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	133,433	0,02445	1,143
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	143,333	0,05281	1,000
25.99 Dřobené výrobky, rořaze a pruřiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	125,000	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,433	0,01177	1,087
"Navýšenie P"											
21 348 € 46 185 € 67 533 €											

Penový dopa Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limite materiálov, prevodmi z rozkladu položiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Vypracoval:

Predkladáť

Za stavebný dozor:

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:

Kvantita do ktorého spada dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvantita realizácie za ktorej sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Áno 18,6%

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšenie JC	Hodnota navýšenia JC	Hodnota navýšenia JC ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC - Množstvo	Navýšenie JC - Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
06.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	133,933	155,167	0,02322	1,000
06.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	99,200	113,633	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	105,667	175,900	0,00000	1,479
16.21 Dřevy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	130,933	161,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stáťarstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	79,333	121,700	0,00000	1,348
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	86,067	199,433	0,03924	2,092
23.21 Desky, fólie, lišcie a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	107,400	149,033	0,01261	1,189
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,800	208,167	0,06636	1,247
23.11 Ploché sklo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	195,600	0,16701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	77,26	77,26	0,00	253	19,555	19,555	112,567	130,800	0,02654	1,000
23.52 Vápnó a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,033	289,800	0,02084	1,675
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	59,85	59,85	0,00	41	2,430	2,430	114,400	114,400	0,00569	1,000
24.10 Železo, oceť a ferózliatiny	715,62	1,038,24	322,62	31	22,206	32,216	96,800	164,233	0,06506	1,451
24.20 Rúry, tučky, duté profily a prísušensťo k nim, z ocele	23,88	35,84	11,96	1,428	34,068	51,174	111,533	193,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, nítky, duté profily a prísušensťo k nim, z ocele	14,44	21,69	7,25	102	1,473	2,213	111,533	193,067	0,04289	1,502
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	139,900	238,900	0,02699	1,495
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,467	177,667	0,00816	1,388
24.44 Meď a výrobky z meďi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100,667	127,033	0,02445	1,051
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	132,667	154,100	0,05281	1,000
26.99 Dřobené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	106,800	124,600	0,01749	1,000
28.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	124,933	0,00357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,060

"Navýšenie P" 27 856 € 79 732 € 107 688 €

Centový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limítkach položiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa: Za stavebný dozor: Odsúhlasil: Odsúhlasil:

Výpracoval: Odsúhlasil:

Prekladaf

1. kvartál 2021
 4. kvartál 2022
 Áno
 1,205 20,5%

Popis	Pôvodná JC ("Zem")	Navýšenie JC	Hodnota navýšenia pôvodný JC	Hodnota navýšenia ("Navýšenie m")	Pôvodný JC Množstvo	Navýšenie JC Množstvo	Index pôvodný (10)	Index nový (1)	Riziko	Výškový KZ pre navýšenie JC ("m")
iný a stavebné kamene, vápenc, sadrovec, krycia a bobilica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	133,933	154,600	0,02322	1,000
lepníky	4,56	4,56	0,00	0	2 817	2 817	99,200	116,333	0,00000	1,000
rezavé a bobľovité	0,00	0,00	0,00	0	0	0	105,667	160,167	0,00000	1,311
drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	130,933	157,700	0,12448	1,000
Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva	17,45	23,33	5,87	632	1 878	2 509	79,333	122,267	0,00000	1,336
Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva	18,17	24,28	6,11	281	864	1 154	79,333	122,267	0,00000	1,336
aké ropné produkty	0,87	1,62	0,75	4	5	9	86,057	102,133	0,03924	1,072
aké ropné produkty	0,85	1,59	0,74	11	10	18	86,067	102,133	0,03924	1,072
aké ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	107,400	149,833	0,01261	1,168
lacie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,800	220,500	0,06536	1,317
iné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	151,867	0,18701	1,000
opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	113,600	113,600	0,03164	1,000
opracované sklo vrátane technického skla	77,26	77,26	0,00	253	19 555	19 555	112,567	131,333	0,02694	1,000
a sadra	87,69	166,54	78,85	12	1 083	2 657	139,033	293,300	0,02084	1,889
z betónu, cementu a sady	59,85	59,85	0,00	55	3 328	3 328	101,333	114,400	0,03559	1,000
z betónu, cementu a sady	64,20	64,20	0,00	590	37 883	37 883	101,333	114,400	0,03559	1,000
oceľ a ferocelíny	715,52	816,04	100,52	35	24 947	31 883	86,500	149,433	0,06506	1,279
oxy, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	238,54	305,01	66,47	58	13 751	17 583	96,500	149,433	0,06506	1,279
oxy, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	238,54	305,01	66,47	11	2 363	3 279	96,500	149,433	0,06506	1,279
oxy, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	24,76	35,17	10,41	828	20 448	29 047	111,533	186,067	0,04289	1,421
oxy, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	14,99	21,29	6,30	59	884	1 256	111,533	186,067	0,04289	1,421
Výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	139,900	238,900	0,02699	1,476
Výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,467	171,300	0,08815	1,310
konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100,667	130,633	0,02445	1,068
konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	132,667	147,800	0,05261	1,000
Výrobky, reťazce a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	106,800	123,333	0,011749	1,000
elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	122,167	0,03357	1,000
tabľové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,041

"Navýšenie P" 22 379 € 130 017 € 152 396 €

Renový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limite schválených množstiev štandardu STD a schválenia cenovým oddelením NDS:

Za zhotoviteľa: _____
 Vypracoval: _____
 Predkladá: _____
 Za stavebný dozor: _____
 Odsúhlasil: _____
 Za Objedávateľa: _____
 Odsúhlasil: _____

1. kvartál 2021

3. kvartál 2022

Áno

1,186 18,5%

Kvantita do ktorého spadá dátum ukončenia počítania ponuky (t0)

Kvantita realizácie za ktorej sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Material	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia JC	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC* Množstvo	Navýšená JC* Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	155,167	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	113,633	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	151,47	223,97	72,50	2	112	234	348	105,667	175,900	0,00000	1,478
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	161,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	121,700	0,00000	1,348
19.20 Rastlinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	199,433	0,03924	2,092
22.21 Džbky, fólia, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	149,033	0,01261	1,189
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	209,167	0,06636	1,247
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	155,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	130,800	0,02694	1,000
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,033	299,800	0,02084	1,675
23.63 Výrobky z betónu, cementu a sady	50,26	50,26	0,00	29	1418	1418	1418	107,333	114,400	0,05559	1,000
24.10 Železo, oceľ a feroliatiny	715,62	1 038,24	322,62	18	5743	12 738	18 481	96,500	184,233	0,06506	1,451
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a prúsenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	193,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a prúsenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	193,067	0,04289	1,502
24.30 Ostatné výrobky prúseného spojovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	238,900	0,02689	1,495
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	177,667	0,00815	1,386
24.44 Meď a výrobky z meď	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	127,033	0,02446	1,051
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	154,100	0,05281	1,000
25.99 Drotená výroba, reťaze a príslušenstvo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	124,600	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,933	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblivé zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,060

"Navýšenie P" 5 855 € 14 390 € 20 245 €

Penový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených množstiev, prevodmi z rozkladu položiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Vypracoval:

Prekladac

Za stavebný dozor:

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:

Kvantita do končného späť dátumu ukončenia podávania ponuky (t)

Kvantita realizácie za ktorej sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (sk áno)

1. kvartál 2021

4. kvartál 2022

Áno

1,205 20,5%

Material	Pôvodná JC ("C/m³")	Navýšenie JC	Hodnota navýšenia JC (pôvodné JC)	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC - Množstvo	Navýšenie JC - Množstvo	Index pôvodný (t)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
06.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápence, sadrovce, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	154,600	0,02322	1,000
06.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	116,333	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rozané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	160,167	0,00000	1,311
16.21 Dřev a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	197,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného strojárstva a tesárstva	17,45	23,33	5,87	54	319	949	1,268	79,933	122,267	0,00000	1,336
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,87	1,82	0,75	11	8	10	18	86,067	182,133	0,03924	1,872
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,85	1,59	0,74	23	17	19	36	86,067	182,133	0,03924	1,872
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	148,833	0,01261	1,168
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,600	220,500	0,06636	1,317
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	51,867	0,16701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	-0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	131,333	0,02694	1,000
23.52 Vápnin a sadra	87,69	166,54	78,85	12	915	1 017	1 932	138,033	293,300	0,02084	1,899
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	64,20	64,20	0,00	183	0	12 376	12 376	101,333	114,400	0,03569	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferózliatiny	715,62	915,04	199,42	29	5 723	20 538	26 262	96,500	149,433	0,06506	1,279
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	186,067	0,04289	1,421
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	239,900	0,02699	1,476
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	171,300	0,00815	1,310
24.44 Meď a výrobky z meďi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	130,633	0,02445	1,068
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	147,800	0,05281	1,000
25.99 Dřevinné výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,900	123,333	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	122,167	0,00357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,600	0,01177	1,041

"Navýšenie P" 6 983 € 34 910 € 41 892 €

Čenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených množstiev STD a schválenia cenovým oddelením MNE

Za zhotoviteľa: / Za stavebný dozor: / Za Objednávateľa: Odsúhlasil: Odsúhlasil:

Vypracoval: Odsúhlasil:

Prekľádca

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,158 15.8%

10)

(t)

?

(ek. áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("Jcm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia JC	Hodnota JC	Hodnota JC	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC Množstvo	Navýšená JC Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")	
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápennec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	133,933	145,267	0,02322	0,00000	1,000	
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	99,200	110,533	0,00000	0,00000	1,000	
16.10 Drevo, rezané a hobľované	137,64	230,45	92,80	0	48	68	115	105,667	193,567	0,00000	0,00000	1,674	
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	130,933	164,133	0,12448	0,00000	1,000	
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	79,333	110,033	0,00000	0,00000	1,229	
19.20 Refinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	86,087	190,167	0,03924	0,00000	2,015	
22.21 Dvosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	0,00000	1,227	
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,800	167,433	0,06636	0,00000	1,000	
23.11 Ploché sklo	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	155,600	0,16701	0,00000	1,000	
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	0,00000	1,000	
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,567	127,133	0,02694	0,00000	1,000	
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,033	223,533	0,02084	0,00000	1,441	
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	50,26	50,26	0,00	20	0	1,028	1,028	101,333	111,667	0,03559	0,00000	1,000	
24.10 Železo, oceľ a ferrozliatiny	715,62	1,224,66	509,04	53	27,088	38,078	65,164	96,500	186,633	0,06506	0,00000	1,711	
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	170,000	0,04289	0,00000	1,324	
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	139,900	228,600	0,02699	0,00000	1,449	
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,467	183,300	0,00815	0,00000	1,464	
24.44 Meď a výrobky z meďi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100,667	133,433	0,02445	0,00000	1,143	
25.11 Kovové konštrukcie a časť konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	132,667	143,333	0,05281	0,00000	1,000	
25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	108,800	125,000	0,01749	0,00000	1,000	
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	0,00000	1,000	
27.30 Káble a kábové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	83,900	105,433	0,01177	0,00000	1,087	
"Navýšenie P"							27 132 €	39 174 €	66 307 €				

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených množstiev v limitke materiálov, prevodní z rozkladu položiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Vypracov:

Predkladá:

Za stavebný dozor:

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:

1. kvartál 2021

3. kvartál 2022

Áno

1,186 18,6%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navyšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("Zm")	Navýšenie JC	Hodnota JC navyšenia (pôvodný JC)	Množstvo	Hodnota navyšenia ("Navýšenie P")	Pôvodná JC Množstvo	Navýšenie JC Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navyšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kameň, výpenec, sadrovac, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	155,167	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	113,633	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	151,47	223,97	72,50	0	36	75	111	105,687	175,900	0,00000	1,478
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	161,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárska	17,54	23,64	6,10	174	1 062	3 051	4 112	79,333	121,700	0,00000	1,348
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárska	18,25	24,61	6,35	53	338	866	1 302	79,333	121,700	0,00000	1,348
19.20 Rafinované ropné produkty	0,78	1,63	0,85	66	56	51	107	86,067	169,433	0,03924	2,092
19.20 Rafinované ropné produkty	0,79	1,65	0,86	33	28	26	54	86,067	169,433	0,03924	2,092
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	143,033	0,01281	1,189
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	136,800	203,167	0,08638	1,247
23.11 Píselná skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	155,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	139,800	0,02654	1,000
23.52 Vápnik a sánra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	259,800	0,02084	1,875
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	50,28	50,28	0,00	20	0	1 008	1 008	107,333	114,400	0,03359	1,000
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	62,44	62,44	0,00	679	0	42 407	42 407	101,333	114,400	0,03559	1,000
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	68,25	68,25	0,00	29	0	1 946	1 946	101,333	114,400	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a feroliatiny	715,82	1 038,24	322,62	87	28 077	62 280	90 358	96,500	164,233	0,06506	1,451
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	163,067	0,04289	1,502
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,800	238,900	0,02869	1,485
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	177,667	0,00815	1,388
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	127,033	0,02445	1,051
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	154,100	0,05281	1,000
25.93 Drotené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	124,600	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,933	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,060

"Navýšenie P" 29 595 € 111 810 € 141 405 €

cenový dopad bol odsúhlasený na základe schvárených množstiev v limite materiálov, prevodní z rozkladu položiek STD a schvárenia cenovým oddelením NDS

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za Objednávateľa:

Vypracoval:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Prekladá:

1. kvartál 2021
 4. kvartál 2022
 Ano
 1,205 20,5%

Materiál	Převodná JC ("JCov")	Navyšovací JC	Hodnota navyšovacího JC ("Navyšování Pm")	Množstvo navyšování JC	Převodná JC- množstvo	Navyšovací JC- množstvo	Index povodný (I)	Index navyšovací (II)	Riziko	Výsledný IZ pře navyšování JC ("Pm")
08.11 Dekorační a stavební kamena, vápno, sadrovec, křída a hrdlička	0,00	0,00	0,00	0	0	0	103,933	164,600	0,02922	1,000
08.12 Pírodní písky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	99,200	116,333	0,00000	1,000
18.10 Dřevě, rezaně a hoblovaně	192,11	257,84	507,94	33	6,374	8,358	105,667	160,167	0,00000	1,311
16.21 Dříví a dřevěná paňky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	130,933	157,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatní výrobky dřevěného stromatva a těstěna	17,45	23,33	5,87	112	1,946	2,603	79,333	122,267	0,00000	1,336
16.23 Ostatní výrobky stavebního stromatva a těstěna	16,17	24,28	5,11	752	13,656	18,249	79,333	122,267	0,00000	1,336
19.20 Rámcové ropané produkty	0,87	1,62	0,75	12	0	20	66,067	102,133	0,03924	1,872
19.20 Rámcové ropané produkty	0,95	1,59	0,74	24	18	21	86,067	102,133	0,03924	1,872
22.21 Došky, jáde, hadce a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	107,400	146,933	0,01281	1,168
22.23 Stavební výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,800	220,500	0,06636	1,317
23.11 Píchné síky *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	51,967	0,19701	1,000
23.19 Ostatní zpracované síky včetně technického síla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,667	131,333	0,02694	1,000
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	136,033	293,300	0,02084	1,898
23.60 Výrobky z betonu, cementu a sady	62,44	62,44	0,00	73	4,586	4,586	101,333	114,400	0,05559	1,000
23.60 Výrobky z betonu, cementu a sady	64,20	64,20	0,00	202	12,970	12,970	101,333	114,400	0,05559	1,000
23.90 Výrobky z betonu, cementu a sady	68,25	68,25	0,00	48	3,905	3,905	101,333	114,400	0,05559	1,000
23.60 Výrobky z betonu, cementu a sady	2,750,00	2,750,00	0,00	100	275,000	275,000	101,333	114,400	0,05559	1,000
24.10 Železo, oceli a ferorozahy	715,62	615,04	100,42	25	4,949	17,759	95,500	149,433	0,06506	1,276
24.20 Růry, růry, duté profily a příslušenstv k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	111,533	186,067	0,04269	1,421
24.30 Ostatní výrobky prvotního zpracování ocele	1,869,44	2,922,85	342,41	1	1,980	2,923	199,900	238,800	0,02699	1,476
24.30 Ostatní výrobky prvotního zpracování ocele	1,809,69	2,689,36	860,67	1	1,909	2,669	199,900	238,800	0,02699	1,476
24.30 Ostatní výrobky prvotního zpracování ocele	3,767,96	5,661,01	1,793,02	1	1,793	3,766	199,900	238,800	0,02699	1,476
24.30 Ostatní výrobky prvotního zpracování ocele	3,332,30	4,918,00	1,585,70	1	1,586	3,332	199,900	238,800	0,02699	1,476
24.30 Ostatní výrobky prvotního zpracování ocele	2,353,06	3,73,69	1,20,11	1	1,20	2,354	199,900	238,800	0,02699	1,476
24.30 Ostatní výrobky prvotního zpracování ocele	3,424,42	6,053,85	1,926,53	1	1,930	3,424	199,900	238,800	0,02699	1,476
24.42 Hnětk	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,467	171,300	0,00815	1,310
24.44 Měd a výrobky z měd	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100,667	130,633	0,02445	1,068
25.11 Kovové konstrukce a části konstrukce	0,00	0,00	0,00	0	0	0	132,667	147,800	0,05281	1,000
25.53 Dřevěné výrobky, řezané a pňžhy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	108,900	123,333	0,01749	1,000
26.11 Vybava elektrických komponentů	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	122,167	0,03357	1,000
27.30 Kóble a kašunové zařízení	0,00	0,00	0,00	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,041

"Navyšování Pm" 20 138 € 362 297 € 372 436 €

Novovýhod byl odeslán na základě množství v limitech materiálů, převodní z rozkladu položek STP a schválení novým oddělením NDS
 Za zhotovitele: stavební dozor:
 Vypracoval:
 Odeslal:
 Za Objednavatele:

Předkládá:

Kvartál do ktorého spada dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

1. kvartál 2021

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

4. kvartál 2022

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Áno

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak, Áno)

1,205 20,5%

Materiál:	Pôvodná JC ("Jcm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia JC pôvodnej JC	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC * Množstvo	Navýšená JC * Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výšiacny KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoratívne a stavebné kamene, vápno, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	154,600	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	116,333	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	160,167	0,00000	1,311
16.21 Dýhy a drovené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	157,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	78,333	122,267	0,00000	1,336
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	78,333	122,267	0,00000	1,336
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	182,133	0,03824	1,872
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	182,133	0,03924	1,872
22.21 Dvaky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	148,833	0,01281	1,188
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	136,800	220,500	0,06636	1,317
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	51,667	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	77,26	77,26	0,00	29	0	2 204	0	112,567	131,333	0,02694	1,000
23.52 Vápnok a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	136,033	293,300	0,02084	1,899
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	62,44	62,44	0,00	18	0	1 137	0	101,333	114,400	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferózliatiny	715,62	815,04	199,42	5	997	3 579	4 576	96,500	149,433	0,06506	1,279
24.20 Rúry, rúčky, čuté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	186,067	0,04289	1,421
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	236,900	0,02699	1,476
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	171,300	0,00815	1,310
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	130,633	0,02445	1,068
25.11 Kovové konštrukcie a častí konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	147,800	0,05281	1,000
25.93 Dřevěné výrobky, reťaze a púzliny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	123,333	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	122,167	0,00357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,041

"Navýšenie P" 997 € 6 920 € 7 918 €

Centový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limite materiálov, prevodní z povolených odhadov STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za Objednávateľa:

Vypracoval: r

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Predkladá:

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,188 15,8%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (akt.áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC * Množstvo	Navýšená JC * Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08-11 Dekoračné a stavebné kamene, vápence, sadrovce, keráma a bridlice	0,00	0,00	0	0	0	193,933	145,267	0,02322	1,000
08-12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0	0	0	99,200	110,533	0,00000	1,000
16-10 Drevo, rezané a hobľované	0,00	0,00	0	0	0	105,667	193,567	0,00000	1,674
16-21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0	0	0	130,933	164,133	0,12449	1,000
16-23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárstva	0,00	0,00	0	0	0	79,333	110,033	0,00000	1,229
19-20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0	0	0	86,067	190,167	0,03924	2,013
22-21 Dosky, fólia, bridlice a profily z plastov	0,00	0,00	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22-23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0	0	0	138,800	167,433	0,06636	1,000
23-11 Ploché sklo	0,00	0,00	0	0	0	120,600	156,600	0,18701	1,000
23-19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0	0	0	113,600	119,600	0,03184	1,000
23-51 Cement	0,00	0,00	0	0	0	112,567	127,133	0,02694	1,000
23-52 Vápn a sadra	0,00	0,00	0	0	0	198,033	229,533	0,02084	1,441
23-60 Výrobky z bránu, cementu a sady	62,44	62,44	0	865	865	101,333	111,867	0,03559	1,000
24-10 Železo, oceľ a feroliatiny	715,62	1 224,56	509,04	23	16 803	96,500	186,633	0,06506	1,711
24-10 Železo, oceľ a feroliatiny	236,54	408,22	169,68	59	14 052	96,500	186,633	0,06506	1,711
24-20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0	0	0	111,533	170,000	0,04289	1,324
24-30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0	0	0	139,900	228,600	0,02699	1,449
24-42 Hliník	0,00	0,00	0	0	0	112,467	183,300	0,00815	1,464
24-44 Meď a výrobky z medi	0,00	0,00	0	0	0	100,667	133,433	0,02445	1,143
25-11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0	0	0	132,667	143,333	0,05281	1,000
25-93 Drôtové výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0	0	0	106,800	125,000	0,01749	1,000
26-11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27-30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	83,900	109,433	0,01177	1,087

"Navýšenie P" 21 948 € 31 720 € 53 669 €

Nový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených množstiev a prevodmi z rozpisu. Možnosť STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Vypracove

Príkladá:

Za stavebný dozor

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:

Kvartál do ktorého spadá ukončenie podávania ponuky (0)

1. kvartál 2021

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (0)

3. kvartál 2022

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Áno

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ok éno)

1,188 18,5%

Materiál:	Pôvodná JC ("JC/m ³)	Navýšená JC	Hodnota navýšenia JC	Množstvo JC	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC - Množstvo	Navýšená JC - Množstvo	Index pôvodný (0)	Index nový (1)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnenec, sármec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	155,167	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	113,633	0,00000	1,000
16.10 Drevá, rezané a hobované	151,47	223,97	72,50	1	101	211	312	105,667	175,900	0,00000	1,479
16.21 Dřev a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	161,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesársťva	17,54	23,64	6,10	21	129	370	499	79,333	121,700	0,00000	1,346
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesársťva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	121,700	0,00000	1,348
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	88,067	199,433	0,03924	2,092
22.21 Desky, fólia, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	149,033	0,01251	1,189
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	208,167	0,06636	1,247
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,800	155,800	0,18701	1,000
23.19 Ostatná opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,667	130,800	0,02694	1,000
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	259,800	0,02084	1,675
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	50,26	50,26	0,00	20	0	1 016	1 016	101,333	114,400	0,03559	1,000
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	62,44	62,44	0,00	377	0	23 520	23 520	101,333	114,400	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a feroliatiny	715,62	1 038,24	322,62	16	5 248	11 636	16 882	96,500	164,233	0,06506	1,451
24.20 Rúry, rúky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,553	193,067	0,04289	1,502
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	238,900	0,02699	1,485
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	177,667	0,00815	1,388
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	127,033	0,02445	1,051
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	154,100	0,05281	1,000
25.93 Drevené výrobky, reťaze a príchyty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	124,600	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektrických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,933	0,00357	1,000
27.30 Káble a kábové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,060
"Navýšenie P"						5 476 €	36 753 €				
"Navýšenie P"						5 476 €	42 228 €				

Canový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limite schválených položiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor

Za Objednávateľa:

Vypracoval

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Predkladá:

1. kvartál 2021

4. kvartál 2022

Áno 20,5%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obstarávanie zmluva veľorozčítu / indexáciu?

Hodnota koeficientu veľorozčítu / indexácie (ak: Áno)

Material	Pôvodná JC [JCm ³]	Navýšená JC	Hodnota navýšenia JC	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC Množstvo	Navýšená JC Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný IC pre navýšenie JC (Pm)
06.11 Dokončená a staviteľná kamenná, vápencová, sadrová, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	154,600	0,02322	1,000
06.12 Pílničie piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	116,333	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobľované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	160,167	0,00000	1,311
16.21 Dýňy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	157,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného súdružstva a tesárska	17,45	23,33	5,87	278	1618	4811	6430	78,333	122,267	0,00000	1,336
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,87	1,62	0,75	60	45	52	56	66,067	162,133	0,03924	1,872
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,85	1,59	0,74	191	142	162	304	66,067	162,133	0,03924	1,872
19.20 Rafinárske ropné produkty	2,17	4,07	1,90	432	819	939	1759	66,067	162,133	0,03924	1,872
19.20 Rafinárske ropné produkty	2,32	4,33	2,02	6	13	15	28	66,067	162,133	0,03924	1,872
22.21 Dosky, dĺžka, hrúbka a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	148,833	0,01261	1,168
22.23 Staviteľné výrobky z plastov	0,20	0,26	0,06	19	1	4	5	138,800	220,500	0,06636	1,317
22.23 Staviteľné výrobky z plastov	3,88	4,85	1,17	2	2	6	8	138,800	220,500	0,06636	1,317
22.23 Staviteľné výrobky z plastov	7,41	9,76	2,35	1	2	7	9	138,800	220,500	0,06636	1,317
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	51,867	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	131,333	0,02694	1,000
23.52 Vápnica a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	263,300	0,02084	1,899
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	64,20	64,20	0,00	81	0	5173	5173	101,333	114,400	0,03559	1,000
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	68,25	68,25	0,00	9	0	620	620	101,333	114,400	0,03559	1,000
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	72,23	72,23	0,00	176	0	12719	12719	101,333	114,400	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferodiaty	715,62	915,04	199,42	47	9428	39837	43267	96,900	163,433	0,06506	1,279
24.20 Rôly, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	186,067	0,04289	1,421
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,900	238,900	0,02698	1,476
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	171,300	0,00815	1,310
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	130,633	0,02445	1,065
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,967	147,800	0,05281	1,000
25.93 Drôtané výrobky, reťazce a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	123,333	0,01743	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	122,167	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,041

"Navýšenie P" 12 072 € 58 346 € 70 418 €

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke materiálov, prevodní z kľúčik, možnosť STP a schválenia cenovým oddelením N+...

Vypracoval:

Uspasli:

Odsúhlasil:

Pracovník

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,158 15,8%

Kvartál do ktorého spada dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Material:	Pôvodná JC ("JC/m ³ ")	Navýšenie JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC* Množstvo	Navýšená JC* Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
06.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenc, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	145,257	0,02322	1,000
06.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	110,533	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	137,64	230,45	92,80	0	26	39	85	105,667	193,587	0,00000	1,674
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	164,133	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesársťva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	110,033	0,00000	1,229
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	180,167	0,03924	2,013
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,900	167,433	0,06636	1,000
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	156,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	127,133	0,02694	1,000
23.52 Vápeno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	223,533	0,02084	1,441
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	50,26	50,26	0,00	145	0	0	0	101,333	111,867	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferózliatiny	715,62	1.224,66	509,04	1	433	608	1.041	96,500	186,633	0,06506	1,711
24.20 Rúry, nůry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	183,300	0,00815	1,464
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	133,433	0,02445	1,143
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	143,333	0,05281	1,000
25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	125,000	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,433	0,01177	1,087

"Navýšenie P" 459 € 7 924 € 8 383 €

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitek schválených položiek STD a schválenia cenovým oddelením H96.

Za zhotoviteľa:

Vypracoval:

Za stavebný dozor:

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:

Predkladá:

1. kvartál 2021

1. kvartál 2022

Áno

1,098 9,8%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Množstvo navýšenia ("Navýšenie Pm")	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC * Množstvo	Navýšená JC * Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,333	145,000	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	105,493	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	166,067	0,00000	1,474
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	146,233	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolarstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	89,333	0,00000	1,154
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	136,633	0,03924	1,450
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	322,37	350,70	28,33	22	623	7 092	7 715	107,400	128,700	0,01261	1,088
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	152,900	0,06636	1,000
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	155,600	0,18701	1,005
23.18 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	118,733	0,02694	1,000
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	212,600	0,02084	1,422
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	108,700	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferostaliary	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	96,500	164,033	0,06506	1,537
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k rúm, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	159,367	0,04289	1,288
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	217,333	0,02599	1,429
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	166,433	0,00815	1,374
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	125,500	0,02445	1,124
25.11 Kovová konštrukcia a železná konštrukcia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	134,367	0,02521	1,000
25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	122,900	0,01749	1,035
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	123,867	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	100,500	0,01177	1,088
"Navýšenie P"						623 €	7 092 €	7 715 €			

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitike schválených položiek STD a schválenia cenovým oddelením JBS.

Za zhotoviteľa:

Vypracoval:

Predkladá:

Za stavebný dozor:

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (Q)

Kvartál realizácie za ktorý sa počítva zľavať o navýšenie (t)

Odstupujú zmluva valorizáciu / indexáciu?

Počítava klasifikáciu valorizácie / indexácie (ak áno)

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,15% 15,6%

Materiál:	Převodě navýšenie JC ("Cm")	Hodnota navýšenie JC převodě JC	Množstvo	Hodnota navýšenie JC ("Navýšenie Pm")	Převodě JC Množstvo	Navýšenie JC Množstvo	Index nový (t)	Index převodě (t)	Riziko	Výsledný Kč převodě navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, výpenos, sadrovos, křídca a bidlica	0,00	0,00	0	0	0	0	145,287	0,02322	0,00000	1,000
08.12 Přirodné plestky	0,00	0,00	0	0	0	0	110,533	0,00000	0,00000	1,000
16.10 Dřevó, rezaná a nabováň	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	0,00000	0,00000	1,000
16.21 Dřevó a dřevéně paněly	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	0,12449	0,00000	1,000
18.23 Ostatné výroby stavebního střešního a řezání	0,00	0,00	0	0	0	0	110,000	0,00000	0,00000	1,000
19.20 Rámcové ropné produkty	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	0,03924	0,00000	2,019
22.21 Dřevó, řezání, řezání a profily z plestev	46,84	59,83	11,09	121	5,910	7,251	150,067	0,01261	0,00000	1,227
22.21 Dřevó, řezání, řezání a profily z plestev	386,30	474,00	87,70	22	1,929	10,438	107,400	0,01261	0,00000	1,227
22.23 Stavební výrobky z plestev	0,00	0,00	0	0	0	0	136,800	0,06636	0,00000	1,000
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0	0	0	0	120,800	0,18701	0,00000	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	0,03184	0,00000	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0	0	0	0	112,667	0,02894	0,00000	1,000
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0	0	0	0	136,033	0,02084	0,00000	1,441
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	0,03559	0,00000	1,000
24.10 Železo, oceť a ferrozlitiny	0,00	0,00	0	0	0	0	86,500	0,06508	0,00000	1,711
24.20 Růry, nůry, duté profily a příslušenstvo k nim, z ocele	2 610,12	3 454,97	844,85	16	12,673	39 182	170,000	0,04289	0,00000	1,324
24.20 Růry, nůry, duté profily a příslušenstvo k nim, z ocele	2 516,59	3 331,17	814,58	1	815	3 331	170,000	0,04289	0,00000	1,324
24.20 Růry, nůry, duté profily a příslušenstvo k nim, z ocele	3 010,51	3 894,96	974,45	7	6 821	21 074	170,000	0,04289	0,00000	1,324
24.20 Růry, nůry, duté profily a příslušenstvo k nim, z ocele	2 181,87	2 884,11	702,24	80	56 459	231 448	170,000	0,04289	0,00000	1,324
24.20 Růry, nůry, duté profily a příslušenstvo k nim, z ocele	189,26	255,80	69,55	40	2 602	10 232	170,000	0,04289	0,00000	1,324
24.20 Růry, nůry, duté profily a příslušenstvo k nim, z ocele	2 634,31	3 487,00	852,69	2	1 705	6 874	170,000	0,04289	0,00000	1,324
24.20 Růry, nůry, duté profily a příslušenstvo k nim, z ocele	2 731,84	3 615,83	884,19	3	2 653	10 947	170,000	0,04289	0,00000	1,324
24.20 Růry, nůry, duté profily a příslušenstvo k nim, z ocele	2 418,82	3 207,89	782,97	2	1 588	6 404	170,000	0,04289	0,00000	1,324
24.30 Ostatné výroby prvotního zpracování ocele	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	0,02899	0,00000	1,449
24.30 Ostatné výroby prvotního zpracování ocele	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	0,02899	0,00000	1,449
24.42 Hliník	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	0,00915	0,00000	1,464
24.44 Měď a výrobky z mědi	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	0,02445	0,00000	1,149
25.11 Kovové konstrukce a další konstrukce	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	0,06281	0,00000	1,000
25.99 Dřevé výroby, řezání a průmysl	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	0,01749	0,00000	1,000
28.11 Výroba elektronických komponentů	0,00	0,00	0	0	0	0	120,800	0,03357	0,00000	1,000
27.30 Káblové a káblové zařízení	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	0,01177	0,00000	1,087

"Navýšenie P" 88 505 € 277 731 € 366 236 €

Čenný dopad byl odsouhlasený na základě schválených množství v limitech mateřských, převodní z rozkřídlení, položek STD a schválená čenných oddělení NDS.

Za zhotovitele:

Vypracováno

Předkládá

Za stavební dozor:

Odsouhlasil:

Za Objednatelce:

Odsouhlasil:

1. kvartál 2021

3. kvartál 2022

Áno

1,186 18,6%

Kopie do ktorého spadá účtom ukončenia podávania ponuky (10)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (1)

Osobitné známe rizikozáťaž / rizikozáťaž?

Hodnota konštanty variácie / indexácie (ak áno)

Materiál	Pôvodná JC [Jcm ³]	Navýšená JC	Hodnota navýšenia JC ("navýšenie Pm")	Hodnota navýšenia JC ("navýšenie Pm")	Pôvodná JC	Navýšená JC	Index: množstvo (10)	Index: množstvo (10)	Index: nový (1)	Ružo	Výsledný KZ pre navýšenie JC [Pm]
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, výpanec, štrkovec, kieda a briedka	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	131,313	131,313	155,167	0,2222	1,000
08.12 Pírodní piesky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	99,200	99,200	113,633	0,0000	1,000
18.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	105,087	105,087	175,900	0,0000	1,479
18.21 Dřevy a dřevné panely	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	130,933	130,933	161,700	0,12449	1,000
18.23 Střápané výrobky stavebného súdržného izolácie a izolácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	78,333	78,333	121,700	0,0000	1,349
19.20 Rukavice tepné produkty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	89,067	89,067	189,433	0,03924	2,092
22.21 Dosky, fóie, lišta a profily z plastov	35,20	41,55	6,65	20	133	704	107,400	107,400	149,033	0,07981	1,169
22.21 Dosky, fóie, lišta a profily z plastov	0,08	0,07	0,01	10	52	62	107,400	107,400	149,033	0,07281	1,189
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	138,000	138,000	208,167	0,06636	1,247
23.11 Píchné sáto	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	120,000	120,000	155,600	0,18701	1,000
23.18 Oštiepné spracované sáto vrátane lechtáčikového sáka	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	113,600	113,600	113,600	0,03164	1,000
23.31 Cement	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	112,567	112,567	130,800	0,02694	1,000
23.32 Vápno a sátra	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	139,033	139,033	259,600	0,02084	1,675
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sádry	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	101,333	101,333	114,400	0,03659	1,000
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sádry	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	101,333	101,333	114,400	0,03659	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferózny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	96,500	96,500	164,233	0,08906	1,451
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	182,35	243,97	162,35	20	1,630	3,247	111,533	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	2,330,12	3,800,92	1,270,41	2	2,541	5,960	7,601	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	2,650,83	3,981,94	1,331,02	6	7,966	15,905	23,911	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	81,25	137,06	45,82	2	62	182	274	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	2,290,27	3,452,26	1,153,99	6	9,232	18,368	27,616	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	2,650,83	3,981,94	1,331,02	6	7,966	15,905	23,911	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	1,821,18	2,883,85	984,66	14	13,565	28,897	40,422	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	2,666,37	4,305,61	1,439,24	1	1,439	2,868	4,306	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	170,18	253,60	85,44	6	613	1,021	1,534	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	2,482,32	3,698,68	1,236,38	1	1,236	2,462	3,699	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	2,134,83	3,298,75	1,071,92	1	1,072	2,185	3,207	111,533	183,067	0,04289	1,502
24.30 Osobné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	139,000	139,000	238,900	0,02889	1,495
24.42 Hlinik	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	112,467	112,467	177,687	0,06915	1,368
24.44 Mied a výrobky z mied	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	109,667	109,667	127,033	0,02445	1,051
25.11 Kovové konštrukcie a čisti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	132,687	132,687	154,100	0,05281	1,000
25.93 Dřevné výrobky, reťazce a príručky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	192,000	192,000	124,600	0,07749	1,000
26.11 Výroba elektrických komponentov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	120,600	120,600	124,833	0,03357	1,000
27.20 Účele a tabľové zaradenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	83,900	83,900	105,500	0,01177	1,069

Navýšenie P 39 389 € 78 918 € 118 307 €

Cenový dopad bol odúčtovaný na základe schválených množstiev v limite materiálov, prevodní zpráva... a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa: / Za stavebný dozor: / Odsúhlasil: / Za objednávateľa:

Vpracoval: / Odsúhlasil:

Príloha:

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,158 15,8%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia JC pôvodnej JC	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pri")	Pôvodná JC Množstvo	Navýšená JC Množstvo	Index pôvodný (t)	Index nový (t)	Riziko	Výskedy JC pre navýšenie JC (ppm)
08.11 Dokračné a stavebné kamene, vápence, sadrovec, krieda a bičica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	145,267	0,02322	1,000
08.12 Priedné piesky	4,80	4,80	0,00	105	0	503	503	98,200	110,533	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hoblované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,567	193,567	0,00000	1,874
16.21 Dvhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	164,133	0,12449	1,000
18.23 Ostatné výroby stavebného stávkova a tesárska	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	78,333	110,033	0,00000	1,229
19.20 Rafinované ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	180,167	0,03924	2,013
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	4,99	6,12	1,13	3	3	15	15	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	11,28	13,84	2,56	3	8	42	42	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	35,33	43,35	8,02	2	16	87	87	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,900	167,433	0,06636	1,000
23.11 Plicité sklo*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	155,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,587	127,133	0,02894	1,000
23.52 Vápnno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	223,533	0,02084	1,441
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	111,867	0,03359	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferozitiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	96,500	166,633	0,06506	1,711
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	8,70	12,64	3,14	5	16	48	48	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	103,14	136,52	33,38	5	167	516	516	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	57,87	76,60	16,73	4	75	231	231	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	21,00	27,79	6,80	4	27	84	84	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	15,42	20,41	4,99	6	30	93	93	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	56,10	74,25	18,16	87	1,887	4,903	6,490	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.30 Ostatné výroby průmyslného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	163,300	0,00815	1,464
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,567	133,433	0,02445	1,145
25.11 Kovové konštrukcie a oceľ konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	143,333	0,06281	1,000
25.83 Dĺžkové výrobky, reťazce a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	125,000	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,433	0,01177	1,087

"Navýšenie P" 1 929 € 6 497 € 8 426 €

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených množstiev, prevodní z rozkladu množiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za Objedávateľa:

Vypracoval:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Predkladá:

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,158 15,8%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia JC pôvodnej JC	Množstvo navýšenia	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC* Množstvo	Navýšená JC* Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	145,267	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	110,533	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	193,567	0,00000	1,874
16.21 Dýny a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	164,133	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	110,033	0,00000	1,229
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	190,167	0,03924	2,013
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,29	0,29	0,00	2	0	1	1	138,800	167,433	0,06636	1,000
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,33	0,33	0,00	2	0	1	1	138,800	167,433	0,06636	1,000
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	155,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	127,133	0,02694	1,000
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	223,533	0,02084	1,441
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	111,867	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a feroliatiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	96,500	186,633	0,06506	1,711
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	22,75	30,11	7,36	2	15	45	60	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	21,28	28,17	6,89	2	14	43	56	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1 762,52	2 554,59	792,07	4	3 188	7 050	10 218	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	52,02	75,40	23,38	24	561	1 248	1 810	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	132,71	192,35	59,64	2	119	265	385	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	17,52	25,39	7,87	2	16	35	51	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	7,64	11,08	3,44	1	3	8	11	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	7,74	11,21	3,48	1	3	8	11	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	9,67	14,01	4,35	1	4	10	14	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	9,77	14,16	4,39	1	4	10	14	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	5,61	8,13	2,52	2	5	11	16	139,900	228,600	0,02699	1,449

24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	5,70	8,27	2,56	2	5	11	17	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	21,33	30,91	9,58	16	163	341	495	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	31,00	44,94	13,93	4	56	124	180	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	17,95	26,02	8,07	4	32	72	104	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	18,45	26,74	8,29	6	50	111	160	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	8,30	12,03	3,73	4	15	33	48	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	10,94	15,85	4,91	4	20	44	63	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,24	1,79	0,56	148	82	183	265	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,36	1,97	0,61	24	15	33	47	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	2,04	2,96	0,92	16	15	33	47	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,98	2,87	0,89	28	25	55	80	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,12	0,18	0,05	12	1	1	2	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,24	0,35	0,11	12	1	3	4	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,46	2,11	0,65	16	10	23	34	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	4,25	6,16	1,91	28	54	119	173	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	3,45	4,99	1,55	188	291	648	939	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,170	16,95	5,26	9	47	105	153	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,40	0,58	0,18	8	1	3	5	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	31,62	45,82	14,21	2	28	63	92	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	86,70	125,66	38,96	4	156	347	503	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	4,63	6,71	2,08	2	4	9	13	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	12,94	18,76	5,82	2	12	26	38	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	42,45	61,52	19,08	1	19	42	62	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	42,45	61,52	19,08	35	668	1 486	2 153	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	42,67	61,84	19,17	60	1 150	2 560	3 711	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	22,41	32,47	10,07	1	10	22	32	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	31,62	45,82	14,21	2	28	63	92	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	11,70	16,95	5,26	15	79	175	254	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	11,30	16,37	5,08	20	102	226	327	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	60,23	87,30	27,07	3	81	181	262	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	39,10	56,67	17,57	8	141	313	453	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	41,90	60,73	18,83	4	75	168	243	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	226,78	328,70	101,92	4	408	907	1 315	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	238,49	345,66	107,17	4	429	954	1 383	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	17,31	25,09	7,78	4	31	69	100	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	18,81	27,26	8,45	4	34	75	109	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	20,61	29,87	9,26	4	37	82	119	139,900	228,600	0,02699	1,449

24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	22,41	32,47	10,07	3	30	67	97	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	24,12	34,96	10,84	4	43	96	140	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	228,09	330,60	102,50	4	410	912	1 322	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,12	0,17	0,05	48	3	6	8	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	103,11	149,44	46,34	4	185	412	598	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	19,13	27,73	8,60	4	34	77	111	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	19,13	27,73	8,60	8	69	153	222	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	12,97	18,80	5,83	8	47	104	150	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	38,31	55,53	17,22	12	207	460	666	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	280,19	406,11	125,92	16	2 015	4 483	6 498	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	10,06	14,57	4,52	16	72	161	233	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	5,92	8,58	2,66	16	43	95	137	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	7,14	10,35	3,21	8	26	57	83	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,73	2,51	0,78	44	34	76	110	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,49	0,71	0,22	8	2	4	6	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	3,00	4,35	1,35	18	24	54	78	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	6,26	9,07	2,81	1	3	6	9	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	6,35	9,21	2,85	1	3	6	9	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	9,40	13,62	4,22	2	8	19	27	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	5,64	8,18	2,54	24	61	135	196	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	13,39	19,41	6,02	16	96	214	311	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	15,21	22,04	6,83	1	7	15	22	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	15,21	22,04	6,83	1	7	15	22	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	15,21	22,04	6,83	1	7	15	22	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	15,21	22,04	6,83	1	7	15	22	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	15,21	22,04	6,83	1	7	15	22	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	15,21	22,04	6,83	1	7	15	22	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	3,72	5,38	1,67	2	3	7	11	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	4,83	7,00	2,17	2	4	10	14	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	8,15	11,81	3,66	8	29	65	94	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	5,11	7,41	2,30	8	18	41	59	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	35,45	51,38	15,93	4	64	142	206	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	35,45	51,38	15,93	4	64	142	206	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	183,300	0,00815	1,464
24.44 Med' a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	133,433	0,02445	1,143

25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	132,687	143,333	0,05281	1,000
25.93 Drotené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	106,800	125,000	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	29,05	31,59	2,53	8	20	232	253	253	253	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	28,78	31,29	2,51	2	5	58	63	63	63	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	4,89	5,10	0,41	88	36	412	448	448	448	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	25,13	27,32	2,19	12	26	302	328	328	328	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	22,61	24,58	1,97	4	8	90	98	98	98	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	60,05	65,29	5,24	8	42	480	522	522	522	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,19	0,21	0,02	8	0	2	2	2	2	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,42	0,46	0,04	132	5	56	61	61	61	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	36,74	39,95	3,21	1	3	37	40	40	40	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	36,76	39,97	3,21	1	3	37	40	40	40	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	20,92	22,75	1,83	2	4	42	45	45	45	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	17,87	19,42	1,56	14	22	250	272	272	272	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	95,25	103,55	8,31	4	33	381	414	414	414	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	1,99	2,16	0,17	10	2	20	22	22	22	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	7,01	7,62	0,61	10	6	70	76	76	76	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	13,81	15,02	1,21	4	5	55	60	60	60	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	144,56	157,17	12,61	12	151	1 735	1 886	1 886	1 886	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	1 635,65	1 778,36	142,71	4	571	6 543	7 113	7 113	7 113	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	9,19	9,99	0,80	689	552	6 330	6 882	6 882	6 882	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a káblové zariadenia	19,24	20,92	1,68	28	47	539	586	586	586	83,900	105,433	0,01177	1,087

"Navýšenie P" 13 472 € 44 242 € 57 714 €

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených položiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za Objednávateľa:

Vypracoval:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Prekladá:

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,188 15,9%

Kvartál do ktorého späť dátum ukončenia počítania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Množstvo navýšenia ("Navýšenie Pm")	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC * Množstvo	Navýšená JC * Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamenné, vápencové, sadrové, keramické a brázdové	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,833	145,267	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	4,80	4,80	0,00	8	0	38	0	99,200	110,533	0,00000	1,000
18.10 Drevo, rezané a hobľované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	193,567	0,00000	1,674
18.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,833	164,133	0,12449	1,000
18.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesársťva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	110,033	0,00000	1,229
19.20 Rafinárstvo ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	88,067	100,167	0,03924	2,013
22.21 Dnosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.21 Dnosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	187,433	0,06636	1,000
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,800	155,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,800	113,800	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	127,133	0,02694	1,000
23.52 Vápnik a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	223,533	0,02084	1,441
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	50,26	50,26	0,00	10	0	523	0	101,333	111,867	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferózliatiny	715,62	1 224,66	509,04	0	193	272	465	96,500	185,633	0,06506	1,711
24.20 Rúry, nůry, otv. profily a prúsenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,800	228,600	0,02699	1,449
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	183,300	0,00815	1,464
24.44 Meď a výrobky z meďi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	133,433	0,02445	1,143
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	143,333	0,05281	1,000
25.83 Drotené výrobky, reťazce a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	125,000	0,01749	1,000
28.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,433	0,01177	1,087

"Navýšenie P" 193 € 833 € 1 026 €

Genový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených, prevodmi z rozkladu položiek STD a schválenia cenovým oddelením Np.

Za zhotoviteľa:

Vypracov:

Príklad

Za stavebný dozor:

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,158 15,8%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmlúva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ek áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšenie JC	Hodnota navýšenia JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Množstvo navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC Množstvo	Navýšenie JC Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")	
06.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	133,933	145,267	0,02322	1,000	
06.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	89,200	110,533	0,00000	1,000	
16.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	103,587	193,587	0,00000	1,674	
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	130,933	184,133	0,12449	1,000	
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	78,333	110,033	0,00000	1,229	
18.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	86,067	190,167	0,03924	2,013	
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	107,400	150,067	0,01281	1,227	
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,800	187,433	0,06638	1,000	
23.11 Ploché sklo*	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	195,600	0,18701	1,000	
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000	
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,567	127,133	0,02584	1,000	
23.52 Vápeno a sadra	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,033	223,533	0,02084	1,441	
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	101,333	111,867	0,03559	1,000	
24.10 Železo, oceľ a ferrozliatiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	96,500	186,633	0,06506	1,711	
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	111,533	170,000	0,04289	1,324	
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	139,900	228,600	0,02699	1,449	
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,467	183,300	0,00015	1,464	
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100,667	133,433	0,02445	1,143	
25.11 Kovová konštrukcia a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	132,667	143,333	0,05281	1,000	
25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	106,800	125,000	0,01749	1,000	
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000	
27.30 Káble a káblové zariadenia	7,91	8,60	0,69	415	286	3 283	3 570	83,900	105,433	0,01177	1,087	
					"Navýšenie P"	285 €	3 283 €	3 570 €				

Nový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limite materiálov, prevodní z rozkladu-paložíet STD a schválenia cenovým oddelením NDS-

Za zhotoviteľa:

Vypracoval:

Predkladá:

Za stavebný dozr

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

1. kvartál 2021

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

2. kvartál 2022

Obsahuje zmluva valorizáciu / Indexáciu?

Áno

Hodnota koeficientu valorizácie / Indexácie (ak áno)

1,158 15,8%

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia pôvodnej JC	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC Množstvo	Navýšená JC Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekorácie a stavebné kamene, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	145,267	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	99,200	110,533	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobľované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	193,567	0,00000	1,674
16.21 Dyhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	164,133	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stoliárstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	110,033	0,00000	1,229
19.20 Rafinárske ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	190,167	0,03924	2,013
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	167,433	0,06636	1,000
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	155,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	127,133	0,02594	1,000
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	223,533	0,02084	1,441
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	51,23	51,23	0,00	1	0	71	71	101,333	111,867	0,03559	1,000
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	111,867	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferózialny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	96,500	186,633	0,06506	1,711
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	183,300	0,00815	1,464
24.44 Meď a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	133,433	0,02445	1,143
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	143,333	0,05281	1,000
25.93 Dřlené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	125,000	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27.30 Káble a kábové zariadenia	7,35	7,99	0,64	40	26	294	319	83,900	105,433	0,01177	1,087
27.30 Káble a kábové zariadenia	1,35	1,46	0,12	114	13	153	167	83,900	105,433	0,01177	1,087

"Navýšenie P" 39 € 518 € 557 €

Cenový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitek množstiev v limitek položiek STD a schválenia cenovým oddelením JBA

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor

Za Objedávateľa

Výpracov:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil

Predklad:

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,158 15,8%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Material:	Pôvodná J.C ("J/Cm")	Navýšenie J.C	Hodnota navýšenia pôvodnej J.C	Množstvo	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná J.C* Množstvo	Navýšenie J.C* Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie J.C ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	145,287	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	4,80	4,80	0,00	72	0	346	346	99,200	110,533	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hoblované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	183,567	0,00000	1,674
18.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	164,133	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a točárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,333	110,033	0,00000	1,229
19.20 Ražňárske rosné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	180,167	0,03924	2,019
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	167,433	0,06636	1,000
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,900	155,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	127,133	0,02694	1,000
23.52 Vápeno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	223,533	0,02084	1,441
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	50,26	50,26	0,00	17	0	850	850	101,333	111,867	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferrozliatiny	715,62	1 224,66	509,04	1	260	365	625	96,500	168,633	0,06506	1,711
24.20 Rúry, rúry, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	170,000	0,04289	1,324
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	183,300	0,00815	1,464
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,867	133,433	0,02445	1,143
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,867	143,393	0,05281	1,000
25.93 Dĺžkové výrobky, reťazce a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	125,000	0,01748	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	7,91	8,60	0,69	244	168	1 930	2 099	83,900	105,433	0,01177	1,087

"Navýšenie P" 428 € 3 481 € 3 919 €

Cenový dopad bol podčiarknutý na základe schvárených množstiev v limitke schvárených množstiev z rozkladu položiek STD a schvárenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Vypracoval:

Predkladá:

Za stavebný dozor:

Odstúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odstúhlasil:

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmlúva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

1. kvartál 2021

2. kvartál 2022

Áno

1,158 15,8%

Materiál:	Pôvodná JC (t-Cm ³)	Navýšenie JC	Hodnota JC navyšenia (t-Cm ³)	Množstvo navyšenia ("Navýšenie Pm ³ ")	Hodnota navyšenia ("Navýšenie Pm ³ ")	Pôvodná JC - Množstvo	Navýšenie JC - Množstvo (t)	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm ³ ")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápence, sadrovce, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	146,267	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	4,80	4,80	0,00	454	0	2 180	2 180	99,200	110,533	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hoblované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	193,667	193,667	0,00000	1,674
16.21 Dřevy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	164,133	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného státnstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,933	110,033	0,00000	1,223
19.20 Rafinované ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	190,167	0,03924	2,013
22.21 Disky, fólie, hradiče a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	150,067	0,01261	1,227
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,600	167,433	0,06636	1,000
23.11 Ploché sklo*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	155,600	0,16701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	127,133	0,02654	1,000
23.52 Vápnó a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	223,533	0,02084	1,441
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	111,667	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferrozliatiny	715,62	1 224,66	509,04	1 462	462	650	1 112	96,600	186,633	0,06506	1,711
24.10 Železo, oceľ a ferrozliatiny	238,54	408,22	169,68	132	22 422	31 522	53 944	96,500	186,633	0,06506	1,711
24.10 Železo, oceľ a ferrozliatiny	238,54	408,22	169,68	1	207	291	488	96,500	186,633	0,06506	1,711
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	111,533	170,600	0,04289	1,324
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	139,900	228,600	0,02699	1,449
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	183,300	0,00815	1,464
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	193,433	0,02445	1,143
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	43,41	43,41	0,00	42	0	1 841	1 841	132,667	143,333	0,05281	1,000
25.93 Dřevné výrobky, reťaze a ručníky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,900	125,000	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	124,900	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,433	0,01177	1,087
"Navýšenie P"						23 092 €	36 483 €				
"Navýšenie P"						23 092 €	59 575 €				

Penový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limite schválených položiek STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Za stavebný doz:

Za objednávateľa:

Vypracoval:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Predkladá:

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t0)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (tak, ako)

1. kvartál 2021

3. kvartál 2022

Áno

1,186 18,8%

Material:	Pôvodná JC ["JCm ³ "]	Navýšenie JC	Hodnota navýšenia JC pôvodnej JC	Hodnota množstvo navýšenia ["Navýšenie Pm ³ "]	Pôvodná JC* Množstvo	Navýšenie JC* Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ["Pm ³ "]
06.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnenec, sadrovec, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	133,933	155,167	0,22322	1,000
06.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	0	0	0	99,200	113,633	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	105,667	175,900	0,00000	1,475
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	130,933	161,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolařstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	79,333	121,700	0,00000	1,348
19.20 Rafinované ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	86,067	199,433	0,03924	2,092
19.20 Rafinované ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	86,067	199,433	0,03924	2,092
22.21 Dvosky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	107,400	149,033	0,01281	1,189
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,800	208,167	0,06636	1,247
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	155,600	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,667	130,800	0,02694	1,000
23.52 Vápnik a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	138,033	259,600	0,02084	1,675
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	101,333	114,400	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferrozliatiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	96,600	164,233	0,06506	1,451
24.20 Rúry, kúby, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	28,60	42,95	14,36	5	143	215	111,533	193,067	0,04289	1,502
24.30 Ostatná výroba prvotného spracovania ocele	23,83	35,62	11,79	5	119	178	139,900	238,900	0,02689	1,495
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,17	1,75	0,58	10	12	18	139,900	238,900	0,02689	1,495
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	112,467	177,667	0,00815	1,388
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100,667	127,033	0,02445	1,051
25.11 Kované konštrukcie a čalun konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	132,667	154,100	0,05281	1,000
25.93 Drôtované výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	106,600	124,600	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	120,600	124,933	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	89,900	106,900	0,01177	1,060
"Navýšenie P"										
					137 €	274 €			410 €	

Penový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených množstiev STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za Objednávateľa:

Vypracoval:

Odsúhlasil:

Odsúhlasil:

Príloha

1. kvartál 2021

4. kvartál 2022

Áno

1,205 20,5%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva valorizáciu / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("Jcm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia navýšenia pôvodnej JC	Množstvo ("Navýšenie Pm")	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Pôvodná JC* Množstvo	Navýšená JC* Množstvo	Index pôvodný (t)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný JC pre navýšenie ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápnenec, sadrovce, krieda a bridlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133,933	154,600	0,02922	1,000
08.12 Prírodné piesky	0,00	0,00	0,00	313	0	0	0	99,200	116,333	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hobľované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105,667	150,167	0,00000	1,311
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	130,933	157,700	0,12449	1,000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolarstva a tesárska	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	78,333	122,267	0,00000	1,336
19.20 Rafinované ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	86,067	182,133	0,03924	1,872
22.21 Desky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	107,400	148,833	0,01261	1,168
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,800	220,500	0,06636	1,317
23.11 Ploché sklo*	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	51,867	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,567	131,333	0,02894	1,000
23.52 Vápnok a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	138,033	293,300	0,02094	1,899
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sady	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	101,333	114,400	0,03859	1,000
24.10 Železo, oceľ a ferrozliatiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	96,500	149,433	0,06506	1,279
24.20 Rúry, tuhy, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	29,67	42,15	12,48	30	374	890	1,265	111,533	186,067	0,04289	1,421
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	23,83	35,18	11,34	30	340	715	1,055	139,900	238,900	0,02899	1,476
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,17	1,73	0,56	60	33	70	104	139,900	238,900	0,02899	1,476
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	112,467	171,300	0,00815	1,310
24.44 Med a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100,667	130,533	0,02446	1,069
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	132,667	147,800	0,05281	1,000
25.93 Drôtené výrobky, reťazca a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	106,800	123,333	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120,600	122,167	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,041

"Navýšenie P" 748 € 1 675 € 2 423 €

Penový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limitke schválených množstiev, prevodmi z množstiev, ktoré sú v limitke STD a schválenia cenovým oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Vypracoval:

Prílohou:

Za stavebný dozor:

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:

1. kvartál 2021

4. kvartál 2022

Áno

1,205 20,5%

Kvartál do ktorého spadá dátum ukončenia podávania ponuky (t)

Kvartál realizácie za ktorý sa podáva žiadosť o navýšenie (t)

Obsahuje zmluva vložnosť / indexáciu?

Hodnota koeficientu valorizácie / indexácie (ak áno)

Materiál:	Pôvodná JC ("JCm")	Navýšená JC	Hodnota navýšenia ("Navýšenie Pm")	Množstvo	Hodnota JC pôvodnej JC	Hodnota navýšenia JC	Množstvo	Pôvodná JC - Množstvo	Navýšená JC - Množstvo	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Riziko	Výsledný KZ pre navýšenie JC ("Pm")
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, výpenec, sadrovce, krieda a bitúlica	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	133,933	154,600	0,02322	1,000
08.12 Prírodné piesky	4,56	4,56	0,00	78	0	0	356	0	0	99,200	116,333	0,00000	1,000
16.10 Drevo, rezané a hoblované	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	105,667	160,167	0,00000	1,311
16.21 Dýhy a drevené panely	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	130,933	157,700	0,12449	1,000
18.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	79,333	122,267	0,00000	1,336
19.20 Rafinované ropné produkty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	86,067	182,133	0,03924	1,872
22.21 Dostky, fólie, hadice a profily z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	107,400	148,533	0,01281	1,166
22.23 Stavebné výrobky z plastov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	138,800	220,500	0,06636	1,317
23.11 Ploché sklo *	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	120,600	51,867	0,18701	1,000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	113,600	113,600	0,03184	1,000
23.51 Cement	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	112,567	131,333	0,02894	1,000
23.52 Vápno a sadra	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	138,033	293,300	0,02084	1,899
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	101,333	114,400	0,03559	1,000
24.10 Železo, oceľ a feroliatiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	96,500	149,433	0,06506	1,279
24.20 Rúry, rúčky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	29,67	42,15	12,48	12	150	0	356	0	0	111,533	186,067	0,04289	1,421
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	23,83	35,18	11,34	6	68	0	143	0	0	139,900	236,900	0,02699	1,476
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,17	1,73	0,56	12	7	0	14	0	0	139,900	236,900	0,02699	1,476
24.42 Hliník	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	112,467	171,300	0,08915	1,310
24.44 Meď a výrobky z medi	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100,667	130,633	0,02445	1,068
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	132,667	147,800	0,05281	1,000
25.93 Dretené výrobky, reťaze a pružiny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	106,800	123,333	0,01749	1,000
26.11 Výroba elektronických komponentov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	120,600	122,167	0,03357	1,000
27.30 Káble a káblové zariadenia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	83,900	105,500	0,01177	1,041
"Navýšenie P"										224 €	869 €	1 093 €	

Canový dopad bol odsúhlasený na základe schválených množstiev v limite cenových oddelením NDS.

Za zhotoviteľa:

Vypracov:

Predkladá

Za stavebný doz:

Odsúhlasil:

Za Objednávateľa:

Odsúhlasil:
