

# Harmonogram stavby "Zateplenie objektu Domov dôchodcov a Do


Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o. Detva Vypracoval: Viazanička	Rok						
	Mesiac						
	Deň	1	2	3	4	5	6
	Dĺžka trvania						
<b>Popis</b>							
<b>Zateplenie objektu Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb LUNA - Brezno,p.č.687/51, 52</b>	<b>180,00</b>						
<b>Zemné práce</b>	<b>35,00</b>						
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	35,00						
<b>Zakladanie</b>	<b>42,00</b>						
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	42,00						
<b>Vodorovné konštrukcie</b>	<b>35,00</b>						
Filtračné vrstvy zo štrkodrviny so zhutnením - okapový chodník	35,00						
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>	<b>161,00</b>						
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	14,00						
Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 10% štukových hladných	21,00						
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	151,00						
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	70,00						
Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrnná - sokel	70,00						
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením - sokel	151,00						
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy - čelo loggie	151,00						
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 70 mm, skrutkovacie kotvy - podhľad loggií	151,00						
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - vonkajšie steny loggií,	151,00						
strojovne							
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	151,00						
Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy - fasáda	151,00						
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>	<b>176,00</b>						
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	80,00						
Montáž + demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	157,00						
Búranie podkladov pod dlažby a búranie dlažieb	70,00						
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>	<b>155,00</b>						
<b>Izolácie tepelné</b>	<b>161,00</b>						
<b>Konštrukcie klampiarske</b>	<b>116,00</b>						
<b>Konštrukcie stolárske</b>	<b>133,00</b>						
<b>Podlahy z dlaždíc</b>	<b>161,00</b>						
<b>Nátery</b>	<b>19,00</b>						
<b>Maľby</b>	<b>19,00</b>						
<b>Elektromontáže</b>	<b>168,00</b>						
Bleskozvod	168,00						





2. mesiac

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

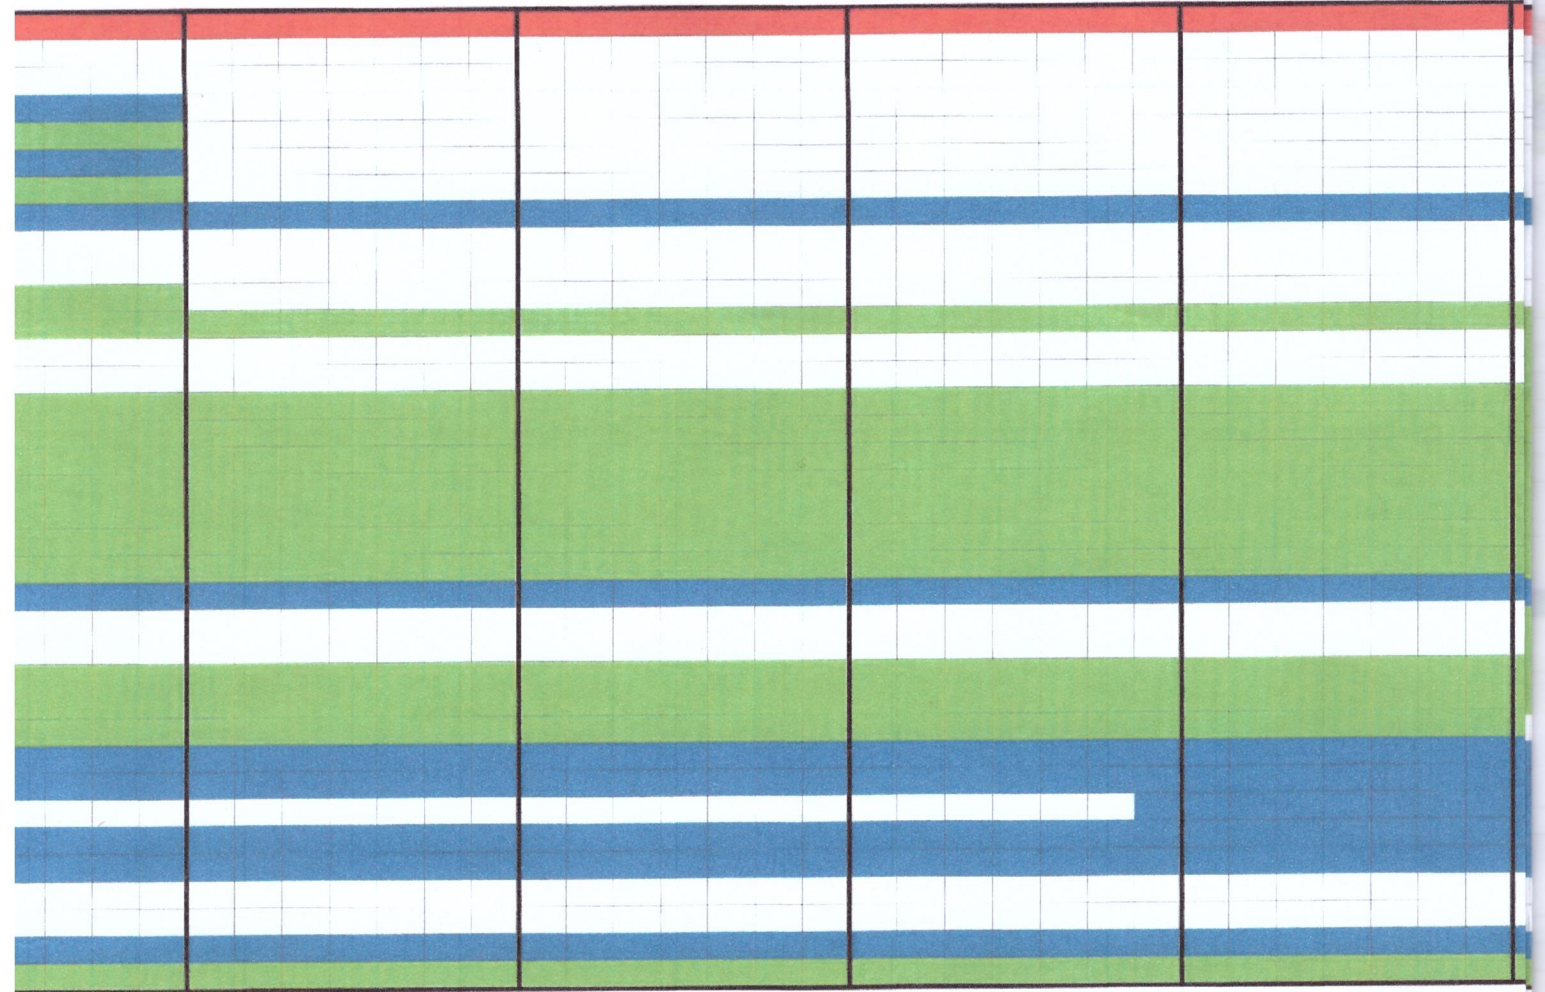






4. mesiac

5. mesiac

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

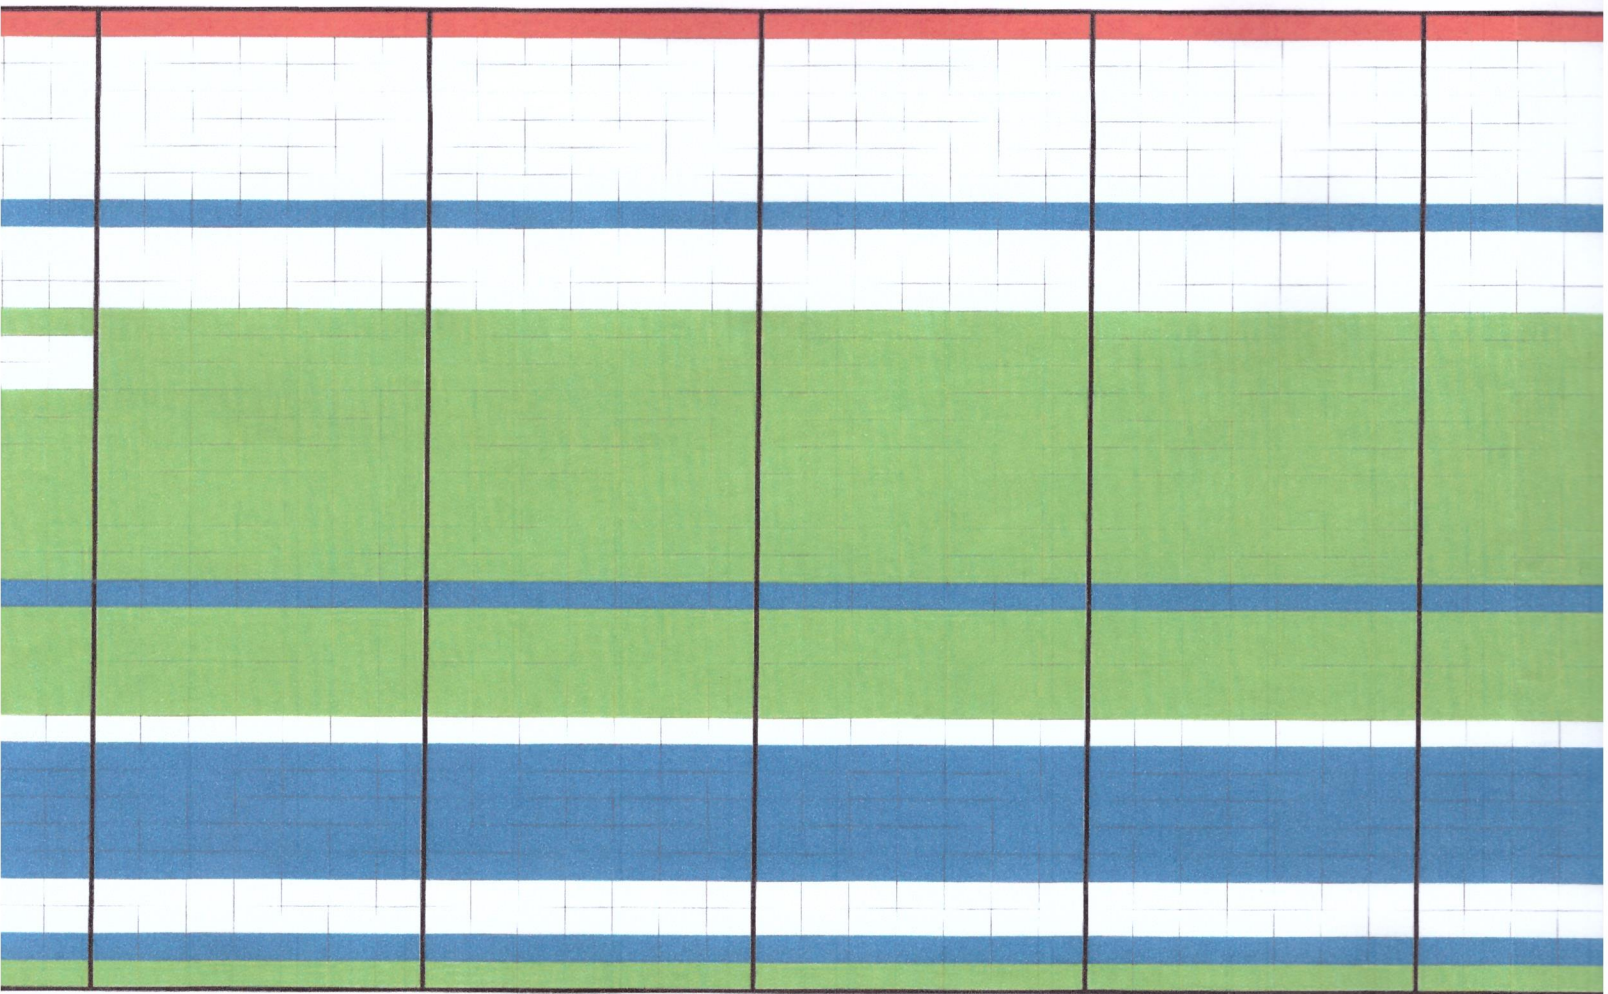



siac															6. mesiac																		
136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169




M. R. ŠTEFÁNKA 2  
 962 12 DETVA  
 IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

8	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

