

Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác - denný

Stavba: Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary. Časť 2: Gajary – Rozšírenie spoločnej ČOV

Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900 61 Gajary


Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto výstavby: katastrálne územie obce Gajary

Lehota výstavby: 296dní

Začiatok realizácie: 25.7.2023

Koniec realizacji: 15.5.2024

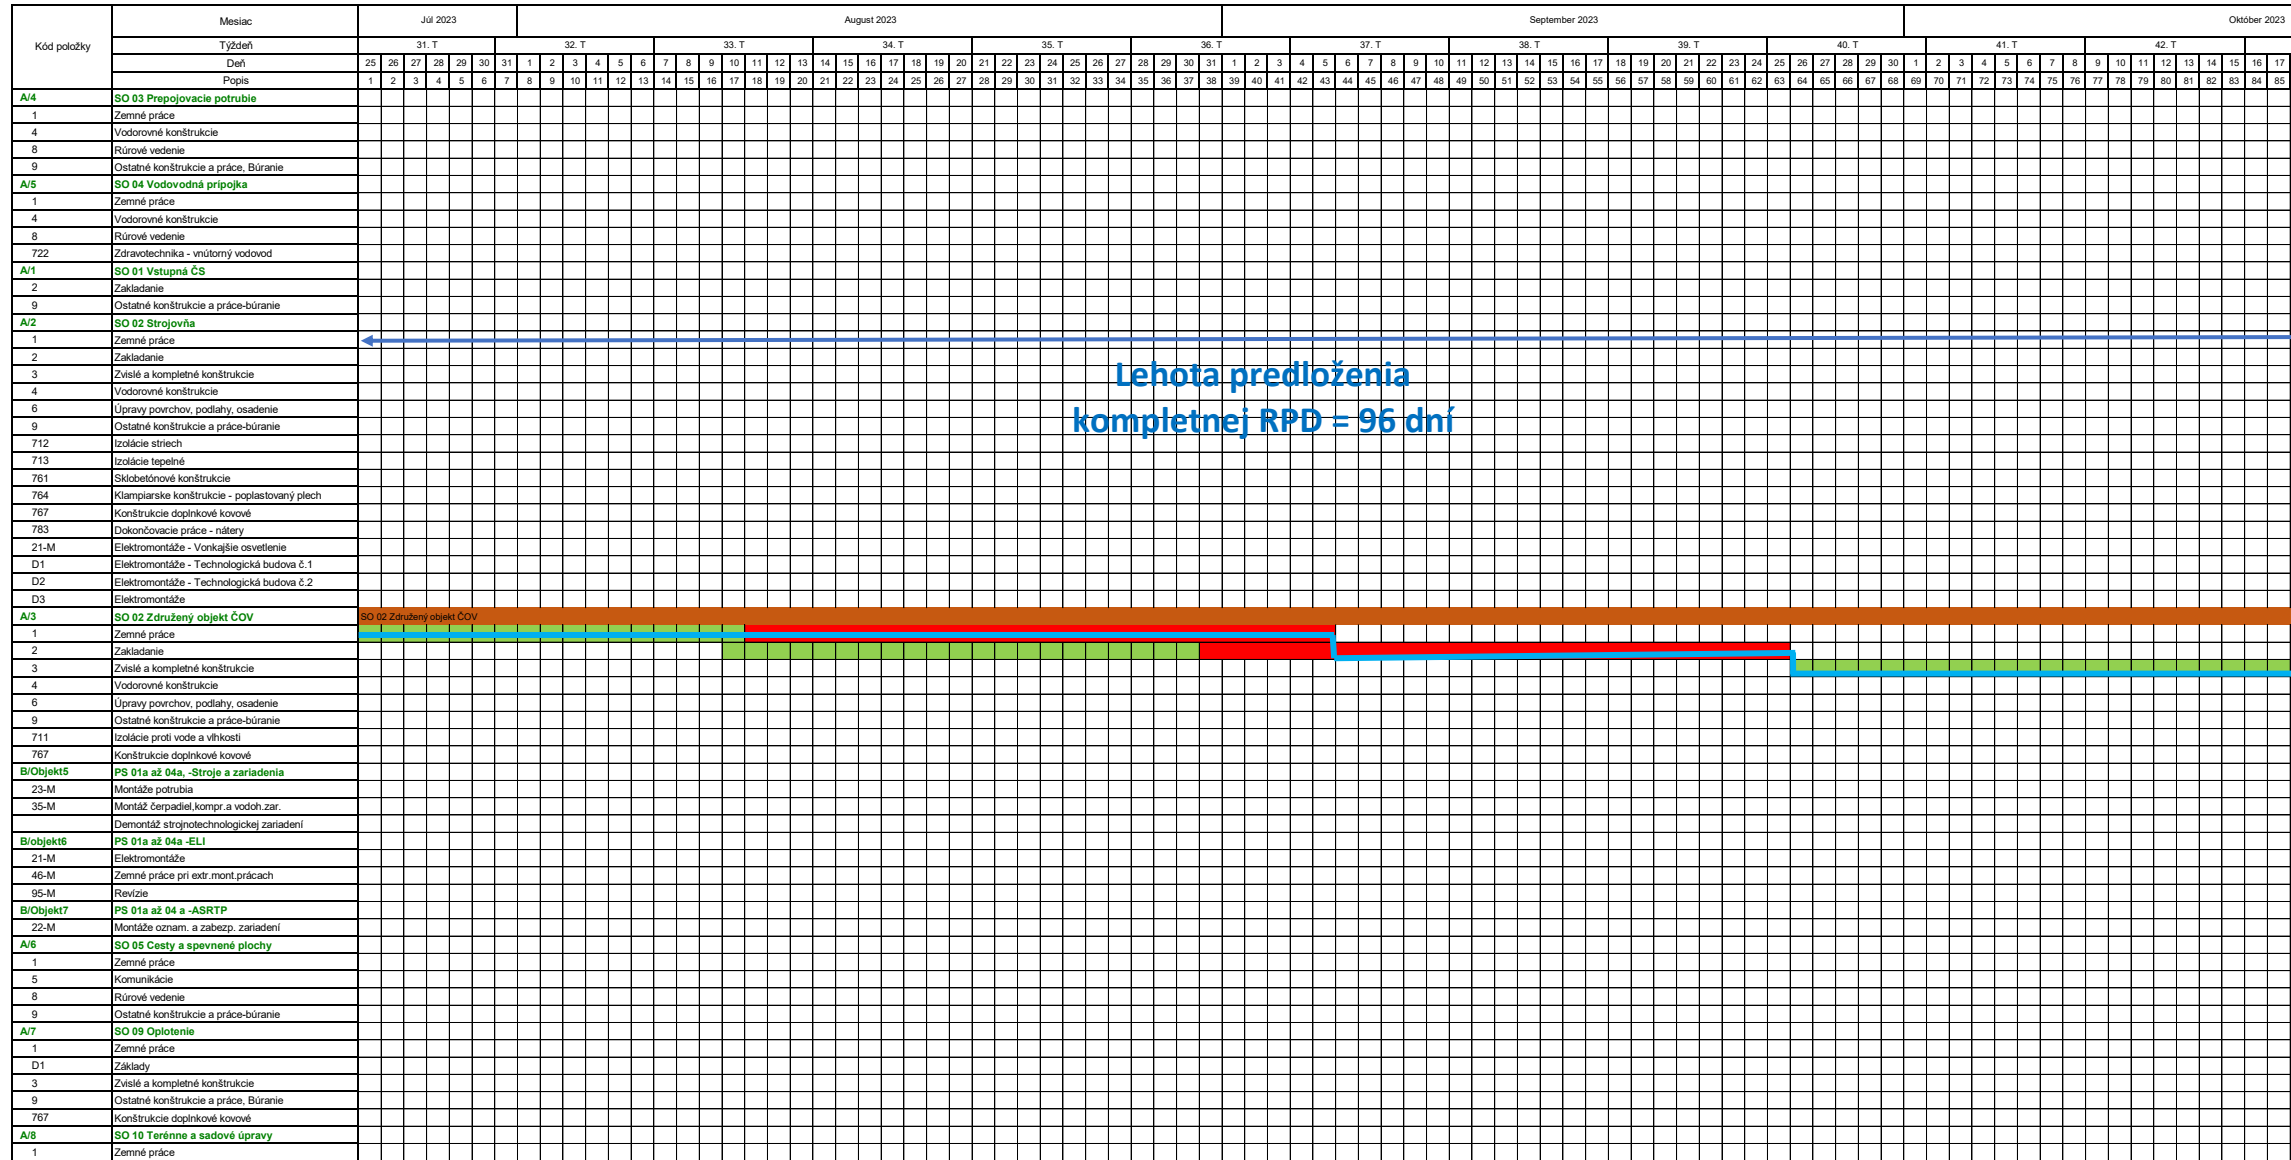

Poznámky:

Predĺženie doby realizácie vplyvom dodania čiastočnej RPD

== Milník pre dodanie RPD do 29.10.203.

☒ Odsúhlasenie technickej špecifikácie technológie, objednanie a dodanie strojov a zariadení

 Kritická cesta

V Závode, dňa

V Prešove, dňa

Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Objednávateľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ

Stavba:	Dobudovanie kanalizačnej siete
Objednávateľ:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto výstavby:	katastrálne územie obce Gajary
Lehota výstavby:	296dní
Začiatok realizácie:	25.7.2023
Koniec realizácie:	15.5.2024

Kód položky		Mesiac	November 2023												December 2023												Január 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Týždeň	43. T				44. T				45. T				46. T				47. T				48. T				49. T				50. T				51. T				52. T				53. T				54. T				55. T				56. T				57. T				58. T				59. T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Deň	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Vecný a časový harmonogram

Stavba: Dobudovanie kanalizačnej siete

Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67, 900

Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Miesto výstavby:	katastrálne územie obce Gajary
Lehota výstavby:	296dní
Začiatok realizácie:	25.7.2023
Koniec realizácie:	15.5.2024

Kód položky	Mesiac	Február 2024												Marec 2024												Apríl 2024												Máj 2024																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Týždeň	60. T						61. T						62. T						63. T						64. T						65. T						66. T						67. T						68. T						69. T						70. T						71. T						72. T						73. T																																																																																																																																																																																																																									
	Deň	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																										
	Popis	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296																																																																																																																																																																																																										
A/4	SO 03 Prepajovacie potrubie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	Vodorovné konštrukcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	Rúrové vedenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A/5	SO 04 Vodovodná prípojka																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	Vodorovné konštrukcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	Rúrové vedenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A/1	SO 01 Vstupná ČS																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Zakladanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A/2	SO 02 Strojovňa																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Zakladanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	Vodorovné konštrukcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
712	Izolácie stiech																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
713	Izolácie tepelné																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
761	Skobestonové konštrukcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
764	Klampsierske konštrukcie - poplastovaný plech																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
783	Dokončovacie práce - nátery																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
21-M	Elektromontáže - Vonkajšie osvetlenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D1	Elektromontáže - Technologická budova č.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D2	Elektromontáže - Technologická budova č.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D3	Elektromontáže																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A/3	SO 02 Združený objekt ČOV																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Zakladanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	Vodorovné konštrukcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
B/Objekt5	PS 01a až 04a, -Stroje a zariadenia - nová časť																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
23-M	Montáže potrubia																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
35-M	Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Demontáž strojnotechnologickej zariadení																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
B/Objekt6	PS 01a až 04a -ELI																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
21-M	Elektromontáže																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
46-M	Zemné práce pri extr.mont.pracach																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
95-M	Revízie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
B/Objekt7	PS 01a až 04 a -ASRTP																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A/6	SO 05 Cesty a spevnené plochy																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	Komunikácie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	Rúrové vedenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A/7	SO 09 Oplotenie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D1	Základy																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	Zvislé a kompletné konštrukcie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Ostatné konštrukcie a práce, búranie																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
767	Konštrukcie doplnkové kovové																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A/8	SO 10 Terénne a sadové úpravy																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Zemné práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

V Závode, dňa

Ing. Richard Nimsch, predseda zdruzenia
Zdruzenie obci Enviropark Pomoravie
Objednavateľ
