



ZMLUVA NA VYKONANIE ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU

uzavretá podľa § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Zmluva**“)

„Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna“

Číslo objednávateľa: **2020/BAA/002/021**
Číslo zhotoviteľa: **20/068/3**

medzi

Združenie R2 Mýtna
ako Objednávateľ

a

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV V NITRE
ako Zhotoviteľ

ČLÁNOK I Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Združenie R2 Mýtna v zložení:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
zastúpený: v súlade s platným Podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ, na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 02.01.2019
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 581/B

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Konajúci prostredníctvom: Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti Stred, na základe plnej moci
Ing. Peter Kordiak, na základe plnej moci
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 991/B

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva
Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva
IČO: 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka č. 248/V

Obchodné meno: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha, Česká republika
Štatutárny orgán: Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Erika Kohoutová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka
IČO: 452 74 924
DIČ : CZ45274924
Zapísaný: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 1561
Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika
IČO: 31 818 714
DIČ: 2021778583
IČ DPH: SK2021778583
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka č. 449/V

Bankové spojenie združenia: Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK0481000001159521810237
SWIFT/BIC: KOMBSKBA

Osoby oprávnené konať za Objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ Doprastav, a.s.
Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti Stred, STRABAG s.r.o.
Ing. Ladislav Macura, riaditeľ závodu Dopravné stavby, EUROVIA SK, a.s.

Ing. Jan Malata, riaditeľ závodu Mosty a konštrukcie EUROVIA CS, a.s.

- vo veciach technických: p. Ján Karásek, Riaditeľ stavby,
Ing. Miloš Lešták
Peter Kordiak, Zástupca riaditeľa stavby
Vladimír Chovanec, Zástupca riaditeľa stavby
Ing. Ľuboš Šalvary, Zástupca riaditeľa stavby

Korešpondenčná adresa: združenie R2 Mýtna, zariadenie staveniska , 962 04 Kriváň

(ďalej spoločne len „Objednávateľ“)

Osoby oprávnené konať vo veciach technických nie sú oprávnené k úkonom v mene Objednávateľa, ktoré by viedli alebo mohli viesť k zmene alebo zániku tejto Zmluvy.

1.2 ZHOTOVITEĽ: ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV V NITRE

Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra
IČO: 00 166 723
DIČ: 2021246656
IČ DPH: SK2021246656
Právna forma: Rozpočtová organizácia
V zastúpení: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ

Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: Mgr. Marek Vojteček, PhD.
vo veciach technických: Mgr. Marek Vojteček, PhD.
bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN - účet: SK1281800000007000249596
BIC: SPSRSKBA

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“, jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

S ohľadom na vzájomnú dohodu obidvoch Zmluvných strán a obsah tejto Zmluvy sa obidve Zmluvné strany dohodli nasledovne:

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril zmluvu o dielo č. obj. Z1/2020/006/04 (č. investora ZM/2020/0077) zo dňa 13.02.2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.02.2020 (ďalej len „**Hlavná zmluva**“) s obstarávateľom Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 (ďalej len „**Investor**“), a to na účely realizácie stavby „Zhotovenie stavby rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“ (ďalej len „**Stavba**“).
- 2.2. Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu so Zhotoviteľom na vykonanie záchranného archeologického výskumu v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou tak, aby Objednávateľ prostredníctvom Zhotoviteľa riadne splnil svoje záväzky vyplývajúce z Hlavnej zmluvy podľa (i) podčlánku 4.24 (Nálezy na Stavenisku) prílohy Hlavnej zmluvy označenej ako „Osobitné zmluvné podmienky, Zväzok 2“ v spojení s podčlánkom 4.24 prílohy Hlavnej zmluvy označenej ako Všeobecné zmluvné podmienky, Zväzok 2 a (ii) podľa bodu 3.18 (Ochrana pamiatkového fondu) časti 1 prílohy Hlavnej zmluvy označenej ako „Požiadavky Objednávateľa, Zväzok 3“ a prílohou I.08 (Archeologický prieskum časti I. prieskumy Zväzku 5 a Vysvetleniami súťažných podkladov Súťaže, s ktorými sa Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy riadne a k svojej spokojnosti oboznámil. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že Hlavná zmluva medzi Objednávateľom a Investorom súvisí, ovplyvňuje a má podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

- 2.3. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Stavba sa realizuje podľa pravidiel a zásad „Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu“ pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov FIDIC (ďalej len „**Žltá kniha FIDIC**“), v slovenskom preklade vypracovanom Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov SACE z 2008 a jednotlivé postupy v zmysle týchto zásad sú pre neho vo vzťahu k plneniu z tejto Zmluvy záväzné.
- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu ku dňu uzavretia tejto Zmluvy poskytol údaje, ktoré sú potrebné na vykonanie záchranného archeologického výskumu a vyplývajú z Hlavnej zmluvy a zo súťažných podkladov Súťaže.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu poskytol rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici č. KPUBB-2020/9514/73881/BRE zo dňa 17.9.2020 (ďalej len „**Rozhodnutia**“). Rozhodnutia tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa a počas celého výkonu tejto Zmluvy bude spĺňať podmienky v zmysle § 32 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), alebo je zapísaný v databáze „Zoznam hospodárskych subjektov“ a zároveň sa zaväzuje tieto podmienky spĺňať počas trvania tejto Zmluvy.
- 2.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu Zmluvy v zmysle § 2 ods. 5 nemá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nakoľko nie je partnerom verejného sektora, a preto nie je zapísaný v Registri podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). V prípade, ak Zhotoviteľovi táto povinnosť vznikne počas trvania Zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu vzniku povinnosti záväzkov registrácie splniť.
- 2.8. Ak sa niektoré z vyhlásení Zhotoviteľa podľa bodu 2.6 a/alebo 2.7 ukáže ako nepravdivé, považuje sa to za závažné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie aktualizácie archeologického prieskumu a následne záchranného archeologického výskumu (prieskumu) v lokalite staveniska Stavby: „Zhotovenie stavby rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“ v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, Hlavnej zmluvy a tiež podmienkami určenými v Rozhodnutiach. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v štyroch etapách:

I. etapa výskumu (archeologický výskum) bude pozostávať z terénnej povrchovej prospekcie (vyhľadávania a zberu archeologických nálezov a odborného zdokumentovania nálezovej situácie a nálezov), sondážneho archeologického výskumu (vrátane mechanizmov, robotníkov, koordinácie, geodetických prác – vytýčenie/zameranie), spracovania priebežnej správy a výskumného elaborátu všetko v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 15.04.2020 tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**I. etapa Výskumu**“)

II. etapa výskumu (plošný archeologický výskum) bude pozostávať zo zberu dát pre potreby výskumnej dokumentácie, fotodokumentáciu, terénne merania, zakresľovanie archeologických situácií, archívacia archeologických objektov v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 15.4.2020 tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy a vyhotovenie výskumnej dokumentácie (ďalej len „**II. etapa Výskumu**“),

III. etapa výskumu bude pozostávať zo sledovania zemných zásahov pod úroveň pôdneho krytu počas realizácie zemných prác. V prípade zistenia archeologických situácií budú tieto plošne doskúmané v rozsahu stavebných objektov.

IV. etapa výskumu – konzervácia a dokumentácia archeologických nálezov; vyhotovenie výskumnej dokumentácie v zmysle platných predpisov.

(ďalej spoločne len „**Výskum**“ alebo „**Archeologický výskum**“ alebo „**Záchranný archeologický výskum**“).

- 3.2. Po ukončení Záchranného archeologického výskumu Zhotoviteľ vypracuje výskumnú správu vrátane výskumnej dokumentácie (ďalej len „**Výskumná správa**“), ktorú odovzdá do 120 dní od skončenia Výskumu na Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, resp. na iný príslušný orgán; Zhotoviteľ zároveň odovzdá tri originály Výskumnej správy Objednávateľovi.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Zhotoviteľ:

- a) Odborne vykoná Záchranný archeologický výskum po etapách uvedených v čl. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, ktorých priestorový a časový rozsah sa po dohode oboch Zmluvných strán bližšie určuje čl. V. bod 5.1 a harmonogram, a to v súlade a podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s ostatnými príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z príslušných administratívnych rozhodnutí týkajúcich sa Výskumu. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby čo najmenej (iba v nevyhnutnom rozsahu) zasahoval do realizácie ostatných prác a dodavok uskutočňovaných na Stavbe,
- b) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Výskumu postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou, dôkladnosťou a odbornosťou, ktoré sa dajú očakávať od odborne kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou prác podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto Zmluvy. Zhotoviteľ Výskum vykoná po etapách uvedených v čl. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, a v termínoch uvedených v čl. V. bod 5.1 tejto Zmluvy,
- c) Bez zbytočného odkladu preukázateľne oznámi začiatok Výskumu Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici, o čom zároveň bez zbytočného odkladu informuje Objednávateľa, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň,
- d) Do 50 dní po ukončení každej etapy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi 3 exempláre Výskumnej správy pre jednotlivé etapy,
- e) Do 15 dní po ukončení každej etapy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi stanovisko k ďalšiemu postupu výkopových prác, resp. stručný projekt Archeologického výskumu,
- f) Bude viesť denník Výskumu, v ktorom budú priebežne zaznamenávané všetky dôležité skutočnosti,
- g) Zabezpečí poučenie svojich pracovníkov o BOZP v súlade s aktualizovaným plánom BOZP na stavenisku, podľa prílohy Hlavnej zmluvy označenej ako „Osobitné zmluvné podmienky, Zväzok 2“ v spojení s podčlánkom 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré použije pri plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy dodržiavali príslušné právne predpisy v oblasti BOZP a OPP, a boli v súlade s Prílohami č.4 a 5 tejto Zmluvy,
- h) Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení povinností Objednávateľa voči Investorovi súvisiacich s touto Zmluvou, a
- i) Zhotoviteľ vyhlasuje, že má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu.

4.2. Objednávateľ:

- a) Počas uskutočňovania Archeologického výskumu bude spolupracovať s pracovníkom Zhotoviteľa zodpovedným za realizáciu Výskumu,
- b) Objednávateľ zabezpečí príslušné mapové podklady (katastrálnu mapu, resp. výsek z katastrálnej mapy) v mierke 1:10 000 úseku v digitálnej i tlačenej forme,
- c) Objednávateľ poskytne kópiu príslušného záväzného stanoviska/rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu K PUBB-2020/9514/73881/BRE zo dňa 17.9.2020
- d) Na základe požiadaviek Zhotoviteľa zabezpečí vstup na Stavenisko, vytýči stavenisko a podzemné siete a vytvorí podmienky pre činnosť Zhotoviteľa súvisiacu s predmetom Zmluvy,

- e) V harmonograme Stavby vyčlení časový priestor na realizáciu Záchranného archeologického výskumu,
- f) Bude dodržiavať autorské práva vedúcich Archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch, a
- g) Uhradí v termíne splatnosti oprávnené vynaložené náklady na Archeologický výskum, nepresahujúce čiastky uvedené v článku V. tejto Zmluvy.

V. TERMÍN A MIESTO PLNENIA

5.1. Termín a miesto vykonania Archeologického výskumu:

- a) **I. etapa Výskumu** – terénny výskum: Október 2020 – Február 2021, resp. v priebehu výkopových prác
Miesto: Stavba „R2 Kriváň - Mýtna“
- b) **II. etapa Výskumu** – plošný archeologický výskum – Marec 2021 – Jún 2021
- c) **III. etapa Výskumu** – sledovanie zásahov pod úroveň pôdneho krytu – počas realizácie zemných prác
- d) **IV. etapa Výskumu** - rekonštrukcia a konzervácia archeologických nálezov, vyhotovenie výskumnej dokumentácie: max. 120 dní od ukončenia III. etapy Výskumu

Miesto: priestory Zhotoviteľa (Archeologický ústav SAV)

5.2. Termín protokolárneho odovzdania výsledkov Výskumu – Výskumná správa

Objednávateľovi spolu s kompletnou výskumnou dokumentáciou spĺňajúcou všetky formálne a odborné náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov a požiadaviek Hlavnej zmluvy: do 120 dní od ukončenia Výskumu, resp. zemných prác, t.j. od ukončenia terénnej časti Archeologického výskumu..

VI. CENA

- 6.1. Cena za Výskum, ktorý je podľa čl. III. predmetom tejto Zmluvy, je: **169 404,00 Eur bez DPH** (slovom: stošesťdesiatdeväťtisíc štyristoštyri eur) (ďalej len „Cena“). Táto Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z., ako cena maximálna.
- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. VII. tejto Zmluvy dohodnutú Cenu podľa skutočne realizovaných prác maximálne do výšky uvedenej v ods. 6.1 tohto článku.
- 6.3. Zhotoviteľ je viazaný jednotkovými cenami podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len „Cenová ponuka“). Množstvá a typy prác uvedené v cenovej špecifikácii prác Zhotoviteľa nestanovujú a nemajú vplyv na rozsah predmetu tejto Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že Cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe požiadaviek Objednávateľa, Rozhodnutí a dokumentácie, ktoré mu boli poskytnuté ako súčasť podkladov k vypracovaniu ponuky vrátane tejto Zmluvy
- 6.5. K Cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.
- 6.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že Cena zohľadňuje všetky výrobné náklady, režijné náklady na všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu a dokončeniu Výskumu a odstráneniu prípadných väd, ako aj primeraný zisk. V Cene je zahrnuté aj vykonanie všetkých prípadných nepredvídaných prác a dodavok potrebných k riadnemu vykonaniu Výskumu.
- 6.7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky, písomne požadované Objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za navyše práce. Na účely tejto Zmluvy písomným súhlasom sa považuje uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve, ak nie je v ostatných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak. Navyše práce sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vy-

konať na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, podpísanom štatutárnymi orgánmi Zmluvných strán, ktorého obsahom bude najmä cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru za naviac práce iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia naviac prác zástupcami Objednávateľa.

- 6.8. V prípade, ak pôjde o naviac práce, ktoré neboli Zhotoviteľom položkovite ocenené pri uzavretí tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť návrh jednotkových cien za tieto nové položky. Na základe Zhotoviteľom predloženého návrhu Zmluvné strany uzavru po vzájomnom odsúhlasení dodatok k tejto Zmluve.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1. Zhotoviteľ bude Objednávateľovi mesačne fakturovať zmluvnú Cenu za Záchranný archeologický výskum a faktúru doloží súpisom vykonaných prác. Faktúra bude vystavená na Finančného správcu Združenia R2 Mýtna – Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava a zaslaná na adresu sídla Združenia R2 Mýtna - dočasne na STRABAG s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť záverečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní a prebratí výsledkov Výskumu – Výskumnej správy vrátane výskumnej dokumentácie.
- 7.2. Splatnosť čiastkových faktúr a záverečnej faktúry je 65 dní od dátumu preukázateľného doručenia faktúry Objednávateľovi („**Dohodnutá splatnosť**“) na fakturačnú adresu Objednávateľa uvedenú v čl. I. tejto Zmluvy. Na realizáciu Výskumu nebude poskytnutá žiadna zálohová platba.
- 7.3. Zmluvné strany si dohodli zádržné, ktorého výška je 5 % z Ceny za Dielo bez DPH (krátkodobé zádržné).
- 7.4. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi doručенú faktúru zníženú o výšku zádržného. Zhotoviteľ si zádržné uvedie samostatne v každej faktúre, pričom sa vypočítava z hodnoty fakturovaných prác bez DPH.
- 7.5. Zádržné nepredstavuje nezaplatenú časť Ceny za dielo, s ktorou by bol Objednávateľ v omeškaní. Zádržné slúži predovšetkým na uspokojenie nárokov Objednávateľa z väd Diela, nárokov na zmluvnú pokutu, nárokov na náhradu škody, dodatočné náklady Objednávateľa plynúce z nedodržania povinností Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, odškodné a akékoľvek iné nároky voči Zhotoviteľovi zo Zmluvy.
- 7.6. Zhotoviteľ môže žiadať úhradu Zádržného až po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom. Zádržné (resp. jeho zostatok) Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi po vzniku nároku na zaplatenie Zádržného po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov, a to do 65 dní odo dňa predloženia písomnej výzvy na zaplatenie Zádržného zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že Zádržné by malo byť splatné skôr ako sa stane splatnou faktúra, z ktorej bolo uplatnené Zádržné, ktoré má byť uvoľnené Zhotoviteľovi podľa tohto bodu, splatnosť takéhoto Zádržného bude v tomto prípade zhodné so splatnosťou poslednej faktúry, z ktorej bolo uplatnené Zádržné, resp. jeho časť, ktorá má byť uvoľnená Zhotoviteľovi podľa tohto bodu.
- 7.7. Objednávateľ odsúhlasí svojim podpisom súpis vykonaných prác, ktoré mu predloží Zhotoviteľ. Zhotoviteľ k Súpisu prác vykonaných v príslušnom mesiaci, ocenených podľa Cenovej ponuky, vždy k 25. dňu v mesiaci a priloží všetky potrebné doklady. Dátum zdaniteľného plnenia (dodania) bude dátum prevzatia prác Objednávateľom.
- 7.8. Faktúra - daňový doklad, bude obsahovať:
- označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo,
 - názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO a DIČ, Objednávateľa a Zhotoviteľa,
 - v prípade, že Zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak doplniť údaj o tom,
 - číslo Zmluvy a označenie časti Výskumu,
 - označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,

- g) výšku fakturovanej čiastky bez DPH, výšku DPH v eurách alebo informáciu o prenose daňovej povinnosti,
- h) výška zadržanej sumy,
- i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia,
- j) pečiatku a podpis vystavovateľa.

7.9. Ako prílohy faktúr budú:

- a) Súpis vykonaných prác potvrdený Objednávateľom
- b) Zisťovací protokol

Prílohou záverečnej faktúry bude okrem dokumentov uvedených v ods. a) a b) aj protokol o odozvaní a prevzatí výsledkov Výskumu – Výskumnej správy vrátane výskumnej dokumentácie.

7.10. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy určené touto Zmluvou a platnými a účinnými právnymi predpismi alebo bude obsahovať nesprávne údaje, má Objednávateľ právo vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

7.11. Zhotoviteľ je povinný faktúry zasielať doporučenou poštou na adresu Objednávateľa uvedenú v čl. VII bod 7.1 Zmluvy alebo osobne na sekretariát PT Združenia. Elektronicky možno zaslať faktúru na adresu: [ludovit.lalik@strabag.com]; avšak takéto zaslanie faktúry má len informatívny charakter a nespĺňa náležitosti riadneho doručenia faktúry.

7.12. Zhotoviteľ slobodne, vážne, určite a záväzne vyhlasuje, že vzhľadom na doterajšie obchodné vzťahy s Objednávateľom resp. skúsenosti a informácie o Objednávateľovi a vzhľadom na finančnú stabilitu a dodržiavanie platobnej disciplíny Objednávateľom, nepožaduje a ani v budúcnosti nebude požadovať zabezpečenie svojich pohľadávok zo Zmluvy voči sebe ako Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky. Toto vyhlásenie Zhotoviteľa o nepožadovaní zabezpečenia svojich pohľadávok zo Zmluvy o dielo prostredníctvom Bankovej platobnej záruky sa považuje za písomne vyhlásenie Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.4a Hlavnej zmluvy

7.13. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas si plniť svoje finančné záväzky voči podzhotoviteľom alebo dodávateľom. Podzhotoviteľ, resp. dodávateľ je oprávnený písomne oznámiť Objednávateľovi, že zhotoviteľ si neplní svoje finančné záväzky. Pokiaľ sa zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním diela dostane do omeškania s plnením svojich finančných záväzkov voči podzhotoviteľom alebo dodávateľom, na zaplatenie ktorých vznikol podzhotoviteľom alebo dodávateľom v súlade s uzavretou zmluvou nárok (ďalej len „Záväzok voči podzhotoviteľovi“) o viac ako 10 dní, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, tieto záväzky splniť za Zhotoviteľa. V prípade úhrady Záväzkov voči podzhotoviteľovi za Zhotoviteľa v súlade s týmto bodom Zmluvy, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie náhrady vo výške Objednávateľom uhradeného Záväzku voči podzhotoviteľovi v plnom rozsahu (Pohľadávka objednávatelia) alebo je objednávatel' oprávnený započítať si akúkoľvek pohľadávku zhotoviteľa voči Objednávateľovi s Pohľadávkou Objednávatelia voči Zhotoviteľovi (ktorá má pôvod v plnení Objednávatelia podzhotoviteľom, resp. dodávateľom za Zhotoviteľa podľa vyššie uvedeného). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby každá zmluva s podzhotoviteľom, dodávateľom ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné, a obsahovali ustanovenia ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky, taktiež musia rešpektovať ustanovenia tejto Zmluvy a nesmú sa priečiť alebo byť v rozpore s Hlavnou zmluvou o dielo a tiež so Zákom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s úhradou Záväzkov voči podzhotoviteľovi Objednávateľom v súlade s týmto bodom a podpisom tejto Zmluvy dáva Objednávateľovi neodvolateľný súhlas na úhradu Záväzkov voči podzhotoviteľom ako aj na započítanie Pohľadávok Objednávatelia vzniknutých z titulu úhrady Záväzkov voči podzhotoviteľovi s pohľadávkami Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Prípadné námietky, ktoré má Zhotoviteľ voči podzhotoviteľovi alebo voči Záväzku voči podzhotoviteľovi je zhotoviteľ oprávnený uplatňovať výlučne voči podzhotoviteľovi a nesmie ich uplatniť voči Objednávateľovi.

7.14. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na mesačnej báze ku 30.dňu v mesiaci nasledovné údaje :

- a) zoznam všetkých fyzických osôb- podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
 - b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku.
- 7.15. Akýkoľvek peňažný záväzok Objednávateľa zo Zmluvy môže byť v súlade s § 332 ods. Obchodného zákonníka uhradený aj zo strany spoločnosti: STRABAG BRVZ s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 31 319 637 priamo z jeho účtu (ďalej len "STRABAG BRVZ s.r.o."). Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, splnením peňažného záväzku zo Zmluvy spoločnosťou STRABAG BRVZ s.r.o. nepreberá peňažný záväzok Objednávateľa (§ 531 Občianskeho zákonníka) ani sa nestáva dlžníkom popri ňom (§ 533 Občianskeho zákonníka).

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE VÝSKUMNEJ SPRÁVY

- 8.1. Zmluvne strany sa dohodli, že po riadnom ukončení Výskumu a po riadnom vypracovaní kompletnej Výskumnej správy vrátane výskumnej dokumentácie spĺňajúcej všetky formálne a odborné náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov nevyžadujúcej prepracovanie, Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Výskumnú správu vrátane výskumnej dokumentácie písomným odovzdávacím a preberacím protokolom podpísaným Zmluvnými stranami prostredníctvom splnomocnených/poverených zástupcov všetkých Zmluvných strán.
- 8.2. Odovzdanie Výskumnej správy vrátane výskumnej dokumentácie sa uskutoční v mieste dohodnutom medzi Zmluvnými stranami, inak v mieste písomne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi. Vykonanie Výskumnej správy vrátane výskumnej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi minimálne desať (10) dní pred jej protokolárnym odovzdaním a prevzatím.
- 8.3. Najneskôr pri preberacom a odovzdávacom konaní je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi (i) kompletnú výskumnú dokumentáciu (vrátane všetkých nálezových správ) spĺňajúcu všetky formálne a odborné náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov nevyžadujúcu prepracovanie v troch (3) vyhotoveniach, (ii) denník výskumu v zmysle tejto Zmluvy a ostatné príslušné dokumenty a doklady vyžadované na základe Hlavnej zmluvy a na základe príslušných právnych predpisov. V prípade, ak bude mať Výskumná správa vrátane výskumnej dokumentácie vady a/alebo nedorobky Objednávateľ nie je povinný ju prevziať. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa odovzdať jeden rovnopis Výskumnej správy vrátane výskumnej dokumentácie Krajskému pamiatkovému úradu Nitra v súlade s bodom 3.2. tejto Zmluvy.

IX. SANKCIE

- 9.1. Objednávateľ môže uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z Ceny za každý deň omeškania s plnením predmetu Zmluvy.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu až po doručení sankčnej faktúry Objednávateľa. Táto je splatná do 14 dní od jej doručenia.
- 9.3. V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúr v zmluvnom termíne môže Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi úrok z omeškania v súlade § 369 Obchodného zákonníka vo výške platnej ku dňu splatnosti záväzku Objednávateľa.
- 9.4. V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie Staveniska Zhotoviteľom (vrátane likvidácie odpadu) má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5. Ak Zhotoviteľ umiestnil na Stavenisku reklamné tabule bez súhlasu Objednávateľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každý aj začatý deň ich umiestnenia.
- 9.6. Za každé porušenie povinnosti mlčanlivosti sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000 EUR.
- 9.7. V prípade, ak alebo Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ v rozpore s predmetom Zmluvy prekročil rozsah výrubu drevín v brehových porastoch ako odsúhlasený Objednávateľom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,00 EUR za každých 10 m³ výrubu navyše.

9.8. Uhradenie zmluvnej pokuty nevylučuje uplatnenie ďalšieho úroku z omeškania podľa §369 Obchodného zákonníka alebo náhrady škody.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 10.2. Zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami dohodnutými a podpísanými obidvoma Zmluvnými stranami.
- 10.3. Obsah Zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný, čo oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán potvrdzujú svojimi podpismi.
- 10.4. Záväzkové vzťahy Zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.5. Táto Zmluva je platná dňom podpisu zástupcov všetkých Zmluvných strán a účinná od nasledujúceho dňa po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR (www.crz.gov.sk).
- 10.6. Nálezové správy a celá dokumentácia vykonaného Záchraného archeologického výskumu bude archivovaná u Zhotoviteľa, 3x odovzdaná Objednávateľovi a 1x odovzdaná Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre.
- 10.7. K zmene, doplneniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy môže dôjsť len na základe písomnej dohody obidvoch Zmluvných strán. Zmluvné strany vstúpia okamžite do rokovania, ak sa potvrdí nadpriemerný výskyt archeologických situácií a v takomto prípade sa dohodnú aj na úprave max. Ceny.
- 10.8. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, prerokovávajú a rozhodujú súdy Slovenskej republiky.
- 10.9. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka Zhotoviteľa
 - Príloha č. 2 – Požiadavky na archeologický výskum
 - Príloha č. 3 – Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu č. KPUBB-2020/9514/73881/BRE zo dňa 17.9.2020
 - Príloha č. 4 BOZP
 - Príloha č. 5 Nelegálna práca

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa :

V Bratislave, dňa:
Za Doprastav, a.s.

V Nitre, dňa
za Archeologický ústav SAV v Nitre

Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva

Ing. František Očkaják
*výrobný riaditeľ
na základe plnej moci*

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ AÚ SAV

V Bratislave, dňa:
Za STRABAG s.r.o.

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti

Ing. Peter Kordiak
na základe plnej mocikonaťel'

V Košiciach, dňa
EUROVIA SK, a.s.

Ing. Ing. Róbert Šinály	Ing. Juraj Dančišín
<i>podpredseda predstavenstva</i>	<i>člen predstavenstva</i>

V Prahe, dňa
Za EUROVIA CS, a.s.

Ing. Ján Malata
riaditeľ závodu Mosty a konstrukce
na základe plnej moci

PRÍLOHA Č. 2 – Požiadavky na archeologický výskum

Nálezy na Stavenisku (Hlavná zmluva, Všeobecné zmluvné podmienky upravené Osobitnými zmluvnými podmienkami, podčlánok 4.24)t

Všetky fosílie, mince, cenné alebo starožitné predmety a objekty, a iné pozostatky alebo predmety geologicky a archeologicky zaujímavé nájdené na Stavenisku budú odovzdané do starostlivosti a právomoci Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zabránenie Personálu Zhotoviteľa, alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov.

Zhotoviteľ po objavení takýchto nálezov bezodkladne vydá oznámenie Stavebnému dozoru, ktorý vydá pokyn ako sa s nimi má zaobchádzať. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo Náklady v dôsledku plnenia týchto pokynov, Zhotoviteľ vydá Stavebnému dozoru ďalšie oznámenie a bude mať nárok podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) na:

- (a) predĺženie lehoty v dôsledku každého takého oneskorenia ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené podľa podčlánku 8.4 (Predĺženie Lehoty výstavby), a
- (b) úhradu všetkých takýchto Nákladov, ktoré budú zahrnuté do Zmluvnej ceny.

Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia Stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 (Rozhodnutia) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom.

Ochrana pamiatkového fondu (Zväzok 3 časť 1 článok 3 podčlánok 3.18)

Aktuálna právna ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkových území je zabezpečovaná podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Archeologický prieskum sa vykoná na lokalitách, identifikovaných v rámci Archeologického prieskumu (Zväzok 5, časť I Prieskumy, I.08 Archeologický prieskum) na základe súpisu lokalít na trase výstavby rýchlostnej cesty (s možným ohrozením archeologických lokalít).

Objednávateľ predpokladá, že na uvedené je potrebné vytvoriť časový priestor v súčinnosti so stavebnými prácami.

Podrobnejšie členenie rozsahu prác na jednotlivých lokalitách je uvedené v Archeologickom výskume vo zväzku 5, časť I.

Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu a oznámiť začiatok prác KPÚ v Žiline.

Po ukončení záchranného archeologického výskumu Zhotoviteľ vypracuje Výskumnú dokumentáciu, ktorú odovzdá do 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu na Krajský pamiatkový úrad Žilina.

Uvedené skutočnosti musí Zhotoviteľ zohľadniť pri príprave Harmonogramu prác.

Zhotoviteľ vytvorí podmienky a zabezpečí vykonanie záchranného archeologického výskumu v zmysle právoplatného rozhodnutia

Zväzok 5 časť 5 súťažných podkladov Súťaže

Priložené v tlačenej verzii nakoľko je k dispozícii len ako pdf. súbor

HLAVNÝ PROJEKTANT DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA		 DOPRAVOPROJEKT a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA ZVOLEN 960 01 Zvolen, M.R.Štefánika 4724
RIADITEĽ DÍZIE Ing. J. GUOTH <i>guth</i>	Č. ZÁKAZKY 7367-01	
HLINÍŽ. PROJEKTU Ing. P. GRAMBLIČKA <i>grambl</i>	Č. ARCH. 7367-01	

I.8

VYPRACOVAL L. CHMELO, B. ŠEBESTA	ZODP. PROJEKTANT F. ŽÁK MATYASOWSKY	HLINÍŽ. PROJEKTU Ing. Peter GRAMBLIČKA <i>grambl</i>	 Archeologická Agentúra Archeological Agency Cukrová 14, 811 08 Bratislava	
KONTROLOVAL F. ŽÁK MATYASOWSKY	OKRES (OBVOD) STAVBY DETVA, LUČENEC			
OBJEDNÁVATEĽ: NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. BRATISLAVA				
RÝCHLOSTNÁ CESTA R2 KRIVÁŇ - LOVINOBAŇA, TOMÁŠOVCE			STUPEŇ DSP	FORMÁT -
			DÁTUM 02.2016	Č. ZÁKAZKY 7367-01
ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM			MIERKA -	Č. ARCH. 7367-01
			Č. VÝKRESU	Č. SÚPRAVY



Archeologická Agentúra
Archaeological Agency



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ



VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÁ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

Rýchlostná cesta R2
Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
- časť I. Archeologický prieskum



Riaditeľ projektu: František Žák Matyasowszky
Autor výskumu a dokumentácie: Ladislav Chmelo, Bohuslav Šebesta, Marek Šútor &
František Žák Matyasowszky

2016

NITRA

ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, info@archeologickaagentura.sk
tel: +421 2 593 241 32 mobil: +421 949 490 751 IČO 46567763 DIČ 2023471263 IČDPH SK2023471263
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka č. 79959/B
www.ArcheologickaAgentura.sk

V mene ARCHEOLOGICKEJ AGENTÚRY ďakujem za spoluprácu počas celej doby výskumných prác objednávateľovi VPÚ DECO PRAHA a.s. Moja vďaka patrí tiež archeológom Mgr. Bohuslavovi Šebestovi, PhD., Mgr. Ladislavovi Chmelovi a všetkým študentom z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí pracovali priamo v teréne.

PhDr. Mgr. František Žák Matyasowszky, PhD.
generálny riaditeľ a konateľ
ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA

I. Stručná charakteristika osídlenia stredného povodia Hrona, Slatiny a Krivánskeho potoka (na trase Rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce)

Informácie sú uvedené v rovnomennej kapitole I. v správe Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. DÚR. F8 Archeologický výskum, z. č. 7367-00 (AÚ SAV 2010, 3, 4).

II. Archeologické lokality na stavbe R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

Charakteristika a podrobné informácie o známych ohrozených archeologických lokalitách sú v správe Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. DÚR. F8 Archeologický výskum, z. č. 7367-00 (*AÚ SAV 2010*, 5-8). Všetky sú platné a aktuálne.

III. Prieskum na nepreskúmaných úsekoch trasy R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce v roku 2015

Úseky, ktoré skúmala ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, sú vyznačené v správe Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. DÚR. F8 Archeologický výskum, z. č. 7367-00 (*AÚ SAV 2010*, 11-16) žltou farbou. Pracovne boli rozdelené nasledovne:

- 1.) Úsek 1.1 (km 9,0-9,65) = Mýtna – Pod Meškovou
- 2.) Úsek 1.2 (km 9,65-10,5) = Mýtna – Červenina
- 3.) Úsek 2 (km 11,6-14,8) = Divín, Lovinobaňa – Divínsky háj
- 4.) Úsek 3.1 (km 15,3-15,85) = Lovinobaňa – Kôšky
- 5.) Úsek 3.2 (km 15,85-16,85) = Lovinobaňa – Roveň
- 6.) Úsek 3.3 (km 16,85-17,0) = Uderiná – Uderinský mlyn
- 7.) Úsek 4 (km 19,5-20,65) = Podrečany – Valné

Celková dĺžka úsekov podrobených archeologickému prieskumu bola 8,55 km. Povrchový zber bolo ale možné vykonať len v dĺžke 2,4 km na plochách, ktoré boli rozrušené poľnohospodárskymi zemnými prácami. Ostatné plochy boli skúmané odlišným spôsobom, ktorý je podrobnejšie rozpísaný pri každom jednotlivom úseku. Na prieskume sa zúčastnili okrem členov ARCHEOLOGICKEJ AGENTÚRY aj študenti Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

1.) Úsek 1.1 (km 9,0-9,65) = Mýtina – Pod Meškovou (Plán 1):

Plocha je pasienkom, ktorý je zarastený vegetáciou. V čase určenom na prieskum nebol pooraný. Bol preskúmaný detektorom kovov. Týmto spôsobom neboli na ploche zistené žiadne archeologické objekty, nálezy ani situácie. Archeologický potenciál danej plochy ale nie je možné s určitosťou vylúčiť kvôli terénnym podmienkam.



Úsek 1.1; pohľad na JV.

2.) Úsek 1.2 (km 9,65-10,5) = Mýtina – Červenina (Plán 1):

Na tomto úseku sa vďaka priaznivejším podmienkam (poorané pole) uskutočnil spolu s prieskumom detektorom kovov aj povrchový zber v línách. Bola objavená sporadicky sa vyskytujúca štiepaná industria, ktorú je možné datovať do obdobia praveku a zároveň novoveká keramika, ktorá ale nie je predmetom archeologického bádania.



Úsek 1.2; pohľad na SZ.



Úsek 1.2; povrchový zber, pohľad na JV.

3.) Úsek 2 (km 11,6-14,8) = Divín, Lovinobaňa – Divínsky háj (Plán 2):

Plocha je situovaná na úpätí kopca, ktorý je relatívne husto zarastený lesom. Povrchový zber je v daných podmienkach vylúčený. Prieskum bol uskutočnený ako vyhľadávanie antropogénnych reliktov v krajine. Boli prezerané vývraty stromov. V rámci možností bol do prieskumu zapojený detektor kovov. Neboli zistené žiadne archeologické objekty, nálezy, situácie ani antropogénne relikty. Polygóny skúmané ARCHEOLOGICKOU AGENTÚROU sú červenou farbou vyznačené v Pláne 1 až 4.



Úsek 2; pohľad na juhovýchod.

4.) Úsek 3.1 (km 15,3-15,85) = Lovinobaňa – Kôšky (Plán 3):

Plocha je zarastená trávami a nízkou vegetáciou. Napriek tomu tu bol uskutočnený povrchový zber v línách (aj keď jeho výsledky za daných podmienok majú nízku vypovedaciu hodnotu). Doplnený bol prieskumom za pomoci detektoru kovov. Týmto

spôsobom neboli na ploche zistené žiadne archeologické objekty, nálezy ani situácie. Archeologický potenciál danej plochy ale nie je možné s určitosťou vylúčiť kvôli terénnym podmienkam.



Úsek 3.1; pohľad na J.

5.) Úsek 3.2 (km 15,85-16,85) = Lovinobaňa – Roveň (Plán 3):

Situácia na tejto ploche bola veľmi podobná predošlému úseku 3.1, keďže je vlastne jeho pokračovaním. V km 15,85-16,5 bola plocha zarastená nízkou vegetáciou s výnimkou 40-50 m pásu na km 15,9, na ktorom bol uskutočnený povrchový zber. V km 16,5-16,85 bola plocha pooraná a uskutočnil sa na nej povrchový zber v línách. Na celej ploche bol použitý prieskum detektorom kovov. Týmto spôsobom neboli na ploche zistené žiadne archeologické objekty, nálezy ani situácie. Archeologický potenciál danej plochy ale nie je možné s určitosťou vylúčiť kvôli terénnym podmienkam.



Úsek 3.2; pohľad na J.



Úsek 3.2; pohľad na JV.



Úsek 3.2; povrchový zber, pohľad na JZ.

6.) Úsek 3.3 (km 16,85-17,0) = Uderiná – Uderinský mlyn (Plán 3):

Plocha bola zarastená nízkou vegetáciou a nebola pooraná. Uskutočnil sa len prieskum detektorom kovov. Týmto spôsobom neboli na ploche zistené žiadne archeologické objekty, nálezy ani situácie. Archeologický potenciál danej plochy ale nie je možné s určitosťou vylúčiť kvôli terénnym podmienkam.

7.) Úsek 4 (km 19,5-20,65) = Podrečany – Valné (Plán 4):

Celý úsek bol pooraný, i keď je nutné podotknúť, že už starou orbou. Na celej ploche trvalého záberu sa uskutočnil povrchový zber kombinovaný s prieskumom detektorom kovov. Nájdenej bola len keramika, ktorú je možné datovať do obdobia novoveku.



Úsek 4; pohľad na JV.



Úsek 4; povrchový zber, pohľad na SZ.

IV. Požiadavky na ochranu archeologických nálezísk

Požiadavky pre ďalšie stupne dokumentácie a predbežné požiadavky na realizáciu stavby sú uvedené v správe Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. DÚR. F8 Archeologický výskum, z. č. 7367-00 (*AÚ SAV 2010*, 8, 9). Je nutné zdôrazniť, že sa nerealizoval geofyzikálny prieskum ani letecká prospekcia. Naďalej doporučujeme pred realizáciou predmetnej stavby dané úkony realizovať. Povrchový prieskum a prieskum detektorom kovov bol uskutočnený len na polygónoch vyčlenených v DÚR (*AÚ SAV 2010*, 11-16) žltou farbou označených ako nepreskúmané. Ako je uvedené v kapitole III., terénne podmienky nedovoľovali preskúmať všetky polygóny metódou povrchového zberu. V správe DÚR sa taktiež nachádzajú evidované archeologické lokality, ktoré priamo porušuje budúca trasa rýchlostnej cesty (*AÚ SAV 2010*, 5-7, 11, 13, 14):

Lokalita 1: Kriváň, poloha „Dolné Diely“

Lokalita 2: Kriváň, poloha „západne od kóty 503 m n. m.“

Lokalita 3: Mýtna, poloha „intravilán“

Lokalita 4: Lovinobaňa, poloha „intravilán“

Ako predstihovú prieskumnú časť za účelom explicitného orientovania sond a polygónov v terénnej časti výskumu odporúčame uskutočniť geofyzikálny prieskum. Plocha prieskumu tvorí v týchto miestach spolu približne 8,5 ha. Veľkosť pracovného tímu odhadujeme v počte 4 odborní pracovníci s pracovnou dobou minimálne 2 týždne (týždeň terénne merania a týždeň odborné spracovanie výsledkov) pre všetky štyri lokality. V týchto miestach je nutné uskutočniť zisťovaciu sondáž s následným archeologickým výskumom v kontexte metodiky popísanej nižšie v odseku o spresnení informácií. Za účelom týchto prác odhadujeme pracovný tím v zložení: 3 x odborný pracovník, 3 x technický pracovník, 15 x robotník; s trvaním zemných prác v rozsahu minimálne 2 mesiace pre každú lokalitu.

Skutočný rozsah terénnych prác bude závisieť od konečného počtu objavených lokalít, ich rozsahu, množstva archeologických objektov a situácií.

Na spracovanie archeologickej výskumnej dokumentácie odhadujeme pracovný tím v zložení: 3 x odborný pracovník; 3 x technický pracovník; s trvaním v rozsahu minimálne 1 mesiac pre každú lokalitu. Skutočný rozsah dokumentačných prác bude závisieť od konečného počtu objavených lokalít, ich rozsahu, množstva archeologických objektov a situácií. Veľmi dôležitým faktorom budú artefakty – ich počet, druh a zachovanosť.


Okrem týchto bodov je nutné podotknúť a spresniť niektoré informácie:

- Orientačnú cenu výkonov na základe hodinových sadzieb bez DPH treba upraviť nasledovne: robotníci €12/hodina; technickí pracovníci €20/hodina; archeológovia €25/hodina; geofyzikálny prieskum €90/hodina.
- na úsekoch s pozitívnymi archeologickými nálezmi je nutné v predstihu pred samotnými zemnými prácami uskutočniť zisťovaciu sondáž v podobe priebežných sond v rozsahu trvalého záberu stavby za účelom zistenia skutočného archeologického potenciálu daných úsekov (v prípade vhodného povrchu je vhodné vykonať geofyzikálny prieskum). Skrývku ornice je nutné v týchto prípadoch uskutočniť za pomoci mechanizmu s plochou svahovacou lyžicou.
- po pozitívnom náleze v zisťovacích sondách je nutné zistiť rozsah lokality menšími zisťovacími sondami (len v prípade ak nebol vykonaný geofyzikálny prieskum) a následne v priestore s výskytom archeologických nálezov, objektov alebo situácií realizovať plošnú skrývku ornice s plochou svahovacou lyžicou (ak je potrebné aj podorničia) a záchranný archeologický výskum
- Počas záchranného archeologického výskumu (najmä v miestach potvrdených archeologických lokalít) je potrebné okrem personálneho aj kompletné geodetické zameranie objavených archeologických lokalít a dostatočné technické zabezpečenie zo strany investora/objednávateľa (stroj s plochou svahovacou lyžicou, nákladné autá na odvoz zeminy, prenosný kontajner, unimobunka, WC a pod.)
- na úsekoch trasy rýchlostnej cesty, ktoré nie sú evidovanou archeologickou lokalitou alebo polygónom s archeologickým potenciálom uskutočniť archeologický odborný

dozor v súčinnosti so zemnými prácami v celej dĺžke úseku rýchlostnej cesty (zemné práce, odhumusovanie a skrývka ornice v prítomnosti archeológa)

- v bodoch o poskytnutí celkovej situácie stavby v požadovaných mierkach z pôvodnej správy *AÚ SAV (2010, 9)* špecifikujeme, že je nutné ju poskytnúť primárne digitálne (*.dwg formát)
- po ukončení terénnej časti prác vyčleniť časový úsek podľa rozsahu a charakteru odkrytých archeologických lokalít na vypracovanie archeologickej výskumnej dokumentácie (v rozmedzí 10 až 12 mesiacov od ukončenia terénnych prác).

Neoddeliteľnou súčasťou tejto správy je správa DÚR vypracovaná *AÚ SAV (2010)*.

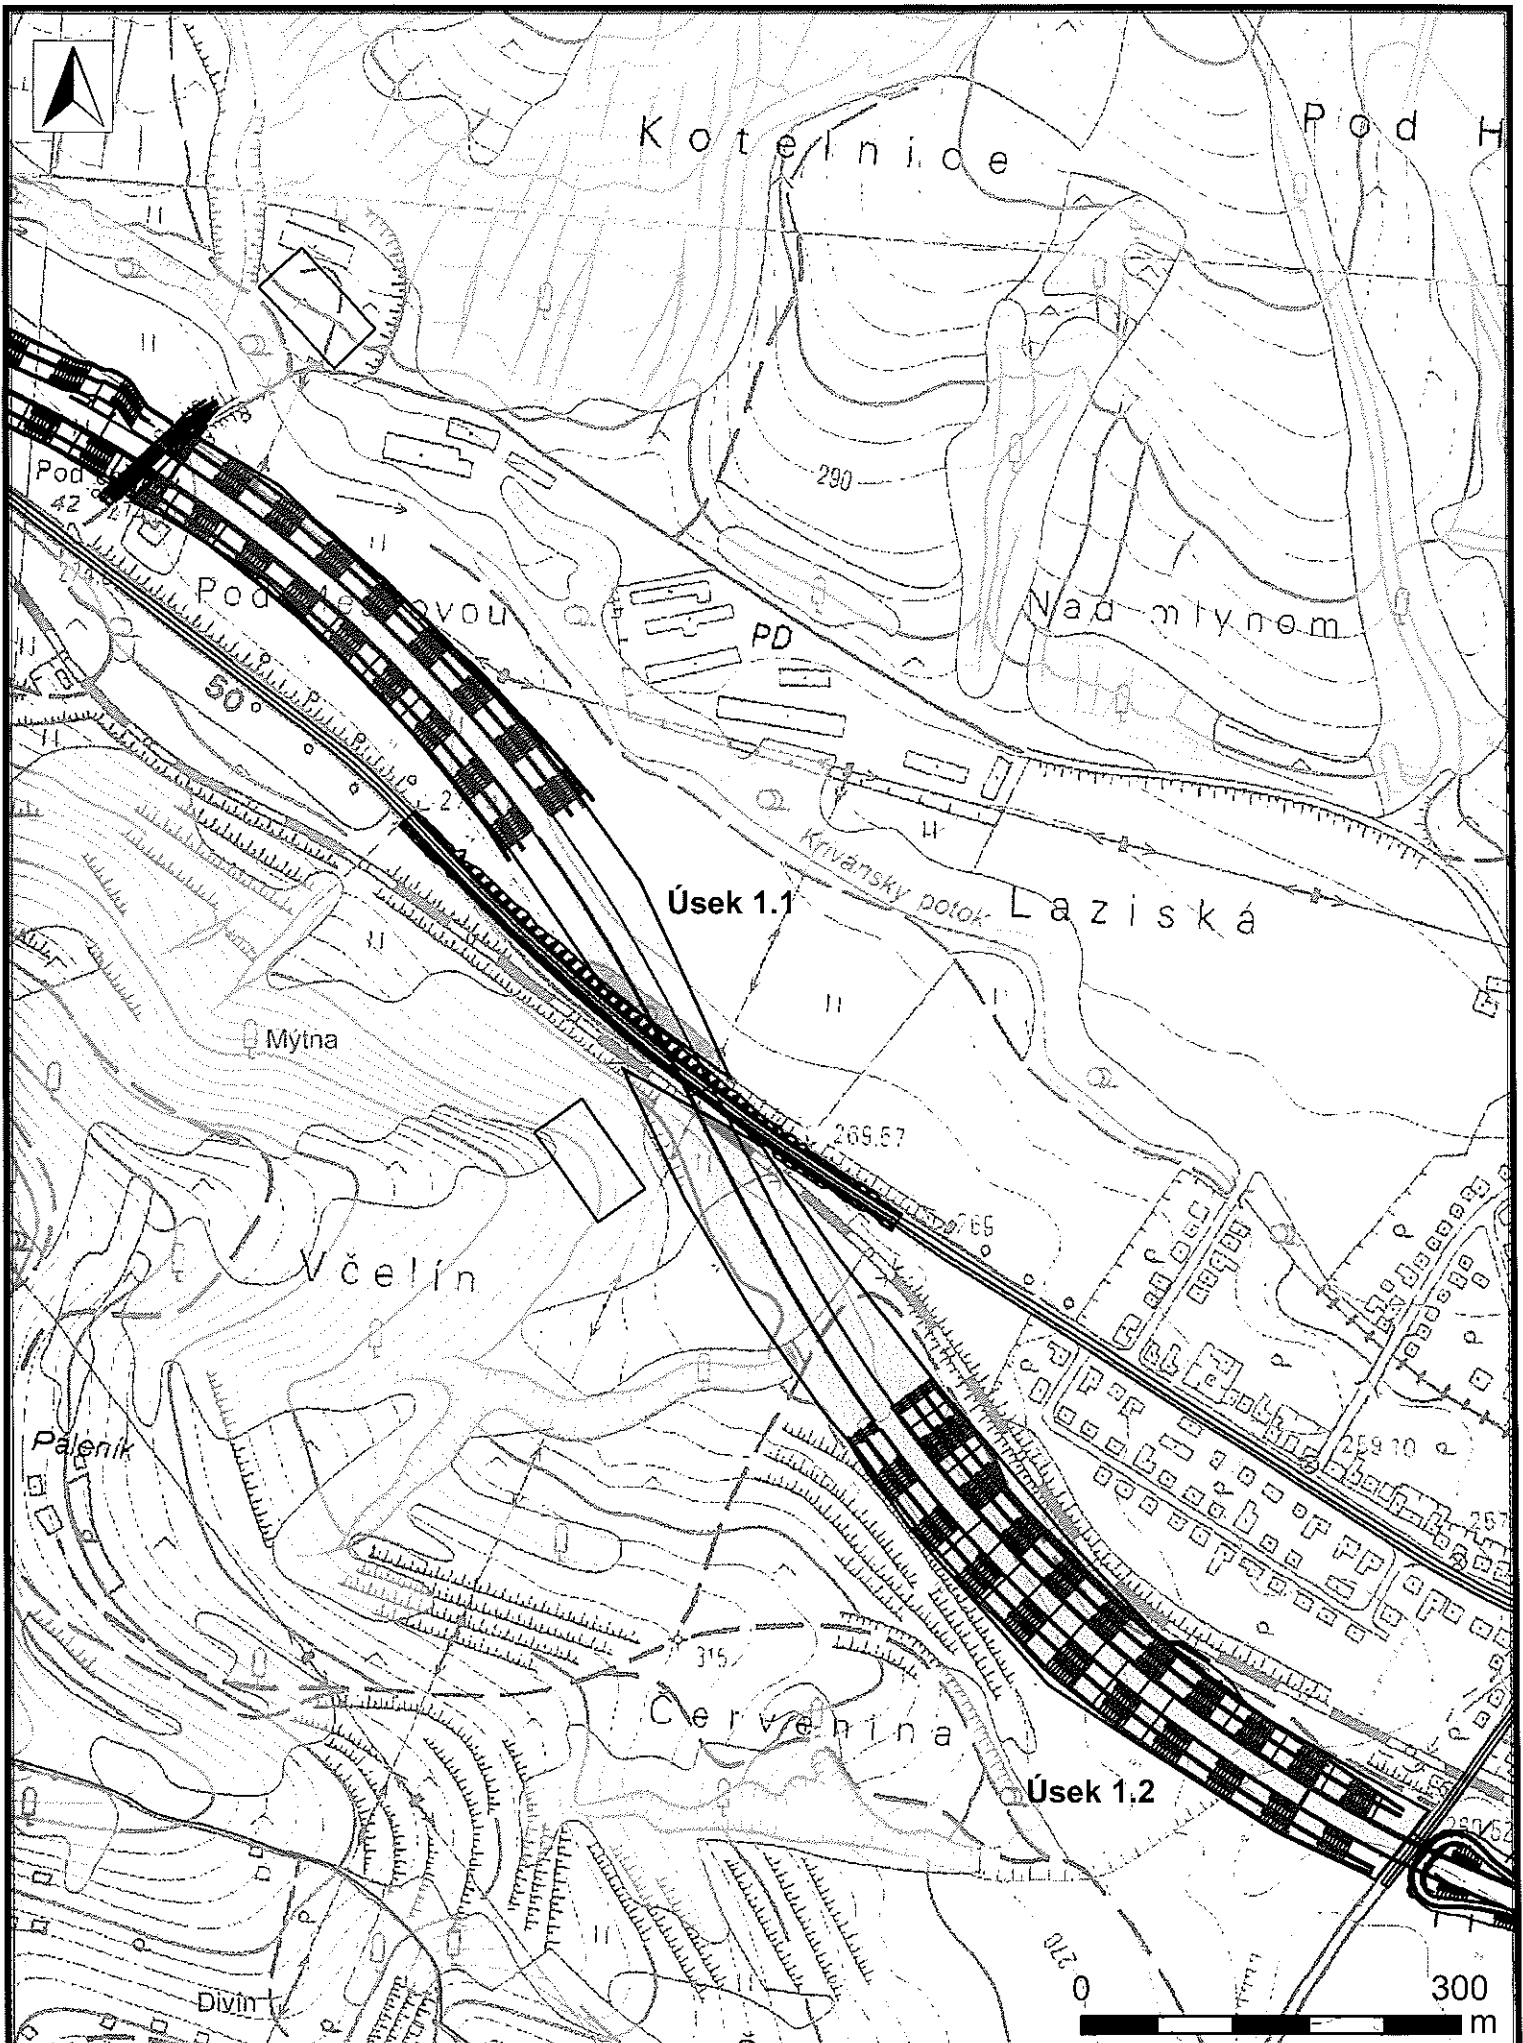

Archeologická Agentúra
Archaeological Agency

Názov/Title: Úsek 1.1, Mýtina - Pod Meškovou; Úsek 1.2, Mýtina - Červenina; okr. Lučenec

Projekt/Project: Rýchlostná cesta R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce


Mierka/Scale: 1: 6000

Vyhotovil/Drawn by: B. Šebesta

Ref. číslo/Ref. no.: P041

Dátum/Date: 15/01/2016

Plán/Fig.: 1

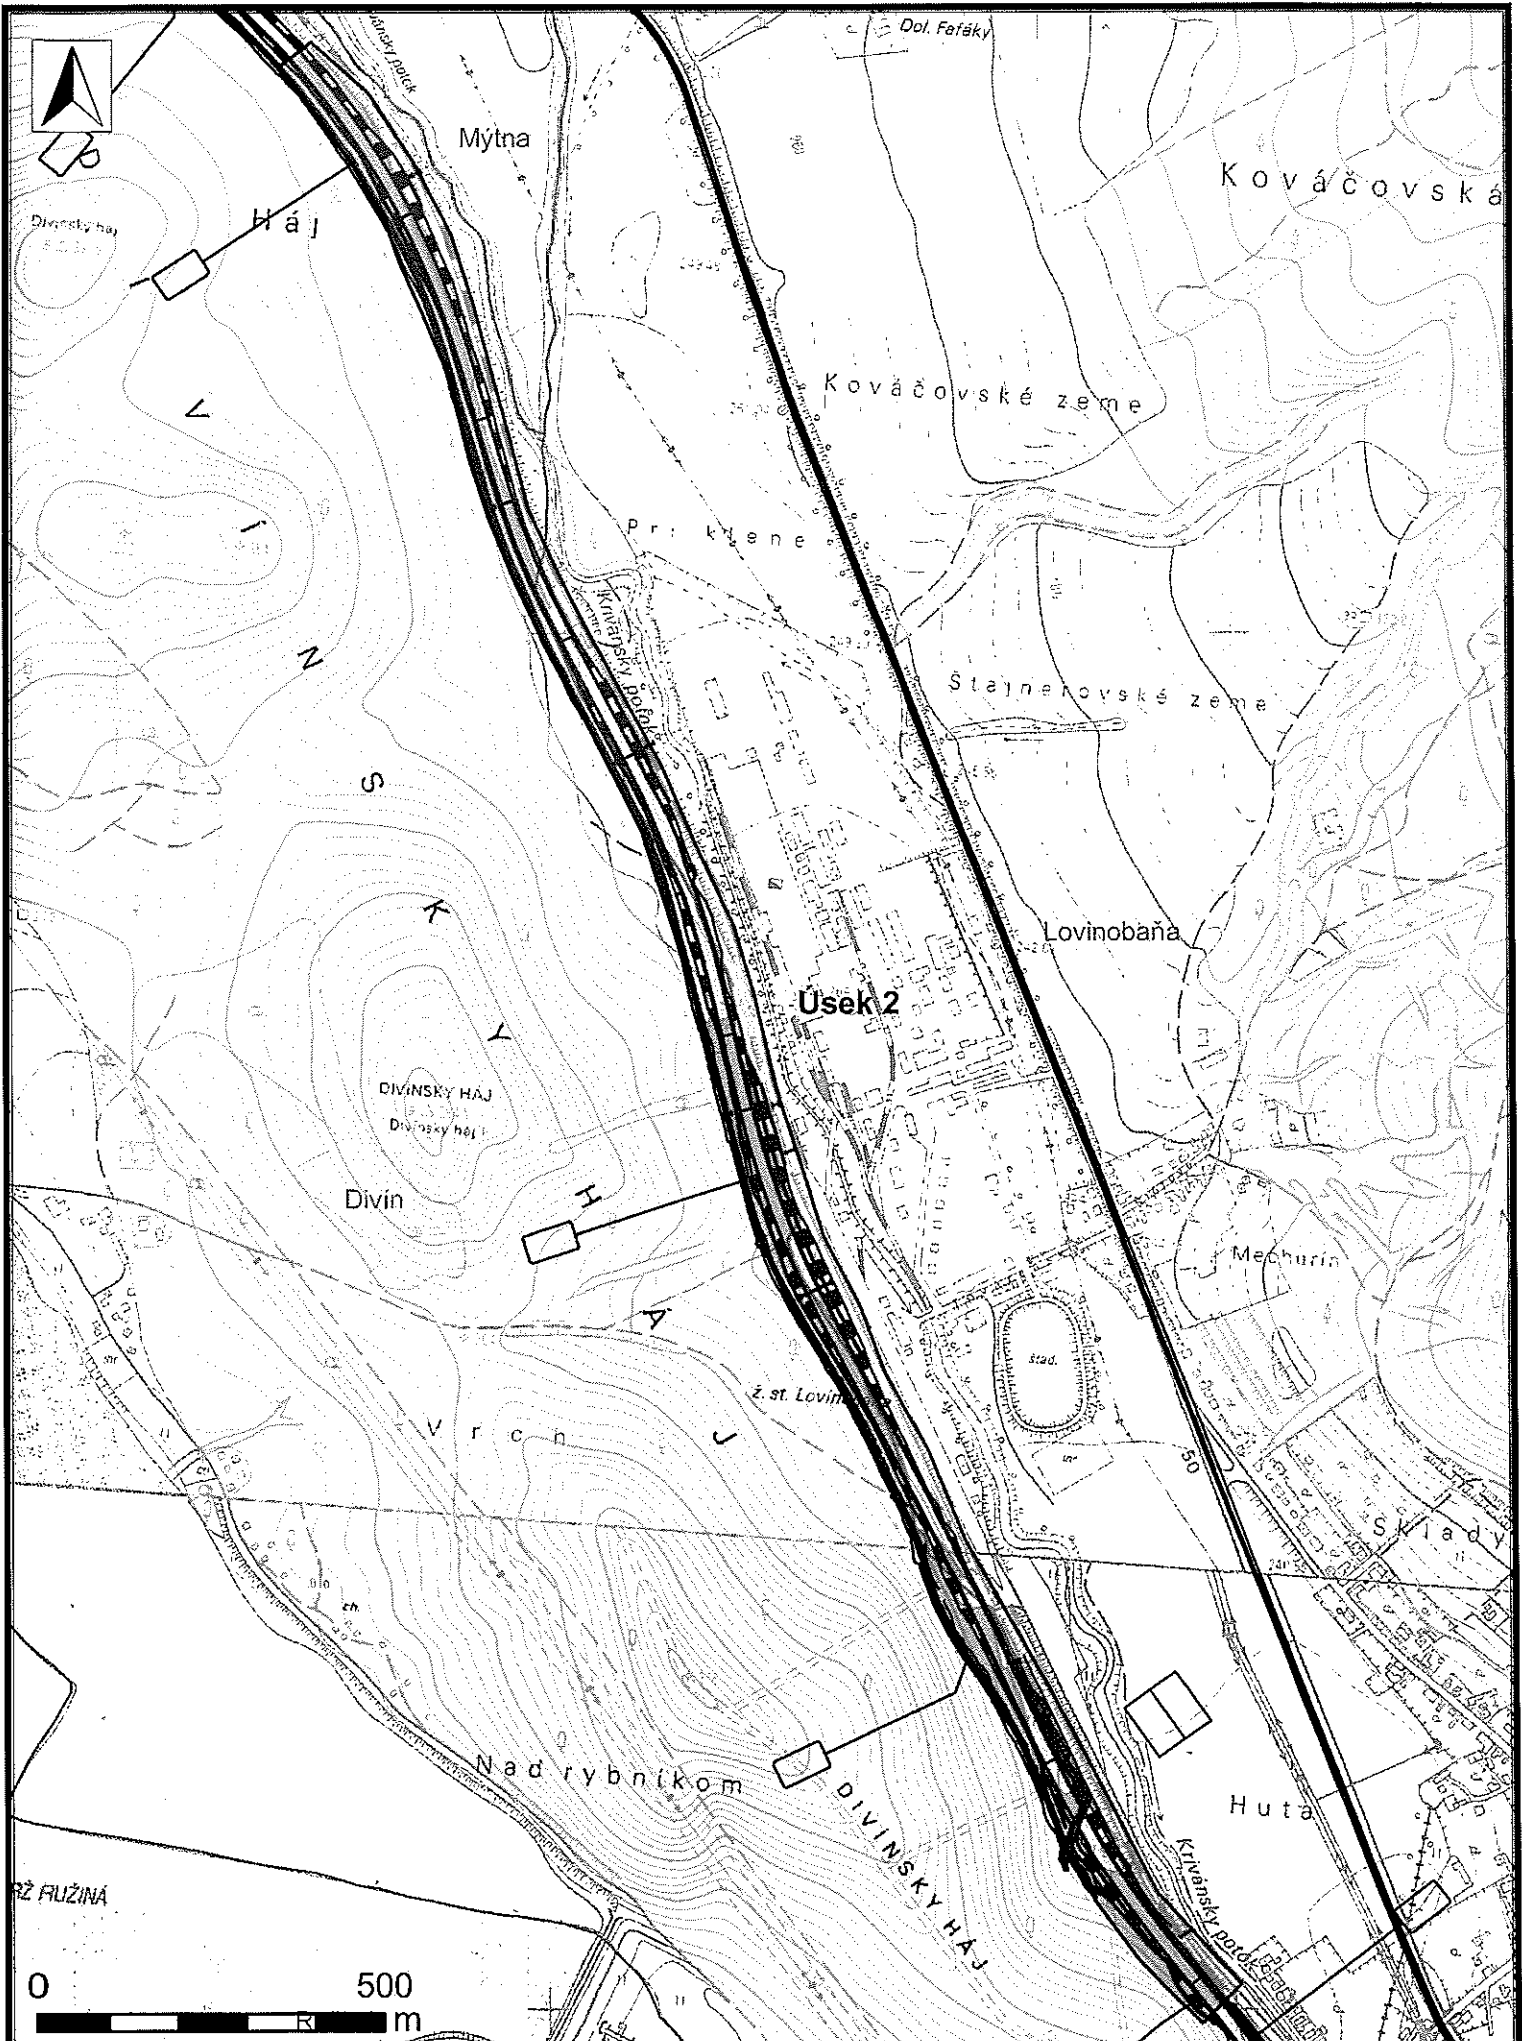

Archeologická Agentúra
Archaeological Agency

Názov/Title: Úsek 2, Divín a Lovinobaňa - Divínsky háj; okr. Lučenec

Projekt/Project: Rýchlostná cesta R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce


Ref. číslo/Ref. no.: P041

Mierka/Scale: 1: 11 000

Dátum/Date: 15/01/2016

Vyhotovil/Drawn by: B. Šebesta

Plán/Fig.: 2

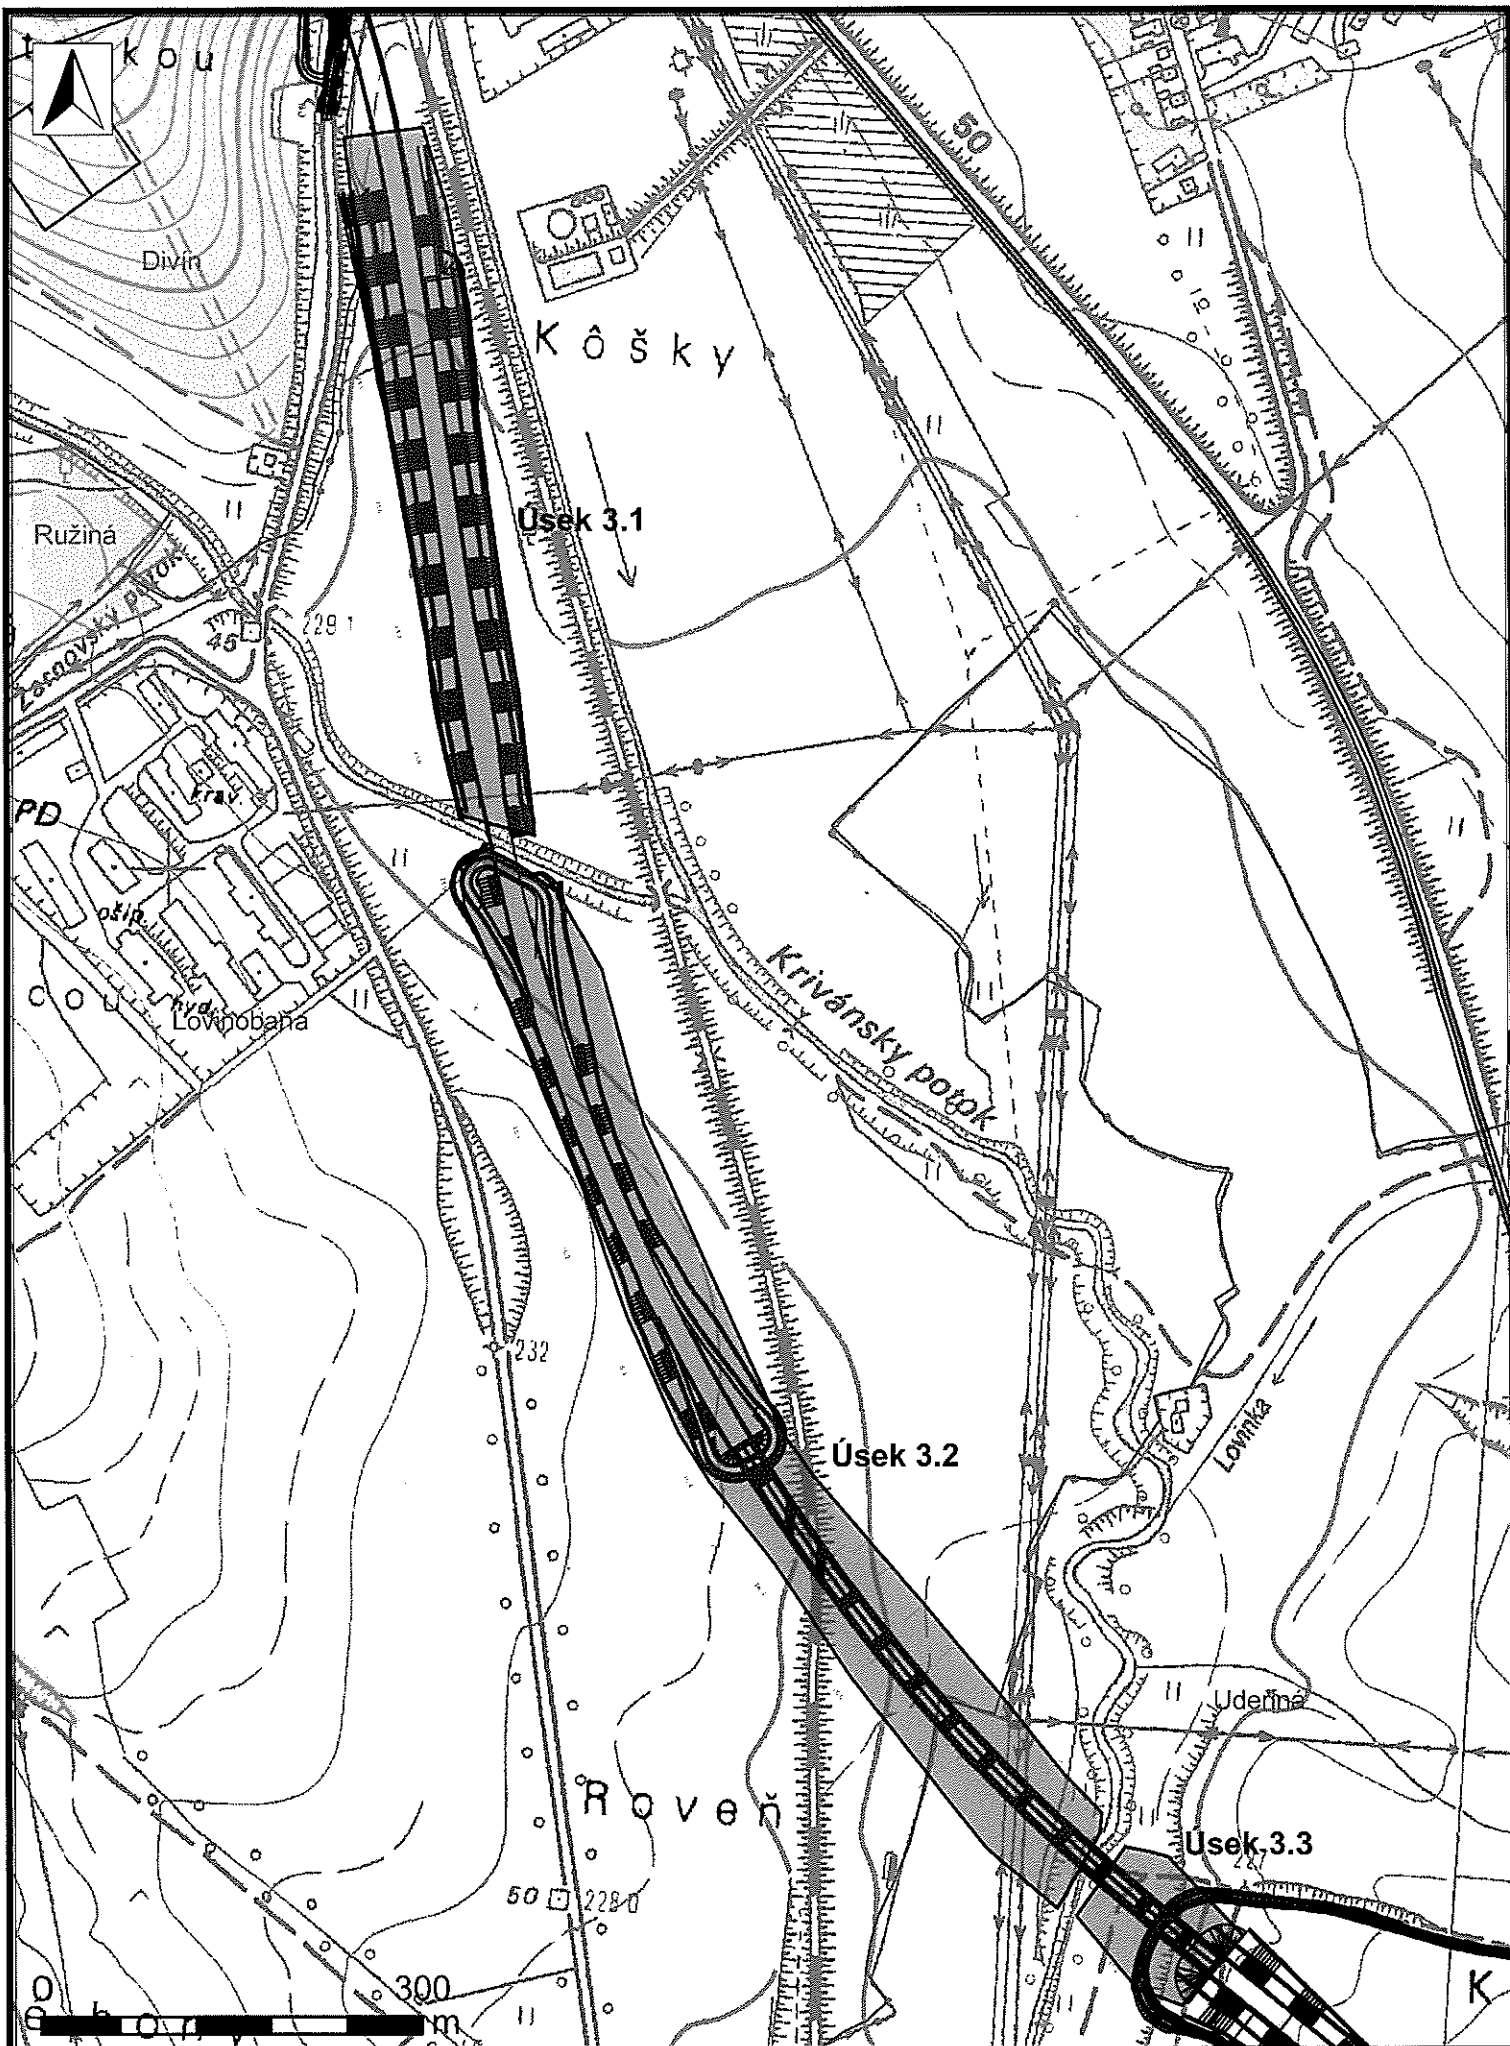

Archeologická Agentúra
Archaeological Agency

Názov/Title: Úsek 3.1, Lovinobaňa - Kôšky; Úsek 3.2, Lovinobaňa - Roven; Úsek 3.3, Uderina - Uderinský mlyn; okr. Lučenec

Projekt/Project: Rýchlostná cesta R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce


Mierka/Scale: 1: 6000

Vyhotovil/Drawn by: B. Šebesta

Ref. číslo/Ref. no.: P041

Dátum/Date: 15/01/2016

Plán/Fig.: 3

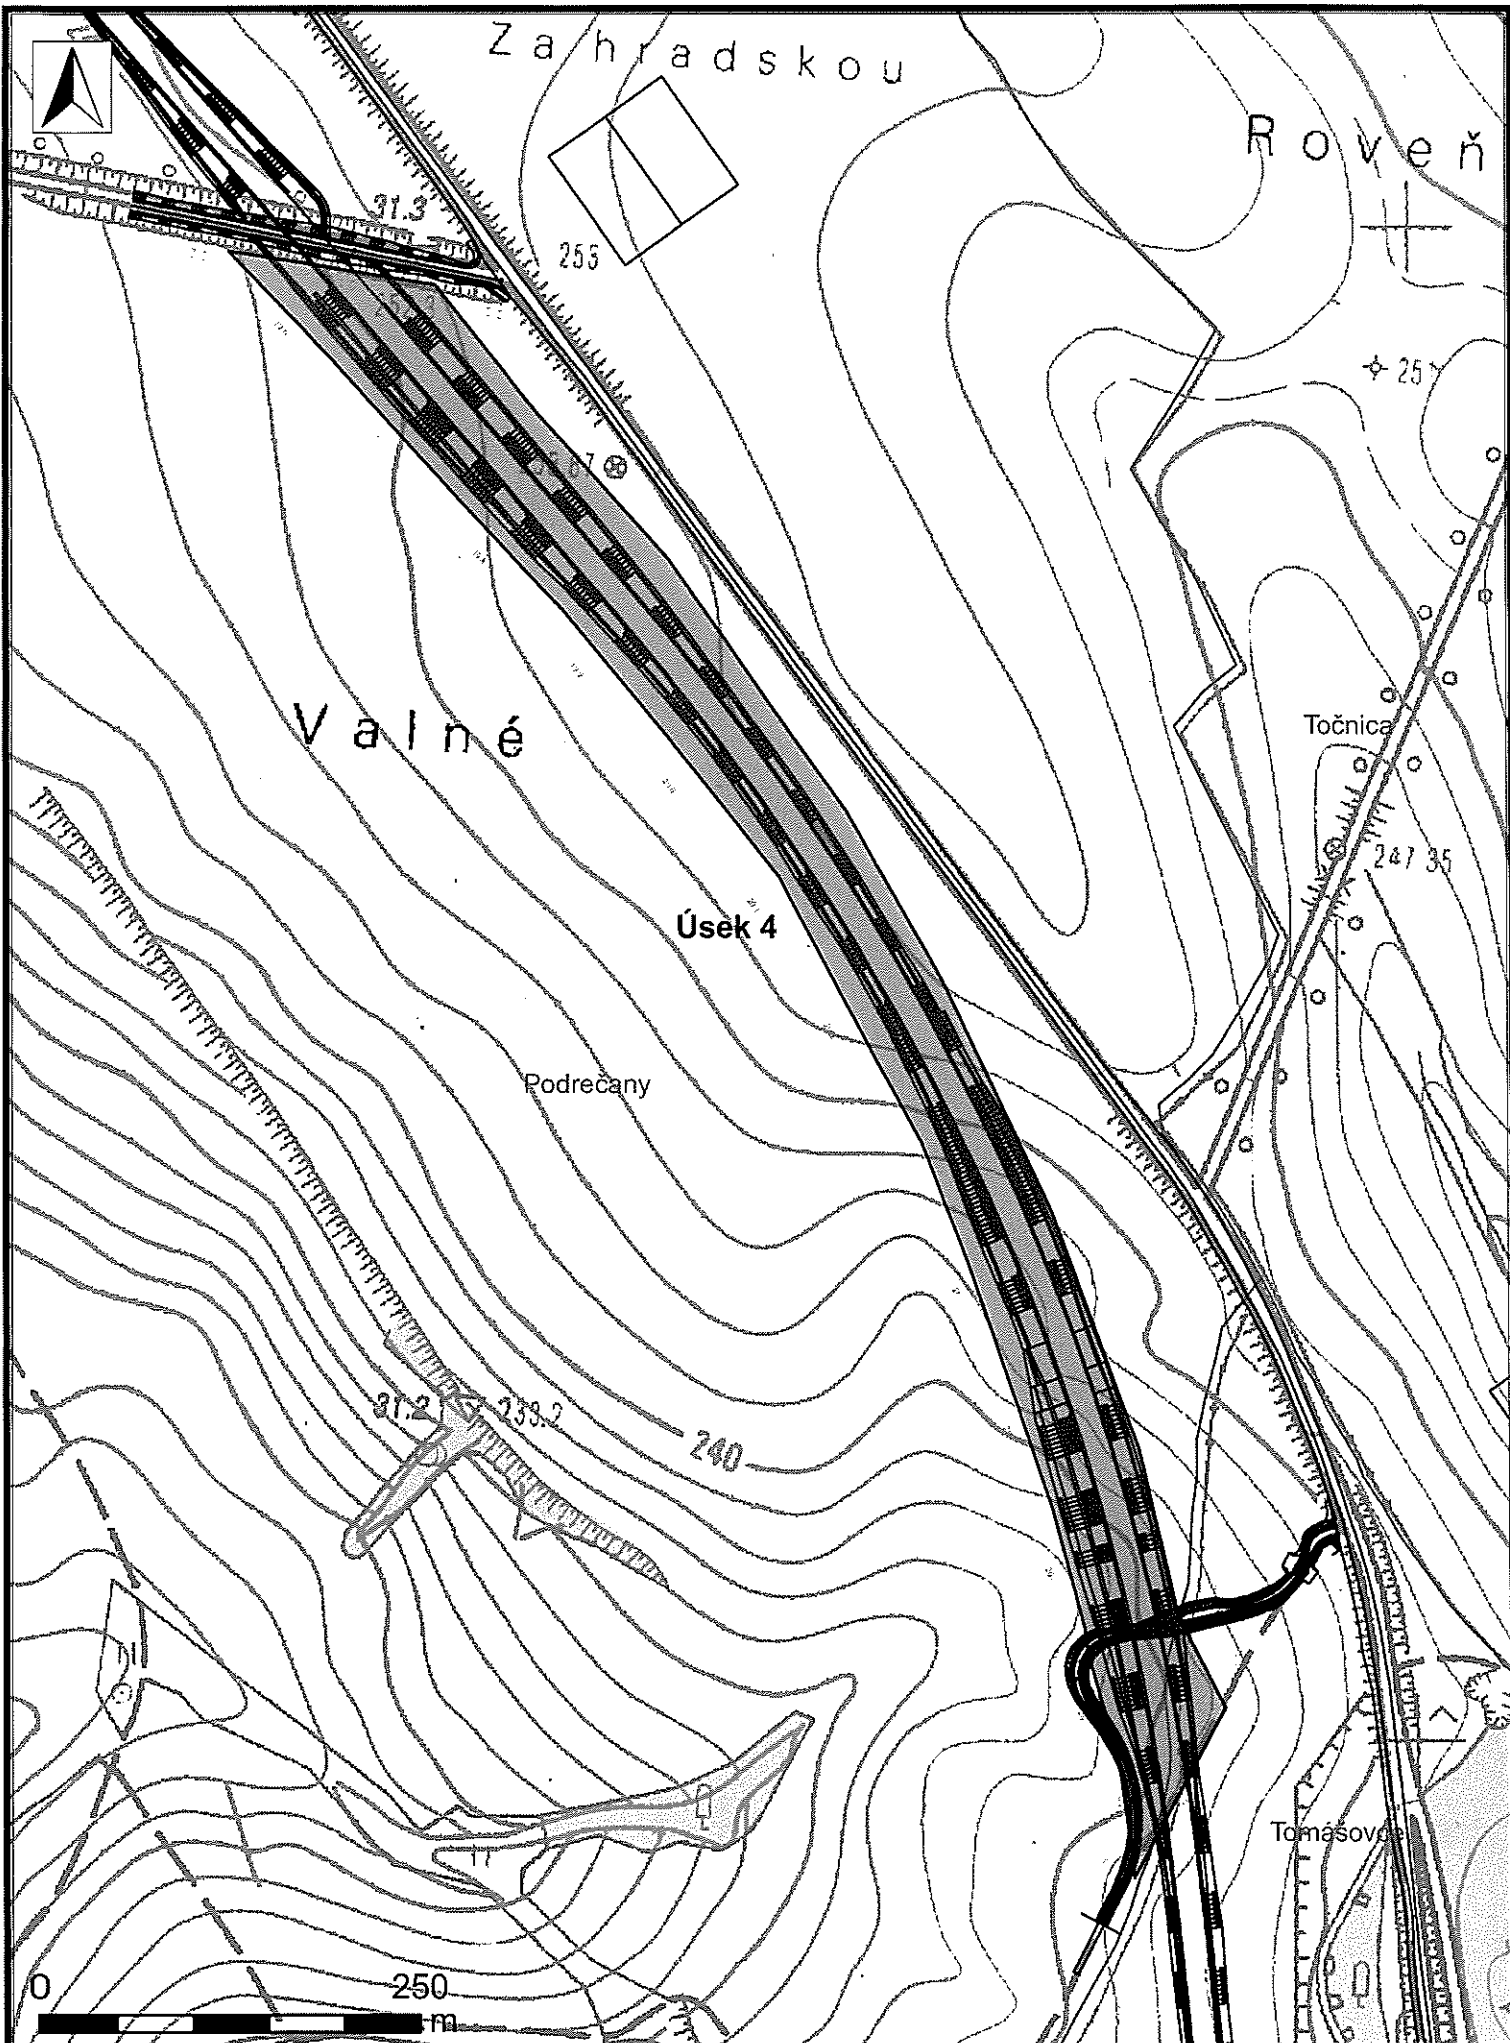

Archeologická Agentúra
Archaeological Agency

Názov/Title: Úsek 4, Podrečany - Valné; okr. Lučenec

Projekt/Project: Rýchlostná cesta R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce

Ref. číslo/Ref. no.: P041

Mierka/Scale: 1: 5000

Dátum/Date: 15/01/2016

Vyhotovil/Drawn by: B. Šebesta

Plán/Fig.: 4

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

DÚR

F. 8 Archeologický výskum

z.č. 7367-00

Objednávateľ: **DOPRAVOPROJEKT,a.s.**

Kominárska 2,4; 632 03 Bratislava

Spracoval: **Archeologický ústav SAV**

Nitra 2010

OBSAH

I. Stručná charakteristika osídlenia stredného povodia Hrona, Slatriny a Krivánskeho potoka (na trase Rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce).

II. Archeologické lokality na stavbe R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

III. Požiadavky na ochranu archeologických nálezísk

IV. Záver

V. Prílohy

I. Stručná charakteristika osídlenia stredného povodia Hrona a jej prítokov (na trase R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce)

I. Stručná charakteristika osídlenia povodia Slatiny a jej prítokov

Zvolenská kotlina predstavuje uzavretý, avšak z vnútrozemia Karpatskej kotliny relatívne prístupný geografický celok na okraji vnútorného oblúku Karpát, ktorý bol osídľovaný už v najstarších etapách slovenského praveku (neolit – lineárna a bukovohorská kultúra). Osídľovacie vlny postupovali z nížin popri vodných tokoch; jedným z nich bola Slatina a Krivánsky potok.

Kľúčovou lokalitou pre oblasť Podpoľania dodnes ostáva hradisko Detva-Kaľamárka. Výskumom P. Šalkovského v rokoch 1986-1989 sa tu potvrdilo osídlenie z mladšej až neskorej doby bronzovej cez dobu halštatskú, laténsku, rímsku, obdobie sťahovania národov až po včasný stredovek (Šalkovský 2002, 39-40). Vznik opevnenej osady v Detve-Kaľamárke sa nedial samostatne, ale bol výsledkom spomínaných kolonizačných vln do oblasti Podpoľania v jednotlivých obdobiach. Dokladajú to už objavené osady na terasách Slatiny a Krivánskeho potoka a vytvára sa tým aj predpoklad pre objavenie ďalších nálezísk v tejto oblasti.

Dôležitým náleziskom v blízkosti povodia Slatiny je Lieskovec-Hrádok s potvrdeným osídlením z obdobia eneolitu, doby bronzovej a doby rímskej a osada nachádzajúca sa v jeho bezprostrednej blízkosti. V povodí pravobrežného prítoku Slatiny – Hučavy sú doložené archeologické lokality v katastroch obcí Hrochoť (hradisko z doby bronzovej Chochuľka a jaskynné nálezisko z obdobia sťahovania národov - Abčiná). Ďalšie hradisko z doby bronzovej sa nachádza v obci Uderiná v polohe Hradište. V obci Očová sú potvrdené dve osady a depot z doby bronzovej. Hroby z doby bronzovej sa našli v Podrečanoch. Sídliisko z doby bronzovej je doložené v intraviláne Lovinobane. Ďalšiu osadu prieskumom zistil P. Šalkovský v Dúbravách-Želobudzy. Juhovýchodne od Želobudze sa nachádza hradisko Svošť. Vo Zvolenskej Slatine sú potvrdené nálezy badenskej kultúry (poloha Kobelovec) a pohrebisko lužickej kultúry (poloha Boroviny).

Pomerne intenzívne osídlenie juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny (povodie Slatiny) a povodia Krivánskeho potoka v praveku i včasnej doby dejinnej dokladajú aj náleziská priamo z trasy plánovanej cesty R2 (Detva-Krné, lužická kultúra); Pstruša (poloha Kostolisko/Horevodie, polykultúrna lokalita s nálezmi z doby bronzovej až včasného stredoveku); Kriváň (poloha Dolné Diely, doba bronzová?). Z včasného stredoveku pochádzajú aj sídliskové nálezy z Tomášoviec. Podobne v trase prítoku Ipľa, t.j. Krivánskeho potoka.

Povodie Slatiny a Krivánskeho potoka bolo teda od praveku dôležitou komunikačnou tepnou nadregionálneho a diaľkového významu spájajúcou oblasť stredného Poiplia a stredného Pohronia. Ako vidíme z plánovanej výstavby rýchlostnej cesty R2, túto bonitu si trasa starej obchodnej cesty popri Slatine a Krivánskom potoku udržala dodnes.

II. Archeologické lokality na rýchlostnej ceste R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce.

Predchádzajúca charakteristika osídlenia dokladá bohaté osídlenie tohto regiónu v dávnej i menej vzdialenej minulosti. Časť nálezov z archeologických lokalít reprezentuje kontakty s vyspelým kultúrnym prostredím ďaleko za hranicami Slovenska, čím lokality nadobúdajú nadregionálny význam. Rozmanitými stavebnými aktivitami dochádza nezriedka k poškodeniu, prípadne k úplnému zničeniu archeologických lokalít, ktoré sú právom chránené pamiatkovým zákonom. Aby sa predišlo ich likvidácii a tým k strate národného kultúrneho dedičstva, je potrebné lokality preskúmať archeologickým výskumom. Takáto situácia sa javí aj v prípade naplánovanej rýchlostnej cesty, ktorá prechádza či už priamo, alebo okrajovo areálom niekdajších sídlisk. Na úseku ide o nasledujúce lokality, cez ktoré priamo prechádza naplánované teleso cesty R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce.

Vzhľadom na uvedené navrhujeme v 1. zisťovacej etape archeologického výskumu sledovať terasy Slatiny a Krivánskeho potoka, a to:

Lokalita: 1: Kriváň

Poloha: Dolné Diely

Datovanie: pravek (doba bronzová?)

Nálezy: keramika

Lit: prieskum Malček/Beljak 2007

Lokalita: 2: Kriváň

Poloha: západne od kóty 503 m.n.m., lokalita môže zasahovať až do trasy cesty

Datovanie: paleolit?

Nálezy: silicítové úštepky

Lit: nepublikovaná NS z archívu AÚ SAV v Nitre (Bárta 8481/78)

Lokalita: 3: Mýtna

Poloha: intravilán

Datovanie: stredovek Obec pochádza zo 14 storočia, z roku 1393. V listinách sa vyskytuje pod názvom *Wamuslehtaya* tj. Mýtna lehota, v roku 1467 *Wamosfalva* Nad obcou sa vypína

evanjelický kostol a cintorín, ktorý je spoločný s obcou Dobroč. Je ohradený múrom, ktorý podľa odhadu archeológov pochádza z konca 13. a začiatku 14. storočia.

Nálezy: keramika

Lit: www.mytna.sk

Lokalita: 4: **Lovinobaňa**

Poloha: intravilán

Datovanie: doba bronzová a stredovek. Z intravilánu obce sú potvrdené sídliskové nálezy pilinskej kultúry z doby bronzovej (ústna informácia PhDr. Vladimíra Mitáša, PhD.). Obec sa spomína od roku 1336 a v minulosti patrila k Divínskemu panstvu. O starobyľom pôvode obce Lovinobaňa uvádzajú, že toto územie v časoch nadvlády Tomajovcov (od roku 1222) nebolo ľudoprázdne, že tu už predtým existovalo staršie slovanské osídlenie. Z prvkov materiálnej povahy sa spomína Lovinobanský kostol už v 14. storočí. Prvé stopy vzťahujúce sa na banskú činnosť v Lovinobani pochádzajú z roku 1247 až 1250, kedy kráľ Belo IV. vzal pôdu a teda aj ťažbu a prevzal ju tak do kráľovskej starostlivosti (jednalo sa hlavne o striebro).

Nálezy: keramika

Lit: nepublikovaná NS AÚ SAV v Nitre V. Mitáš, www.lovinobana.sk

Lokality v blízkosti plánovanej cesty:

Lokalita: 5: **Uderiná/Točnica**

Poloha: Hradište

Datovanie: doba bronzová – hradisko kyjatickej kultúry

Nálezy: keramika

Lit: nepublikovaná NS z archívu AÚ SAV v Nitre (Furmánek 4176/67).

Lokalita: 6: **Podrečany**

Poloha: Hrb

Datovanie: doba bronzová – pohrebisko kyjatickej kultúry

Nálezy: keramika, hrobové inventáre

Lit: nepublikovaná NS z archívu AÚ SAV v Nitre (Budinský-Krička 156/41).

Lokalita: 7: **Tomášovce**

Poloha: SZ od obce

Datovanie: včasný stredovek – osada

Nálezy: keramika

Lit: nepublikovaná NS z archívu AÚ SAV v Nitre (Janek 6331/72).

Lokalita: 8: **Tomášovce**

Poloha: intravilán

Datovanie: stredovek – osada *Prvá historická zmienka o obci TOMASOVCE sa nachádza v listine Belu IV. Vydaná je vo Zvolene 3.augusta roku 1247.Je zachovaný aj hodnoverný opis vydaný prepostom Filipom a Ostrihomskou kapitulou po3.8.1247.*

Nálezy: keramika

Lit: nepublikovaná NS z archívu AÚ SAV v Nitre (Janek 6331/72),
www.tomasovce.sk.

Z polôh na trase R2, kde doteraz neboli evidované archeologické nálezy (čo je spôsobené stavom výskumu a prieskumu v tejto oblasti), ale kde je výskyt archeologických nálezov mimoriadne pravdepodobný - treba spomenúť predovšetkým pravobrežnú a ľavobrežnú terasu Krivánskeho potoka (k.ú. Mýtna, Lovinobaňa, Podrečany) – tak ako je to zvýraznené v grafickej prílohe.

III. Požiadavky na ochranu archeologických nálezísk

Požiadavky d'alšie stupne dokumentácie:

DSP:

Vyššie uvedený zoznam lokalít jednoznačne dokázal prítomnosť archeologických nálezísk. Žiaľ, veľká časť nálezov je staršieho dáta a dnes už presne nelokalizovateľná. Preto je potrebné v ďalšom stupni projektovej dokumentácie **DSP - zabezpečiť vykonanie podrobného archeologického povrchového prieskumu spojeného výberovou s geofyzikálnou a leteckou prospekciou, prípadne i so zisťovacou sondážou, ktorého výsledkom bude územná archeologická štúdia, v ktorej bude definovaný stav archeologických lokalít, náročnosť výskumu a čas potrebný na ich archeologický výskum.**

Predpokladaný rozsah výskumu:

dĺžka: 2 mesiace (mimo december – február)

Personálne zabezpečenie:

- archeológ – 320 hod.
- technický pracovník – 320 hod.
- archeologický robotník – 320 hod.
- geofyzika – 40 hod.

Orientačná cena výkonov na základe hodinových sadzieb bez DPH:

- Robotníci hod. sadzba 5,5 Eur
- Technickí pracovníci hod. sadzba 11,5 Eur,-Sk
- Archeológ hod. sadzba 16,0 Eur
- Geofyzika hod. sadzba 95,0 Eur

Predbežné požiadavky na realizáciu stavby:

Sumarizáciou poznatkov o archeologických náleziskách v rámci prípravy DÚR sa potvrdil pomerne hustý výskyt archeologických nálezísk v predpokladanej trase.

Následne v rámci stavebných prác bude potrebné:

- zabezpečiť odhumusovanie iba za prítomnosti archeológa – osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou na konanie archeologického výskumu a to najmenej 2 mesiace pred plánovaným začiatkom realizácie stavby
- v mieste výskytu archeologických nálezísk zabezpečiť odstránenie ornice buldozermi a podorničia zemnými strojmi s plochou svahovacou lyžicou (UDS a pod.) pod dohľadom archeológa najmenej 4 mesiace pred začiatkom výstavby
- v harmonograme stavby vyčleniť časový priestor na realizáciu jednotlivých archeologických výskumov (podľa tejto správy)
- realizátorovi výskumu poskytnúť celkovú situáciu stavby (1:10 000) a v miestach s výskytom arch. nálezísk 1:1000
- poskytnúť ortofotomapu
- požiadať o rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu Pamiatkový úrad SR, resp. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (najlepšie už pri príprave DSP)

IV. Záver

Na základe vykonaného prieskumu možno predpokladať výskyt archeologických lokalít v viacerých polohách. Uvedený počet archeologických lokalít, **ktoré ležia priamo v telese cesty** (prílohy), nemusí byť konečný. Mnohé polohy sú poľnohospodársky neobrábané, a tým pre archeológov neprístupné a neznáme. Výskum tiež ukázal, že časť sídlisk leží pod výraznejšími soliflukčnými naplaveninami, a tak sa ani hlbokou orbou nemusia na povrch ornice dostať archeologické nálezy. Taktiež veľmi dôležité sú výšinné osídlené polohy.

Pri odhumusovaní celej trasy cesty je potrebná prítomnosť archeológa. Nemožno vylúčiť, že sa počas realizačných prác objavia nové archeologické lokality mimo tých, ktoré sú vyznačené na priložených mapách.

V Nitre, 30. 03. 2010

PhDr. Ján Beljak, PhD.

PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

V. Prílohy


A/ Mapy

B/ Fotografie terénnej situácie


modrou farbou - známe archeologické lokality
žltou - pravdepodobný výskyt archeologických lokalít




Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

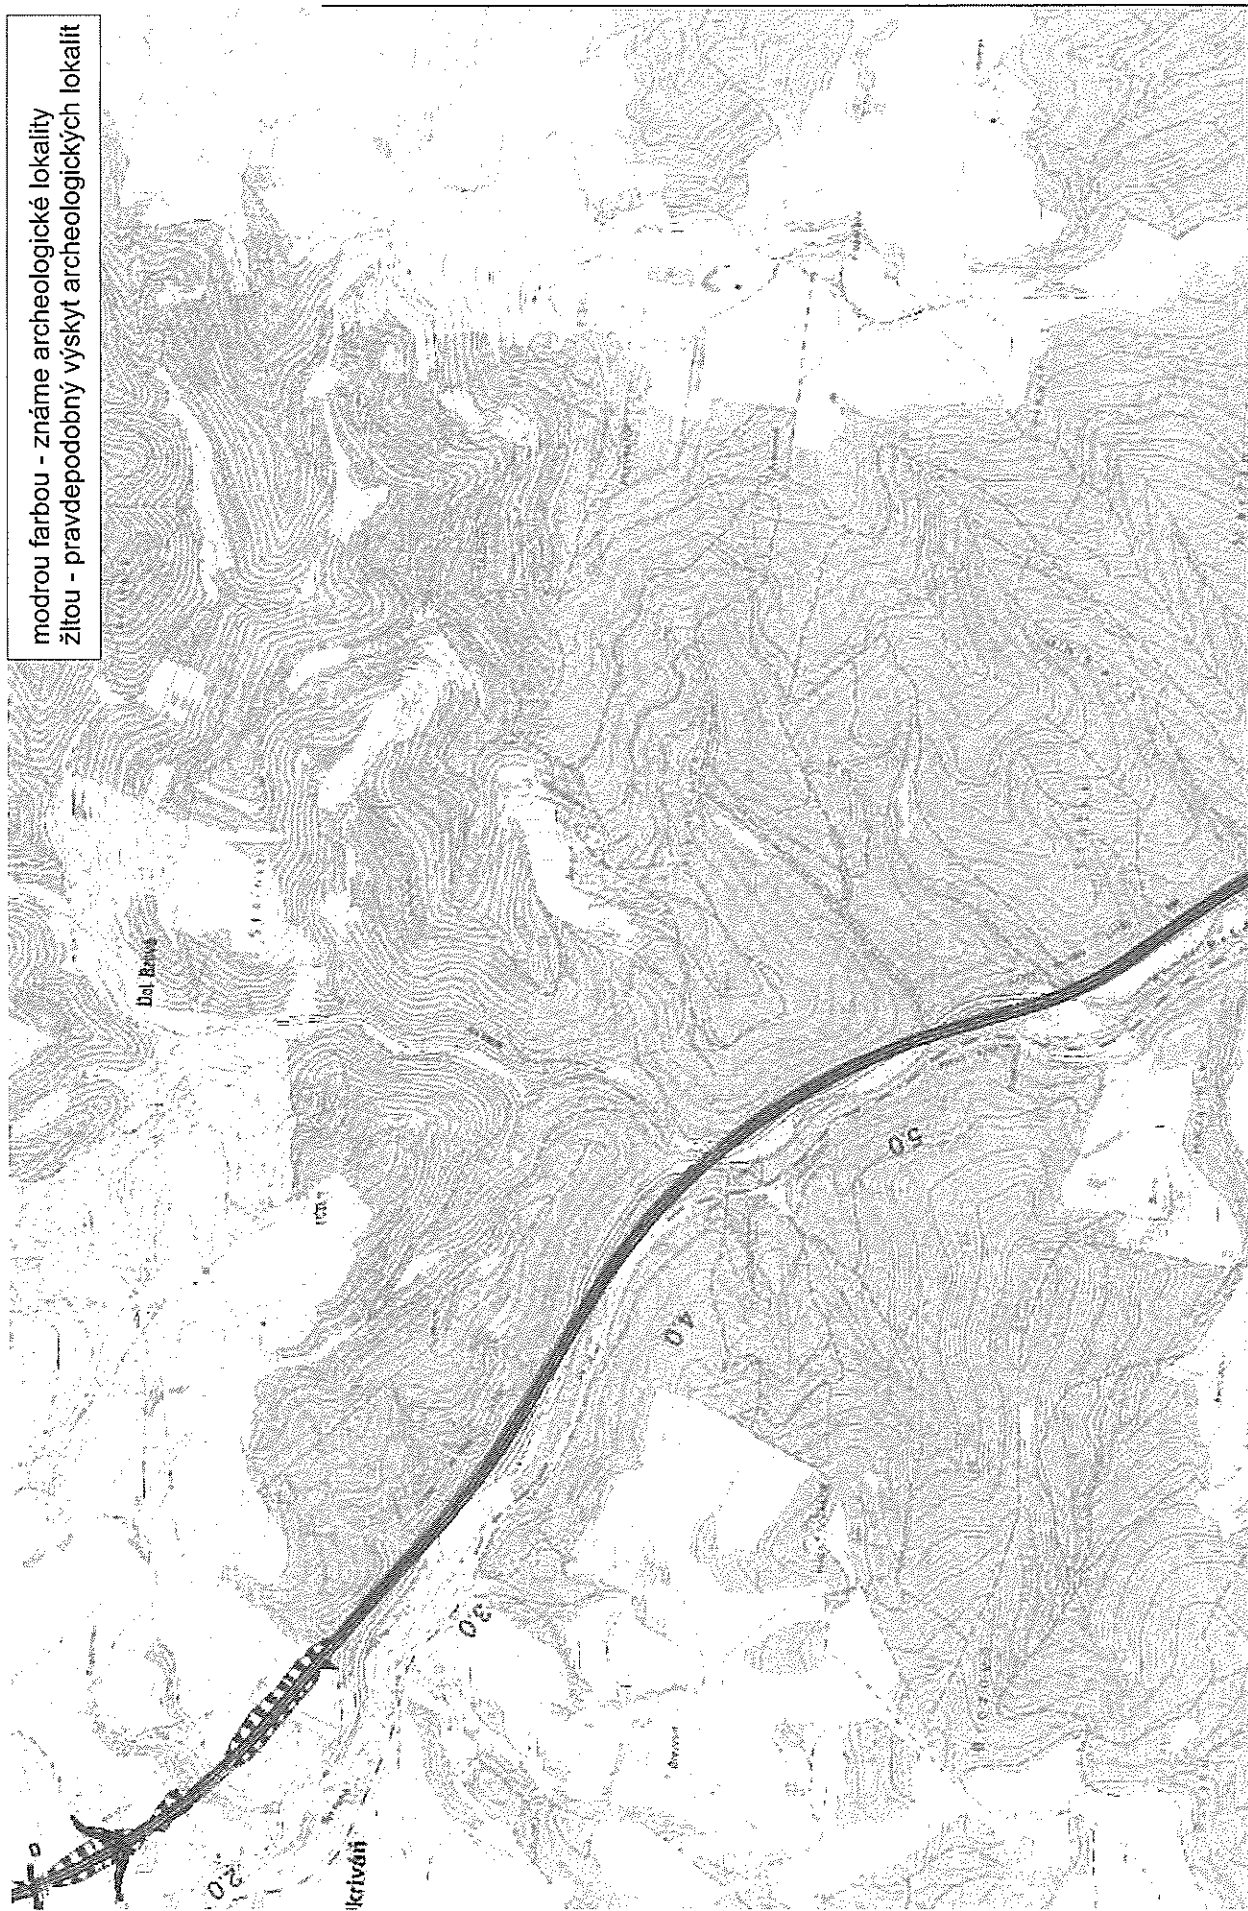


Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

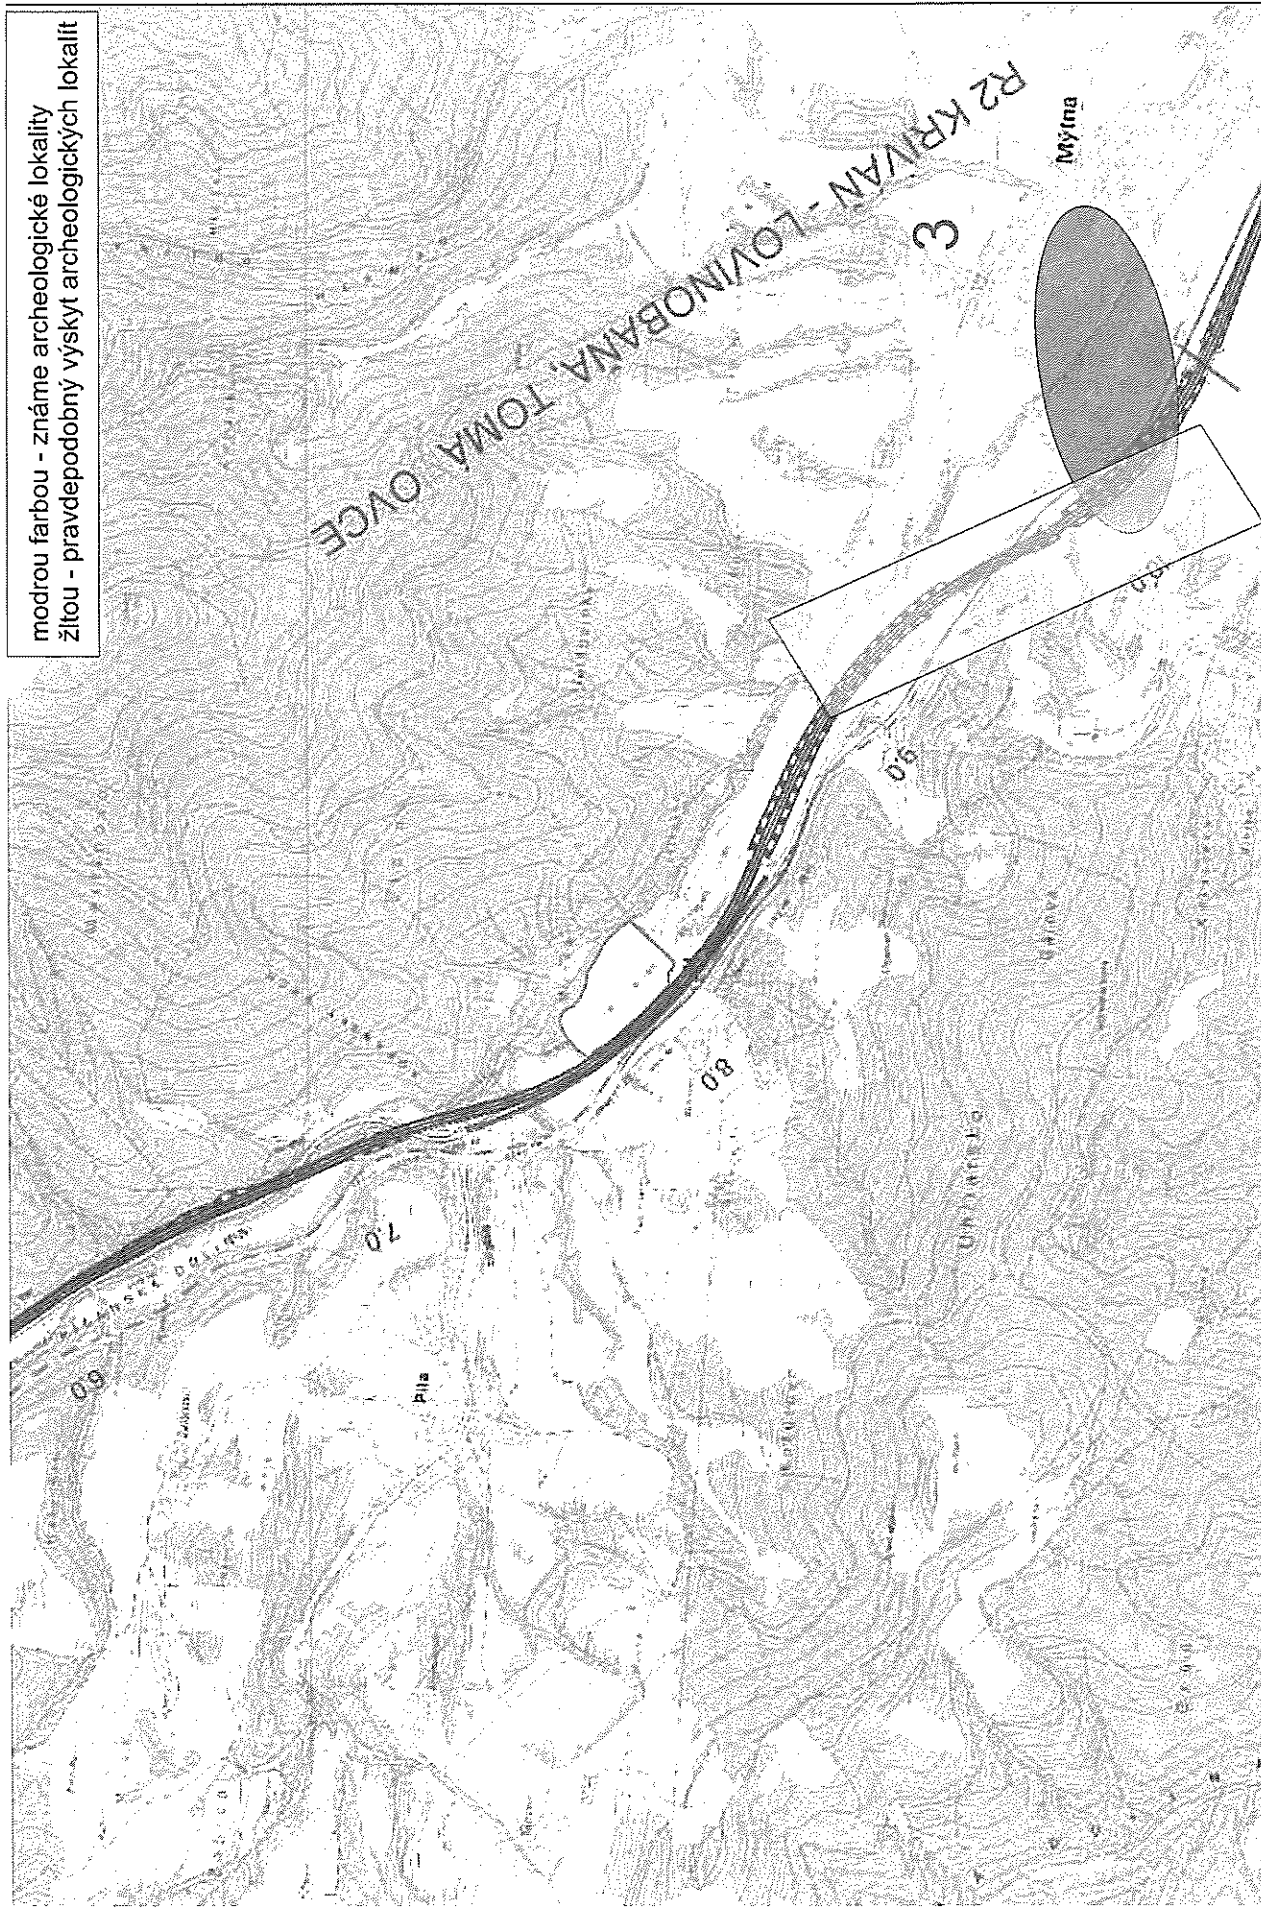


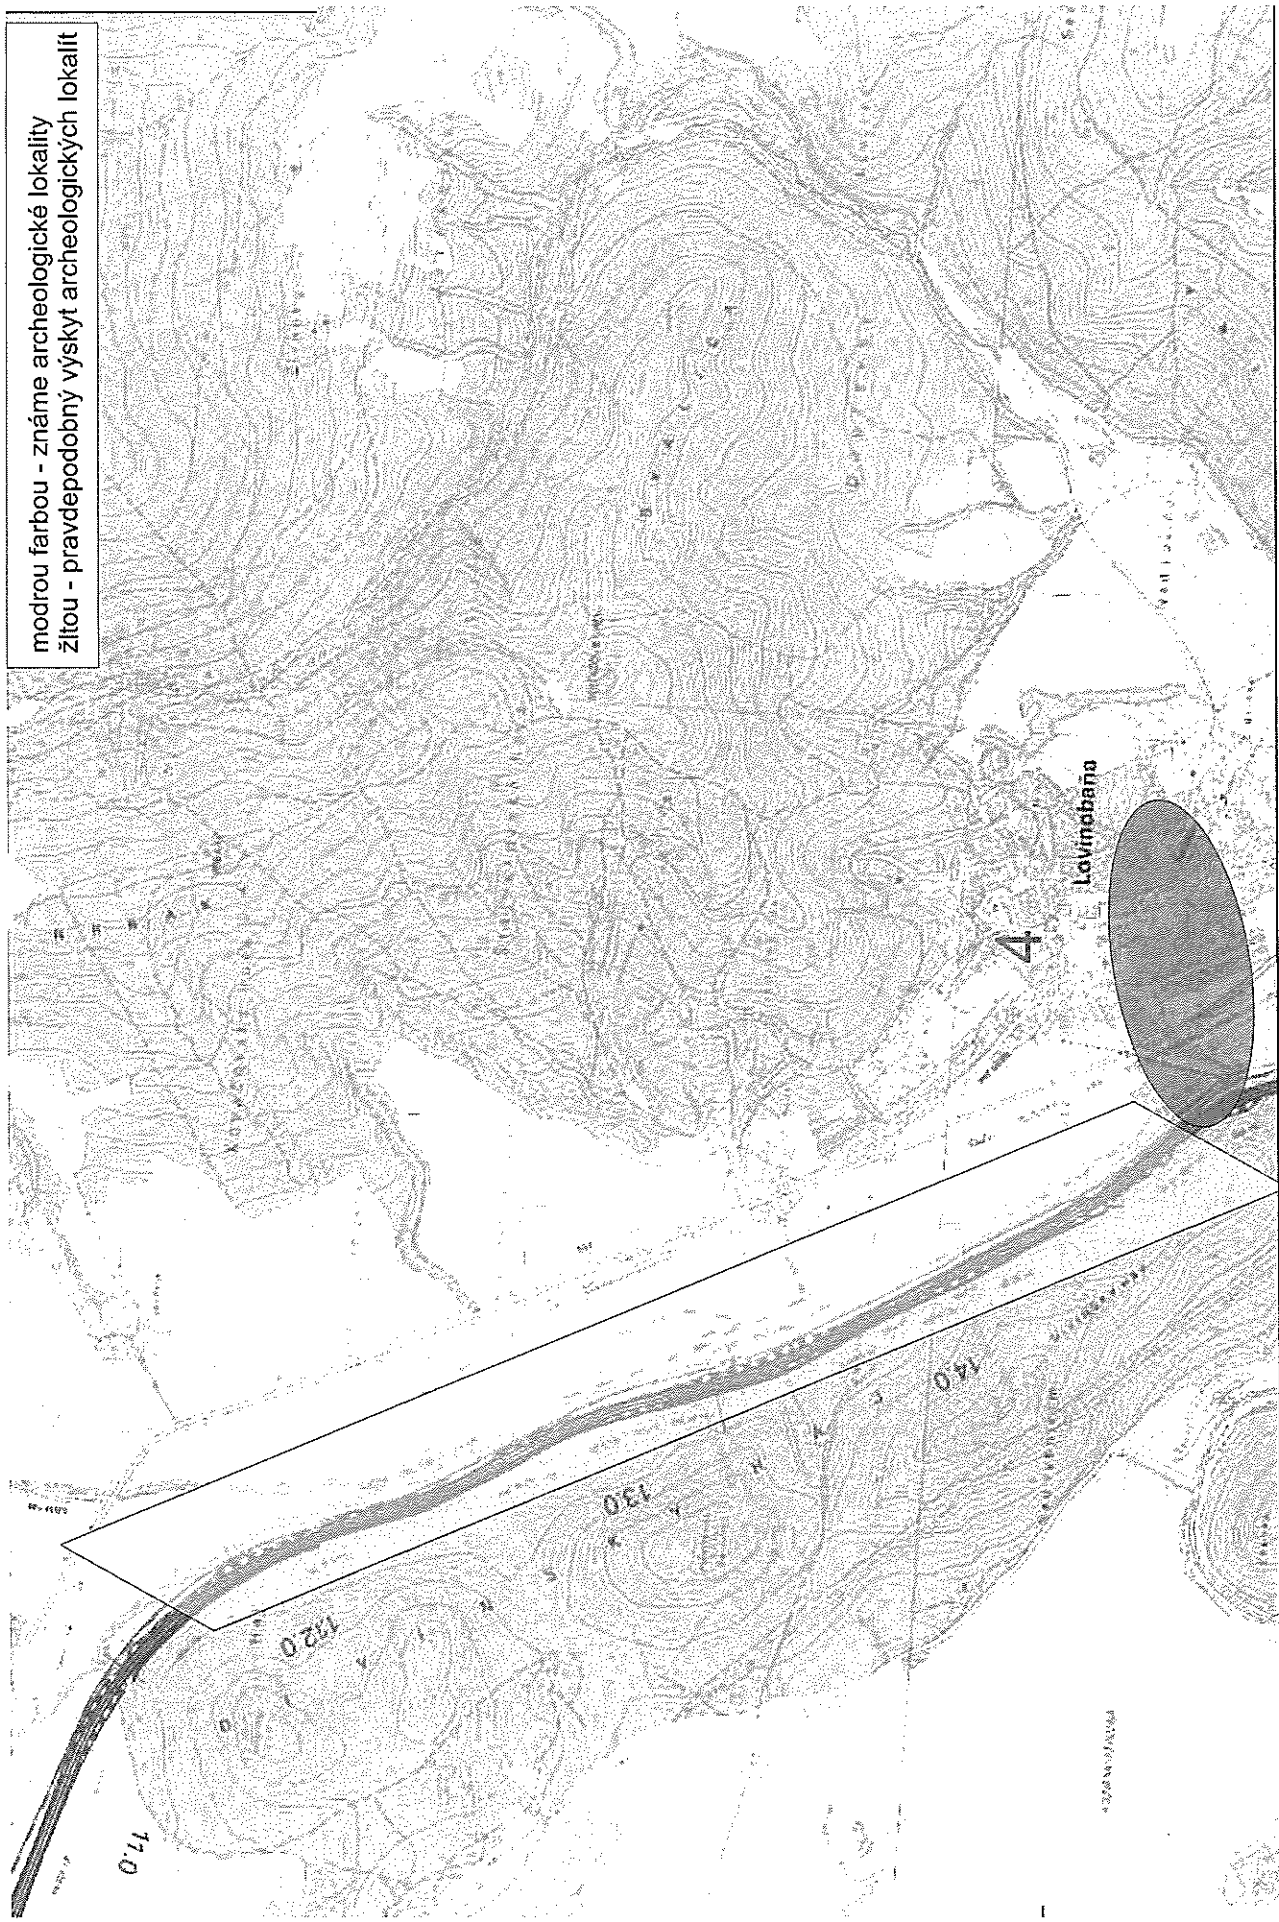

Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

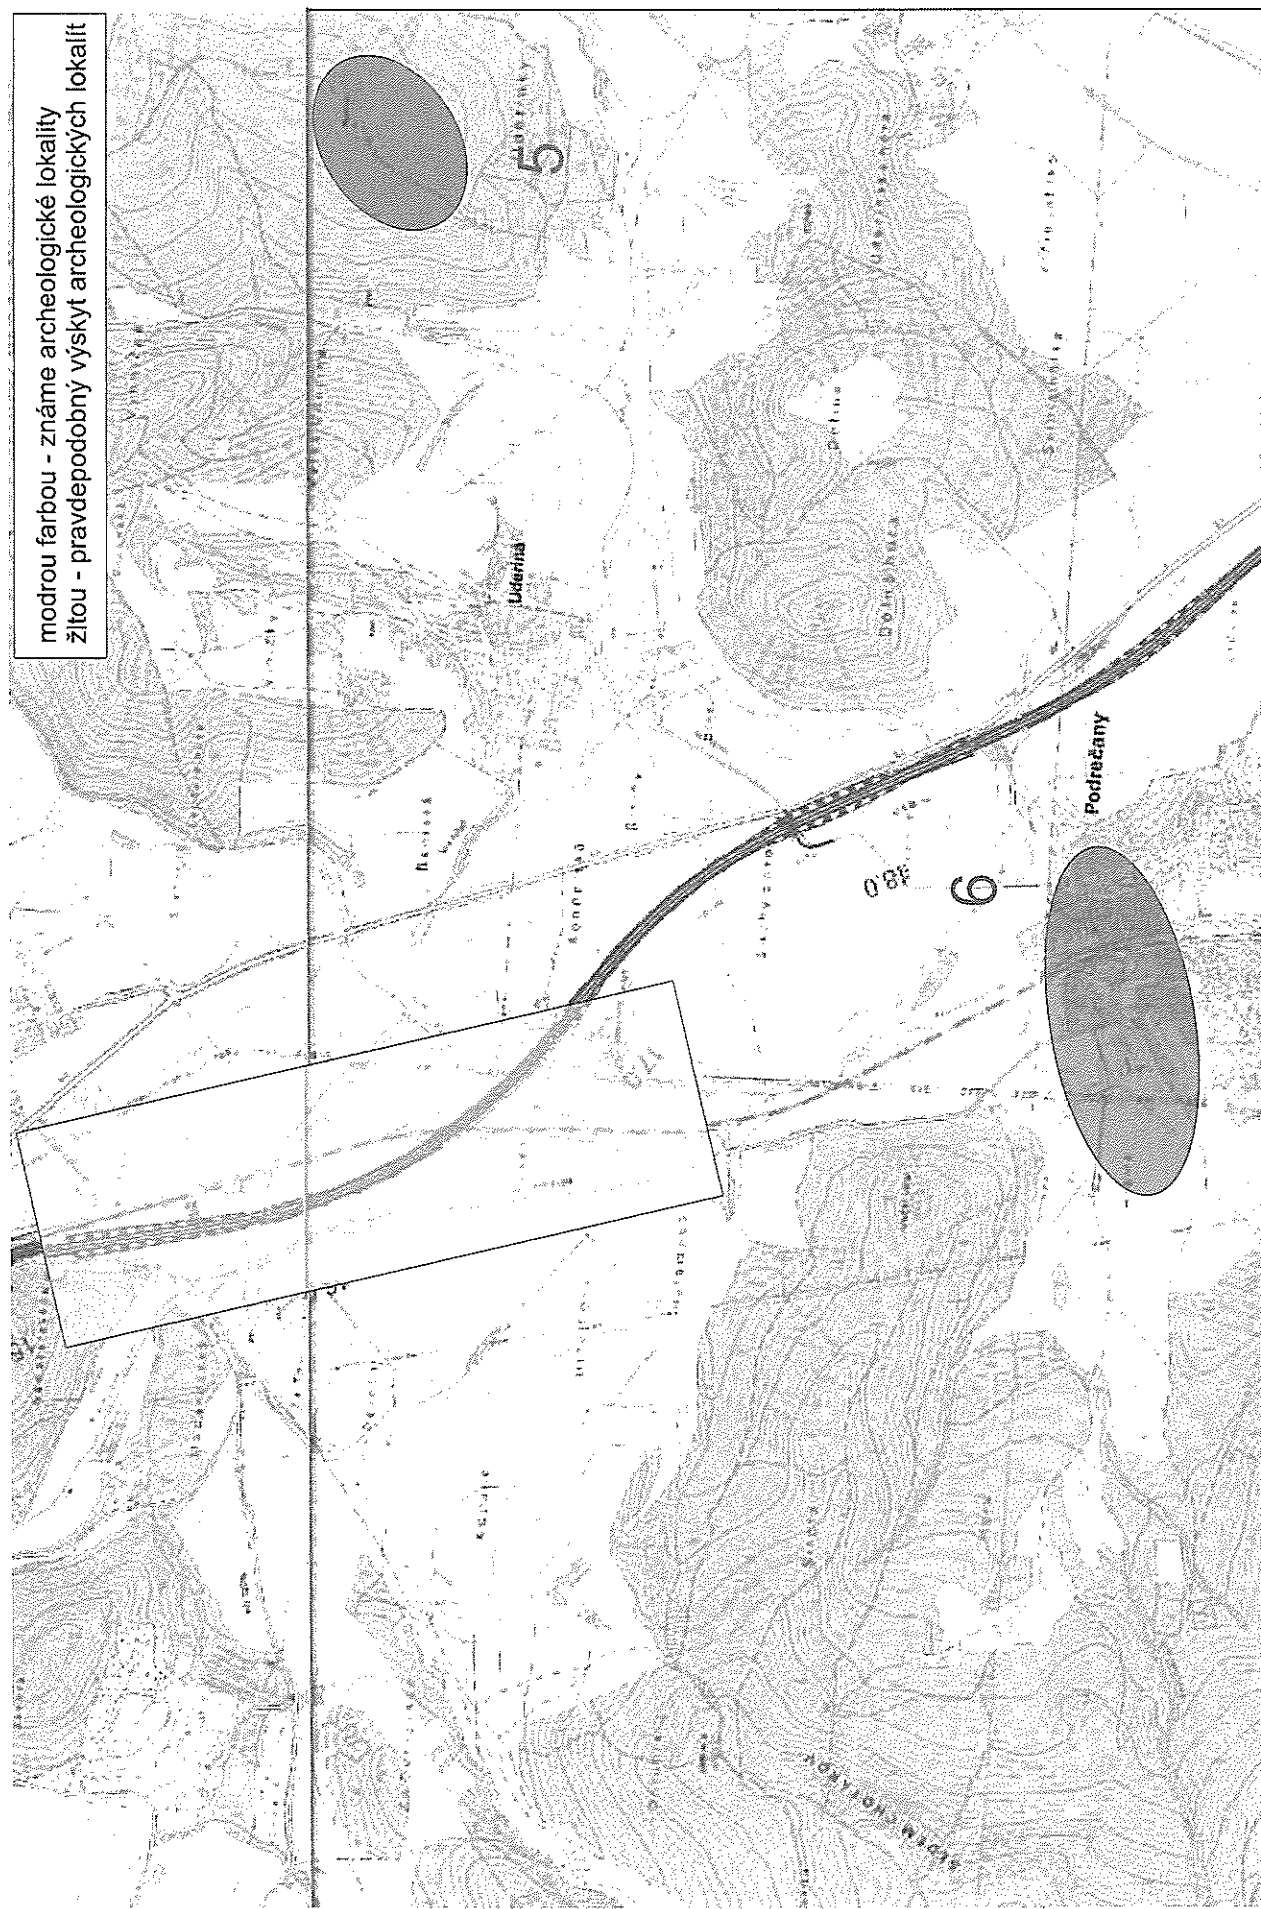

Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

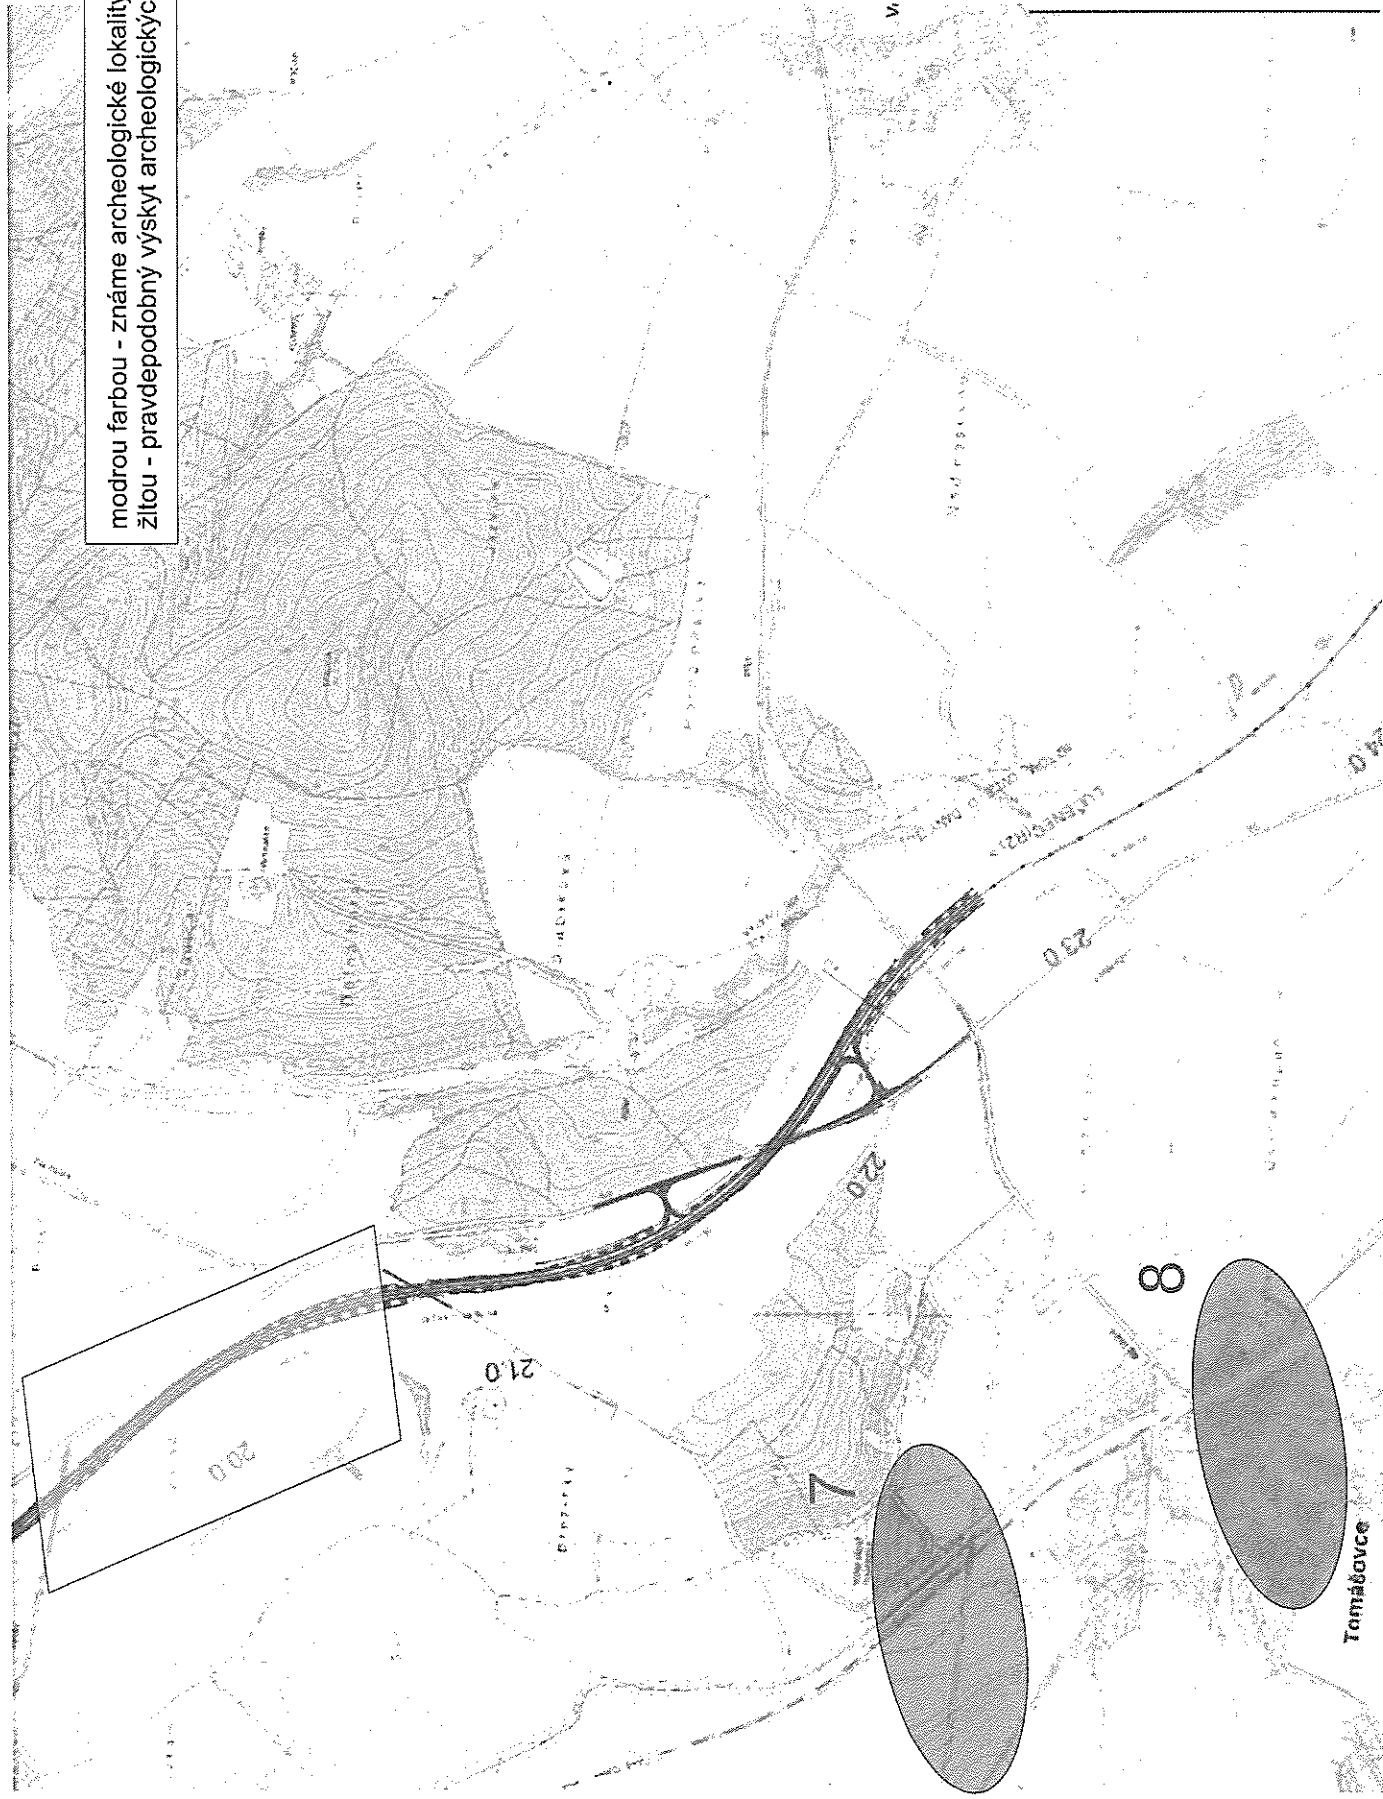

Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce



Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. Terénna situácia v km 3.



Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. Terénna situácia v km 6.



Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. Terénna situácia v km 10.



Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. Terénna situácia v km 16.



Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. Terénna situácia v km 16,5.



Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. Terénna situácia v km 17.



Rýchlostná cesta R2: Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce. Terénna situácia v km 22.



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
AKADEMICKÁ 2
949 21 NITRA

Vaša značka

Naša značka
Cp47/2018Voj

Vybavuje
Mgr. M. Vojteček, PhD.
0902 925 643

Nitra
15.4.2020

Vec: „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“. – cenová ponuka archeologického výskumu.

Na základe Vašej žiadosti zasielame cenovú ponuku a požiadavky na zabezpečenie záchranného archeologického výskumu na stavbe „**Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina**“.

Metóda realizácie archeologického výskumu:

Archeologický výskum sa uskutoční v štyroch etapách.

V prvej etape sa bude pred začatím stavebných prác realizovať podrobný povrchový prieskum a sondážny výskum na územiach s predpokladaných archeologickým potenciálom.

Druhá etapa bude prebiehať formou plošného odkryvu lokalizovaných archeologických nálezísk, exkavácie a dokumentácie archeologických situácií.

Tretia etapa, realizovaná počas samotných zemných prác, bude pozostávať zo sledovania zemných zásahov pod úroveň pôdneho krytu. Prípadné zistené archeologické situácie budú plošne doskúmané v rozsahu stavebných objektov.

V štvrtej etape sa uskutoční konzervácia a dokumentácia archeologických nálezov a vyhotoví sa výskumná dokumentácia v zmysle platnej vyhlášky.

Oceňovacia tabuľka výkazu výmer

Stavba :

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtina

Objednávateľ:

"Združenie R2 Mýtina"

Dodávateľ:

Archeologický ústav SAV

1. Archeologický prieskum - aktualizácia

	Množstvo	M.J.	Jednotková cena (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
Archeologický prieskum - aktualizácia	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00

2. Záchranný archeologický výskum

	Počet hodín	M.J.	Jednotková cena (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
robotníci	9 600,00	HZS	6,40	61 440,00
odborní pracovníci	2 880,00	HZS	15,00	43 200,00
technický pracovníci	2 880,00	HZS	10,30	29 664,00
zemný stroj	600,00	Sh	35,00	21 000,00
geofyzikálny prieskum	150,00	HZS	82,00	12 300,00
				167 604,00

Oprávnenie:

Archeologický ústav SAV je v zmysle Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu § 36 ods. 2 zo zákona oprávnenou osobou na vykonávanie archeologického výskumu na celom území Slovenska.

Zmluvná viazanosť:

Archeologický ústav SAV Nitra garantuje cenu i termíny uvedené v tejto ponuke do 31. decembra 2021.

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujeme, že nemáme pozastavenú podnikateľskú činnosť. Archeologický ústav SAV je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie pod ev. číslom 2017/2-PO-E3677. Prehlasujeme, že súhlasíme so zadávacími podmienkami špecifikovanými v žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky a súvisiacich dokumentoch. Ďalej prehlasujeme, že sme sa zoznámili so všetkými podkladmi a okolnosťami, ktoré môžu mať vplyv na cenu, dobu a podmienky plnenia.

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Riaditeľ AÚ SAV
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED
Akademická 2
949 21 NITRA (11)



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Naše číslo: KPUBB-2020/9514-8/73881/BRE
Vybavuje/kontakt: Mgr. Gabriela Brežňanová, PhD./+421 48 245 58 34
Banská Bystrica, 17.09.2020

ROZHODNUTIE

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v spojitosti s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) podľa § 35 ods. 7 a v spojitosti s § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona

rozhodol

o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum podľa § 35 ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. a) a b) pamiatkového zákona ako opatrenie na záchranu archeologických nálezov na území líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“ na pozemkoch v k. ú. Kriváň, Podkriváň (okres Detva), Píla a Mýtna (okres Lučenec) a

na jeho vykonanie určuje nasledovné podmienky:

1. **druh výskumu:** archeologický, záchranný
2. **miesto a rozsah vykonávaného výskumu:** na území líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“ na pozemkoch v k. ú. Kriváň, Podkriváň (okres Detva), Píla a Mýtna (okres Lučenec)
3. **spôsob vykonávania výskumu:** Archeologický výskum bude realizovaný nasledovne:
 - a) Na celom území zasiahnutom predmetnou líniovou stavbou pred začiatkom zemných prác uskutočnenie povrchového prieskumu magnetometrom, prípadne aj ďalšími nedeštruktívnymi metódami, za účelom vyhľadávania archeologických nálezísk a zisťovania ich rozsahu.
 - b) Po vyhodnotení výsledkov prvej etapy, prieskumu územia nedeštruktívnymi metódami, vykonať v miestach s predpokladom výskytu archeologického náleziska alebo archeologických nálezov zisťovacie sondy. Zo zisťovacích sond bude jasná stratigrafická situácia terénu zasiahnutého danou stavbou.
 - c) V prípade potvrdenia existencie archeologického náleziska alebo archeologického kontextu bude nasledovať plošný archeologický výskum v rozsahu predmetnej stavby za účelom jeho preskúmania a zdokumentovania, ako aj záchrany archeologických nálezov. Poloha každého z archeologických objektov bude geodeticky zameraná.
 - d) Sledovanie zemných prác súvisiacich so skrávkou ornice na území stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna“, v prípade zistenia archeologického náleziska jeho plošné preskúmanie a zdokumentovanie a záchrana archeologických nálezov.
 - e) Sledovanie všetkých ďalších zemných prác súvisiacich s výstavbou stavieb v dočasnom zábere a následné štandardné zdokumentovanie zistených archeologických objektov a situácií plošným archeologickým výskumom a záchrana archeologických nálezov.

- f) Počas vykonávaného terénneho výskumu je prípustné uplatniť moderné geodetické a fotogrametrické dokumentačné metódy.
- a) Výskum podrobne dokumentovať v grafickej a fotografickej podobe.
- b) Výskumnú dokumentáciu spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR (ďalej len „pamiatkový úrad“) odovzdať krajskému pamiatkovému úradu do 120 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiadať o jej predĺženie.
- c) Výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu KPÚ Banská Bystrica.
- d) Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
4. **Podmienky vykonania výskumu** môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnutelných (napr. depot) a nehnuteľných archeologických nálezov (napr. pôvodné dno priekopy, zachovaná koruna násypu, úprava valu) ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ Banská Bystrica.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica dňa 26.04.2010 vydal rozhodnutie č. BB-10/842-2/2770/BRE o podmienkach archeologického výskumu na území líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce“ v k. ú. Kriváň, Podkriváň, Mýtina, Píla, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany, Tomášovce a Točnica, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.05.2010. Jeho právoplatnosť uplynula dňa 18.05.2013 v zmysle § 44a pamiatkového zákona, keďže nedošlo k úkonu, na ktorý sa vzťahuje.

Dňa 20.03.2014 KPÚ Banská Bystrica začal z vlastného podnetu konanie vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať na území líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce“ archeologický výskum. Toto rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica vydal dňa 14.04.2014 pod č. KPUBB-2014/6702-4/24020/BRE a právoplatnosť nadobudlo dňa 23.04.2014. Právoplatnosť citovaného rozhodnutia uplynula dňa 23.04.2017 v zmysle § 44a pamiatkového zákona, keďže nedošlo k úkonu, na ktorý sa vzťahuje.

Dňa 18.08.2017 KPÚ Banská Bystrica vydal rozhodnutie č. KPUBB-2017/5312-8/63028/BRE o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na líniovej stavbe „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (Úsek Mýtina – Lovinobaňa, Tomášovce)“ na pozemkoch v k. ú. Mýtina, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany, Tomášovce (okres Lučenec), ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.09.2017. Archeologický výskum na uvedenej stavbe je od roku 2019 do súčasnosti vykonávaný v súlade s citovaným rozhodnutím.

KPÚ Banská Bystrica dňa 21.08.2020 prijal žiadosť spoločnosti StVS – servicing, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica o vydanie záväzného stanoviska o projektovej dokumentácii líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ na pozemkoch v k. ú. Kriváň, Podkriváň (okres Detva), Píla a Mýtina (okres Lučenec). Žiadateľ je splnomocnencom na inžiniersku činnosť zhotoviteľa stavby Združenia R2 Kriváň – Mýtina (zloženého z členov Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava; STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava; EUROVIA Sk, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice; EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha I); stavebníkom stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre stavbu „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ predložená KPÚ Banská Bystrica dňa 21.08.2020 obsahuje v porovnaní s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie niekoľko zmien. K najdôležitejším zmenám patria drobné úpravy smerového a výškového vedenia, úprava tvaru zemného telesa (úprava sklonov svahov z 1:1 riešených ako vystužená zemina na sklony 1:2 s terénnymi lavičkami), dobudovanie mimoúrovňovej križovatky Kriváň, zaradenie SO 225 Most na R2 nad cestou II/526, zmena v konštrukcii vozovky R2, úprava zjazdov z cesty I/16 vytvorením samostatných ľavých odbočení počas výstavby, úprava objektivej skladby preložiek inžinierskych sietí. Stavba „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ bude dlhá 9,296 km. Začína sa mimoúrovňovou križovatkou Kriváň napájajúcou sa na existujúci úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša -

Kriváň, pokračuje úsek v km 0,000 – 2,700 rýchlostnou cestou zarezávajúcou sa do terénu na niektorých miestach. V úseku v km 2,700 – 7,000, v údolí Krivánskeho potoka, bude cesta viesť po troch estakádach a ďalej, v údolí Krivánskeho potoka okolo vodnej nádrže Mýtina, bude trasa rýchlostnej cesty v súbehu so železničnou traťou Zvolen – Fíľakovo a cestou I/16 a končí napojením na budovaný úsek R2 Mýtina – Lovinobaňa, Tomášovce.

Dňa 28.08.2020 začal KPÚ Banská Bystrica z vlastného podnetu konanie vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum na území líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ na pozemkoch v k. ú. Kriváň, Podkriváň (okres Detva), Píla a Mýtina (okres Lučenec) a o druhu, rozsahu, spôsobe vykonávania výskumu a o nakladaní s nálezmi. Počas lehoty pre uplatnenie pripomienok, 7 dní, odo dňa doručenia oznámenia o začatí uvedeného konania, neboli vznesené žiadne a KPÚ Banská Bystrica rozhodol o vykonaní záchranného archeologického výskumu na území predmetnej líniovej stavby. Líniová stavba „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ nebude zasahovať do pamiatkového územia.

Líniová stavba „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ nebude zasahovať do pamiatkového územia. Výsledky archeologických prieskumov na trase stavby, ktorý v rokoch 2010 a 2020 vykonal Archeologický ústav SAV v Nitre, poukázali na 3 archeologické náleziská, ktorých rozsah však nebol zistený. Stavba „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ zasiahne do pravekého archeologického náleziska (sídlička z doby bronzovej?) situovaného na polohe *Dolné Diely* v k. ú. Kriváň. Sú z neho doložené nálezy keramiky. Západne od kóty 503 m. n. m. vo východnej časti k. ú. Kriváň boli zistené silicítové úštepky, ktoré naznačujú existenciu archeologického náleziska zo staršej doby kamennej (paleolit). Výskyt archeologických nálezov možno predpokladať aj v intraviláne Mýtnej, ktorá sa vyvinula niekedy v 14. storočí pri mýtnom mieste neďaleko hradu (Divín) rodu Tomaj spomínanom v listine z roku 1335. Uvádza sa aj v súpise starých mýtnych staníc v Novohradskej stolici z roku 1405 (*Wamoslehota*). Podľa daňového súpisu Novohradskej stolice z roku 1457 sa v Mýtnej (*Wamosfalw*) nachádzalo 7 port. Počas 15. storočia Mýtina figurovala medzi tými majetkami, ktoré boli kráľom za zradu zhabané pánom z Lučenca a darované Michalovi Orságovi z Gútu (v roku 1467) a Jánovi Ungorovi z Nádasdu (v roku 1473). V súpise mimoriadnej vojenskej dane z roku 1542 sa v Mýtnej uvádza 6 port Žigmunda Balašu a o niekoľko rokov neskôr (1549) sa v portálnom súpise Novohradskej stolice uvádza 8 obývaných port a 1 opustená usadlosť Krištofa Orsága a 3 a ½ obývaných usadlostí divínskeho panstva Žigmunda Balašu. Stredoveká Mýtina však dosiaľ nie je presnejšie lokalizovaná. Počas prieskumu Archeologického ústavu SAV v Nitre súvisiaceho s prípravou projektovej dokumentácie predmetnej stavby pre stavebné povolenie v roku 2020 boli v trase stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“, predovšetkým v úseku, ktorý bude budovaný na estakádach, zistené viaceré pozostatky banskej činnosti z minulosti, píngy a zárezy. Koncentrácia píng bola lokalizovaná v úseku v km 6,100 – 6,700, ďalšia pínga bola zachytená v km 5,700 a zásek bol identifikovaný v km 4,700. Je však pravdepodobné, že archeologických nálezísk na trase líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ môže byť viac.

Na základe uvedeného je dôvodný predpoklad, že realizáciou zemných prác v súvislosti so stavbou „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtina“ na pozemkoch v k. ú. Kriváň, Podkriváň, Píla a Mýtina, pravdepodobne budú narušené archeologické nálezy, archeologické objekty alebo kontexty, v zmysle § 36 ods. 3 pamiatkového zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:

- podľa § 36 ods. 4 archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad alebo ním zriadená právnická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s pamiatkovým úradom alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 35a ods. 3 písm. a) a c) a má poverenie od pamiatkového úradu alebo od ním zriadenej právnickej osoby na vykonávanie archeologického výskumu a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou; iná právnická osoba môže archeologický výskum vykonávať iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom

- podľa § 39 ods. 8 ak stavebník alebo ten, kto má rozhodnutie podľa odseku 1 vykonať, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť na vykonanie výskumu osobu podľa § 35a ods. 1 alebo, určí túto osobu ministerstvo na návrh pamiatkového úradu
- zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR vykonávať archeologický výskum je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch, Pamiatkovom úrade SR a na internetovej adrese www.pamiatky.sk.

1. Pri zabezpečení archeologického výskumu je **vlastník povinný**:

- a) podľa § 38 ods. 3 pamiatkového zákona finančne zabezpečiť archeologický výskum
- b) do uzatváranej zmluvy o vykonaní archeologického výskumu s oprávnenou osobou podľa § 39 pamiatkového zákona uviesť podmienky vykonávania archeologického výskumu vyplývajúce z tohto rozhodnutia, hlavne druh, rozsah a spôsob vykonávania výskumu, nakladanie s nálezmi a povinnosť spracovať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 9 a 10 pamiatkového zákona a § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, vykonávajúcej pamiatkový zákon (ďalej len „vykonávacia vyhláška“), navrhovateľ súčasne poskytne osobe poverenej vykonaním archeologického výskumu kópiu tohto rozhodnutia
- d) jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou odovzdať podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona bezodplatne KPÚ Banská Bystrica a Archeologickému ústavu SAV

Pri vykonávaní archeologického výskumu je **oprávnená osoba povinná**:

- a) nález historických stavebných konštrukcií (napr. torza architektúry) bezodkladne ohlásiť KPÚ Banská Bystrica, ktorý rozhodne o naložení s predmetným nálezom a ďalšom postupe prác
- b) podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona ten, kto pamiatkový výskum vykonáva na základe zmluvy podľa § 39 ods. 3, je povinný vykonať na ochranu pamiatkových hodnôt opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu. Pamiatkový výskum nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov alebo odstránenie nepriaznivých následkov pamiatkového výskumu
- c) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej dokumentácii, ktorá bude vypracovaná v súlade s kritériami, ktoré určuje § 10 vykonávajúcej vyhlášky
- d) podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámiť KPÚ Banská Bystrica 5 dní vopred začatie archeologického výskumu a bezodkladne ukončenie terénnej časti výskumu.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 35 ods. 7 a v spojitosti s § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona, a vzhľadom na situovanie stavby rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 11 ods. 2 písm. a) pamiatkového zákona počas realizovania archeologického výskumu vykoná KPÚ Banská Bystrica.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica v súlade s § 53 a 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. arch. Zuzana Klasová
riaditeľka
krajského pamiatkového úradu

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Tel.: +421 48 24 55 111

Lazovná 8 | 975 55 Banská Bystrica
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk

Slovenská republika
www.pamiatky.sk

17.09.2020

<PUBB-2020/9514-8/73881/BRE

Doručuje sa

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zasiela saNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica
StVS – servicing, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**Na vedomie**Ministerstvo dopravy a výstavby, Nám. slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Nám. Ľ.
Štúra5943/1, 974 05 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica



Príloha č. 3

BOZP, OŽP, OPP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrana životného prostredia (ďalej len „OŽP“) a ochrana pred požiarom (ďalej len „OPP“)

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov prípadného podzhotoviteľa, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi Objednávateľa, hlavne pokynmi určeného zástupcu Objednávateľa, (autorizovaného bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblasť kontroly kvality) a zástupcu investora, ktorým je pre oblasť BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s koordinátorom BOZP investora a s určeným zástupcom Objednávateľa, a to po celú dobu realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné právnické a fyzické osoby, ktoré budú pre neho vykonávať niektoré práce, boli taktiež zaviazané k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom BOZP a určeným zástupcom Objednávateľa po celú dobu realizácie Diela.
4. Pokiaľ Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ, alebo osoby, za ktoré je Zhotoviteľ zodpovedný, porušujú povinnosti v oblasti BOZP, má Objednávateľ právo vyzvať Zhotoviteľa, aby podľa pokynov Objednávateľa vykonal nápravu.
5. Určení zástupcovia zmluvných strán sú povinní sa pred začatím plnenia podľa Zmluvy vzájomne informovať o povinnostiach vyplývajúcich zo zák. č. 124/2006 Z.z. § 18 o spolupráci na spoločnom pracovisku a uzavrieť Dohodu o spolupráci podľa § 18 zákona č. 124/2006 Z.z.. Zmluvné strany o tom vyhotovia zápis, poprípade to uvedú v zápise o prevzatí (odovzdaní) staveniska.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím plnenia svojho záväzku preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov s Plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
7. Na základe výzvy Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklad o školení zamestnancov Zhotoviteľa v oblasti BOZP a ochrane proti požiarom v rozsahu stanovenom právnymi alebo inými predpismi o BOZP a OPP a ostatné doklady v zmysle predloženého zoznamu dokladov zhotoviteľovi, alebo by som tam dala že je povinný predložiť doklady požadované v zmysle zoznamu dokladov, kde sú zahrnuté už aj spomínané školenia.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať Objednávateľovi písomné denné zoznamy svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojho dodávateľa, prípadne ďalších osôb, ktoré sa na Stavenisku jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení. Iné osoby, než osoby uvedené v takomto zozname, smú na stavenisko vstúpiť len s vedomím určeného zástupcu Objednávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za BOZP týchto osôb po dobu, počas ktorej sa zdržujú na Stavenisku.
9. Zhotoviteľ zaistí, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty, prípadne pracovný odev s reflexnými prvkami, a zaväzuje sa ich používanie sústavne kontrolovať.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť viditeľné označenie s logom firmy svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov.

5

11. Zhotoviteľ, v prípade ak vykonáva práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou je povinný pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 §14 Príloha č.6.
12. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa použiť konštrukcie stavby ako prostriedok k zdvíhaniu alebo spúšťaniu bremien.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať bezpečné vyhradené technické zariadenia v súlade s právnymi predpismi a dodržiavať návody na ich bezpečnú obsluhu. Na žiadosť Objednávateľa predloží doklady o ich revíziách, odborných prehliadkach a skúškach.
14. Zamestnanci Zhotoviteľa sa môžu zdržiavať len na pracoviskách alebo v priestoroch Staveniska, v ktorých plnia pracovné povinnosti pri plnení záväzku Zhotoviteľa a ohľadom ktorých prevzali od Zhotoviteľa informácie a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; pritom používajú len prístupové cesty určené Objednávateľom.
15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
16. Po odovzdaní a prevzatí jednotlivých ucelených častí predmetu Diela vymedzených v Zmluve zodpovedá Zhotoviteľ za zaistenie BOZP svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov, taktiež za všetky osoby ktoré sa s jeho vedomím na odovzdanom pracovisku nachádzajú.
17. Skládky a miesta pre uloženie drobného materiálu smie Zhotoviteľ zriadiť len v priestoroch určených na to Objednávateľom, a to spôsobom odpovedajúcim predpisom o BOZP.
18. Každý pracovný úraz zamestnanca Zhotoviteľa na stavenisku sa Zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne oznámiť aj určenému zástupcovi Objednávateľa a umožniť Objednávateľovi účasť pri zisťovaní príčin a okolností vzniku takéhoto pracovného úrazu. Zhotoviteľ rovnako Objednávateľovi odovzdá kópiu záznamu o registrovanom pracovnom úraze, a ak ide o evidovaný pracovný úraz, písomne oznámi Objednávateľovi údaje o takomto pracovnom úraze. Povinnosťami podľa tohto bodu nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa právnych predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.
19. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci na Stavenisku nepožívali alkoholické nápoje, návykové, omamné a psychotropné látky a nevstupovali na Stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo vykonať dychovú skúšku k zisteniu prítomnosti alkoholu v dychu. Zhotoviteľ je povinný zamestnanca, ktorý vstúpil na Stavenisko pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látok alebo ich na Stavenisku požíva, alebo zamestnanca, ktorý sa odmietol podrobiť dychovej skúške, vykázať zo Staveniska. Pokiaľ tak nevykoná ani napriek výzve Objednávateľa, právo vykázať ho má Objednávateľ.
20. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti OPP a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti OPP na Stavenisku.
21. O každom požiari vzniknutom na odovzdanom Stavenisku Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu informuje Objednávateľa. Tým nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa ohlásiť požiar príslušnému Hasičskému a záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej správy ani iné povinnosti vyplývajúce z právnych a iných predpisov o ochrane pred požiarmi.
22. Pri vykonávaní činností alebo prevádzkovaní zariadení so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom je Zhotoviteľ zodpovedný za ich protipožiarne zabezpečenie.
23. Zhotoviteľ rovnako zaistí následný dozor po ukončení prác s otvoreným ohňom alebo iných činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v rozsahu podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a príslušných technických noriem.
24. Zhotoviteľ prijme všetky opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej jeho činnosťou na Stavenisku v súlade s právnymi predpismi a ďalej opatrenia k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na Stavenisku a na príľahlých pozemkoch pred znečistením.
25. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na Stavenisku a na prístupových cestách na Stavenisku, priebežne odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri plnení jeho záväzku, technickými opatreniami zabráňovať ich prenikaniu mimo Stavenisko a zaistiť ich uloženie

a likvidáciu podľa právnych predpisov o odpadoch. Na žiadosť Objednávateľa je zhotoviteľ povinný mu predložiť doklady o splnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o odpadoch v súvislosti s plnením jeho záväzku. Na Stavenisku je zakázané spaľovať akýkoľvek odpad.

26. Pokiaľ Objednávateľ zaviedol na Stavenisku triedenie odpadov, je Zhotoviteľ povinný dodržiavať takto zavedený postup triedenia a ukladania jednotlivých druhov odpadov.
27. Zhotoviteľ zabezpečujúci práce, pri ktorých vzniká odpad zaradený do skupiny č. 17 stavebné odpady a odpady z demolácií v zozname odpadov v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, je povinný v zmysle § 77 ods. 3 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o odpadoch**“) stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií a vyhlasuje, že je zaregistrovaný v zozname registrovaných osôb vedenom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 98 zákona o odpadoch a je teda ako sprostredkovateľ oprávnený organizovať zhodnocovanie alebo zneškodňovanie takéhoto odpadu.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vozidlá a stavebné stroje používané pri plnení jeho záväzku proti úniku prevádzkových náplní na stavebné prvky a konštrukcie, do pôdy alebo vôd a neponechávať zbytočne v chode spaľovacie motory. Zhotoviteľ nebude vykonávať údržbu vozidiel alebo stavebných strojov na Stavenisku. Pri doplňovaní prevádzkových náplní na Stavenisku zabezpečí ochranu proti ich úniku mimo prevádzkových nádrží strojov.
29. Zhotoviteľ sa zaväzuje manipulovať s chemickými látkami a chemickými prípravkami na Stavenisku spôsobom odpovedajúcim právnym predpisom o chemických látkach a chemických prípravkoch. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný poskytnúť odberateľovi zoznam nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, s ktorými pri plnení svojho záväzku manipuluje, ako aj karty bezpečnostných údajov, prípadne doklady o školení Zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov autorizovanou osobou, ak to vyžadujú právne predpisy. Objednávateľ Zhotoviteľa oboznámi s havarijným plánom, pokiaľ je spracovaný alebo s opatreniami pre prípad havárie.
30. Zhotoviteľ je povinný pri realizovaní diela dodržiavať právne predpisy o ochrane prírody a krajiny a nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty.
31. Objednávateľ Zhotoviteľa oboznámi s environmentálnym plánom výstavby, pokiaľ je spracovaný a Zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať.



Príloha č. 4

NELEGÁLNA PRÁCA

ZÁKAZ NELEGÁLNEJ PRÁCE A NELEGÁLNEHO ZAMESTNÁVANIA

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy:
 - a) nie je vedený v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „Zoznam“), ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“),
 - b) neporušil zákaz nelegálnej práce ani nelegálneho zamestnávania ako je definovaný nižšie v zmysle Zákona o nelegálnej práci,
 - c) nespolupracuje ani nebude spolupracovať so subjektmi zapísanými v Zozname, alebo subjektmi o ktorých ma vedomosť, že porušujú zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania,
 - d) nebola mu vrátane subjektov, ktoré dodávajú pre Zhotoviteľa prácu, tovar alebo poskytujú služby, uložená povinnosť zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa Zákona o nelegálnej práci.
2. Ak sa preukáže akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v Zmluve ako nepravdivé alebo nastanú skutočnosti uvedené v ods. 1. tohto článku, je Objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy spôsobom ako pri podstatnom porušení zmluvy.
3. Nelegálna práca je vykonávanie práce fyzickou osobou pre zamestnávateľa, pričom:
 - a) medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 400/2009 Z. z.,
 - b) zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti.
4. Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom:
 - a) medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 400/2009 Z. z.,
 - b) medzi zamestnávateľom a pracujúcim je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona č. 400/2009 Z. z., ale zamestnávateľ nespĺnil oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni podľa § 231 zákona č. 461/2003 Z. z.,
 - c) zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. zamestnáva pracujúceho, ktorý nie je príslušníkom členského štátu Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo je bez štátnej príslušnosti,
 - d) zamestnávateľ v rozpore s podmienkami podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Ak kontrolné orgány, zmluvní partneri Objednávateľa uložia Objednávateľovi pokutu či akúkoľvek inú peňažnú sankciu za nelegálnu prácu alebo za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ktorého sa dopustil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za spôsobenú škodu, najmä nie však výlučne uhradiť pokutu uloženú Objednávateľovi kontrolným orgánom, zmluvné pokuty uložené zmluvnými partnermi či akékoľvek iné náklady (vrátane právnych služieb), ktoré Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikli.
