

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“), (ďalej len „Zmluva“)
medzi

OK – TEAM, s.r.o.

so sídlom:	Nová 200/7, 028 01 Trstená
IČO:	31 330 631
DIČ:	2020816149
IČ DPH:	SK2020816149
IBAN:	SK65 0200 0000 0031 8877 4158
konajúca prostredníctvom:	Ing. Jozef Obtulovič, konateľ
zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 55458/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Fakultná nemocnica Trnava

so sídlom:	A. Žarnova 11, 917 02 Trnava
zastúpená:	JUDr. Vladislav Šrojta, riaditeľ
IČO:	00610381
DIČ:	2021191084
IČ DPH:	SK 2021191084
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK54 8180 0000 0070 0028 1238
SWIFT:	SPSRSKBA
Zriadený:	Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.6.1991, v znení neskorších rozhodnutí

(ďalej len „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ spolu s Objednávateľom ďalej aj ako „Zmluvné strany“, samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Túto Zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky s názvom **„Úprava vnútorných priestorov 1.PP kliniky infektológie FNTT pre účely zriadenia farmakokinetického laboratória“**. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 23.12.2021 postupom podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.
- (B) Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj Zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

- (C) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“) ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora ako partner verejného sektora, spĺňa túto povinnosť.

Článok I Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác tvoriacich predmet zákazky s názvom „**Úprava vnútorných priestorov 1.PP kliniky infektológie FNTT pre účely zriadenia farmakokinetického laboratória**“ z dôvodu potreby umiestnenia a sprevádzkovania obstaraného spektrometra spolu s príslušenstvom do priestorov pripravených na tento účel. Objekt je v správe Objednávateľa a je zapísaný na liste vlastníctva č. 2467 evidovanom Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom pre okres: Trnava, obec: Trnava, k.ú. Trnava, v časti A: Majetková podstata ako stavba, druh stavby: 12, popis stavby: infekčná klinika, súpisné číslo 5379, postavená na pozemku parc. č. 6474/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 640 m². Práce budú vyhotovené v rozsahu podľa „Výkazu výmer“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a výkresovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 2 až 8 tejto Zmluvy (ďalej len „*dielo*“).
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dielom sa na účely tejto Zmluvy považujú aj jeho jednotlivé časti, resp. objekty.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovené dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku II tejto Zmluvy.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať zhotovené dielo Objednávateľovi riadne a včas a Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas zhotovené dielo ako celok alebo jeho jednotlivé časti bez väd a nedorobkov na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
- 1.5 Dielo je zhotovené riadne, pokiaľ nemá žiadne vady a nedorobky, je v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách.
- 1.6 Zhotovenie diela pozostáva z realizácie z úpravy vnútorných priestorov troch miestností v priestoroch kliniky infektológie FNTT. Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré neboli vo Výzve na predkladanie ponúk výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce Zhotoviteľa, alebo ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel, alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela dostatočný časový priestor, oboznámil sa s nimi a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal Objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla sťažovať realizáciu samotného diela.

Článok II Cena za zhotovenie diela

- 2.1 Cena za dielo bola určená na základe rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy.
- 2.2 Cena diela je platná a záväzná počas celej doby realizácie diela až do úplného a riadneho zhotovenie diela a je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a výsledku verejného obstarávania, a to vo výške:

	cena bez DPH:	sadzba 20% DPH	cena vrátane DPH
Architektonicko-stavebné riešenie	22 164,79	4 432,96	26 597,75
Elektroinštalácie	15 013,58	3 002,71	18 016,30
Zdravotechnické inštalácie	5 669,37	1 133,88	6 803,24
Celková cena	42 847,74	8 569,55	51 417,29

- 2.3 K cene diela je Zhotoviteľ oprávnený účtovať aktuálnu výšku DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). V prípade, že predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA a Zhotoviteľ je platiteľ dane z pridanej hodnoty v tuzemsku, uplatní sa na stavebné práce prenos daňovej povinnosti podľa ust. § 69 ods.12 písm. j) zákona o dani z pridanej hodnoty.
- 2.4 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením diela vrátane dopravných, výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií Zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov, certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, náklady na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie a vyčistenie staveniska, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela.
- 2.5 V prípade vzniku navyšiac prác uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy, alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany Objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za dielo a vtedy predmetné práce, tovary, ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 2.6 V prípade vzniku navyšiac prác bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. formou dodatku k Zmluve.

Článok III Platobné podmienky

- 3.1 Úhrada ceny za dielo sa uskutoční na základe faktúry vyhotovenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru za každý objekt samostatne najskôr dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia jednotlivých objektov Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za zhotovenie jednotlivých častí diela,

resp. objektov do 7 dní odo dňa ich protokolárneho odovzdania a prevzatia Objednávateľom, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli protokolárne odovzdané a prevzaté Objednávateľom.

- 3.2 Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi preddavok, ani zálohovú platbu na zhotovenie diela.
- 3.2 Objednávateľ je povinný fakturovanú čiastku (za každú časť diela) uhradiť Zhotoviteľovi so splatnosťou 60 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi, a to na účet Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 3.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi v prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s ustanoveniami zákona o dani z pridanej hodnoty. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.

Článok IV

Termín, miesto a spôsob zhotovenia diela

- 4.1 Miestom zhotovenia diela je Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotoví dielo v nasledovných termínoch:
 - 4.2.1 prevzatie staveniska (stavebných priestorov): do piatich kalendárnych (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy na základe Protokolu z odovzdania a prevzatia staveniska vypracovaného v dvoch rovnopisoch. Porušenie povinnosti prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy;
 - 4.2.2 vykonanie a odovzdanie diela Objednávateľovi najneskôr do 60 dní od účinnosti Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi **záväzný časový a vecný harmonogram stavebných prác pri prevzatí staveniska**. Nedodržanie termínov v súlade s týmto harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- 4.4. Zmluvné strany si dohodli:
 - Kontakt na zodpovedného pracovníka Objednávateľa:
Ing. Ivan Šulek, č. tel.: 0907 888 621, e-mail: ivan.sulek@fntt.sk
Ing. Daniel Bél, č. tel.: 0902 986 500, e-mail: daniel.bel@fntt.sk
 - Kontakt na zodpovedného pracovníka Zhotoviteľa:
Ing. Jozef Obtulovič, č. tel.: 0911 538 005, e-mail: obtulovic@okteamsro.sk
Miroslav Kňazovický, č. tel.: 0902 491 492, e-mail: okteamsro@okteamsro.sk
- 4.5 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi a jeho pracovníkom nerušený prístup na miesto zhotovenia diela ako aj prístup ku všetkým energiám potrebných pre Zhotoviteľa na riadne uskutočnenie prác smerujúcich k zhotoveniu diela (napr. el. energia, voda). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade (i) porušenia tejto povinnosti Objednávateľa alebo (ii) vyjadrením nesúhlasu Objednávateľa

s pokračovaním zhotovovania diela, je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác bez rizika akejkoľvek sankcie alebo nároku na náhradu škody spôsobenej prerušením prác. V takomto prípade sa akékoľvek lehoty na strane Zhotoviteľa predlžia o dobu, počas ktorej bude vykonávanie prác prerušené.

- 4.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť Objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 4.7 Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy bude ukončený protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela Objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele, doklady o vykonaní potrebných skúšok a revízií a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
- 4.8 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.
- 4.9 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto Zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná Zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia zhotoveniu diela.
- 4.10 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný o prerušení realizácie diela podľa tohto ustanovenia Zmluvy písomne informovať Objednávateľa. V prípade, ak Objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, Zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela na základe písomného stanoviska Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
- 4.11 Termín zhotovenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme stavebných prác sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k Zmluve) predlžujú bez uplatnenia sankcií Objednávateľa:
- 4.11.1 o dobu oprávneného prerušenia prác na diele Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy,
- 4.11.2 o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné zhotovovať dielo z dôvodu na strane Objednávateľa (oneskorenie odovzdania staveniska, ak sa v priebehu zhotovenia diela Zmluvné strany dohodnú o naviac prácach, ktoré neboli dohnuté pri uzatvorení Zmluvy).
- O tejto skutočnosti sa Zmluvné strany zaväzujú spísať písomný protokol.
- 4.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude zhotovované za plnej prevádzky Objednávateľa a prevádzky dotknutých subjektov a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavenisko tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov Objednávateľa a/alebo tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať dielo tak, aby v čo možno najmenšej miere zasahoval do práv a záujmov Objednávateľa a tretích subjektov. Zhotoviteľ je povinný prispôbiť sa prevádzkovým podmienkam Objednávateľa, t. j. zdravotníckemu zariadeniu s

nepretržitou prevádzkou. Zhotoviteľ počas realizácie diela nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky Objednávateľa alebo tretích subjektov. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný prerokovať s Objednávateľom vopred.

Článok V

Zmluvné záruky

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním podľa tejto Zmluvy, v najvyššej možnej kvalite, vrátane jeho prípadných zmien v dohodnutom mieste, termíne, na svoje náklady a svoju zodpovednosť. Dielo prípadne jeho jednotlivé časti musia byť zhotovené v kvalite požadovanej Objednávateľom a v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s výkazom výmer a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený zhotoviť dielo prostredníctvom svojich subdodávateľov, pričom za zhotovenie diela zodpovedá tak, ako by ho zhotovil sám.
- 5.2 Pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti Objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania celého diela prípadne jeho jednotlivých častí bez väd a nedorobkov Objednávateľovi. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
- 5.4 Počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy Objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín od obdržania reklamácie pri vadách brániacich riadnej prevádzke pracoviska a do 30 dní od obdržania reklamácie pri ostatných vadách, ktoré nebránia riadnej prevádzke pracoviska. Pri odstraňovaní záručnej vady je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s pokynmi Objednávateľa. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 3 dni, je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi písomne najneskôr v lehote 2 dní od obdržania reklamácie.
- 5.6 Pred uplynutím záručnej doby vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenie stavu diela. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zaznamenaný v protokole o ukončení záručnej doby za prítomnosti zástupcov oboch Zmluvných strán. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom Zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť zaznamenaná v protokole. V prípade, ak Zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vadného plnenia Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia Zhotoviteľa v plnom rozsahu.

Článok VI

Zhotovenie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a normy vzťahujúce sa na zhotovené dielo.
- 6.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne podľa bodu 4.2.1 tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje vyhradiť Zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie materiálu, výrobkov a pracovných pomôcok Zhotoviteľa.
- 6.3 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na realizáciu diela, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatého staveniska bezpečnostným značením v zmysle NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v platnom znení a NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 6.5 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie diela nedostatky alebo sú v rozpore s STN, Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. Zhotoviteľ je povinný použiť pri zhotovení diela materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej životnosti diela bola zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita diela, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní diela.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného pokoja, za čistotu a poriadok na stavenisku pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný vykonať dôsledné denné upratovanie staveniska po ukončení prác, dopravu a odvoz stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 6.7 Náklady s odpadmi vrátane dokladovania o naložení s odpadom je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu sú zohľadnené v cene diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, prípadnú sankciu sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko v termíne podľa bodu 7.6. tejto Zmluvy.

Článok VII

Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Objednávateľ je povinný prevziať zhotovené dielo od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak má dielo vady, na ktoré Objednávateľ upozorní Zhotoviteľa v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, odstránením väd Zhotoviteľom je Objednávateľ povinný dielo bezodkladne prevziať.
- 7.2 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v mieste zhotovenia diela. Za deň odovzdania a prevzatia diela, alebo jeho časti, sa považuje deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti Objednávateľom.
- 7.3 Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom zhotovení, t.j. ukončením všetkých stavebných prác, po odstránení všetkých väd a nedorobkov, odovzdaním a prevzatím na základe písomného odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu podľa tejto Zmluvy.
- 7.4 V prípade, ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne k prevzatiu diela potrebnú súčinnosť spočívajúcu v tom, že na výzvu Zhotoviteľa zaslanú Objednávateľovi v súlade s bodom 7.9. tejto Zmluvy nebude žiadnym spôsobom reagovať, alebo protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude sa dielo považovať za odovzdané v súlade s touto Zmluvou.
- 7.5 Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto Zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.
- 7.6 Po ukončení prác (zhotovení diela) je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál a pod. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže Objednávateľ zabezpečiť poriadok staveniska na náklady Zhotoviteľa.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním diela vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie a to formou zaslania e-mailu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy pre užívanie diela. Všetky doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre diela a iné doklady vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pri odovzdaní a prebratí diela.
- 7.8 V prípade, ak budú pri odovzdávaní a preberaní diela zistené také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela na účel, ktorému má slúžiť, a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z ustanovenia bodu 7.8 tejto Zmluvy, Objednávateľ dielo neprevezme, v takom prípade je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú lehotu nie kratšiu ako 5 kalendárnych dní na odstránenie väd a nedorobkov.
- 7.9 V prípade, ak budú pri odovzdávaní a preberaní diela zistené také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani spolu nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela na účel, ktorému má slúžiť, Objednávateľ dielo prevezme s podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom

rozsahu odstránené do termínu dohodnutom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr do 14 kalendárnych dní.

- 7.10 Nesplnenie povinností Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky podľa bodov 7.8 a 7.9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.

Článok VIII

Stavebný denník

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku odo dňa začatia prác na diele až do dňa protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Účelom vedenia stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania diela zo strany Objednávateľa. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať zhotovenie diela.
- 8.2 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa zhotovovania diela, najmä akékoľvek naviacpráce, menej práce alebo zmeny, údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, vady a nedorobky diela, dodržiavanie časového harmonogramu prác, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od harmonogramu prác, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Zápisy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať vedúci stavby Zhotoviteľa, oprávnený pracovník Zhotoviteľa a oprávnený pracovník Objednávateľa.
- 8.3 K písomnému zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku je Zhotoviteľ povinný písomne sa vyjadriť najneskôr nasledujúci pracovný deň po vykonanom zápise a zároveň je povinný zapísať návrh opatrení vedúcich k odstráneniu väd, nedorobkov alebo iných rozhodujúcich skutočností, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni písomného vyjadrenia sa Zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený predkladať stavebný denník Objednávateľovi každý pracovný deň. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní po ich doručení.

Článok IX

Kontrola realizácie diela a subdodávateľa

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela Zhotoviteľom prostredníctvom zodpovedného pracovníka Objednávateľa. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo že dielo vykazuje vady alebo nedorobky, je oprávnený Zhotoviteľa na tieto skutočnosti upozorniť a písomne sa dožadovať ich odstránenia či už v priebehu výkonu prác na diele alebo po ich ukončení. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela alebo iné nedorobky bez meškania odstrániť.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za riadne plnenie predmetu Zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s Objednávateľom a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil na zhotovenie diela subdodávateľov alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok.

- 9.3 Zhotoviteľ je vo vzťahu k Objednávateľovi jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností v súvislosti so zhotovením diela.
- 9.4 Zoznam subdodávateľov v rozsahu podľa ust. § 41 zákona o verejnom obstarávaní tvorí Prílohu č. 9 tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy, a to vrátane splnenia povinností subdodávateľov podľa ZoRPVS.
- 9.6 Ak má Zhotoviteľ v úmysle zhotoviť dielo prostredníctvom subdodávateľa neidentifikovaného v Prílohe č. 9 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ môže zadať zhotovenie diela alebo jeho časti novému subdodávateľovi, až po doručení oznámenia zmeny subdodávateľa Objednávateľovi.
- 9.7 Zámer realizácie diela prostredníctvom nového subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi spôsobom dohodnutým v Čl. XIV tejto Zmluvy s uvedením údajov o novom subdodávateľovi v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, údajov o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu Prílohy č. 9 tejto Zmluvy. Objednávateľ nie je oprávnený nového subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi vylúčenie subdodávateľa zo zoznamu subdodávateľov alebo akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel alebo mohol dozvedieť o tejto zmene. Vylúčenie subdodávateľa zo zoznamu subdodávateľov Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť.

Článok X

Bezpečnosť a ochrana zdravia

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 10.1.1 dodržiavať pracovnoprávne, bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na stavenisku,
 - 10.1.2 zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - 10.1.3 zabezpečiť pracovníkom osobné ochranné pracovné prostriedky a to podľa profesií, činností a rizík vykonávanej práce,
 - 10.1.4 minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 10.2 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov Objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu činnosti prevádzky Objednávateľa.

Článok XI

Sankcie - dôsledky omeškania

- 11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
- 11.1.1 v prípade, ak bude Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny neodovzdanej časti diela za

každý aj začatý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká Objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,

11.1.2 ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v preberacom protokole v lehote určenej na ich odstránenie (bod 7.10.), alebo počas záručnej doby, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok),

11.1.3 Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania voči Objednávateľovi v prípade, ak Objednávateľ mešká s úhradou faktúry a to v zákonnej výške z dlžnej sumy za každý deň omeškania,

11.1.4 v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa upravených v Čl. X tejto Zmluvy, zodpovedá Zhotoviteľ za všetky škody vzniknuté z dôvodu takéhoto porušenia.

11.2 Objednávateľ má voči Zhotoviteľovi popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku nedodržania termínu vykonania a odovzdania diela v dohodnutom termíne.

11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje Zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto Zmluvy, najmä zhotoviť dielo včas.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia (ani s nimi nebudú nijako obchodovať) na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Písomný súhlas Objednávateľa je podmienený predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR, inak je tento súhlas neplatný. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie pohľadávky bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v prípade, ak porušením povinností Zhotoviteľa upravených touto Zmluvou alebo v súvislosti s touto Zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči Objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

Článok XII

Vlastnícke právo k dielu, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za vady

12.1 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ obstaral k zhotoveniu diela, je do doby protokolárneho prevzatia zhotoveného diela Objednávateľom, Zhotoviteľ. Od termínu prevzatia staveniska od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela do doby protokolárneho prevzatia zhotoveného diela Objednávateľom zodpovedá za škodu na zhotovovanom diele, tiež na veciach a materiáloch obstaraných k jeho zhotoveniu Zhotoviteľ.

12.2 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného diela dňom protokolárneho prevzatia diela alebo jeho jednotlivých častí od Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele na Objednávateľa.

Článok XIII

Odstúpenie od Zmluvy

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak:

- a) Zhotoviteľ bezdôvodne nepreberie stavenisko v zmysle bodu 4.2.1 tejto Zmluvy,
- b) Zhotoviteľ sa dostal do omeškania so zhotovením diela oproti termínom uvedeným v záväznom časovom a vecnom harmonograme prác o viac ako 30 dní,
- c) Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví zhotovovanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
- e) neodstráni vady a nedorobky v lehote určenej v bode 7.10 tejto Zmluvy,
- f) Zhotoviteľ je v likvidácii, voči Zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,.
- g) Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny.

13.2 Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Objednávateľom bez riadneho zhotovenia diela z dôvodu okolností na strane Zhotoviteľa, Objednávateľovi vzniká právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne v príčinnej súvislosti s vadným plnením alebo porušením povinností, ku ktorým sa Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy zaviazal.

13.3 Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenia poskytnuté Zmluvnými stranami navzájom do okamihu zániku Zmluvy si každá zo Zmluvných strán ponecháva.

13.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ nedodrží podmienky dohodnuté v Zmluve a tým Zhotoviteľovi znemožní riadny výkon dohodnutých prác na diele. V takom prípade je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľné vynaložené náklady, ktoré mu opodstatnene vznikli do dňa odstúpenia od Zmluvy.

13.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hrozacej Objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela Zhotoviteľom,
- b) odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela,
- c) vypratať, opustiť a odovzdať Objednávateľovi stavenisko do 5 pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
- d) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre zhotovenie diela.

Článok XIV **Doručovanie**

14.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že každá písomnosť, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy doručená druhej Zmluvnej strane sa bude považovať za doručeníu:

- a) okamihom doručenia, ak bola písomnosť doručená osobne, a prevzatie je Zmluvnou stranou vyznačené na listine,
- b) tretí pracovný deň po ich preukázateľnom odoslaní doporučenou zásielkou na adresu sídla

- niektorej zo Zmluvných strán uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy, alebo
- c) v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod. v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný mailom a doručený druhej Zmluvnej strane o čom existuje systémový záznam elektronickej pošty,
 - d) v prípade vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi uplynutím tretieho dňa odo dňa vrátenia nedoručenej zásielky druhej Zmluvnej strane, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 14.2 Pri preukazovaní doručenia písomnosti je potrebné preukázať, že došlo k doručeniu, alebo že obálka, ktorá obsahovala písomnosť, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka, alebo že odosielateľ akejkoľvek mailovej správy môže predložiť potvrdenie o mailovom prenose.
- 14.3 Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od Zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto Zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní odo dňa mailovej komunikácie.
- 14.4 Zmluvné strany majú právo písomne si oznámiť inú adresu na doručovanie písomných podaní, a to bez dodatku k tejto Zmluve. Táto zmena je účinná po uplynutí piatich pracovných dní po doručení písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.

Článok XV **Záverečné ustanovenia**

- 15.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 15.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 15.3 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre Zhotoviteľa a tri pre Objednávateľa.
- 15.4 Túto Zmluvu je možné meniť len na základe písomných a očíslovaných dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma Zmluvnými stranami. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu tejto Zmluvy počas jej trvania v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 15.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy vždy najskôr vzájomnou dohodou.
- 15.6 Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo protiprávnym, potom sa takéto ustanovenie bude považovať za oddelené od ostatných ustanovení tejto Zmluvy bez dosahu na platnosť a zákonnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Ak taká neplatnosť alebo protiprávnosť ovplyvní práva a/alebo povinnosti Zmluvných strán, potom Zmluvné strany vynaložia náležité úsilie na nahradenie tohto neplatného alebo protiprávneho ustanovenia iným platným a zákonným ustanovením, ktoré bude najvhodnejšie zodpovedať zámeru zamýšľanému pôvodným ustanovením a touto Zmluvou.

- 15.7 Zánikom tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy. Zánik tejto Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, ani nárokov na zaplatenie Zmluvných pokút alebo iných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku tejto Zmluvy.
- 15.8 Zmluvne strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, že vôľa Zmluvných strán je pri uzatváraní tejto Zmluvy skutočne daná, vôľa prejavovaná v Zmluve je slobodná, bez nátlaku, bezprávnej vyhrážky, vážna, určitá, zrozumiteľná, bez omylu, a že Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok ani jednej zo Zmluvných strán a Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1: Položkový rozpočet (vyplnený výkaz výmer)

Príloha č. 2: D1.01 – Výkres architektonicko-stavebného riešenia „Výsek pôdorysu 1.PP – Búracie práce“

Príloha č. 3: D1.02 – Výkres architektonicko-stavebného riešenia „Výsek pôdorysu 1.PP – Nový stav“

Príloha č. 4: D1.03 – Výkres architektonicko-stavebného riešenia „Výsek pôdorysu 1.PP – Pôdorys prístrojového vybavenia“

Príloha č. 5: E1.01 – Výkres elektroinštalácií „Výsek pôdorysu 1.PP – Svetelné obvody“

Príloha č. 6: E1.02 – Výkres elektroinštalácií „Výsek pôdorysu 1.PP – Zásuvkové obvody“

Príloha č. 7: E1.03 – Výkres elektroinštalácií „Výsek pôdorysu 1.PP – Dátové zásuvky“

Príloha č. 8: ZTI1.01 – Výkres zdravotníckych inštalácií „Výsek pôdorysu 1.PP“

Príloha č. 9: Zoznam subdodávateľov

V Trstenej, dňa

V Trnave, dňa

OK – TEAM, s.r.o.
Ing. Jozef Obtulovič
konateľ

Fakulta
JUDr. Vladimír
riaditeľ

ca Trnava
ojta



FAKULTNÁ NEMOCNICA
TRNAVA

Príloha č. 1: Položkový rozpočet (vyplnený výkaz výmer)

Výkaz Výmer

Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude spolu s jeho identifikačnými údajmi súčasťou uzatvorenej zmluvy.

1. Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:	OK - TEAM s.r.o.
Sídlo:	Nová 200/7, 028 01 Trstená
IČO:	31330631
DIČ:	2020816149
IČ DPH:	SK2020816149
Bankové spojenie vo formáte IBAN:	SK65 0200 0000 0031 8877 4158

2. Názov zákazky:

Úprava vnútorných priestorov 1.PP kliniky infektológie FNTT pre zriadenie
farmakokinetického laboratória

3. Návrh na plnenie kritérií

Rekapitulácia výkazu výmer		
Č.	Popis	Celková cena
		42 847,74
1	Architektonicko-stavebné riešenie	22 164,79
2	Elektroinštalácie	15 013,58
3	Zdravotechnické inštalácie	5 669,37
	Cena celkom bez DPH	42 847,74 €
	DPH	8 569,55 €
	Cena celkom s DPH	51 417,29 €

* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa“ („N/A“).

Ak uchádzač nie je platcom DPH, týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že ak sa neskôr stane platcom DPH, nie je oprávnený fakturovať k ponúkanej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa stal platcom DPH nie je dôvodom na zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena sa považuje za cenu vrátane DPH.

V Trstenej

dňa 05.01.2022

Ing. Čotulovič Jozef

.....
Pečiatka, meno a podpis uchádzača

Rozpočet

Stavba: Úprava vnútorných priestorov 1.PP kliniky infektológie FNTT pre zriadenie farmakokinetického laboratória
Objekt: Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava

Zhotoviteľ: OK - TEAM s.r.o. , Nová 200/7, 028 01 Trstená

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 05.01.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 014	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	1,800	65,30	117,54
2 014	346234311.S_UP	Murárske práce - vysekanie, zamurovanie a začistenie, drážka pre rúrku na vodu, DN 40	m	42,000	22,10	928,20
3 014	346234312.S_UP	Murárske práce - vysekanie, zamurovanie a začistenie, drážka pre rúrku na vodu, DN 15	m	50,500	21,10	1065,55

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 014	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	168,500	9,20	1550,20
5 011	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	168,500	13,10	2207,35
6 011	612467501_UP	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	17,000	2,75	46,75
7 011	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	168,500	6,55	1103,68
8 011	632457525_UP	Cementová samonivelizačná hmota Weber - Terranova, weber.floor 4150, triedy CT-C25-F5, hr. 7 mm	m2	49,500	18,20	900,90

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 003	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,600	4,53	229,22
10 011	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	48,700	4,22	205,51
11 014	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	48,700	0,50	24,35
12 013	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	0,720	5,90	4,25
13 760	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,87	0,87
14 760	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,000	10,00	20,00
15 013	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,600	12,50	20,00
16 013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,700	16,31	11,42
17 013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,300	0,66	8,78
18 013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,700	12,30	8,61

19 013	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,200	2,20	9,24
20 211	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,700	4,12	2,88
21 013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,700	50,50	35,35

99 Presun hmôt HSV

22 011	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	11,734	12,30	144,33
--------	-------------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konštrukcie - drevostavby

23 763	763115112	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	8,500	77,60	659,60
24 763	763135020_UP	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela (vrátane roštu)	m2	49,500	52,10	2578,95
25 590	590130000100	Podhľad kazetový Casoprano Casoroc, hrana A, hr. 8,0 mm, šxl 600x600 mm, sadrokartónový, RIGIPS	m2	49,500	26,80	1326,60
26 763	763135095	Montáž kaziet, konštrukcia viditeľná, hrany A SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	49,500	7,30	361,35
27 590	590130001900	Kazeta stropná Casoroc, hrana A, biela, hr. 12,5 mm, šxl 600x600 mm, sadrokartónová, RIGIPS	m2	49,500	15,55	769,73
28 763	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5592,594	0,07	363,52

766 Konštrukcie stolárske

29 760	766662113_UP	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, vrátane kovania	ks	2,000	15,60	31,20
30 611	P	Dvere vnútorné plné, DTD laminát, š. 900	ks	1,000	160,00	160,00
31 611	P	Dvere vnútorné plné, DTD laminát, š. 800	ks	1,000	160,00	160,00
32 549	549160000300_U P	Kľučka - kľučka dverová 2x, METALIA ARTITEC TIPO	kpl	2,000	31,80	63,60
33 760	766702111_UP	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr. steny do 170 mm	ks	2,000	39,30	78,60
34 611	611810000700_U P	Zárubňa vnútorná obložková, DTD laminát, hrúbka steny 10 - 15 cm, š. 60,70,90 cm	ks	2,000	150,30	300,60
35 766	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	609,700	0,01	5,49

776 Podlahy povlakové

36 775	776420011_UP	Lepenie podlahových fabionov z PVC	m	5,040	8,71	43,90
37 284	284110000133_U P	Podlaha PVC heterogénna (napr. Novoflor Extra STATIK SD - 2120-131, hr.2 mm)	m2	5,280	18,20	96,10
38 775	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	50,600	4,35	220,11
39 775	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	49,500	11,09	548,96
40 284	284110000130_U P	Podlaha PVC heterogénna (napr. Novoflor Extra STATIK SD - 2120-131, hr.2 mm)	m2	51,750	18,55	959,96
41 775	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	50,600	0,52	26,31
42 775	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	50,600	1,41	71,35

43	775	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1947,060	0,20	389,41
----	-----	-------------	---	---	----------	------	--------

781 Obklady

44	771	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	4,950	35,60	176,22
45	597	597640002300_U P	Obkladačky keramické COLOR ONE, lxvxhr 198x198x6,5 mm, farba biela, RAKO	m2	4,950	30,10	149,00
46	597	P	Škárovacia hmota CERESIT CE 40, biela	kg	5,000	5,50	27,50
47	771	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	256,235	0,23	58,93

784 Maľby

48	784	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	17,000	2,10	35,70
49	784	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	17,000	2,10	35,70
50	784	784430303_UP	Akrylovanie dvojnásobné kútov, stykov pretierateľným tmelom, pred zhotovením malieb	m	8,500	4,20	35,70
51	784	784452251	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	168,500	11,70	1971,45
52	784	784452271_UP	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m, RAL 9010	m2	168,500	7,80	1314,30

ost Ostatné

53	R	OST01	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	-------	--	-----	-------	--------	--------

Celkom

22164,79

Rozpočet

Stavba: Úprava vnútorných priestorov 1.PP kliniky infektológie FNTT pre zriadenie farmakokinetického laboratória
Objekt: Elektroinštalácie

Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava

Zhotoviteľ: OK - TEAM s.r.o. , Nová 200/7, 028 01 Trstená

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 05.01.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	66,360	2,09	138,89
2	345	345710011400	Rúrka ohybná PVC LPFLEX 2329 D29, KOPOS	m	66,360	1,98	131,39
3	345	345710019600	Spojka pre LPE ohybné rúrky 0229/1	ks	44,000	0,65	28,60
4	345	345710030300	Vývodka rovná 9929, KOPOS	ks	28,000	0,85	23,66
5	921	210010006_UP	Murárske práce - vysekanie, zamurovanie a začistenie, drážka pre rúrku alebo kábel do D 39 mm	m	66,360	15,00	995,40
6	921	210010112_UP	Lišta elektroinštalčná Niedax, uložená pevne, vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu	m	105,930	4,80	508,46
7	345	345750057100_U P	Lišta Niedax kovová, nedierkovaná, 5820/30 S	m	105,930	4,16	440,67
8	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	48,000	2,47	118,56
9	345	P	Krabica KU 68-1901	ks	48,000	0,46	21,84
10	921	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	8,000	8,06	64,48
11	345	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	8,000	4,03	32,24
12	921	210010327_UP	Krabica (KO 125/1L štvorcová) do dutých stie, inštalčná s viečkom, bez zapojenia	ks	13,000	6,98	90,74
13	345	345410000600	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO125/1L šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	13,000	10,40	135,20
14	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	124,000	1,30	161,20
15	354	354310017400	Káblové oko medené lisovacie CU 1,5x3 KU-L	ks	124,000	0,32	39,68
16	921	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,86	2,86
17	345	345340004500	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	1,000	7,18	7,18
18	345	345350001500	Kryt spínača TANGO tlačidlový 3558A-A651 B, ABB	ks	1,000	2,88	2,88
19	345	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	1,000	1,63	1,63
20	921	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	3,000	6,50	19,50
21	345	345330003300	Prístroj prepínača 3558-A51340 radenie 6+, ABB	ks	3,000	8,84	26,52
22	345	345350001800	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	ks	3,000	2,88	8,64

23	345	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	3,000	1,63	4,88
24	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	42,000	6,95	291,90
25	345	345510004300_U P	Zásuvka s prepäťovou ochranou VALENA S74396, 2P+T	ks	42,000	55,20	2318,40
26	345	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	9,000	1,63	14,63
27	345	345350002600	Rámček TANGO 2-násobný vodorovný 3901A-B20 B biely, ABB	ks	8,000	2,77	22,15
28	345	345350003000	Rámček TANGO 3-násobný vodorovný 3901A-B30 B biely, ABB	ks	3,000	4,35	13,05
29	345	345350003400	Rámček TANGO 4-násobný vodorovný 3901A-B40 B biely, ABB	ks	2,000	7,76	15,52
30	921	210111135_UP	Zásuvka CEE 230 V, 16A vrátane zapojenia	ks	2,000	7,80	15,60
31	345	P	Zásuvka CEE 3P 16A 230V	ks	2,000	47,60	95,20
32	921	210201520	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhládového, LED - núdzový režim	ks	4,000	15,10	60,40
33	348	348150001100_up	Svietidlo núdzové SCHRACK-LED, 3h, NLK2U003SC+NLK2E (svietidlo+zapustená rām)	ks	4,000	72,30	289,20
34	921	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	21,000	24,70	518,70
35	348	348130002400_U P	LEDVANCE 4058075066601 PANEL LED VALUE 600x600 - 40W/4000K	ks	21,000	61,75	1296,75
36	921	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	90,720	1,66	150,60
37	341	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	90,720	0,96	87,09
38	921	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	433,200	2,21	957,37
39	341	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	433,200	1,75	758,10
40	921	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	73,560	2,21	162,57
41	341	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	73,560	6,00	441,36
42	921	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	18,000	2,21	39,78
43	341	341110002400	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	18,000	15,87	285,66
44	921	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	13,200	2,21	29,17
45	341	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	13,200	1,20	15,81

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

46	922	220511030	Kábel voľne uložený na stenu	m	38,160	2,21	84,33
47	341	341230001400	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm2	m	38,160	3,77	143,86
48	922	220733040_UP	Montáž dátovej zásuvky	ks	6,000	10,10	60,60
49	383	383150000300	Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e UTP, LOGUS 90	ks	6,000	14,28	85,68

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

50	HZS	HZS000114_01	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) - revízia elektroinštalácie	kpl	1,000	355,00	355,00
----	-----	--------------	---	-----	-------	--------	--------

Ost Ostatné

51	R	OST_01	D+M rozvádzača OEZ DISTRITON RZB-Z-4S96	kpl	1,000	2500,00	2500,00
52	R	OST_02	Zriadenie nového prívodu v PRIS skrini	kpl	1,000	350,00	350,00

53	R	OST_02	Kompletné odskúšanie rozvádzača po jeho dozbrojení a zapojení	kpl	1,000	200,00	200,00
54	R	OST_04	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	300,00	300,00

Celkom

15013,58

Rozpočet

Stavba: Úprava vnútorných priestorov 1.PP kliniky infektológie FNTT pre zriadenie farmakokinetického laboratória
 Objekt: Zdravotechnické inštalácie

Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava

Zhotoviteľ: OK - TEAM s.r.o. , Nová 200/7, 028 01 Trstená

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 05.01.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1	713	713482112_UP	Montáž trubíc z PE, hr. 10-20 mm, na potrubie vodovodne dn 15-40	m	50,500	12,60	636,30
2	283	283310001800_U P	Izolácia trubice TUBOLIT na potrubie vodovodne DN 15-40 hr. 10-20 mm	m	53,025	5,20	275,73
3	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	224,523	0,05	10,24

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

4	721	721173203_UP	Potrubie z rúr PP-HT DN 32 odpadové prípojné	m	14,000	16,10	225,40
5	721	721173205_UP	Potrubie z rúr PP-HT DN 40 odpadové prípojné	m	28,000	16,25	455,00
6	721	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	3,000	5,00	15,00
7	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	4,000	5,50	22,00
8	551	551610000100_U P	Privzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	58,60	117,20
9	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	431,676	0,05	19,81

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

10	721	722171312_UP	Potrubie z viacvrstvových rúr PE plastohliníkových DN 15	m	50,500	19,50	984,75
11	721	722211005	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 15	ks	2,000	20,30	40,60
12	551	551110024600	Guľový uzáver prírubový série 02 na vodu nerez, DN 20, dl. 120 mm, tesnenie PTFE, IVAR	ks	2,000	265,80	531,60
13	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	10,45	41,80
14	551	551110020100_U P	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8" + flexi hadica	ks	4,000	12,45	49,80
15	721	722221083	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	3,000	19,24	57,72
16	551	551110011300	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, IVAR	ks	3,000	12,75	38,25
17	721	722290226_UP	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	50,500	2,55	128,78
18	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,500	2,10	106,05

19 721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1419,758	0,02	26,83
--------	-----------	--	---	----------	------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety


20 721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	2,000	7,80	15,60
21 551	P	Umývadlový sifón, biela, plast	ks	2,000	15,30	30,60
22 721	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,486	0,01	0,30

ost Ostatné

23 R	OST02	D+M protizápachového uzáveru pre klímu HL 138	ks	3,000	100,00	300,00
24 R	OST02	D+M Prečerpávacej stanice (napr. Grundfos SOLOLIFT2 C-3)	kpl	2,000	620,00	1240,00
25 R	OST03	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	300,00	300,00

Celkom

5669,37

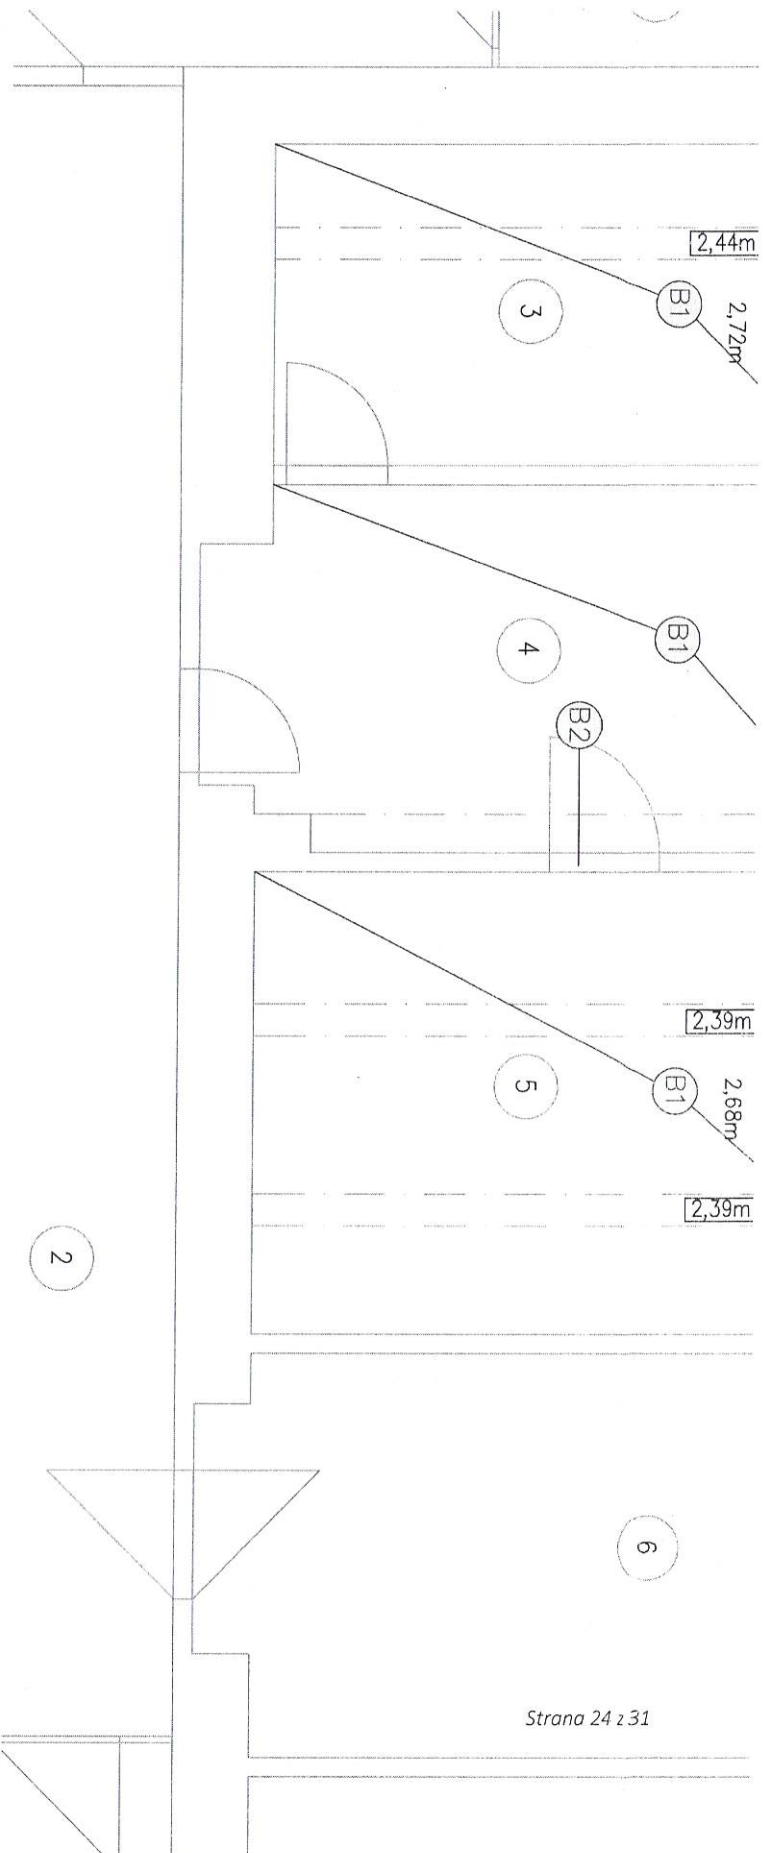

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA
3	KANCELÁRIA	11,30	PVC
4	KANCELÁRIA	13,75	PVC
5	KANCELÁRIA	20,09	PVC

LEGENDA HMŔ

BÚRACIE PRÁCE

- B1 ODBRÁNENIE NAŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY VRÁTANE ZBRÚSENIA LEPIDLA A SAMONIVELIZAČNÉHO POTERU
- B2 ZVESENIE DVERNÉHO KRÍDLA VRÁTANE VYBÚRANIA ZÁRUBNE, 1ks


Autor projektu	Zodpovedný projektant	Koord
	Ing. Daniel Béi	Ing
Investor : Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žamova 11, 9		
stavba : INFEKČNÉ ODDelenie		
Fakultná nemocnica Trnava		
objekt :		
príloha : D1.01 - Architektonicko-stavebné riešenie		
obsah : Výsek pôdorysu 1. PP - Búracie práce		
názov díg. súboru :	číslo výkresu :	
INF_Podorys 1.PP.dwg	D1.01	

LEGENDA NOVÝCH KONŠTÍ

- A VYSPRAVENIE ONAĽTOK, NOVÁ MALE FARBA: BIELA
- B UMÝVATEĽNÝ NÁĽTER APLIKOVAĽ PO
- C NOVÁ NÁĽĽAPNÁ VRSTVA PODĽAĽHA SD - 2120-131, hr. 2mm + FABIÓN,
- D1 - D2 VNÚĽTORNÉ INTERIÉROVÉ DVERE
- E KERAMICKÝ OBĽKLAD NA STENU REAL napr. RAKO-séria Color ONE, 200x200 mm
- F SDK KAZETOVÝ PODĽĽĽAD RIGIPS CA; TYP HRANY - A, SYST. MONTÁĽŽE - T24

POZNÁMKA

- VŠETĽKY EXISTUJÚCE STENY LOKÁĽNE
- NA DODATOČNÉ NEROVNOTY PODĽAĽH
- ELEKTROINŠĽTALÁCIE KOMPLET NOVÉ V SAMOSTATNÁ PD)

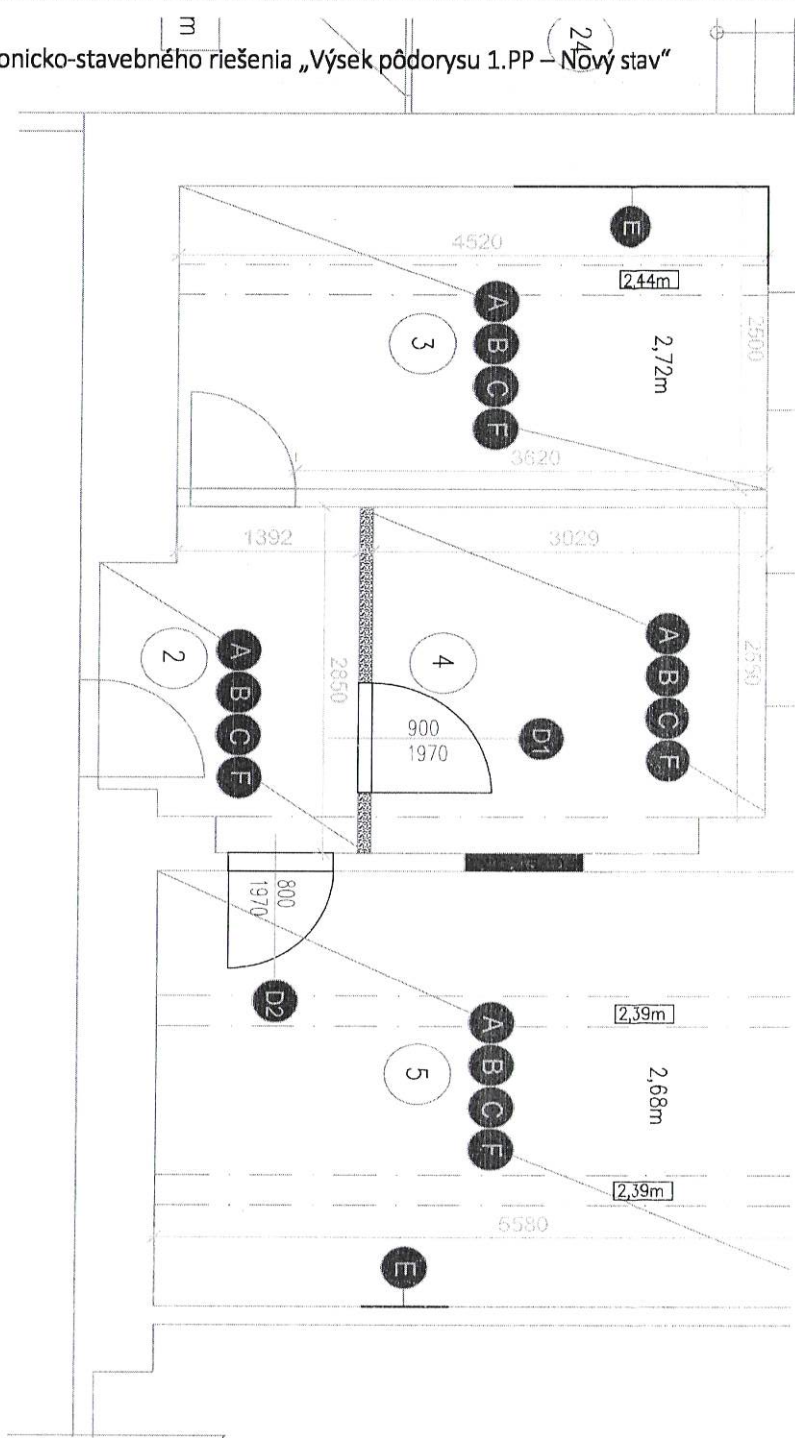


Príloha č. 3: D1.02 – Výkres architektonicko-stavebného riešenia „Výsek pôdorysu 1.PP – Nový stav“

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAĽHA
2	PRECHODNÁ MIESTNOSĽ	4,99	ANTISTAT.PODĽAĽHA + FABIÓN
3	UMÝVACIA MIESTNOSĽ	8,48	ANTISTAT.PODĽAĽHA + FABIÓN
4	ANALYTICKÁ MIESTNOSĽ	9,11	ANTISTAT.PODĽAĽHA + FABIÓN
5	MIESTNOSĽ NA SPRACOVÁVANIE VZORKY	20,09	ANTISTAT.PODĽAĽHA + FABIÓN

Autor projektu	Zodpovedný projektant	Koor
	Ing. Daniel Bel	lni
Investor : FakulĽná nemocnica Trnava, Andreja Ľarmova 11, 9		
stavba : INFEKČNÉ ODDEĽENIE		
FakulĽná nemocnica Trnava		
objekt :		
profesia : D1.01 - Architektonicko-stavebné riešenie		
obsah : Výsek pôdorysu 1. PP - Nový stav		
názov dg. súboru :		
INF_Podorys 1.PP.dwg	číslo výkresu :	D1.02

Príloha č. 4: D1.03 – Výkres architektonicko-stavebného riešenia „Výsek pôdorysu 1.PP – Pôdorys prístrojového vybaven

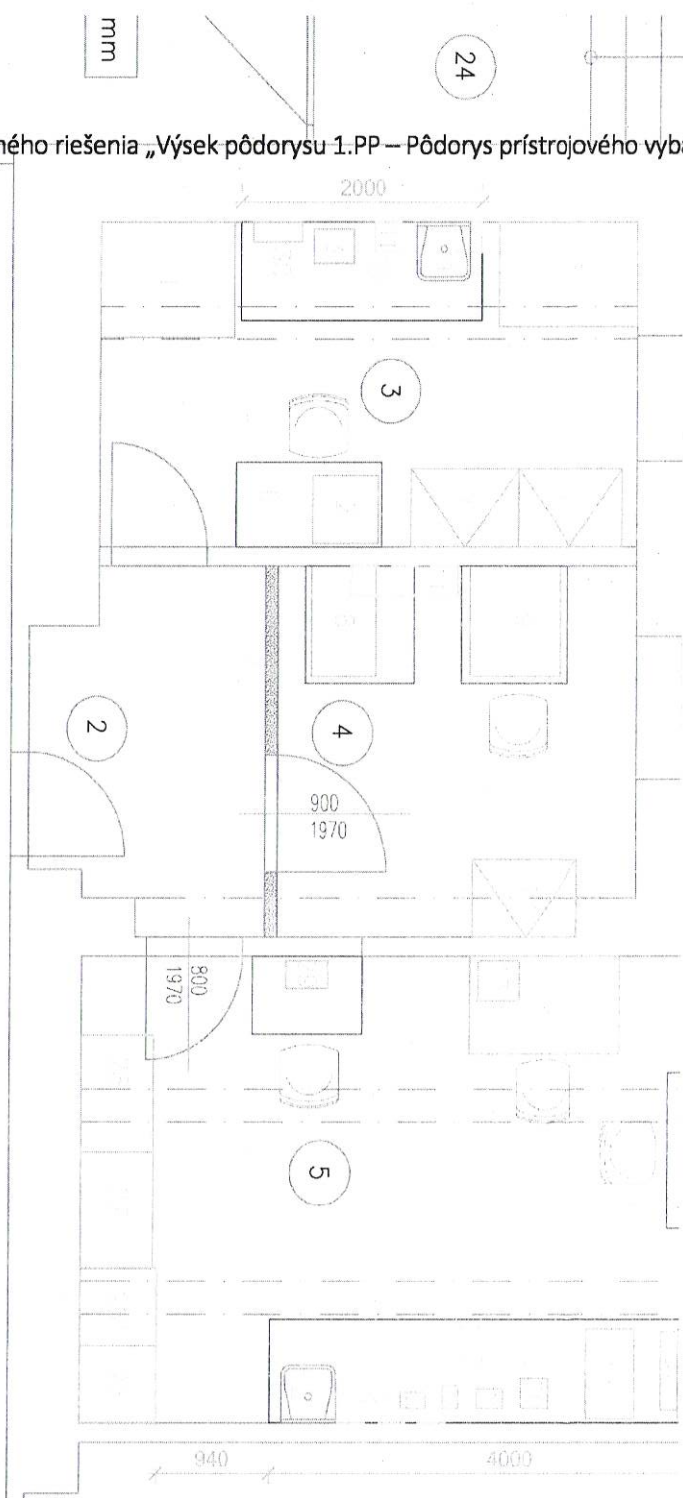


LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
2	PRECHODNÁ MIESTNOSŤ	4,99
3	UMÝVACIA MIESTNOSŤ	8,48
4	ANALYTICKÁ MIESTNOSŤ	9,11
5	MIESTNOSŤ NA SPRACOVÁVANIE VZORKY	20,09

- 5 - UMÝVACIA LABORATORNEHO SKL
- 6 - STÔL + STOLIČKA
- 7 - ZOSTAVA SKRIŇ NA LABORATORNÉ
- 8 - PRÍSTROJ LC
- 9 - PRÍSTROJ MS+PC
- 10 - SKRIŇ NA LABORATORNÉ VYUŽIT
- 11 - KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY
- 12 - BEZDŮTĚHOVÝ BOX
- 13 - SYSTÉM NA ZAKONZERVOVANIE \
- 16 - STÔL S PC
- 17 - LABORATORNÝ STÔL S MÉDIOVOI
- 18 - CENTRIFÚGA S CHLADENÍM
- 19 - CENTRIFÚGA NECHLADENÁ
- 20 - MIKROCENTRIFÚGA
- 21 - PH METER
- 22 - HOMOGENIZÁTOR
- 23 - MAGNETICKÉ MIEŠADLO S OHREV
- 24 - LABORATORNÉ UMÝVADLO (445x
- ZMIEŠAVACEJ PÁKOVEJ BATÉRIE
- 25 - LABORATORNÁ CHLADIČKA
- 26 - LABORATORNÁ CHLADIČKA
- 27 - BEZPEČNOSTNÁ SKRIŇ NA CHEM
- 28 - SKRIŇ NA LABORATORNÉ SKLO
- 29 - ANALYTICKÁ VÁHA
- 30 - SYSTÉM NA PRÍPRAVU ČISTEJ A I
- 31 - MRAZNIČKA
- 32 - LABORATORNÝ STÔL Dĺžky 2000

Autor projektu	Zodpovedný projektant	Koort
	Ing. Daniel Bél	Ing
Investor : Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žamova 11, 9		
stavba : INFEKČNÉ ODDelenie		
Fakultná nemocnica Trnava		
objekt :		
profesia : D1.01 - Architektonicko-stavebné riešenie		
obsah : Výsek pôdorysu 1. PP - Pôdorys prístrojového vyba		
název díg. súboru : INF_Podorys 1.PP.dwg		číslo výkresu : D1.03

Príloha č. 5: E1.01 – Výkres elektroinštalácií, Výsek pôdorysu 1.PP – Svetelné obvod

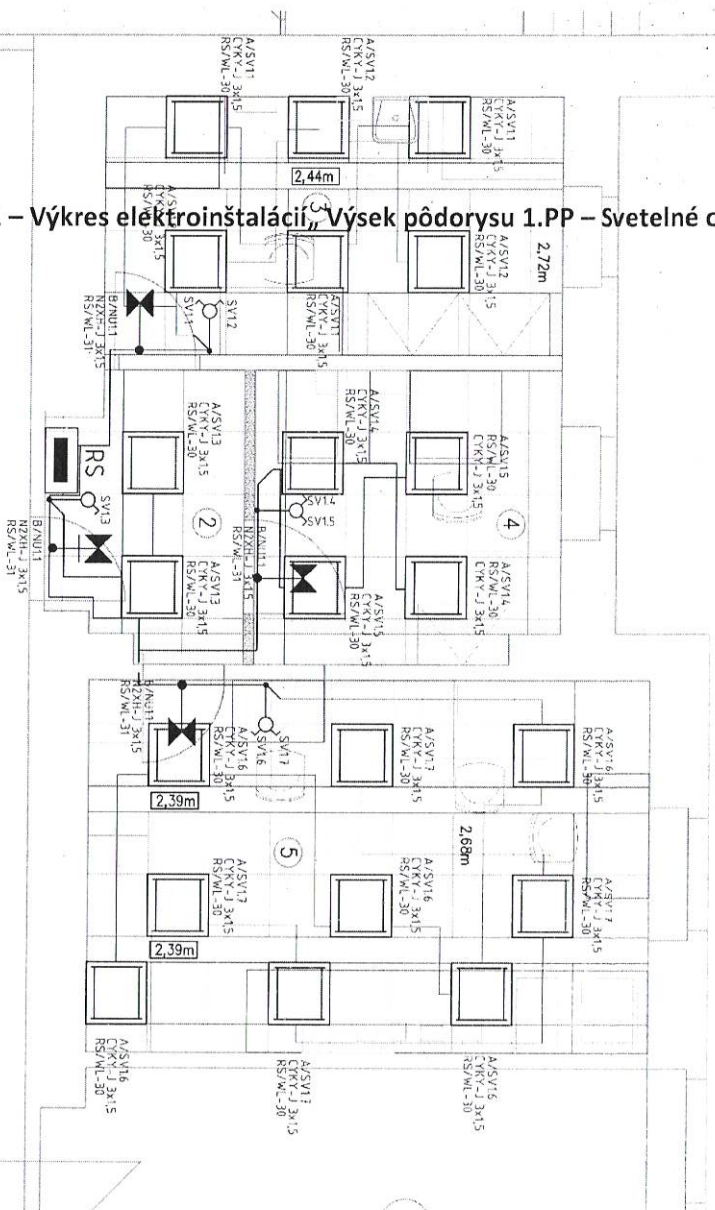

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
2	PRECHODNÁ MIESTNOSŤ	4.99
3	UMÝVACIA MIESTNOSŤ	8.48
4	ANALYTICKÁ MIESTNOSŤ	9.11
5	SPRACOVÁVANIE VZORKY	20.09

POZNÁMKY

- Rozvodná sústava – 3~ PE-N AC, 50Hz, 400/230V/TN-S
Prívod istíť 3 x 40 A
- Ochranné opatrenie
- samočinné odpojenie napájania podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.11
 - Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
 - zábŕany alebo kryty podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.11.2 (príloha A.2)
- Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
- samočinné odpojenie pri poruche podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.11.3.2
 - systém TN podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.11.4
- Doplnková ochrana
- doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.15.
 - prídavové chrániče In –30mA podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.15.1
 - doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.15.

LEGENDA

- A SVETIDLO LEDVANCE 600x600, 21 ks
- B NÚDZOVÉ SVETIDLO, SCHACK-LED, 3h, NLK2U003SC-NLK2E (svetidlo-zapustený rám), 4 ks
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ZAPUSTENÝ /I/- ABB -PRÍSTROJ 3558-A01340 – 1 ks
- SERIOVÝ SPÍNAČ ZAPUSTENÝ /S/- ABB -PRÍSTROJ 3558-A05340 – 3 ks
- NOVÝ ROZVÁDZAČ OZD. DISTRIB. RZB-Z-4596
- RS NOVÝ ROZVÁDZAČ OZD. DISTRIB. RZB-Z-4596
- NAPÁJACÍ KÁBEL CYKY-J 3x15 (N2XH-J 3x15 PRE NC) / CYKY-J 3x25 / CYKY-J 5x6
- KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ ZAPUSTENÁ KP68, KU68, KR68, KU97
- KÁBLOVÉ VEDENIE POD OMIETKOU
- KÁBLOVÉ VEDENIE NA POVRCHU LIŠŤAMI
- KÁBLOVÉ VEDENIE V TRUBE VHM, FXP
- KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ ROZVODNÁ 6455-11
- KÁBEL FIP 6A

- ~ ZÁSUVKA JEDNOMÁSOBNÁ ZAPUSTENÁ 230V/16A S PREPÄTOVOU OCHRANOU
- ~ ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ ZAPUSTENÁ 230V/16A S PREPÄTOVOU OCHRANOU
- ~ ZÁSUVKA KRABICOVÁ ZAPUSTENÁ 3x230V/16A S PREPÄTOVOU OCHRANOU
- ~ ZÁSUVKA KRABICOVÁ ZAPUSTENÁ 4x230V/16A S PREPÄTOVOU OCHRANOU
- LAN ~ DÁTOVÁ ZÁSUVKA POLOZAPUSTENÁ KAT. 6A DO KRABICE KP68
- RACK (NAPR. CONTEC 500X500X300mm)


Autor projektu		Zodpovedný projektant	Koordinácia projektu
		Ing. Daniel Běl	Ing. Daniel Běl
Investor : Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žamova 11, 917 75 Trnava			
stavba : INFEKČNÉ ODDelenIE			
Fakultná nemocnica Trnava			
objekt :			
profesia : EI - Elektroinštalácie			
obsah : Výsek pôdorysu 1. PP - Svetelné obvody			
název dŕg. súboru : INF_Podorys 1.PP.dwg		číslo výkresu : E1.01	číslo revízie : 00
		číslo výkresu : E1.01	číslo revízie : 00
		číslo výkresu : E1.01	číslo revízie : 00



Č. M.	NÁZOV Miestnosti	PLOCHA (m ²)
2	PRECHODNÁ Miestnosť	4,99
3	UMÝVACIA Miestnosť	8,48
4	ANALYTICKÁ Miestnosť	9,11
5	Miestnosť NA SPRACOVÁVANIE VZORKY	20,09

Rozvodná sústava - 3+ PE+N, AC, 50Hz, 400/230V/1TN-S
 Prívod isťit 3 x 4,0 A
 Ochranné opatrenie
 -samočinné odpojenie napájania podľa STN 332000-4-4/1/2007 čl.4.11
 Požiadavky na zariadenú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
 -zábrana alebo krytý podľa STN 332000-4-4/1/2007 čl.4.11.2 (príloha A.2)
 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
 -samočinné odpojenie pri poruche podľa STN 332000-4-4/1/2007 čl.4.11.3
 -systém TN podľa STN 332000-4-4/1/2007 čl.4.11.4
 Doplňková ochrana
 -doplňkové ochranné pospaganie podľa STN 332000-4-4/1/2007 čl.4.15,
 -prídovné chrániče In -30mA podľa STN 332000-4-4/1/2007 čl.4.15.1
 -doplňkové ochranné pospaganie podľa STN 332000-4-4/1/2007 čl.4.15,
 -prídovné chrániče In -30mA podľa STN 332000-4-4/1/2007 čl.4.15.1

Strana 28 z 31

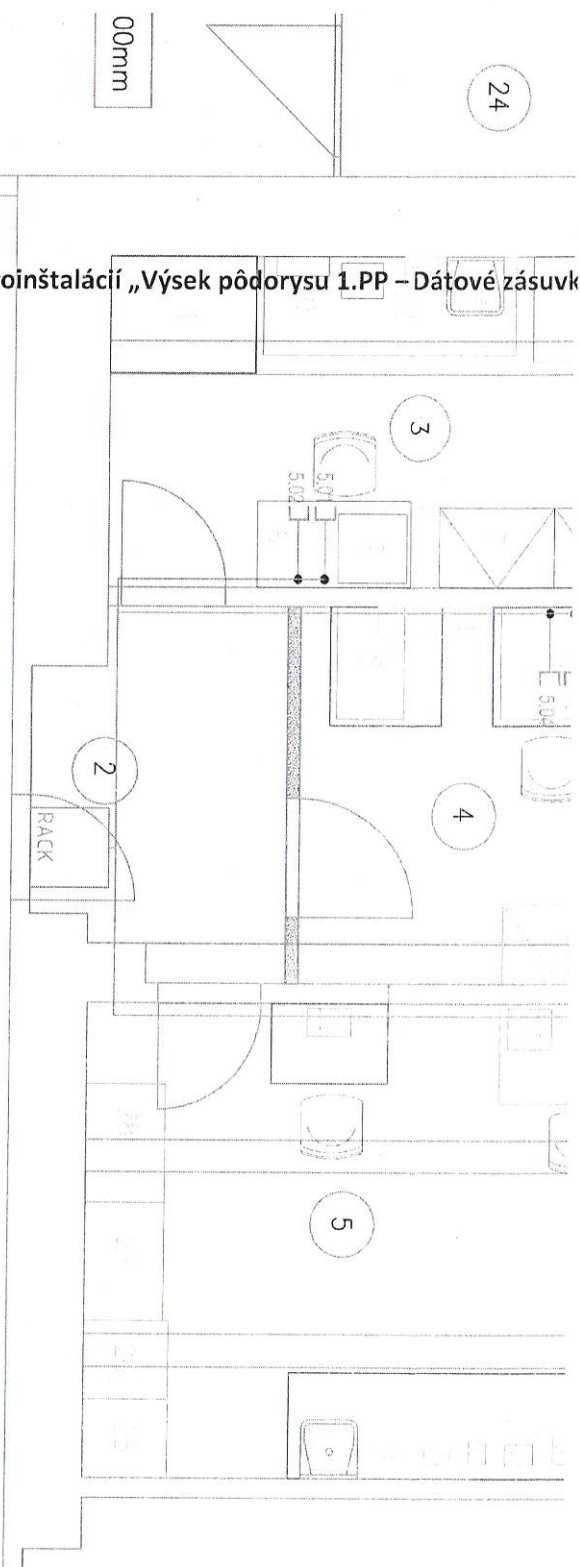

Príloha č. 7: E1.03 – Výkres elektroinštalácií „Výsek pôdorysu 1.PP – Dátové zásuvky“

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
2	PRECHODNÁ MIESTNOSŤ	4,99
3	UMÝVACIA MIESTNOSŤ	8,48
4	ANALYTICKÁ MIESTNOSŤ	9,11
5	MIESTNOSŤ NA SPRACOVÁVANIE VZORKY	20,09

LEGENDA MIESTNOSTÍ

POZNÁMKY


- Rozvodná sústava - 3+ PE+N AC, 50Hz, 400/230V/TN-S
Prívod istíť 3 x 4,0 A
- Ochranné opatrenie
- samočinné odpojenie napájania podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.11
- Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
- zbrany alebo kryty podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.11.2 (príloha A.2)
- Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
- samočinné odpojenie pri poruche podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.11.3.2
-systém TN podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.11.4
- Doplnková ochrana
- doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.15.
-prúdové chrániče In -30mA podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.15.1
-doplnkové ochranné pospájanie podľa STN 332000-4-41/2007 čl.4.15.

2

- NÚDZOVÉ SVIETIDLO, SCHACK-LED, 3h, N
 JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ZAPUSTENÝ /1/ -
 SERIOVÝ SPÍNAČ ZAPUSTENÝ /5/ - ABB
 NOVÝ ROZVÁDZAČ 0,5 Z DISTRITON RZB-Z-
 NÁPÁJACÍ KÁBEL CYKY-J 3x1,5 (N2XH-J)
 KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ ZAPUSTEN
 KÁBLOVÉ VEDENIE POD OMIETKOU
 KÁBLOVÉ VEDENIE NA POVRCHU LIŠŤAMI
 KÁBLOVÉ VEDENIE V TRUBE VRM, FXP
 KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ ROZVODNÁ
 KÁBEL FTP 6A
 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUSTENÁ 230
 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ ZAPUSTENÁ 230
 ZÁSUVKA KRABICOVÁ ZAPUSTENÁ 3x230V
 ZÁSUVKA KRABICOVÁ ZAPUSTENÁ 4x230V
 LAN DÁTOVÁ ZÁSUVKA POLOZAPUSTENÁ KA
 RACK (NAPR. CONTEC 500X500X300mm)

Autor projektu	Zodpovedný projektant	Koor
	Ing. Daniel Bel	Ing
Investor : Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 9		
stavba : INFEKČNÉ ODDelenie		
Fakultná nemocnica Trnava		
objekt :		
profesia : EI - Elektroinštalácie		
obsah : Výsek pôdorysu 1. PP - Dátové zásuvky		
názov dlg. súboru : INF_Podorys 1.PP.dwg	číslo výkresu :	E1.03

Príloha č. 8: ZT11.01 – Výkres zdravotníckych inštalácií „Výsek pôdorysu 1.F

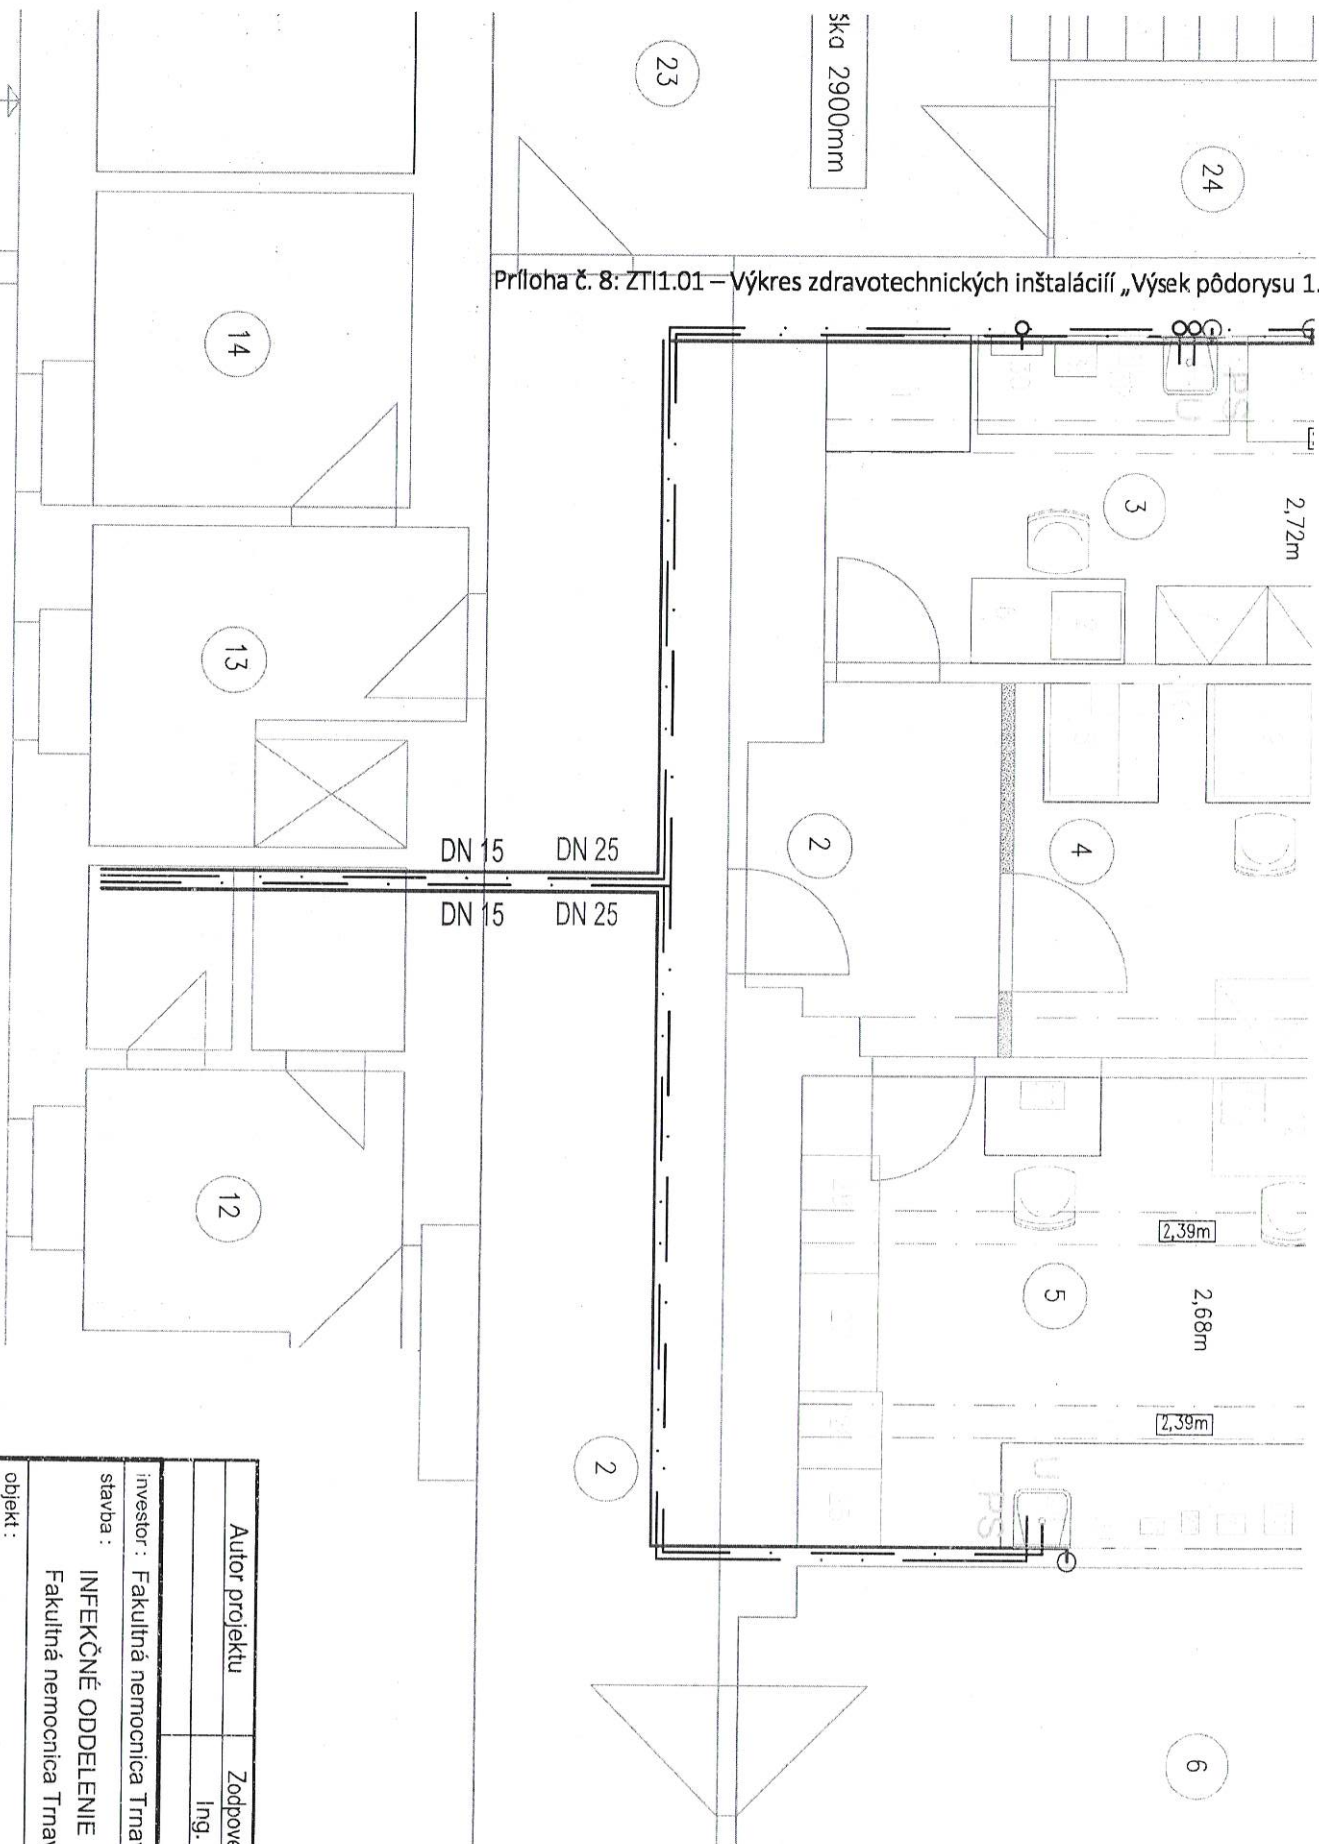


Strana 30 z 31

2	PRECHC
3	UMYVAC
4	ANALYTI
5	MIESTNK SPRACC

LEGENDA

U Laborat
s nekorc
PS Prečerp

ZNAČENIE



Autor projektu	Zodpovedný projektant	Koord
	Ing. Daniel Bél	Ing
Investor : Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žamova 11, 9'		
stavba : INFEKČNÉ ODDelenie		
Fakultná nemocnica Trnava		
objekt :		
profesia : ZTI - Zdravotníckych inštalácie		
obsah : Výsek pôdorysu 1. PP		
názov diag. súboru :	číslo výkresu :	
INF_Podorys 1.PP.dwg	ZT11.01	

Príloha č. 9: Zoznam subdodávateľov

Por. č.	Subdodávateľ	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
1.	(Názov subdodávateľa sídlo a IČO)	(Meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
2.	ELIM LEVICE s.r.o.	TIBOR ÖBERT
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
