

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ: **Mesto Bardejov**
Sídlo: Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščák
IČO: 00321842
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK70 0900 0000 0050 5698 5200

Zhotoviteľ: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR**
oprávnená podnikateľ v SR vznikom organizačnej zložky
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Zapísaný v: OR OS Bratislava I, oddiel Po, vložka 679/B
Zastúpená: Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Sekerák
vo veciach technických: Ing. Ján Sekerák
IČO: 31792693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže – **Stavebné práce - Športová hala Bardejov, drevený obklad a dokončovacie práce.**
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) **Stavebné práce - Športová hala Bardejov, drevený obklad a dokončovacie práce** podľa Výkazu výmer a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa

realizácie diela a jeho kvality.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 43 333,10 €, DPH predstavuje sumu 8 666,62 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 51 999,72 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatel'om.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel' oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj názov projektu. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Projekt bude realizovaný v katastri **Mesto Bardejov**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania **do 180 kalendárnych dní** od prevzatia staveniska.

3. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
4. V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
 - e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
 - a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
 - b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a

podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas celej doby realizácie diela a to najneskôr v deň prevzatia staveniska a preukázať sa ním Objednávateľovi. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny diela s DPH podľa bodu II.1 tejto Zmluvy.
- d) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- e) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník a fotodokumentáciu prác. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- f) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré

nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.

- g) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- j) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- k) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- l) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- m) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- n) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- o) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- p) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

- q) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- r) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- s) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- t) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- u) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- v) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- w) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- x) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziiu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa

poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií.

2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a. neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2. tohto článku alebo;
 - b. nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c. neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.
4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 3 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a. požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b. odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c. zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.

Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

5. Náhradu nákladov podľa bodov 3 a 4 tohto článku Objednávateľ vykoná zaslaním listu zhotoviteľovi s priložením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto článku, pričom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť uvedené náklady do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia listu Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri

práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.

4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Prílohe č. 1 z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - a. Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní.
 - b. Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou.
 - c. Ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme prác o viac ako 10 (desať) dní.
 - d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy.
 - e. Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
 - f. Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa.
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

IX. Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
 - Príloha č. 2: Harmonogram prác v členení na jednotlivé činnosti
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Plnomocenstvo Metrostav a.s.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
5. Objednávateľ je v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
9. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch ako originál. Z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
12. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že

tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v Prešove dňa 03.05.2022

v Bardejove dňa 04.05. 2022

Ing. Ján Sekerak

Na základe plnej moci

MUDr. Boris Hanuščak

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (naviac práce)

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SOKEL V KIOSKOCH	872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	872,38
DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ KAMENNÉHO	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	823,60
DEMONTÁŽ OK 1.NP ROH	646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	646,46
TRASA KABLOVÉHO VEDENIA MEDZI 1.NP - 1.F	655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	655,78
DVERE	1 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,64
HYDRANT VSTUP	1 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,90
OBKLAD STENY	38 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38 308,34
Celkom bez DPH	43 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43 333,10
DPH 20% z	43 333,10					8 666,62
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						51 999,72

Krycí list stavby

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (naviac práce)

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 28.3.2022

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO: DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO: DIČ:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

IČO: 31792693 DIČ: 2020253301

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		
HSV	28 800,76	127,44	28 800,76			0
PSV	14 532,34	600,48	14 532,34	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			43 333,10	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		43 333,10
				DPH 20% z	43 333,10	8666,62
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		51 999,72

Odberateľ: Dodávateľ:

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt SOKEL V KIOSKOCH		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	28.3.2022
Odberateľ: MESTO BARDEJOV			
IČO:		DIČ:	
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava			
IČO: 31792693		DIČ: 2020253301	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV					0		
PSV	872,38	586,80	872,38	Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00	
Stážené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		872,38	
				DPH 20% z	872,38	174,48	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		1 046,86	

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-tyt architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt SOKEL V KIOSKOCH

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce PSV								
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	280,48	0,00	280,48	0,0400	0,0000			
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	591,90	586,80	591,90	0,0000	0,0000			
Práce PSV	872,38	586,80	872,38	0,0400	0,0000			
Celkom v EUR	872,38	586,80	872,38	0,0400	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-tyt architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Zákazka Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt SOKEL V KIOSKOCH

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
	771415111_1	Montáž soklíkov rovných polymérových lepených k podkladu	m	53,94	5,20	280,48	0,001	0,037	
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				280,48		0,04	0
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,00	5,10	5,10		0	
	597641250_8	Podlahová lišta z HD polyméru typ ako MD359 (MARDOM DECOR) - (sokel k dlažbe na chodbe)	m	60,00	9,78	586,80		0	
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				591,90		0,000	0
		Práce PSV				872,38		0,040	0
		Celkom v EUR				872,38		0,040	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-tyt architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ KAMENNÉHO OBLOŽENIA STENY PARAPETU

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	359,00	0,00	359,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	359,00	0,00	359,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	464,60	0,00	464,60	0,0000	0,0000			
Práce PSV	464,60	0,00	464,60	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	823,60	0,00	823,60	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Zákazka Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (naviac práce)

Objekt DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ KAMENNÉHO OBLOŽENIA STENY PARAPETU

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612462094		Vnútorná omietka stien WEBER, vápennocementová, strojné nanášanie, weberdur jadrová omietka 1 mm IN, hr. 25 mm	m2	20,00	17,95	359,00		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				359,00		0	0
		Práce HSV				359,00		0,000	0
		Práce PSV							
782		OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA							
782631323.SD		Demontáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov s očistením pre spätné nalepenie	m2	20,00	12,28	245,60		0	
782631324.SD		Spätné nalepenie	m2	20,00	10,95	219,00		0	
782		OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				464,60		0,000	0
		Práce PSV				464,60		0,000	0
		Celkom v EUR				823,60		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt DEMONTÁŽ OK 1.NP ROH

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 28.3.2022

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

IČO: 31792693

DIČ: 2020253301

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	144,62	0,00	144,62		
PSV	501,84	0,00	501,84	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			646,46	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	646,46
				DPH 20% z	646,46
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	775,75

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-tyt architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt DEMONTÁŽ OK 1.NP ROH

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	45,64	0,00	45,64	0,0700	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	98,98	0,00	98,98	0,0000	0,0000			
Práce HSV	144,62	0,00	144,62	0,0700	0,0000			
Práce PSV								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	501,84	0,00	501,84	0,0200	0,0000			
Práce PSV	501,84	0,00	501,84	0,0200	0,0000			
Celkom v EUR	646,46	0,00	646,46	0,0900	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Zákazka Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt DEMONTÁŽ OK 1.NP ROH

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612423721.r	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 300 mm omietkou hladkou	m2	2,00	18,25	36,50	0,036	0,073	
	612460123.r	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	2,00	4,57	9,14		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				45,64		0,07	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	962031132.r	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,00	12,55	25,10		0	
	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,64	13,08	8,37		0	
	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,76	0,41	2,36		0	
	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,64	10,25	6,56		0	
	P1111107	Poplatok za skladovanie	t	0,64	85,00	54,40		0	
	P1111108	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,64	3,42	2,19		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				98,98		0	0
		Práce HSV				144,62		0,070	0
		Práce PSV							
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
	767996801.r	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	246,00	2,04	501,84	0,000	0,015	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				501,84		0,020	0
		Práce PSV				501,84		0,020	0
		Celkom v EUR				646,46		0,090	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyiac práce)

Objekt TRASA KABLOVÉHO VEDENIA MEDZI 1.NP - 1.PP

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 28.3.2022

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

IČO: 31792693

DIČ: 2020253301

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	637,11	0,00	637,11		
PSV	18,67	13,68	18,67	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			655,78	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	655,78
				DPH 20% z	655,78
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	786,94

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt TRASA KABLOVÉHO VEDENIA MEDZI 1.NP - 1.PP

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	637,11	0,00	637,11	0,0000	0,0000			
Práce HSV	637,11	0,00	637,11	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
AKUSTICKÉ A PROTITRASOVÉ OPATRENIA	18,67	13,68	18,67	0,0100	0,0000			
Práce PSV	18,67	13,68	18,67	0,0100	0,0000			
Celkom v EUR	655,78	13,68	655,78	0,0100	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Zákazka Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (naviac práce)

Objekt TRASA KABLOVÉHO VEDENIA MEDZI 1.NP - 1.PP

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	P100001	Osekanie a zarovnanie ostenia káblovej ryhy, doloženie kamenného obkladu	hod	24,00	15,33	367,92		0	
	P100002	Montáž a dodávka nárazuvzdorného dreveného obkladu z lamiel typ ako AKUFON BL so skrytým kotvením cez CLIP SYSTÉM	m2	1,56	172,56	269,19		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				637,11		0	0
		Práce HSV				637,11		0,000	0
		Práce PSV							
714		AKUSTICKÉ A PROTITRASOVÉ OPATRENIA							
	P100003	Montáž podkladového roštu pre akustické obklady	m2	1,56	3,20	4,99	0,000	0	
	P100004	Dodávka Late 60x40	m3	0,02	720,00	13,68	0,550	0,01	
714		AKUSTICKÉ A PROTITRASOVÉ OPATRENIA				18,67		0,010	0
		Práce PSV				18,67		0,010	0
		Celkom v EUR				655,78		0,010	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt DVERE	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
	Dňa 28.3.2022
Odberateľ: MESTO BARDEJOV	
IČO:	DIČ:
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava	
IČO: 31792693	DIČ: 2020253301

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	433,84	0,00	433,84		0		
PSV	588,80	0,00	588,80	Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu			1 022,64	Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00	
Stážené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		1 022,64	204,53
				DPH 20% z	1 022,64	204,53	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR			1 227,17

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt DVERE

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	433,84	0,00	433,84	0,0000	0,0000			
Práce HSV	433,84	0,00	433,84	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
AKUSTICKÉ A PROTIOTRASOVÉ OPATRENIA	588,80	0,00	588,80	0,0000	0,0000			
Práce PSV	588,80	0,00	588,80	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	1 022,64	0,00	1 022,64	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Zákazka Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt DVERE

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
6		BEŽNÉ STAVEBNÉ PRÁCE							
	P100001	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	M2	12,76	34,00	433,84		0	
6		BEŽNÉ STAVEBNÉ PRÁCE				433,84		0	
		Práce HSV				433,84		0,000	0
		Práce PSV							
714		AKUSTICKÉ A PROTIOTRASOVÉ OPATRENIA							
	P100005	D+M dvojkridlových dverí (dvere biele plné, kľučka)	ks	1,00	389,85	389,85		0	
	P100006	D+M jednokridlových dverí biele 800 l plné	ks	1,00	198,95	198,95		0	
714		AKUSTICKÉ A PROTIOTRASOVÉ OPATRENIA				588,80		0,000	0
		Práce PSV				588,80		0,000	0
		Celkom v EUR				1 022,64		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt HYDRANT VSTUP

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 28.3.2022

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-tyt architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

IČO: 31792693

DIČ: 2020253301

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV					
PSV	1 003,90	0,00	1 003,90	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 003,90	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 003,90
				DPH 20% z	1 003,90
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	1 204,68

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt HYDRANT VSTUP

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce PSV								
AKUSTICKÉ A PROTITRASOVÉ OPATRENIA	1 003,90	0,00	1 003,90	0,0000	0,0000			
Práce PSV	1 003,90	0,00	1 003,90	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	1 003,90	0,00	1 003,90	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Zákazka Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt HYDRANT VSTUP

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	714	AKUSTICKÉ A PROTIOTRASOVÉ OPATRENIA							
	P100007	HS DN25-30M /640X640X265/ NEREZ SO ZÁMKOM, PLNÉ DVIERKA	ks	1,00	631,40	631,40		0	
	P100008	Montáž	ks	1,00	172,50	172,50		0	
	P100009	Doprava	kpl	1,00	50,00	50,00		0	
	P100010	Stavebná úprava pre osadenie	kpl	1,00	150,00	150,00		0	
	714	AKUSTICKÉ A PROTIOTRASOVÉ OPATRENIA				1 003,90		0,000	0
		Práce PSV				1 003,90		0,000	0
		Celkom v EUR				1 003,90		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt OBKLAD STENY

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 28.3.2022

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

IČO: 31792693

DIČ: 2020253301

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	27 226,19	127,44	27 226,19		
PSV	11 082,15	0,00	11 082,15	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			38 308,34	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	38 308,34
				DPH 20% z	38 308,34
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	45 970,01

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-tyt architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022

Stavba Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (navyac práce)

Objekt OBKLAD STENY

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	26 605,51	127,44	26 605,51	0,1000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	559,28	0,00	559,28	1,7100	0,0000			
PRESUNY HMŔT	61,40	0,00	61,40	0,0000	0,0000			
Práce HSV	27 226,19	127,44	27 226,19	1,8100	0,0000			
Práce PSV								
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	11 031,21	0,00	11 031,21	0,0100	0,0000			
NÁTERY	50,94	0,00	50,94	0,0100	0,0000			
Práce PSV	11 082,15	0,00	11 082,15	0,0200	0,0000			
Celkom v EUR	38 308,34	127,44	38 308,34	1,8200	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Dátum: 28.3.2022


Zákazka Mestská športová hala v Bardejove - rekonštrukcia (naviac práce)

Objekt OBKLAD STENY

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	1003_108	Dodávka neakustického obkladu stien typ ako Akufon BL hr. 16 mm	m2	169,98	154,71	26 298,07		0	
	1003_109	Montáž a dodávka atypické dvierka pre ELI rozvádzač zabudované do akustického obkladu stien	ks	1,00	180,00	180,00		0	
	6051510100	Hranolček zo smrekovca, akosť I, plocha prierezu 25-75 cm2,	m3	0,18	720,00	127,44	0,550	0,097	
1		ZEMNÉ PRÁCE				26 605,51		0,1	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	56,25	7,27	408,94	0,006	0,348	
	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	52,75	2,38	125,55	0,026	1,357	
	941941195	Príplatok k cene za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia šírky od 0,8 m do 1 m a výšky do 10 m	m2	52,75	0,47	24,79		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				559,28		1,71	0
99		PRESUNY HMŔT							
	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,70	36,03	61,40		0	
99		PRESUNY HMŔT				61,40		0	0
		Práce HSV				27 226,19		1,810	0
		Práce PSV							
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	78,43	46,00	3 607,83	0,000	0,002	
	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	350,00	0,90	315,00		0	
	766411112_1	Montáž obloženia stien neakustickým obkladom AKUFON BL hr. 16 mm, v systémovom prevedení	m2	154,53	46,00	7 108,38	0,000	0,005	
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				11 031,21		0,01	0
783		NÁTERY							
	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	15,53	3,28	50,94	0,000	0,005	
783		NÁTERY				50,94		0,010	0
		Práce PSV				11 082,15		0,020	0
		Celkom v EUR				38 308,34		1,820	0

ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	★	Stavebné práce - Športová hala Bardejov, drevený	30 dny	9.5.22	17.6.22
2	★	Sokol v kioskoch	2 dny	9.5.22	10.5.22
3	★	Demotáž a spätná montáž kamenného obloženia	3 dny	11.5.22	13.5.22
4	★	Demontáž OK 1.NP roh	3 dny	16.5.22	18.5.22
5	★	Trasa kabelového vedenia medzi 1.NP - 1.PP	2 dny	11.5.22	12.5.22
6	★	Dvere	2 dny	16.5.22	17.5.22
7	★	Hydrant vstup	3 dny	13.5.22	17.5.22
8	★	Obklad steny	22 dny	19.5.22	17.6.22

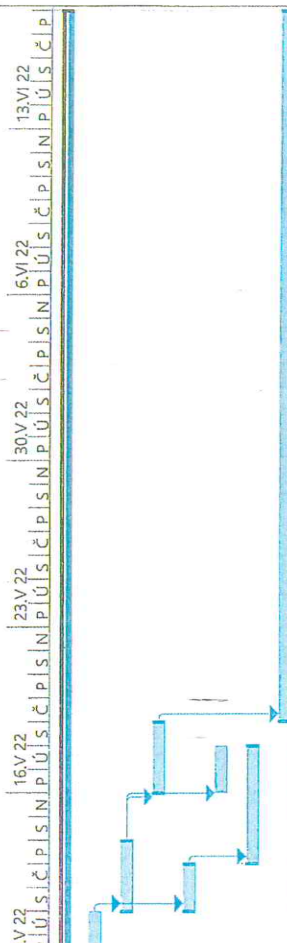

Projekt: Projekt1
Datum: 25.4.22

Úkol	Neaktivní souhrn	Vnější úkoly
Rozdělení	Ruční úkol	Vnější milník
Milník	Pouze s dobou trvání	Konečný termín
Souhrnný	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Průběh
Souhrn projektu	Ruční souhrn	Průběh ručně zadaného úkolu
Neaktivní úkol	Pouze zahájení	
Neaktivní milník	Pouze s datem dokončení	

Stránka 1

Informácie o subdodávateľoch

Verejný obstarávateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov

Zákazka: Stavebné práce „Športová hala Bardejov, drevený obklad a dokončovacie práce“

Uchádzač: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, ČR,
oprávnená podnikateľ v SR vznikom organizačnej zložky
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Zoznam subdodávateľov:

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%

Prijímateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v§ 40 ods.6 písm.

a) až h) a §40 ods. 7. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Prijímateľ požaduje aby **úspešný uchádzač najneskôr v čase uzatvárania zmluvy**, uviedol v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Dátum:03.05.2022

otlačok pečiatky uchádzača

.....

podpis

Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci



Metrostav a.s.
centrála

Plnomocenstvo

Metrostav a.s., so sídlom: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 758, zastúpená Ing. Františkom Kočím – predsedom predstavenstva a Ing. Jaroslavom Heranom – členom predstavenstva, oprávnená podnikateľ v SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, so sídlom: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, IČO: 31 792 693, DIČ: 2020253301, IČ DPH: SK2020253301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 679/B, týmto

splnomocňuje

Ing. Jána Sekeráka, oblastného riaditeľa Metrostav a.s. - divízia 3 pre Košický a Prešovský kraj
nar. 7.6.1964, bytom ul. SNP 90/87, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika

k podpisu Zmluvy o dielo a jej prípadných dodatkov na vykonanie diela: „ **Stavebné práce - Športová hala Bardejov, drevený obklad a dokončovacie práce** “ s objednávateľom Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 00321842.

V Prahe 2.5.2022

Ing. František Kočí
predseda predstavenstva
Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran
člen predstavenstva
Metrostav a.s.

Splnomocnenie prijímam:

Ing. Ján Sekerák
